

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

(al 31 dicembre 2004)

(Articolo 4 , ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 2005

INDICE

1. Quadro riepilogativo dei finanziamenti e dello stato di attuazione degli interventi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia	<i>Pag.</i>	5
1.1 Premessa	»	5
1.2 Lo stato di attuazione	»	6
1.3 Conclusioni	»	12
2. Stato di attuazione dei finanziamenti da parte dei diversi soggetti attuatori	»	16
2.1 Interventi di competenza dello Stato (in amministrazione diretta e in concessione al Consorzio Venezia Nuova)	»	16
2.2 Stato di attuazione degli interventi di competenza della Regione del Veneto	»	18
2.3 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia e del Comune di Cavallino-Treporti	»	19
2.4 Stato di attuazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni	»	21

1 QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

1.1 Premessa

La presente relazione costituisce l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che, in base all'art. 4 della Legge n. 798/84, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84, infatti, in conformità ai disposti della legislazione speciale per Venezia, ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della Legge Speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari Organismi che operano per la salvaguardia e che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia.

I lavori del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84 consentono di sviluppare e di porre in essere alcune fondamentali tematiche riguardanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, permettendo l'assunzione di decisioni di carattere generale e di scelte operative specifiche, in forma di stretto coordinamento e di cooperazione tra i diversi Organismi attivi sul territorio lagunare.

La Relazione che annualmente il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 fornisce al Parlamento è, pertanto, una informativa importante sull'azione svolta dal Comitato stesso e sui risultati che si possono raggiungere quando più Enti agiscono in modo sinergico e coordinato per il raggiungimento di uno stesso obiettivo.

I dati economico – finanziari riportati nella presente Relazione tengono conto degli aggiornamenti trasmessi dai diversi Enti a seguito di specifica richiesta da

parte del Segretario del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 (v. nota allegata prot. n. 349/GAB del 24 maggio 2005) e riproducono la **situazione al 31 dicembre 2004**.

1.2 Lo stato di attuazione

Dal quadro riepilogativo dei finanziamenti finora assegnati (*Allegato n. 1*), risulta che **lo Stato italiano, dal 1984, ha finanziato per Venezia 7.791 milioni di euro**.

Il finanziamento indicato comprende anche il volume di investimento assegnato dal CIPE al “Sistema MOSE” – con deliberazione n. 109 del 29.11.2002 e successive modificazioni e integrazioni – quale opera inserita nel programma delle “infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale” finanziate nell’ambito della “Legge Obiettivo” n. 443/01, a conferma della volontà dello Stato italiano di procedere nella realizzazione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, anche ricorrendo a strumenti di finanziamento diversi dalla legislazione speciale per Venezia.

A questo riguardo giova ricordare che il decreto di attuazione della “Legge Obiettivo” (Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002), prendendo atto del carattere sistemico dell’opera, all’art. 16, comma 4, prevede specificamente che *«le norme del [...] decreto non derogano le previsioni delle leggi [...] relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia»*.

La procedura codificata dalla legislazione speciale rimane, quindi, vigente e il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 continua ad essere l’organo di riferimento istituzionale per la programmazione e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

L’importo indicato non comprende, invece, il volume di investimento assegnato dal CIPE al “Sistema MOSE” – con deliberazioni n. 40 del 29.09.2004 e successiva n. 75 del 20.12.2004 che recepisce la proposta di ripartizione operata dal Comitato ex art. 4 legge 798/84 nella seduta del 4.11.2004, in quanto tale

finanziamento sarà effettivamente disponibile solo nel corso del corrente anno 2005 e quindi non rientra nella situazione al 31.12.2004.

Tenendo conto anche della 2ª assegnazione da parte del CIPE (709 milioni di euro), le somme complessivamente assegnate dallo Stato ammontano a 8.500 milioni di euro.

Nell'*Allegato n. 2* è riportato sinteticamente lo *stato di attuazione dei finanziamenti* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, con l'indicazione per ciascun Ente degli *importi assegnati* e degli *importi spesi* relativamente agli interventi di propria competenza.

Viene riportato nelle tabelle successive il *quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti* con l'indicazione delle somme assegnate, impegnate e spese per ciascuna Legge:

- *Allegato n. 3 – Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti;*
- *Allegato n. 4 – Legge n. 139/92;*
- *Allegato n. 5 – Legge n. 539/95;*
- *Allegato n. 6 – Legge n. 515/96;*
- *Allegato n. 7 – Legge n. 345/97;*
- *Allegato n. 8 – Legge n. 295/98;*
- *Allegato n. 9 – Legge n. 448/98;*
- *Allegato n. 10 – Legge n. 488/99;*
- *Allegato n. 11 – Legge n. 388/00;*
- *Allegato n. 12 – Legge n. 448/01;*
- *Allegato n. 13 – Legge n. 166/02;*
- *Allegato n. 14 – Legge n. 350/03.*

L'*Allegato n. 15* riepiloga sinteticamente, per gli Enti principali, gli importi assegnati e disponibili nel 2004, impegnati e spesi.

Al 31 dicembre 2004 risultano complessivamente impegnati 6.828 milioni di euro, pari al 88% degli importi assegnati, e spesi 4.686 milioni di euro, pari al 60% degli importi assegnati.

L'Allegato n. 16 riporta il confronto dello stato di attuazione delle somme spese tra la situazione al 31.12.2003 della precedente "Relazione al Parlamento", datata settembre 2004, e la situazione aggiornata al 31.12.2004 presentata in questo documento. Risulta che nel corso del 2004 vi è stato un incremento di circa il 7% delle somme complessivamente spese, in linea con l'andamento rilevato negli anni precedenti.

Con riferimento ai singoli Allegati, relativamente agli importi finanziati, impegnati e spesi per singole Leggi si ha:

- la Legge n. 798/1984 e le successive Leggi di rifinanziamento (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92 e n. 724/94) hanno reso disponibili **1.134 milioni di euro in conto capitale, già tutti sostanzialmente impegnati e spesi;**
- a partire dalla Legge n. 139/1992 e per tutte le Leggi di seguito indicate, per proseguire l'opera di salvaguardia vengono autorizzati "limiti di impegno" quindicennali e indicati i soggetti autorizzati a contrarre mutui a valere su tali "limiti di impegno". La Legge n. 139/92 ha reso così disponibili **1.351 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 1.256 milioni (93%) e spesi 1.132 milioni (84%);**
- la Legge n. 539/1995 ha reso disponibili **320 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 306 milioni (96%) e spesi 276 milioni (86%);**
- la Legge n. 515/1996 ha reso disponibili **1.134 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 1.068 milioni (94%) e spesi 869 milioni (77%);**
- la Legge n. 345/1997 ha reso disponibili **664 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 589 milioni (89%) e spesi 393 milioni (59%);**
- la Legge n. 295/1998 ha reso disponibili **133 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 113 milioni (85%) e spesi 81 milioni (61%).**

Si fa notare che, data l'entità, molto contenuta, dei fondi resi disponibili dalla Legge in oggetto per le annualità 1999 e 2000, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, nel proporre l'attribuzione di tali finanziamenti ai diversi Enti, ha ritenuto opportuno favorire, in particolare, lo sviluppo di interventi da parte di Enti normalmente non destinatari di fondi – o di fondi di entità significativa – provenienti dalla Legge Speciale;

- la **Legge n. 448/1998** ha reso disponibili **772 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 672 milioni (87%)** e **spesi 397 milioni (51%)**;
- la **Legge n. 488/1999** ha reso disponibili **636 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 484 milioni di euro (76%)** e **spesi 220 milioni di euro (35%)**;
- la **Legge n. 388/2000** ha reso disponibili **482 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati 341 milioni di euro (71%)** e **spesi 176 milioni di euro (37%)**;
- la **Legge n. 448/2001** ha assegnato un importo complessivo stimato pari a **676 milioni di euro**. Tali somme vengono, per la maggior parte, reperite mediante contratti di finanziamento stipulati e da stipularsi a valere sui “limiti di impegno” con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004 di importo pari, rispettivamente, a 10 milioni, a 15 milioni e a 31 milioni di euro.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 68298, che ripartisce i fondi sulla base di quanto proposto dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 6 dicembre 2001, è stato emesso in data 3 agosto 2002.

Ricordando che la Legge destina anche “limiti di impegno” con decorrenza dall'esercizio 2004, e tenendo conto dei tempi necessari per sottoscrivere i contratti di mutuo con gli Istituti finanziatori e, poi, per destinare, impegnare e spendere le somme così attivate, al 31 dicembre 2004, da parte dei diversi Enti, risultano solo **impegnati 424 milioni di euro (63%)** e **spesi 80 milioni di euro (12%)**. In tali importi sono compresi anche 32 milioni di euro assegnati al Magistrato alle Acque in conto capitale.

- la **Legge n. 166 del 1° agosto 2002, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 443/01 (c.d. “legge obiettivo”), all’art. 13 istituisce un apposito “fondo” e autorizza “limiti di impegno” quindicennali al fine di consentire il finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale individuate nel programma di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001.

In base a tale Legge, il CIPE, con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, successivamente rimodulata con deliberazione n. 63 del 25.07.2003, ha assegnato al “Sistema MOSE”, compreso nel già citato programma delle opere strategiche di cui alla deliberazione del CIPE del 21.12.2001, un volume di investimento attivabile a valere su “limiti di impegno” con decorrenza dal 2003, quale prima “tranche” di finanziamento del fabbisogno complessivo del “Sistema MOSE”.

Successivamente, il CIPE ha recepito, nella deliberazione n. 72 del 29.09.03, le indicazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 4.02.2003 – espresse sulla base delle disposizioni di cui all’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo n. 190/2002 di attuazione della “Legge Obiettivo” e di cui all’art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 – assegnando il “limite di impegno” di 41 milioni di euro circa, con decorrenza dal 2003, ripartito tra il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di Chioggia e di Cavallino – Treporti, consentendo così l’attivazione di un importo di **490 milioni di euro**.

Data la complessità della procedura necessaria per l’attivazione di tali fondi, effettivamente disponibili solo dal 2004, le somme impegnate e spese, al 31.12.2004, relativamente a tale Legge, risultano contenute: **impegnati 485 milioni di euro (99%)** e spesi 76 milioni di euro (**16%**);

- la **Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003)** non destina nuovi “limiti di impegno” per la prosecuzione delle attività di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ma all’art. 80 comma 28 espressamente dispone che *“una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’art. 13 della L. 1.8.2002*

n. 166 può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della L. 29.11.1984 n. 798 con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative Ordinanze di Protezione Civile”.

Come indicato al punto precedente, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nella seduta del 4 febbraio 2003, sulla base di quanto disposto all'art. 16 comma 4 dal Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190 recante la “Attuazione della L. 21.11.2001 n. 443”, ha quindi deliberato in merito alla ripartizione dei suddetti “limiti di impegno”, destinandone una quota-parte ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, e una quota-parte agli interventi di regolazione delle maree alle bocche di porto affidati al concessionario Consorzio Venezia Nuova;

- la **Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria per il 2004)** non destina nuovi “limiti di impegno” per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi Enti, mentre **reca, in Tabella D, in conto capitale, 13 milioni di euro nel 2004, 3 milioni di euro nel 2005 e 3 milioni di euro nel 2006 per gli interventi di competenza dello Stato in amministrazione diretta** di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della Legge 798/84. Essendo il finanziamento reso effettivamente disponibile solo alla fine del 2004, l'importo non viene considerato in quanto l'impegno e la spesa saranno possibili solo a partire dal 2005.

La Legge, inoltre, assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002, destinando alle opere strategiche, tra le quali è compreso il “Sistema MOSE”, nuovi “limiti di impegno” con decorrenza dal 2005 e dal 2006.

In base a tale Legge, pertanto, il CIPE, con deliberazione n. 40 del 29.09.2004, ha attribuito al “Sistema MOSE”, compreso nel già citato programma delle opere strategiche di cui alla deliberazione del CIPE del 21.12.2001, un volume di investimento di 709 milioni di euro attivabile a valere su un “contributo” pluriennale con decorrenza dal 2005, quale seconda “tranche” di finanziamento del fabbisogno complessivo del “Sistema MOSE”.

Successivamente, il CIPE ha recepito, nella deliberazione n. 75 del 20.12.04, le indicazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 4.11.2004 – espresse sulla base delle disposizioni di cui all’art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 prorogato dall’art. 23-quater del Decreto legge n. 355/2003, convertito con la Legge n. 47/2004 – e ha assegnato il “limite di impegno” di 64,888 milioni di euro circa, con decorrenza dal 2005, ripartito tra il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di Chioggia e di Cavallino – Treporti, consentendo così l’attivazione, nel corso del 2005, di un importo complessivo di **709 milioni di euro**.

- la **Legge n. 331 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005)** non destina nuovi limiti di impegno per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi Enti, ne’ assicura il rifinanziamento dell’art. 13 della Legge n. 166/2002 per le opere strategiche.

1.3 Conclusioni

Anche se dalla situazione riportata nella presente Relazione al Parlamento risulta che, progressivamente, lo Stato italiano ha destinato delle somme molto significative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, confermando, nel corso degli anni, l’impegno finanziario e la volontà politica di sostenere gli interventi fisici, ambientali, socio – economici e artistici avviati dalle Amministrazioni e dagli Enti e Istituzioni a ciò preposti, è **comunque necessario che il Governo italiano assicuri continuità alle attività di salvaguardia intraprese**.

Da una parte, infatti, diviene **necessario che venga assicurata continuità dei finanziamenti al “Sistema MOSE”, nell’ambito dei fondi per le opere strategiche**, per consentire il suo sviluppo secondo il programma di realizzazione che, nell’aggiornamento recentemente effettuato in occasione dell’introduzione

del criterio a “prezzo chiuso” per il completamento delle opere, ne prevede l’ultimazione entro il 2012.

Si ricorda che, sulla base del progetto definitivo del novembre 2002, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 ha deliberato, nella seduta del 3 aprile 2003, di completare la progettazione esecutiva e di avviare la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari, sviluppando, in parallelo, alcuni approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia.

A valere sui fondi assegnati dal CIPE nel novembre del 2002, resi, però, effettivamente spendibili solo dai primi mesi del 2004, sono stati avviati a tutti gli effetti i cantieri alle bocche di porto lagunari per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree, una volta acquisite le approvazioni e i pareri necessari sui progetti.

La seconda assegnazione di fondi da parte del CIPE, necessari per assicurare continuità ai lavori in corso alle bocche di porto e richiesti fin dalla primavera del 2003, è intervenuta solo nel mese di settembre del 2004; tenuto conto della complessa procedura propedeutica da espletare, tuttora in corso, l’effettiva disponibilità di tali ulteriori fondi non è prevedibile prima della fine del corrente anno 2005.

La Legge Finanziaria per il 2005 non ha recato il rifinanziamento del fondo per le opere strategiche, facendo così temere delle interruzioni nel flusso delle risorse necessarie per la prosecuzione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, il cui fabbisogno finanziario è stato definito nell’atto aggiuntivo rep. n. 8067 alla Convenzione Generale n. 7191/1991 tra il Magistrato alle Acque e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova, stipulato in data 11.05.2005, che introduce il “prezzo chiuso” per il completamento delle opere stesse.

Pertanto, nonostante gli impegni assunti dal Comitato Interministeriale, permangono tuttavia delle difficoltà di reperimento dei relativi finanziamenti necessari al completamento dell’opera.

Dall'altra parte, in una visione sistemica e globale dell'opera di salvaguardia, ribadita dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nel corso delle sedute del 3 aprile 2003 e del 4 novembre 2004, è necessario che **vengano garantite anche le risorse per la prosecuzione delle altre attività di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica già intraprese dai diversi soggetti secondo le varie competenze**; ciò mediante l'assegnazione, anno dopo anno, di "limiti di impegno" — ovvero di contributi pluriennali sulla base della vigente normativa - di entità adeguata che, secondo le procedure previste per gli interventi ricompresi nella legislazione speciale per Venezia, una volta ripartiti tra i vari soggetti dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84, consentano l'attivazione delle risorse finanziarie richieste.

E' importante ricordare che, mentre con le precedenti Leggi Finanziarie era stato assicurato un flusso di finanziamenti continuativo, anche se inferiore al fabbisogno esposto dai vari Enti nei propri piani generali di intervento, **con le Leggi Finanziarie per il 2003 (Legge n. 289/2002), per il 2004 (Legge n. 350/2003) e per il 2005 (Legge n. 311/2004) questo flusso finanziario è stato addirittura interrotto.**

La possibilità di accedere a una quota parte delle risorse assegnate dal CIPE, per il "Sistema MOSE" a valere sui limiti di impegno destinati alle opere strategiche, infatti, è riservata solo ad alcuni Soggetti (Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti) ed introduce un "iter" particolarmente complesso per l'ottenimento effettivo dei fondi.

Tale procedura di finanziamento, peraltro parziale, delle attività di salvaguardia non sembra, quindi, una efficace alternativa al metodo di finanziamento finora seguito nell'ambito della Legislazione speciale per Venezia.

Si segnala, infine, la necessità che anche il **Magistrato alle Acque di Venezia possa godere con continuità di adeguati finanziamenti in conto capitale**, per provvedere alla realizzazione, in amministrazione diretta, degli interventi di cui alle proprie competenze e, in particolare, della realizzazione di opere urgenti di sistemazione e di difesa di rive, marginamenti e "insulae" dei centri storici

lagunari nonché di messa in sicurezza di edifici demaniali di significativo valore storico-artistico.

Si ritiene, pertanto, doveroso segnalare la **necessità che nella Legge Finanziaria per il 2006 siano previste adeguate assegnazioni per gli interventi di salvaguardia di Venezia, sia mediante lo stanziamento di ulteriori fondi per la legislazione speciale per Venezia** - che ha consentito di disporre, con sufficiente continuità, di risorse di entità significativa -, **sia mediante il rifinanziamento delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, tra le quali è ricompreso il “Sistema MOSE”**, la cui realizzazione, ormai in corso a tutti gli effetti, non può essere inficiata da interruzioni nel flusso dei finanziamenti.

Si ricorda, infine, che in questo ambito, l'**Ufficio di Piano**, costituito con D.P.C.M. del 13 febbraio 2004, quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato ex art. 4 Legge 798/84, coordinato dal Presidente del Magistrato alle Acque, sta svolgendo una importante attività di verifica dell'avanzamento del Piano Generale degli Interventi, al fine di pervenire a futuri indirizzi sull'impiego ottimale delle risorse finanziarie afferenti alla legislazione speciale e alla massima integrazione degli interventi di salvaguardia programmati dalle singole Amministrazioni competenti.

2 STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI DIVERSI SOGGETTI ATTUATORI

2.1 INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO

2.1.1 Interventi dello Stato in amministrazione diretta (v. Documento A)

Gli interventi dello Stato da eseguire in amministrazione diretta – Magistrato alle Acque di Venezia, previsti dall'art. 3 (lettere a), b), c), e), f), g), h), i), m)) della Legge n. 798/84, riguardano: riequilibrio idrogeologico della laguna; servizio vigilanza ed antinquinamento; marginamenti lagunari; restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico; recupero del complesso edilizio dell'Arsenale; consolidamento di ponti, canali e fondamenta; sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali; restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; interventi di edilizia universitaria.

Per lo Stato in Amministrazione diretta – **Magistrato alle Acque di Venezia**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 202 milioni di euro, relativamente alla Legge n. 798/84 e alla recente Legge n. 448/01 che ha assegnato dei fondi al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare e per la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna. Al 31 dicembre 2004, il Magistrato alle Acque ha impegnato 186 milioni di euro e speso 174 milioni di euro relativamente alle somme effettivamente disponibili.

2.1.2 Interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova (v. Documento B)

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d), e l) della Legge n.

798/84 e art. 3 della Legge n. 139/92: riequilibrio idrogeologico della laguna e arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare; opere di regolazione delle maree; difesa dalle acque alte degli abitati insulari; rinforzo dei moli foranei alle tre bocche di porto; marginamenti lagunari; opere portuali marittime a difesa dei litorali; studi per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna; apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

Per il concessionario dello Stato **Consorzio Venezia Nuova**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 3.079 milioni di euro, che diventano 3.718 milioni di euro se si tiene conto dei fondi di cui alla seconda assegnazione da parte del CIPE per il "Sistema MOSE" che saranno disponibili alla fine del 2005. Al 31 dicembre 2004, il Consorzio Venezia Nuova ha impegnato 3.079 milioni di euro e speso 2.039 milioni di euro relativamente alle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e della prima assegnazione da parte del CIPE.

2.2 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE DEL VENETO (v. Documento C)

Gli interventi della Regione del Veneto di cui alla Legge n. 798/84, Legge n. 360/91 e n. 139/92 riguardano in particolare gli interventi in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dall'inquinamento del territorio dei comuni della gronda lagunare e del bacino scolante nella laguna di Venezia, anche mediante la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario nonché d'impianti di depurazione; opere di ristrutturazione dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo; realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia secondo un progetto integrato, in accordo con il Comune di Venezia, finalizzato alla manutenzione dei rii cittadini.

Per la **Regione del Veneto**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 1.762 milioni di euro compresi i fondi relativi alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01, di recente attivazione da parte della Regione. Al 31 dicembre 2004, la Regione del Veneto ha impegnato 1.005 milioni di euro e speso 675 milioni di euro relativamente alle somme assegnate.

Si ricorda che le somme indicate comprendono la quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai "limiti di impegno" destinati alla Regione Veneto, quota che viene assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii in base all'art. 3 della Legge n. 139/92.

Si segnala che gli ultimi finanziamenti destinati alla Regione del Veneto dalla legislazione speciale per Venezia risalgono alla Finanziaria per il 2002 (Legge n. 448/2001).

2.3 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA, DEL COMUNE DI CHIOGGIA E DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Gli interventi del Comune di Venezia e del Comune di Chioggia di cui all'art. 6 della Legge n. 798/84 riguardano: acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali, culturali, produttive, artigianali e commerciali; opere di urbanizzazione primaria; sistemazione di ponti, canali e fondamenta di competenza comunale; contributi ai privati per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare; acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi; per il Comune di Venezia: interventi volti alla manutenzione dei rii cittadini e degli edifici su di essi prospicienti secondo un progetto integrato, in accordo con la Regione Veneto.

2.3.1 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia (v. Documento D)

Per il **Comune di Venezia**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 1.825 milioni di euro, che diventano 1.882 milioni di euro se si tiene conto dei fondi di cui alla seconda assegnazione del CIPE al Comune di Venezia, come quota-parte delle somme assegnate per il "Sistema MOSE", che saranno disponibili alla fine del 2005. Al 31 dicembre 2004, il Comune di Venezia ha impegnato 1.714 milioni di euro e speso 1.222 milioni di euro relativamente alle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e della prima assegnazione di fondi al Comune di Venezia dal CIPE, come quota-parte delle somme assegnate al "Sistema MOSE".

Come già indicato nel paragrafo relativo alla Regione del Veneto, l'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti

dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto venga destinata al Comune di Venezia per la **realizzazione del progetto integrato di manutenzione dei rii** e degli edifici su di essi prospicienti.

Pertanto, agli importi totali assegnati al Comune di Venezia dalle diverse Leggi speciali vanno sommati tali importi.

Il documento del Comune di Venezia (Documento D) non tiene conto degli importi assegnati e spesi relativamente alla Legge n. 798/1984 e dei finanziamenti che potranno essere attivati nel 2005 a valere sui “limiti di impegno” con decorrenza dal 2005, assegnati dal CIPE come quota-parte della seconda assegnazione di fondi per il “Sistema MOSE”.

2.3.2 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Chioggia (v. Documento E)

Per il **Comune di Chioggia**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 276 milioni di euro, che diventano 287 milioni di euro se si tiene conto dei fondi di cui alla seconda assegnazione del CIPE al Comune di Chioggia, come quota-parte delle somme assegnate per il “Sistema MOSE”, che saranno disponibili alla fine del 2005. Al 31 dicembre 2004, il Comune di Chioggia ha impegnato 270 milioni di euro e speso 145 milioni di euro relativamente alle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e della prima assegnazione di fondi al Comune di Chioggia dal CIPE – tramite il Comune di Venezia –, come quota-parte delle somme assegnate al “Sistema MOSE”.

Il documento del Comune di Chioggia (Documento E) non tiene conto degli importi assegnati e spesi relativamente alla Legge n. 798/84 e dei finanziamenti che potranno essere attivati nel 2005 a valere sui “limiti di impegno” con decorrenza dal 2005, assegnati dal CIPE come quota-parte della seconda assegnazione di fondi per il “Sistema MOSE”, nonché degli importi destinati dal

Comune di Chioggia per finanziare Enti minori con le Leggi n. 388/00 e n. 448/01.

2.3.3 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Cavallino - Treporti (v. Documento F)

Per il **Comune di Cavallino – Treporti**, Amministrazione Comunale di recente istituzione di cui il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 ha preso atto nel corso della seduta del 6 dicembre 2001, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 17 milioni di euro, che diventano 20 milioni di euro se si tiene conto dei fondi di cui alla seconda assegnazione del CIPE al Comune stesso – tramite il Comune di Venezia, come quota-parte delle somme assegnate per il “Sistema MOSE”, che saranno disponibili alla fine del 2005. Al 31 dicembre 2004, il Comune di Cavallino-Treporti ha impegnato 17 milioni di euro e speso 285.000 euro relativamente alle somme disponibili provenienti dalle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e dalla prima assegnazione di fondi al Comune di Cavallino-Treporti dal CIPE – tramite il Comune di Venezia -, come quota-parte delle somme assegnate al “Sistema MOSE” .

2.4 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Per gli interventi di competenza di **altri Enti** ¹, le somme complessivamente assegnate sono pari a 629 milioni di euro. Al 31 dicembre 2004, tali Enti hanno

¹Provincia di Venezia; Università degli Studi Ca' Foscari; Istituto Universitario Architettura Venezia; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica; Procuratoria di S. Marco; Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto; Fondazione Querini Stampalia; SAVE Aeroporto Marco Polo; CO.R.I.L.A.; Diocesi Patriarcato di Venezia; Diocesi di Chioggia; Fondazione Giorgio Cini; Biennale di Venezia; Azienda Speciale Porto Chioggia; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

complessivamente impegnato 556 milioni di euro e hanno speso 431 milioni di euro delle somme disponibili.

Di seguito si evidenziano i finanziamenti e gli importi spesi di competenza di ogni singola Amministrazione:

2.4.1 Provincia di Venezia

Gli interventi della Provincia di Venezia riguardano il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio di competenza della Provincia nei centri storici di Venezia e Chioggia.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Provincia di Venezia, è pari a 103 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi ammontano a 47 milioni di euro.

2.4.2 Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (già Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica)

Gli interventi di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica riguardano lo svolgimento del programma di ricerca e di studio sul "Sistema lagunare veneziano" che coinvolge CNR, Università di Padova, Università di Venezia, Istituto di architettura di Venezia, UNESCO.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica è di 10 milioni di euro (Legge n. 798/84); gli importi spesi sono pari a 9 milioni di euro.

2.4.3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Gli interventi di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riguardano il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali è di 9 milioni di euro (Legge n. 798/84); gli importi spesi sono pari a 8 milioni di euro.

2.4.4 Ministero del Tesoro

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero del Tesoro è di 1 milione di euro (Legge n. 798/84), già speso prima del 1998.

2.4.5 Università degli Studi Ca' Foscari (v. Documento G)

Gli interventi di competenza dell'Università degli Studi Ca' Foscari riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi universitarie, l'informatizzazione dell'Ateneo e la creazione di biblioteche informatiche.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Università degli Studi Ca' Foscari al 31.12.2004 è di 119 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 488/01); gli importi spesi ammontano a 71 milioni di euro.

2.4.6 Istituto Universitario Architettura Venezia (I.U.A.V.) (v. Documento H)

Gli interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi per lo svolgimento delle attività dell'Istituto.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Istituto Universitario Architettura Venezia al 31.12.2004 è di 54 milioni di euro (Leggi n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98 e 448/01); gli importi spesi ammontano a 48 milioni di euro.

2.4.7 Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti la salvaguardia della laguna veneziana – CO.RI.LA.
(Consorzio tra Università di Venezia Ca' Foscari, IUAV, Università di Padova e CNR) (v. **Documento I**)

Gli interventi di competenza del CO.RI.LA. riguardano il coordinamento delle ricerche e degli studi scientifici inerenti la laguna di Venezia e la sua salvaguardia.

Il totale dei finanziamenti assegnati al CO.RI.LA. al 31.12.2004 è pari a 12 milioni di euro (Leggi n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 8 milioni di euro.

2.4.8 Aeroporto Marco Polo (SAVE) (v. Documento L)

Gli interventi di competenza dell'Aeroporto Marco Polo riguardano l'ampliamento dell'aerostazione, la sistemazione della viabilità, la realizzazione di piste e impianti per voli notturni, di nuovi piazzali per aeromobili e di garage multipiano.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Aeroporto Marco Polo al 31.12.2004 è di 98 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01), Gli importi spesi sono pari a 96 milioni di euro.

Relativamente alla Legge n. 448/98, i limiti di impegno e, quindi, i finanziamenti per la SAVE sono stati concessi attraverso il Comune di Venezia.

2.4.9 Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto (v. Documento M)

Gli interventi di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia (già Provveditorato al Porto) riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali, realizzazione di piazzali e banchine.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale al 31.12.2004 è di 68 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 515/96 n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi sono pari a 54 milioni di euro.

2.4.10 Azienda Speciale per il Porto Chioggia (v. Documento N)

Gli interventi di competenza Azienda Speciale per il Porto Chioggia riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali, realizzazione di piazzali e banchine.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Azienda Speciale per il Porto Chioggia (A.S.P.O) al 31.12.2004 è pari a 10 milioni di euro (Legge n. 448/98 concessi attraverso il Comune di Chioggia, Leggi n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 1,72 milioni di euro.

2.4.11 La Biennale di Venezia (v. Documento O)

Gli interventi di competenza della Biennale di Venezia riguardano l'allestimento e la gestione di attività culturali di livello internazionale.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Biennale di Venezia è pari a 26 milioni di euro (Legge n. 295/98 e n. 488/99). Gli importi spesi sono pari a 25 milioni di euro.

Con le Leggi n. 388/00 e n. 448/01 sono stati concessi dei “limiti di impegno” e, quindi, dei finanziamenti attraverso il Comune di Venezia.

2.4.12 Fondazione Scientifica Querini Stampalia (v. Documento P)

Gli interventi di competenza della Fondazione Querini Stampalia riguardano attività per l’ampliamento e la funzionalità della sede destinata a biblioteca e a galleria.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Querini Stampalia al 31.12.2004 è di 8 milioni di euro (Leggi n. 798/84 e n. 295/98); gli importi spesi sono pari a 7 milioni di euro.

Con la Legge n. 448/01 sono stati concessi dei “limiti di impegno” e, quindi, dei finanziamenti attraverso il Comune di Venezia.

2.4.13 Fondazione Giorgio Cini (v. Documento Q)

Gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini riguardano il restauro del compendio immobiliare ubicato nell’isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione stessa.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Giorgio Cini al 31.12.2004 è di 32 milioni di euro (fondi concessi attraverso il Consorzio Venezia Nuova per la Legge n. 488/99; fondi assegnati direttamente per le Leggi n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi ammontano a 3 milioni di euro.

2.4.14 Procuratoria di S. Marco (v. Documento R)

Gli interventi di competenza della Procuratoria di S. Marco riguardano interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della Basilica di San Marco.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Procuratoria di S. Marco al 31.12.2004 è di 17 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 488/99 e n. 388/00); gli importi spesi sono pari a 15 milioni di euro.

2.4.15 Curia Patriarcale di Venezia (v. Documento S)

Gli interventi di competenza della Diocesi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese e delle sedi patriarcali nel centro storico veneziano.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Diocesi è pari a 52 milioni di euro (Legge n. 295/98, n. 488/99 e n. 388/00). Gli importi spesi sono pari a 31 milioni di euro.

2.4.16 Diocesi di Chioggia (v. Documento T)

Gli interventi di competenza della Diocesi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese del centro storico di Chioggia.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Diocesi è pari a 10 milioni di euro (Leggi n. 448/98, n. 488/99, n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 6 milioni di euro.

Relativamente alla Legge n. 448/98 i finanziamenti sono stati concessi attraverso il Comune di Chioggia.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE

COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO
(ART. 4 - LEGGE 29.11.1984, N. 798)

IL SEGRETARIO

(T. +39041794341 / 351 Fax +39041794384
Mail: presidenza@magisacque.it)

Prot. n. 349 / GAB

Venezia, **24 MAG. 2005**

- Al Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca Scientifica
Gabinetto On.le Ministro
Piazzale Kennedy, 20
00100 ROMA
- Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Gabinetto On.le Ministro
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
- Alla Giunta Regionale del Veneto
Segreteria del Sig. Presidente
Cà Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA
- Al Sig. Presidente Provincia di Venezia
S. Marco - Palazzo Corner, 2662
30124 VENEZIA
- Al Sig. Sindaco del Comune di Venezia
S. Marco, 4136 - Cà Farsetti
30124 VENEZIA
- Al Sig. Sindaco del Comune di Chioggia
Corso del Popolo, 1193
30015 CHIOGGIA
- Al Sig. Sindaco del Comune di Cavallino Treporti
Via Concordia, 38/d
30010 CA' SAVIO (VE)
- Al Sig. Rettore Università degli Studi di Venezia
Dorsoduro-Ca' Foscari, 3246
30125 VENEZIA
- Al Sig. Rettore I.U.A.V.
Tolentini - S. Crocc, 191
30123 VENEZIA
- Al Sig. Presidente CO.RI.LA
S. Marco, 2847 - Palazzo Franchetti
30124 VENEZIA

- Al Sig. Presidente S.A.V.E.
Aeroporto Marco Polo
30030 TESSERA-VENEZIA
- Al Sig. Presidente Autorità Portuale
Dorsoduro, Zattere, 1401
30100 VENEZIA
- Al Sig. Presidente Azienda Speciale
Porto di Chioggia
Via Maestri del Lavoro, 50
30015 CHIOGGIA
- Al Sig. Presidente Società di Cultura .
La Biennale di Venezia
S. Marco, Cà Giustinian, 1364/a
30124 VENEZIA
- Al Sig. Presidente Fondazione Giorgio Cini
Isola di S. Giorgio Maggiore
30100 VENEZIA
- Al Sig. Presidente Fondazione Querini
Stampalia
Castello, 4778
30100 VENEZIA
- Al Responsabile Amministrativo della
Procuratoria di S. Marco di Venezia
S. Marco, 328
30124 VENEZIA
- Al Responsabile Amministrativo della
Diocesi Patriarcato di Venezia
S. Marco, 320/a
30124 VENEZIA
- Al Responsabile Amministrativo della
Diocesi di Chioggia
via del Vescovado
30015 CHIOGGIA
- Al Consorzio Venezia Nuova
S. Marco, 2803
30124 VENEZIA

OGGETTO: Richiesta dati.


In esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 è necessario predisporre l'annuale "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Ai fini della redazione di tale elaborato si chiede di voler trasmettere, entro il 30 giugno 2005, un dettagliato quadro, con somme espresse in Euro ed aggiornato al 31 dicembre 2004, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Al fine di rendere omogenee tali informazioni e per facilitare l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2004, Vi anticipiamo, in allegato, i precedenti "Quadri analitici dello stato di attuazione dei finanziamenti", già inseriti nella Relazione sopraccitata aggiornata al 31 dicembre 2003.

Distinti saluti

Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato
dott. ing. Maria Giovanna Piva



ALLEGATI

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI DEGLI IMPORTI SPESI
RELATIVAMENTE ALLE LEGGI 7804 e SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 13802, 51098, 34599, 26598, 44899, 38000, 38000, 44001 E 18602
EDIZIONE AL 31 DICEMBRE 1983
IMPORTI LORO IN MIGLIAIA DI EURO

Table with columns for various laws (LEGGI N. 13802, 51098, 34599, 26598, 44899, 38000, 44001, 18602) and a 'TOTALE PER ENTE E TOTALE GENERALE' column. Rows include 'STATO', 'REGIONE DEL VENETO', 'COMUNE DI VENEZIA', and various municipalities like 'MONTebelluna', 'Montebelluna', 'Montebelluna', etc.

Totale per legge e totale generale summary table with columns for 'LEGGI N. 13802', 'LEGGI N. 51098', 'LEGGI N. 34599', 'LEGGI N. 26598', 'LEGGI N. 44899', 'LEGGI N. 38000', 'LEGGI N. 44001', 'LEGGI N. 18602', and 'TOTALE PER LEGGE E TOTALE GENERALE'.

LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2004	176.067	170.408	169.865	169.865
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	362	362	362	362
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento	11.199	7.775	7.232	7.232
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	3.445	1.984	1.984	1.984
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali	77.975	77.975	77.975	77.975
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale	12.352	12.352	12.352	12.352
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta	49.643	49.643	49.643	49.643
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua	10.188	9.413	9.413	9.413
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662	4.662	4.662
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura	6.242	6.242	6.242	6.242
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	401.380	401.380	401.380	399.252
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche	85.679	85.679	85.679	85.224
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli	15.704	15.704	15.704	15.698
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	112.394	112.394	112.394	111.797
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado	119.448	119.448	119.448	118.527
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo	12.896	12.896	12.896	12.893
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione	7.414	7.414	7.414	7.414
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali	43.806	43.806	43.806	43.664
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	4.041	4.041	4.041	4.036
ALTRI ENTI :	57.065	51.616	51.616	49.667
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	2.041	1.756	1.756	1.756
Autorità Portuale già Provveditorato al Porto	10.846	10.846	10.846	10.846
Ministero BB.CC.AA. - dati al 31.12.98	8.522	8.522	8.522	8.072
Ministero Industria	5.165			
Ministero Ricerca Scientifica - dati al 21.02.97	10.329	10.329	10.329	9.312
Ministero del Tesoro	1.033	1.033	1.033	1.033
Procuratoria di S. Marco	4.670	4.670	4.670	4.670
Università degli Studi - dati al 31.12.2004	12.911	12.911	12.911	12.429
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2004	1.033	1.033	1.033	1.033
Fond. Querini Stampalia	516	516	516	516
Ministero Ambiente IUAV				
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004	274.393	274.393	229.788	176.340
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)				
Disinquinamento	239.791	239.791	195.186	157.271
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti	20.658	20.658	20.658	5.125
L. 798/84, art. 5 lett. b) Osp. SS. Giovanni e Paolo	13.944	13.944	13.944	13.944
COMUNE DI VENEZIA - dati al 30.06.97	203.941	203.941	203.941	163.200
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2000	32.060	32.060	31.961	26.322
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
TOTALE	1.144.907	1.133.798	1.088.550	984.645

NOTE

1) Per i rifinanziamenti della Legge 798/84, sono stati considerati gli importi risultanti dalle successive rimodulazioni e al netto delle riduzioni di cui al D.M. Tesoro n. 114758 del 21.02.1994.

2) IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

LEGGE N. 139/92**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 139/92	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	47.772	556.560	(1) 556.560	556.560	522.470
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche	} 35.016	24.957	(1) 24.957	24.957	22.766
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		85.061	(1) 85.061	85.061	85.061
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		141.581	(1) 141.581	141.581	117.768
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		163.542	(1) 163.542	163.542	155.683
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo	} 12.447	11.454	(1) 11.454	11.454	11.243
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione		7.763	(1) 7.763	7.763	7.749
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		119.197	(1) 119.197	119.197	119.197
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	310	3.003	(1) 3.003	3.003	3.003
ALTRI ENTI :	6.714	64.071	64.071	61.918	58.775
Provincia di Venezia - dati al 18.02.98	1.291	14.928	(1) 14.928	12.776	9.632
Università degli Studi - dati al 31.12.2004	2.066	17.991	(1) 17.991	17.991	17.991
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2004	2.066	20.658	(1) 20.658	20.658	20.658
IUAV - dati al 31.12.2004	1.291	10.493	(1) 10.493	10.493	10.493
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004 (*)	36.927	386.376	386.376	299.377	231.775
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	36.927	386.376	(1) 386.376	299.377	231.775
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004	33.570	308.002	(2) 308.002	302.922	285.037
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		164.954		162.106	159.932
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		25.478		24.728	22.175
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		30.393		30.001	22.104
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		32.740		31.650	27.700
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		54.437		54.437	53.126
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	4.132	35.687	(2) 35.687	35.687	34.293
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili	3.062				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	401				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	669				
TOTALE	129.114	1.350.696	1.350.696	1.256.464	1.132.350

NOTE

- **IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI** : gli importi attivati a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge.
- I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia dalla Legge 139/92 e successivo D.M. n. 140503 del 21.05.1992 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.
- **IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO**: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
 - (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993 e dal 1994.
 - (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996. Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".
- **IMPORTI IMPEGNATI**:
 - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
 - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.
- **Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5)**:
 - (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
 - (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

LEGGE N. 539/95**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGGE 539/95	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	9.908	124.051	(1) 124.051	124.051	114.319
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		9.985	9.985	9.985	9.426
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		23.134	23.134	23.134	21.349
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		41.254	41.254	41.254	34.769
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		2.447	2.447	2.447	1.997
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		47.231	47.231	47.231	46.778
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					
ALTRI ENTI :	3.460	33.301	33.301	32.165	30.007
Provincia di Venezia dati al 31.12.2000	952	8.263	(1) 8.263	7.127	5.929
Università degli Studi - dati al 31.12.2004	962	9.237	(1) 9.237	9.237	8.278
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2004	953	9.554	(1) 9.554	9.554	9.554
IUA V - dati al 31.12.2004	593	6.246	(1) 6.246	6.246	6.246
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004 (*)	4.663	50.435	(1) 50.435	46.481	43.017
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)					
Disinquinamento		47.078	47.078	43.124	39.700
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali		3.357	3.357	3.357	3.317
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004	9.128	97.321	(1) 97.321	88.991	80.025
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		63.324		57.956	55.649
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		12.515		10.518	8.605
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		13.572		13.572	12.070
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		7.824		6.859	3.615
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		86		86	86
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	1.503	14.761	(1) 14.761	14.761	9.006
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
TOTALE	28.663	319.869	319.869	306.449	276.374

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI TOTALI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente

e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

LEGGE N. 515/96**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 515/96	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	35.997	460.038	(1) 460.038	460.038	388.857
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		2.866	2.866	2.866	2.858
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		6.964	6.964	6.964	6.964
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		213.854	213.854	213.854	162.276
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		155.140	155.140	155.140	140.863
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		15.722	15.722	15.722	14.884
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		64.222	64.222	64.222	60.914
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		1.270	1.270	1.270	99
ALTRI ENTI:	11.207	130.206	130.206	122.026	107.923
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	3.822	42.866	(1) 42.866	34.686	26.393
Università degli Studi - dati al 31.12.2004	1.833	22.134	(1) 22.134	22.134	19.201
Autorità Portuale - dati al 31.12.2004	3.099	36.736	(1) 36.736	36.736	34.215
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2004	1.524	18.592	(1) 18.592	18.592	18.592
IUA V - dati al 31.12.2004	930	9.878	(1) 9.878	9.878	9.522
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004 (*)	15.907	181.903	181.903	134.476	102.953
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		181.903	(1) 181.903	134.476	102.953
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004	27.942	315.617	(1) 315.617	305.022	243.232
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		194.386		185.584	157.203
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		41.289		39.881	36.043
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		42.674		42.506	24.464
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		20.007		19.790	9.915
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		17.261		17.261	15.607
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	4.492	46.706	(1) 46.706	46.706	26.493
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
TOTALE	79.638	1.134.470	1.134.470	1.068.268	869.458

NOTE

- **IMPORTI ASSEGNATI:** stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- **IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO:** gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- **IMPORTI IMPEGNATI:**

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente

e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- **Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):**

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

LEGGE N. 345/97**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 345/97	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	18.076	239.000	(1) 239.000	239.000	168.098
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		10.308	10.308	10.308	9.976
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		91.389	91.389	91.389	55.804
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		105.385	105.385	105.385	73.335
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		3.099	3.099	3.099	3.024
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		26.767	26.767	26.767	24.031
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		2.050	2.050	2.050	1.926
ALTRI ENTI:	5.165	62.342	62.342	58.685	35.585
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	1.033	13.428	(1) 13.428	9.771	3.252
Università degli Studi - dati al 31.12.2004	2.066	26.546	(1) 26.546	26.546	10.329
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2004	1.033	10.329	10.329	10.329	10.329
IUA V - dati al 31.12.2004	1.033	12.039	(1) 12.039	12.039	11.675
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004 (*)	10.329	142.026	(1) 142.026	77.605	49.813
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti		22.675	22.675	22.675	19.835
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		119.351	119.351	54.930	29.978
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004	16.224	195.993	(1) 195.993	189.272	121.721
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		88.568		87.342	71.067
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		26.682		21.513	17.607
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		36.759		36.759	12.148
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		17.037		16.711	7.410
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		26.947		26.947	13.489
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	1.852	24.830	(1) 24.830	24.830	18.087
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
TOTALE	51.646	664.191	664.191	589.392	393.304

NOTE

- **IMPORTI ASSEGNATI:** stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

- **IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO:** gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- **IMPORTI IMPEGNATI:**

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente

e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

LEGGE N. 295/98**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 295/98		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 1999	anno 2000	totale			
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin. L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	=	=	=	=	=	=	=	=
ALTRI ENTI :	4.391	4.648	56.900	59.838	116.738	116.738	97.299	67.914
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	516	516	7.747	7.747	15.494	(1) 15.494	2.040	121
Università degli Studi - dati al 31.12.2004	776	1.033	10.044	12.911	22.955	(1) 22.955	22.955	2.871
Autorità Portuale di Venezia - dati al 31.12.2004	516	516	6.843	6.843	13.685	(1) 13.685	11.638	6.953
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2004	516	516	6.198	6.198	12.395	(1) 12.395	12.395	12.395
CO.RI.LA. - dati al 31.12.2004	258	258	3.262	3.333	6.595	(1) 6.595	6.595	6.595
Diocesi Patriarcato di Venezia	516	516	6.197	6.197	12.394	(1) 12.394	12.394	12.394
Biennale di Venezia - dati al 31.12.2002	516	516	6.714	6.714	13.428	(1) 13.428	13.428	13.428
Querini Stampalia - dati al 31.12.2004	258	258	3.615	3.615	7.230	(1) 7.230	7.230	6.113
IUAIV - dati al 31.12.2004	516	516	6.281	6.281	12.562	(1) 12.562	8.624	7.044
REGIONE VENETO L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	=	=	=	=	=	=	=	=
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004	658	439	8.255	5.371	13.626	(1) 13.626	13.513	12.747
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili			8.255	5.371	13.626		13.513	12.747
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi								
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii								
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	116	77	1.476	1.030	2.506	(1) 2.506	2.506	292
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili								
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
TOTALE	5.166	5.165	66.631	66.239	132.870	132.870	113.318	80.953

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo.

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valore sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

LEGGE N. 448/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 448/98			IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001	totale			
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	11.362	3.099	5.165	148.223	40.284	67.139	261.423	(2) 261.423	261.423	162.996
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche							20.065	20.065	20.065	18.490
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli										
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.							120.098	120.098	120.098	59.317
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado							89.247	89.247	89.247	58.118
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo							12.061	12.061	12.061	9.149
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione							303	303	303	105
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali							17.100	17.100	17.100	15.277
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca							2.548	2.548	2.548	2.541
ALTRI ENTI:	1.119	516	516	12.404	5.165	5.165	22.734	22.734	22.354	22.354
Provincia di Venezia										
Azienda speciale porto Chioggia dati al 31.12.2004 (*)	129			1.559			1.559	1.559	1.559	1.559
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2004 (**)	775	516	516	7.747	5.165	5.165	18.077	(2) 18.077	18.077	18.077
Diocesi di Chioggia - dati al 31.12.2004 (*)	215			3.098			3.098	(1) 3.098	2.718	2.718
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004 (*)	11.362	3.099	5.165	136.345	37.185	61.975	235.505	(2) 235.505	137.854	57.101
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)										
Disinquinamento							201.935	201.935	115.308	50.630
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti							33.570	33.570	22.546	6.471
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004 (**)	10.639	2.995	3.873	135.794	34.085	41.317	211.196	(2) 211.196	209.220	136.681
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							90.591		90.377	68.545
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria							26.029		25.569	14.382
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati							22.052		22.052	11.851
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi							25.680		24.378	3.961
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)							46.844		46.844	37.942
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (*)	1.670	620	775	22.591	8.242	10.071	40.904	(2) 40.904	40.904	17.744
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili										
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture										
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria										
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati										
TOTALE	36.152	10.329	15.494	455.357	124.961	185.667	771.762	771.762	671.755	396.876

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999.

(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

* Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

-IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) I limiti di impegno all'Azienda Speciale Porto Chioggia e alla Diocesi di Chioggia, del valore indicato, sono stati concessi attraverso il Comune di Chioggia.

(**) I limiti di impegno all'Aeroporto Marco Polo di Venezia, del valore indicato, sono stati concessi attraverso il Comune di Venezia.

Gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti al Comune di Venezia e al Comune di Chioggia non comprendono, pertanto, tali somme.

LEGGE N. 488/99

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 488/99		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2001	anno 2002	anno 2001	anno 2002	totale			
STATO:								
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004 (*)	9.141	7.928	108.456	93.000	208.000	(2) 208.000	208.000	91.267
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					51.699	51.699	51.699	38.356
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo molli					205	205	205	123
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					51.928	51.928	51.928	19.484
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					89.169	89.169	89.169	23.262
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					10.179	10.179	10.179	9.044
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione					997	997	997	997
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					3.823	3.823	3.823	0
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca								
ALTRI ENTI:	1.346	2.143	24.066	27.461	51.526	51.526	42.877	35.221
Provincia di Venezia								
Diocesi Patriarcato di Venezia - dati al 31.12.2004	413	516	4.750	5.949	10.699	(2) 10.699	10.699	10.699
Biennale di Venezia dati al 31.12.2004	465	516	5.681	6.714	12.395	(2) 12.395	12.395	11.784
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2004	413	516	5.165	6.198	11.362	(2) 11.362	11.362	8.871
Fondazione Giorgio Cini (*) dati al 31.12.2004		594	7.747	8.600	16.347	(2) 16.347	7.747	3.193
Diocesi di Chioggia (**) dati al 31.12.2004	55		723		723	(1) 723	674	674
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004 (*)	8.005	7.747	104.065	100.969	205.033	(2) 205.033	75.813	13.158
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)								
Disinquinamento					194.704	194.704	65.484	10.059
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti					10.329	10.329	10.329	3.099
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004	6.352	6.972	68.689	79.017	147.706	(2) 147.706	134.171	74.330
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					77.046		65.633	30.233
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					16.278		14.940	5.715
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					22.401		22.277	12.630
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insempiamenti produttivi					9.102		8.442	2.873
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri (**)					22.879		22.879	22.879
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (**)	978	1.033	9.968	13.428	23.396	(2) 23.396	23.396	6.279
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili								
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
TOTALE	25.823	25.823	315.244	313.875	635.661	635.661	484.257	220.255

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2001 e dal 2002.
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:
 - (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001.
 - (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001 e dal 2002.
 Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".
- IMPORTI IMPEGNATI:
 - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
 - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.
- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n. 139/92, art. 5):
 - (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato ri.
 - (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato ri.
- Finanziamenti per Enti diversi:
 - (*) Attraverso il Consorzio Venezia Nuova, sulla base di quanto deliberato dal Comitato ex. art. 4 Legge n. 798/84, a valere sul finanziamento attivato con limite di impegno decorrente dal 2001, è stata finanziata la Fondazione Giorgio Cini per il restauro del compendio immobiliare ubicato nell'isola di San Giorgio Maggiore nella laguna di Venezia. Inoltre, poiché il Comitato ex. art. 4 Legge n. 798/84, nella seduta del 6.12.2001, ha deliberato di destinare direttamente alla Fondazione Cini una quota parte del limite di impegno destinato già al Consorzio Venezia Nuova, su indicazione del Presidente del Magistrato alle Acque in data 5 luglio 2002 è stata destinata alla Fondazione Giorgio Cini anche la quota di limite di impegno pari a euro 593.925,43. Di conseguenza la quota di limite di impegno con decorrenza 2002 destinata al Consorzio Venezia Nuova è variata da euro 8.521.538,83 a euro 7.927.613,40.
 - (**) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AUSS 14, l'Istituto Cavanis, l'Istituto Salesiano S. Giusto, la Diocesi di Chioggia e il circolo Nautico per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia. Solo la Diocesi di Chioggia ha fornito i dati sullo stato di attuazione, non compresi pertanto, tra quelli del Comune di Chioggia.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato n. 11

LEGGE N. 388/00

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGGE 388/00		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO			IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003	totale					
STATO:										
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	5.061	7.913	60.000	94.000	154.000	(2)	154.000	154.000	86.280	
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					88.502		88.502	88.502	67.554	
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli										
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					3.878		3.878	3.878	501	
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					47.359		47.359	47.359	10.811	
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					8.137		8.137	8.137	6.992	
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione					6.124		6.124	6.124	421	
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali										
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca										
ALTRI ENTI:	1.790	4.337	20.983	52.131	73.114		68.465	57.108	19.878	
Provincia di Venezia	181	207	2.169	2.479	4.648					
Diocesi Patriarcato di Venezia (°°°)		2.374	28.488	28.488	28.488	(3)	28.488	28.488	7.846	
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2004		103	1.239	1.239	1.239		1.239	1.239	1.239	
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31.12.2004		310	3.718	3.718	3.718	(3)	3.718	3.718		
Autorità Portuale - dati al 31.12.2004		362	4.300	4.300	4.300	(3)	4.300	4.216	1.765	
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2004	258	207	3.099	2.479	5.578	(2)	5.578	5.578	5.578	
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31.12.2004	465	207	4.691	2.479	7.170	(2)	7.170	7.170	162	
Fondazione Giorgio Cini - dati al 31.12.2004	516	207	6.524	2.610	9.134	(2)	9.134			
Consorzio Universitario (CO.RI.LA.) - dati al 31.12.2004		362		4.338	4.338	(3)	4.338	4.338	927	
Diocesi di Chioggia (°°) - dati al 31.12.2004	370		4.500		4.500	(1)	4.500	2.361	2.361	
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2004 (°°°)	3.693	5.189	40.619	57.082	97.701	(2)	97.701	1.261	271	
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento					89.837			1.261	271	
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti					6.814					
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali					1.050					
COMUNE DI VENEZIA - dati aggiornati al 31.12.2004 (°)	3.925	6.972	43.920	90.000	133.920	(2)	133.920	108.759	66.909	
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					74.184			56.865	35.865	
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					17.937			10.746	8.508	
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					4.648			4.648	3.050	
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					10.811			10.160	4.600	
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)					26.340			26.340	14.886	
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (°°)	301	1.102	3.612	13.219	16.831	(2)	13.219	13.219	2.893	
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili										
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture										
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		1.102		13.219	13.219		13.219	13.219	2.893	
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati										
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia (°°)	301		3.612		3.612					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORI - dati al 31.12.2004	207	310	2.494	3.736	6.230	(2)	6.230	6.230	56	
TOTALE	14.977	25.823	171.628	310.168	481.796		473.535	340.577	176.287	

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002 e dal 2003.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:

- (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002.
- (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e dal 2003.
- (3) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2003.

Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

- (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(°) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia e l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano

(°°) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AULSS 14, l'Istituto Cavanis, Azienda Servizi Pubblici, l'Istituto per Anziani di Chioggia e la Diocesi di Chioggia, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia. Solo la Diocesi ha fornito i dati sullo stato di attuazione, non compresi, pertanto, in quelli del Comune di Chioggia.

(°°°) A seguito della delibera del Comitato ex art.4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003 la Regione Veneto rinuncia ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno con decorrenza 2003 ad essa assegnati, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi (Palazzo Patriarcale di Venezia) di competenza della Diocesi.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato n. 12

LEGGE N. 448/01
Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGGE 448/01			IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002	anno 2003	anno 2004	totale			
STATO:										
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2004				10.587	10.587	10.587	31.761	(3)	16.204	4.141
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico										
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento										
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari				10.587	10587	10587	31.761		16.204	4.141
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali										
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale										
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta										
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua										
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico										
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura										
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	3.254	5.268	10.325	39.000	63.000	123.000	225.000	(1)	225.000	33.505
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche							15.362	15.362	15.362	4.163
L. 798/84, art. 3 lett. a, d) Rinforzo molli										
L. 798/84, art. 3 lett. a, c) Difesa abitati, insulae, margin.							113.869	113.869	113.869	8.697
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado							68.374	68.374	68.374	12.649
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo							9.601	9.601	9.601	5.331
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione										
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali							17.796	17.796	17.796	2.665
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca										
ALTRI ENTI:	655	278	982	7.995	3.418	12.560	23.973	18.261	10.017	3.623
Provincia di Venezia	113			1.356			1.356			
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31.12.2004	155		129	1.860		1.900	3.760	(2)	3.760	
IUAV dati al 31.12.2004		149	103		1.788	1.236	3.024		3.024	3.024
Autorità Portuale di Venezia - dati al 31.12.2004	129		129	1.520		1.520	3.040	(2)	3.040	1.685
Aeroporto Marco Polo			129			1.548	1.548			
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31.12.2004			134			1.608	1.608			
Fondazione Giorgio Cini dati al 31.12.2004	258	129	129	3.259	1.630	2.000	6.889		6.889	
Consorzio Universitario (CO.R.I.A.) dati al 31.12.2004			129			1.548	1.548	(2)	1.548	1.548
Diocesi di Chioggia - dati al 31.12.2004 (**)			100			1.200	1.200			
REGIONE VENETO dati al 31.12.2004(*)	3.254	4.932	9.007	35.794	54.252	99.077	189.123	(1)	189.123	2.449
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento							173.987		2.449	525
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti							13.186			
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali							1.950			
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2004 (*)	2.505	4.170	8.780	27.372	45.448	94.824	167.644	(1)	167.644	133.034
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							51.426		35.586	14.852
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria							49.547		27.673	12.336
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati							23.398		23.399	6.862
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi							5.152		1.342	602
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri (**)							38.121		45.034	63
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (**)	387	658	1.450	4.644	7.896	17.400	29.940	(1)	28.140	3.340
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili										
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture										
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	387	658	1.300	4.644	7.896	15.600	28.140	28.140	28.140	3.340
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati										
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia (**)			150			1.800	1.800			
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI dati al 31.12.2004	110	186	439	1.350	2.220	5.268	8.838	(1)	8.838	8.838
TOTALE	10.165	15.492	30.987	126.742	186.821	362.716	676.279	637.006	423.682	79.867

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004.

- Finanziamenti per lo Stato in amministrazione diretta:

l'importo indicato è stato finanziato in conto capitale per "spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna" sul cap. 8620 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e assegnato in conto competenza per € 10.587.366,00 nel 2002 e € 10.587.366,00 nel 2003.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004.

(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e/o dal 2004.

(3) Fondi in conto capitale.

Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato ri.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato ri.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia, Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, Fondazione Querini Stampalia e Fondazione Ugo ed Olga Levi, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Venezia.

(**) A seguito della delibera del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003 il Comune di Chioggia rinuncia ad una quota complessiva di limiti di impegno con decorrenza 2004, pari a 250.000 euro che viene assegnata per 150.000 euro all'AULSS 14 di Chioggia per la prosecuzione delle opere a favore dell' Ospedale Civile di Chioggia e per 100.000 euro alla Diocesi di Chioggia per la prosecuzione delle opere di risanamento delle chiese dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina.

Allegato n. 13

LEGGE N. 166/02 (Collegato Infrastrutture)
Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 166/02	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2003	anno 2003			
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	36.333	450.000	450.000	450.000	71.881
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		432.848	432.848	432.848	71.354
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		17.152	17.152	17.152	527
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					
COMUNE DI VENEZIA dati al 31.12.2004 (*)	3.652	30.152	30.152	25.193	3.514
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		13.851		10.527	1.773
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		4.923		3.655	1.351
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		4.324		4.324	261
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		7.054		6.687	129
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato riù					
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2004 (*)	685	8.224	8.224	8.224	104
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORI - dati al 31.12.2004 (*)	228	1.856	1.856	1.856	211
TOTALE	40.898	490.232	490.232	485.273	75.710

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali assegnati dal CIPE con decorrenza dal 2003

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per le Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti;

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Si ricorda che il primo elenco delle opere strategiche di cui alla delibera del CIPE del 21.12.2001, in attuazione della Legge Obiettivo (L. n. 443/01), ricomprende il "Sistema MOSE", per il quale è intervenuta una assegnazione di limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004 per l'attivazione di una prima tranche di finanziamenti da parte del CIPE con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, a valere sul "fondo" per le opere strategiche di cui all'art. 13 della Legge n. 166/02. Per i suddetti limiti di impegno è intervenuta la ripartizione da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 4 febbraio 2003, che ne ha destinato una quota parte alle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti in base alle previsioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002. Con deliberazioni del CIPE n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003, a modifica e integrazione della precedente delibera n. 109 del 29.11.2002, è stato assegnato un unico limite di impegno di importo pari a 40,898 M€ decorrente dal 2002 differito al 2003, ripartito secondo le indicazioni del Comitato.

- (*) Con il limite di impegno assegnato dal CIPE (4,566 M€), il Comune di Venezia, quale soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto interministeriale n. 5279 del 20.03.2003, ha attivato finanziamenti in nome e per conto anche del Comune di Chioggia e di Cavallino - Treporti provvedendo a trasferire le somme di loro spettanza (10,080 M€). Per quanto attiene la quota degli importi assegnati al Comune di Venezia per il finanziamento delle attività del Commissario delegato al traffico acquico nella laguna di Venezia, importo pari a 10,168 M€, la devoluzione è avvenuta con apposito provvedimento. L'importo indicato (€ 30.152) è quindi al netto di tale quota.

Allegato n. 14

LEGGE N. 350/03 per il rifinanziamento fondo opere strategiche
Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 350/03	IMPORTI ASSEGNATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2005	anno 2005			
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2004	58.399	638.100			6.250 (*)
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		587.600			6.250
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		44.000			
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		6.500			
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					
COMUNE DI VENEZIA dati al 31.12.2004 (**)	5.240	57.252			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii					
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2004 (**)	973	10.635			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI - dati al 31.12.2004 (**)	276	3.013			
TOTALE	64.888	709.000	0	0	6.250

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali assegnati dal CIPE con decorrenza dal 2005

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per le Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti;

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- La Legge n. 350/03 rifinanzia il "fondo" per le opere strategiche (art. 13 Legge n. 166/02) di cui al primo programma deliberato dal CIPE (21.12.2001) in attuazione della Legge Obiettivo (Legge n. 443/01). Si ricorda che tale primo programma ricomprende il "Sistema MOSE" per il quale è intervenuta l'assegnazione di un contributo quindicennale con decorrenza dal 2005 per l'attivazione di una seconda tranche di finanziamento da parte del CIPE con deliberazione n. 40 del 29.09.2004, a valere sul suddetto "fondo". Per i summenzionati contributi è intervenuta la ripartizione da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 4 novembre 2004, che ne ha destinato una quota parte alle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti in base alle disposizioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/02 prorogata dall'art. 23 quater della Legge n. 47/04, e una quota parte al Consorzio Venezia Nuova. Con deliberazione n. 75 del 20 dicembre 2004, il CIPE ha recepito tale ripartizione.

La legge n. 350/03 finanzia anche, in conto capitale, 19 milioni di euro per il Magistrato alle Acque di Venezia. Essendo stato reso effettivamente disponibile solo alla fine del 2004, l'importo non viene considerato in quanto l'impegno e la spesa saranno possibili solo a partire dal 2005.

- (*) Alcune attività sono state anticipate nelle more della formalizzazione degli Atti Attuativi finanziati con fondi CIPE.

- (***) Al Comune di Cavallino - Treporti, in base alla delibera CIPE n. 75 del 20.12.2004, che recepisce la ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84, viene attribuito il 5% dell'importo assegnato al Comune di Venezia.

- (***) A seguito della delibera del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 del 4.11.2004 dalla quota spettante al Comune di Chioggia verranno scorporati 3,7 milioni di euro per finanziare attività dell'AULSS 14, della Diocesi di Chioggia, della Provincia di Venezia, della Congregazione Serve di Maria Addolorata e dell'Istituto Cavanis di Chioggia.

Allegato n. 15

RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Aggiornamento al 31 dicembre 2004

TABELLA DI SINTESI DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI, IMPEGNATI E SPESI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98, 448/98, 488/99, 388/00, 448/01 e 166/02

	Importi lordi in migliaia di euro				
	Importi assegnati rispetto al totale generale (%)	IMPORTI IMPEGNATI (B)	Importi impegnati rispetto importi disponibili (B/A) (%)	IMPORTI SPESI (C)	Importi spesi rispetto importi disponibili (%) (C/A)
	(A)				(C/A)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	202.169	186.069		174.006	
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.079.452	3.079.452		2.038.925	
REGIONE VENETO (*)	1.762.495	1.005.104		674.953	
COMUNE DI VENEZIA (*)	1.825.118	1.714.038		1.222.111	
COMUNE DI CHIOGGIA	275.846	270.334		144.853	
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI	16.924	16.924		285	
ALTRI ENTI	629.621	556.066		430.948	
TOTALE GENERALE	7.791.624	6.827.987	88%	4.686.081	60%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii. I valori indicati per il Comune di Venezia sono al netto di tale quota.

Allegato n. 16

RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI		SOMME SPESE				Variazione in percentuale
	(A)	Stato attuazione al 31.12.2003	Stato attuazione al 31.12.2004		%	(D)	
			Importi spesi (B)	Importi spesi (C)			
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	202.169	171.567	174.006				
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.079.452	1.738.328	2.038.925				
REGIONE VENETO	1.762.495	575.270	674.953				
COMUNE DI VENEZIA	1.825.118	1.097.624	1.222.111				
COMUNE DI CHIOGGIA	275.846	120.962	144.853				
COMUNE DI CAVALLINO - TREPONTI	16.924	9	285				
ALTRI ENTI	629.621	425.247	430.948				
TOTALE	7.791.624	4.129.006	4.686.081	53%	60%	+7%	

Importi lordi in migliaia di euro

ELENCO DOCUMENTI

- Documento A* *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque*
Le attività del Magistrato alle Acque in amministrazione diretta –
Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento B* *Consorzio Venezia Nuova*
Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione
al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento C* *Regione del Veneto*
Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi della legge speciale
per Venezia – Aggiornato al 31 dicembre 2004
- Documento D* *Comune di Venezia*
Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale
per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento E* *Comune di Chioggia*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia –
Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento F* *Comune di Cavallino - Treporti*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia –
Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento G* *Università Ca' Foscari di Venezia*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia –
Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento H* *Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia a fronte dei
finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31
dicembre 2004
- Documento I* *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di
ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA*
Stato di attuazione delle attività finanziate dalla legge speciale per Venezia –
Aggiornamento al 31 dicembre 2004

- Documento L* *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo*
Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale
— Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento M* *Autorità Portuale di Venezia*
Stato di attuazione degli interventi di competenza dell’Autorità Portuale
finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia — Aggiornamento al 31
dicembre 2004
- Documento N* *Azienda Speciale per il Porto di Chioggia*
Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti
sulla legge per la salvaguardia di Venezia — Aggiornamento al 31 dicembre
2004
- Documento O* *La Biennale di Venezia*
Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti
sulla legge per la salvaguardia di Venezia — Aggiornamento al 31 dicembre
2004
- Documento P* *Fondazione Scientifica Querini Stampalia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale —
Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento Q* *Fondazione Giorgio Cini*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Dati
consuntivi delle attività svolte — Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento R* *Procuratoria di San Marco — Venezia*
Stato di attuazione degli interventi — Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento S* *Curia Patriarcale di Venezia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale —
Aggiornamento al 31 dicembre 2004
- Documento T* *Diocesi di Chioggia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale —
Aggiornamento al 31 dicembre 2004

Documento A **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque**

Le attività del Magistrato alle Acque in amministrazione diretta –
Aggiornamento al 31 dicembre 2004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI							
MAGISTRATO ALLE ACQUE							
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA							
Aggiornamento al 31 dicembre 2004							
Importi lordi in migliaia di euro							
COMPETENZA	OBIETTIVI	LEGG. N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (910/86 - 67/88 - 360/91 - 415/92 - 724/94)					
		IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	Riequilibrio idrogeologico	362	362	362	100%	362	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	11.199	7.775	7.232	93%	7.232	93%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	Marginamenti lagunari	3.445	1.984	1.984	100%	1.984	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	Restauro di edifici demaniali	77.975	77.975	77.975	100%	77.975	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	Recupero dell'Arsenale	12.352	12.352	12.352	100%	12.352	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	49.643	49.643	49.643	100%	49.643	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	Sistemazione dei corsi d'acqua	10.188	9.413	9.413	100%	9.413	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662	4.662	100%	4.662	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	Edilizia per Università Architettura	6.242	6.242	6.242	100%	6.242	100%
	TOTALI	176.067	170.408	169.865	100%	169.865	100%

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di euro 170.430,78 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contratti.

COMPETENZA		OBIETTIVI	LEGGI N. 448/01				LEGGI N. 350/03						
			IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B) (D/B)	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B) (D/B)			
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico											
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento											
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	31.761	31.761	16.204	51%	19.000	16.000	0	0%	0	0%	
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali											
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale											
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta											
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua											
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico											
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura											
TOTALI			31.761	31.761	16.204	51%	19.000	16.000	0	0%	0	0%	

Importi lordi in migliaia di euro

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

MAGISTRATO ALLE ACQUE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Aggiornamento al 31 dicembre 2004

L'importo finanziato con la Legge 448/01 per il Magistrato alle Acque a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di Comitato ex art. 4 L. 798/84 nella seduta del 6.12.2001 per "spese in gestione al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna" - cap. 7671 ex 8620 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, può essere utilizzato nel periodo 2002-2005.

L'importo finanziato con la Legge 350/03 è relativo al capitolo 7197 i cui fondi vengono assegnati al Magistrato alle Acque tramite il Ministero dell'Ambiente - Difesa del suolo e possono essere utilizzati nel periodo 2004-2006. Essendo stato reso effettivamente disponibile solo alla fine del 2004, l'importo non viene considerato in quanto l'impegno e la spesa saranno possibili solo a partire dal 2005.

Tabella n. 2

Documento B Consorzio Venezia Nuova

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in
concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31
dicembre 2004

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Venezia, **13 GIU. 2005**
Prot. n. **1141** spc/ndo/gol

Spettabile
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
San Polo, 19
30124 Venezia


Alla c.a.: dott. ing. Maria Giovanna Piva

Oggetto: "Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2004".

In risposta alla Vs. nota prot. n. 349/GAB del 24 maggio 2005, con la presente Vi inviamo il documento in oggetto per la redazione dell'annuale "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Cordiali saluti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA



All.: c.s.

Consorzio Venezia Nuova concessionario
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Magistrato alle Acque di Venezia

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Aggiornamento al 31 dicembre 2004

Marzo 2005



Indice

Il Consorzio Venezia Nuova e il Piano Generale degli Interventi

I Finanziamenti

Tabella n. 1 Stato di attuazione dei finanziamenti assegnati al Consorzio Venezia Nuova

Tabella n. 2 Stato di Attuazione degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova

Tabella n. 3 Attuazione del Piano Generale degli Interventi da eseguire in concessione dal Consorzio Venezia Nuova

Grafici Diagrammi generali

Tabella n. 4 Le quantità realizzate e in corso di realizzazione

Lo stato di attuazione delle attività

- 3.1 Studi e sperimentazioni
- 3.2 Difesa dalle acque alte eccezionali
- 3.3 Difesa locale acque medio-alte
- 3.4 Ristrutturazione dei moli foranei
- 3.5 Difesa dalle mareggiate
- 3.6 Recupero morfologico
- 3.7 Arresto del degrado dell'ecosistema lagunare
- 3.8 Allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna
- 3.9 Ausilii luminosi alla navigazione
- 3.10 Apertura delle valli da pesca
- 3.11 Costituzione e potenziamento del Servizio Informativo

Elenchi – Mappe - Foto

1**Il Consorzio Venezia Nuova e il Piano Generale degli Interventi**

Il Consorzio Venezia Nuova è il soggetto attuatore, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, delle attività di salvaguardia di competenza dello Stato in attuazione della legge 798/84.

Per svolgere il proprio compito di concessionario di studi, sperimentazioni, progetti e opere, il Consorzio Venezia Nuova si è dotato di una struttura in grado di pianificare, organizzare e gestire le diverse attività nel loro complesso e in tutte le fasi di attuazione. Il Consorzio è costituito da grandi imprese nazionali, da cooperative e da imprese locali. La sua operatività è iniziata nella seconda metà degli anni '80, quando sono stati avviati i primi interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

Per perseguire gli obiettivi di competenza dello Stato, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova agiscono in base a una "Convenzione Generale"¹ e in base a una serie di obiettivi indicati dalla legge, organizzati in un *Piano Generale degli Interventi* che è stato definito dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo istituito dalla legge 798/84, adeguato alle indicazioni delle istituzioni rappresentate dal Comitato, approvato dagli organismi competenti (a partire dal Magistrato alle Acque e dallo stesso Comitato) e richiamato dalla legge speciale per Venezia n. 139/92, come riferimento per lo sviluppo e il finanziamento delle attività.

Il *Piano Generale degli Interventi*, in particolare, redatto sin dal 1985 come allegato alla Convenzione rep. n. 6479, è stato successivamente adeguato e formulato sugli indirizzi forniti dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nel 1987 ed approvato, nella seduta dell'11 marzo 1987, dal Comitato stesso.

¹ La "Convenzione Generale" rep. n. 7191, sottoscritta nell'ottobre del 1991, disciplina il rapporto fra l'Amministrazione concedente e il Consorzio concessionario in ordine all'insieme degli interventi affidati in concessione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, come prefigurato dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84.



Il *Piano*, nella successiva versione adeguata e aggiornata del 1991, è stato approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia, su parere del Comitato Tecnico di Magistratura, e dallo stesso Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nel 1991. Il *Piano* è stato espressamente richiamato nell'art. 3 della Legge 139/1992, quale strumento di pianificazione dell'azione del Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti). Esso contiene le conclusioni di anni di confronti, di studi e di progettazioni generali con i quali sono state esaminate alternative diverse ed è stata valutata la fattibilità del sistema delle opere e di ciascuna di esse con riguardo alla loro compatibilità ambientale ed alla loro reciproca influenza.

Tale documento è articolato secondo linee di azione distinte, ma in reciproca relazione: la difesa dalle acque alte eccezionali e medio-alte; la difesa dalle mareggiate; il recupero della morfologia lagunare; il riequilibrio ambientale.

Al *Piano* fanno riferimento otto specifici progetti generali:

- Progetto di massima delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari: approvato nel novembre 1992 e valutato positivamente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'ottobre 1994 e nel febbraio 1999;
- Progetto per la difesa locale delle "insulae" dalle acque medio-alte: approvato nel luglio 1992;
- Progetto per il rinforzo dei litorali: approvato nel settembre 1990;
- Progetto per la ristrutturazione dei moli foranei: approvato nel luglio 1991;
- Progetto per il recupero morfologico: approvato nel luglio 1993;
- Progetto per l'arresto e l'inversione del degrado: approvato nel luglio 1994;
- Progetto di fattibilità per la riapertura delle valli da pesca: approvato nel luglio 1993;
- Progetto operativo per l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia: una prima soluzione approvata nel settembre 1994 ed una seconda nel luglio 1997.

L'attuazione dei progetti generali è avvenuta negli anni, e avviene tuttora, attraverso la definizione dei singoli interventi con appositi progetti esecutivi che vengono a loro volta approvati dall'Amministrazione Concedente e dai diversi enti competenti.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Detti interventi in parte sono stati realizzati, in parte sono in corso di esecuzione, in parte devono essere avviati, mediante Atti Attuativi della "Convenzione Generale", sottoscritti tra l'Amministrazione Concedente e il Consorzio concessionario sulla base dei finanziamenti via via disponibili. Altri interventi debbono essere ancora finanziati e, pertanto, sulla base delle future disponibilità dovranno essere oggetto di nuovi, specifici, Atti Attuativi.

Il *Piano* ha subito negli anni una evoluzione nei contenuti degli interventi previsti, anche per una sempre maggiore conoscenza del sistema lagunare e dei meccanismi alla base delle problematiche che lo investono, consentendo di mettere in atto le più avanzate soluzioni progettuali nel rispetto delle situazioni ambientali, urbanistiche e artistiche del luogo di realizzazione dell'intervento.

Il *Piano Generale degli Interventi*, pertanto, è un documento programmatico in continua specificazione, che prevede lo sviluppo temporale parallelo di più attività tra loro diversificate ma fortemente interconnesse e che si realizza progressivamente facendo bagaglio delle esperienze acquisite nelle fasi attuative precedenti.

Nel corso del 2002 si è pervenuti alla ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* a seguito degli accordi intercorsi tra il Governo italiano e la Commissione Europea.

Si ricorda, infatti, che, nel corso del 2002, la Commissione Europea ha proceduto all'archiviazione della procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti dello Stato Italiano in ordine alla presunta incompatibilità, rispetto alla normativa comunitaria, dell'affidamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) al Consorzio Venezia Nuova della concessione unitaria per l'esecuzione delle attività ricomprese nel *Piano Generale degli Interventi* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

A tale importante decisione, che riafferma il ruolo svolto dal Consorzio Venezia Nuova nell'ambito delle peculiari attività unitariamente finalizzate alla salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, nonché la validità della concessione ad esso affidata dallo Stato italiano, la Commissione Europea è pervenuta dopo l'esame dei documenti contrattuali stipulati tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova in data 21 giugno 2002, che recepiscono gli accordi intercorsi tra le Autorità



Italiane e la Commissione Europea volti alla ridefinizione dell'insieme degli interventi la cui esecuzione è affidata in concessione.

In base a tali accordi, sono state stralciate dal *Piano Generale degli Interventi* affidati in concessione le opere di difesa dei centri urbani dalle acque alte e le difese per "insulae", se non ricomprese in finanziamenti già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova, per essere appaltate mediante procedure concorsuali. Inoltre, il Consorzio Venezia Nuova dovrà eseguire le opere meccaniche ed elettromeccaniche, necessarie per la realizzazione dell'intervento di regolazione delle maree alle bocche di porto, mediante appalti di fornitura i cui esecutori dovranno essere individuati per mezzo di gare da indire ed esperire dal Consorzio stesso, secondo le direttive comunitarie.

La ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* che recepisce tali accordi è stata favorevolmente esaminata dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2002.

Si ricorda in particolare che successivamente, il *Piano* è stato presentato, aggiornato al 31.12.2002, dal Presidente del Magistrato alle Acque, quale Segretario del Comitato ex art. 4 Legge 798/84, nella seduta del 3 aprile 2003 al Comitato stesso, che ne ha preso atto e ha deliberato:

"1. di prendere atto del documento "Piano dei Finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi" nella versione 31.12.2002, invitando a provvedere al suo adeguamento anche sulla base di quanto già deliberato da questo Comitato relativamente alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree del "Sistema Mo.S.E.";

2. di prendere formale impegno affinché si provveda ad attivare tutte le iniziative utili a garantire senza soluzione di continuità i flussi finanziari, indicati nel documento "Piano dei finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi", necessari per la realizzazione del "Sistema Mo.S.E." nonché per ulteriori attività, di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova, tendenti al recupero ambientale della laguna di Venezia ed alla sua salvaguardia".

2**I Finanziamenti**

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dalla Legge n. 139/92:

- difesa dalle acque alte eccezionali;
- difesa locale dalle acque medio-alte;
- ristrutturazione dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- difesa dalle mareggiate;
- recupero della morfologia lagunare;
- arresto del degrado dell'ecosistema lagunare;
- allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna;
- ausilii luminosi alla navigazione;
- apertura delle valli da pesca;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo.

Lo stato di attuazione dei finanziamenti stanziati per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova, viene di seguito riportato in alcune tabelle che evidenziano per ciascuna legge e per ciascun obiettivo l'avanzamento aggiornato al 31 dicembre 2004.

In riferimento alla *Tabella n. 1*, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente stanziati in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 al 31.12.2004. Essi ammontano a 4.039 milioni di euro, importo che tiene conto della seconda assegnazione di fondi da parte del CIPE per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.



A partire dalla Legge n. 139/92, i finanziamenti vengono attivati con contratti di finanziamento a valere sui "limiti di impegno", recati anno dopo anno dalle Leggi Finanziarie, destinati in quota parte allo Stato per gli interventi in concessione, per l'ammortamento delle rate (per capitali ed interessi) relative ai mutui contratti dal Consorzio Venezia Nuova, mediante specifica ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 e operata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi ad Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova alla data del 31 dicembre 2004. Tali importi sono pari a 3.401 milioni di euro.

Per **importi impegnati** si intendono gli importi relativi ad Atti Attuativi il cui Decreto Presidenziale approvativo è già stato registrato da parte della Sezione per il Veneto della Corte dei Conti. Al 31.12.2004 risulta, impegnato il 100% degli importi sottoscritti.

Per **importi spesi** al 31.12.2004 si intendono gli importi prodotti a tale data. **Al 31.12.2004 risulta speso il 60% degli importi sottoscritti.**

Nella *Tabella n. 2* è riportato l'elenco degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova e il loro avanzamento.

Nella *Tabella n. 3* viene riportato sinteticamente, per ciascun obiettivo indicato dalle Leggi n. 798/84 e 139/92 il fabbisogno totale, gli importi finanziati, gli importi sottoscritti, gli importi impegnati, gli importi relativi ad attività già realizzate e in corso di realizzazione (comprese le attività di prossimo avvio che hanno il progetto esecutivo approvato) nonché gli importi spesi.

Il **fabbisogno totale** viene valutato sulla base di documenti tecnici già prodotti, di stime provenienti da lavori analoghi, di indicazioni di massima, qualora si tratti di interventi non ancora sufficientemente delineati, da preventivi più dettagliati per interventi il cui progetto si trova già in fase di sviluppo. Per quegli interventi il cui progetto esecutivo è già stato approvato dall'Amministrazione concedente, il fabbisogno totale coincide con l'importo approvato.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Per tale motivo, l'importo indicato quale fabbisogno totale subisce delle evoluzioni nel tempo, tenendo conto di quanto definitosi progressivamente con l'approvazione dei singoli progetti esecutivi.

Di seguito alcuni grafici che mettono in evidenza i dati riportati nelle tabelle precedenti. In particolare, si fa notare l'elevata percentuale rappresentata dagli interventi già realizzati e in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2004, rispetto agli importi già stanziati a favore del concessionario e sottoscritti tra il Consorzio Venezia Nuova e il Magistrato alle Acque.

Il "*Fabbisogno residuo da finanziare*", per ciascun obiettivo, indicato nelle tabelle riportate alla fine di ogni paragrafo, è dato dalla differenza tra il fabbisogno totale e gli importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova.

Con il fabbisogno residuo si dovrà trovare copertura finanziaria per quegli interventi:

- che costituiscono ulteriori stralci di interventi già realizzati o in corso di realizzazione;
- che costituiscono ulteriori fasi di sviluppo di attività che, per loro natura, si sviluppano nel corso di più anni (monitoraggi, manutenzioni di interventi già realizzati, gestione del Servizio Informativo);
- che non hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito degli atti Convenzionali già sottoscritti in quanto non particolarmente urgenti o comunque rinviabili rispetto ad altri interventi;
- la cui progettazione è ancora in fase di sviluppo e, poiché richiede tempi lunghi di completamento e di successiva procedura approvativa, si è ritenuto opportuno rinviare il finanziamento delle relative opere (ciò vale soprattutto per gli interventi di sistemazione delle sponde e dei fondali dei canali portuali a Porto Marghera che non trovano copertura nell'ambito dei fondi provenienti dall'accordo Stato - Montedison (ora Edison S.p.A.) per i quali, per la complessità delle progettazioni e per la complessità del successivo iter approvativo, trovano per lo più finanziamento nell'ambito degli Atti Attuativi finanziati solo i relativi progetti, mentre gli interventi veri e propri non risultano coperti da finanziamenti e quindi sono compresi nel fabbisogno residuo da finanziare);
- che costituiscono nuovi studi e sperimentazioni da realizzare in funzione di alcune esigenze specifiche di approfondimento emerse nel corso di attività progettuali.

Consorzio Venezia Nuova 

La maggior parte del fabbisogno residuo è rappresentata dagli importi valutati necessari per il completamento della realizzazione del sistema delle opere per la regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto lagunari.

L'altra parte rilevante del Fabbisogno residuo è rappresentata dagli interventi ambientali per molti dei quali, come sopra segnalato, nell'ambito dei finanziamenti disponibili, si è preferito finanziare le sole progettazioni, richiedendo tempi di sviluppo e iter approvativi molto lunghi.

La *Tabella n. 4* infine, dà contezza di quanto già realizzato anche in termini di "quantità" ovvero dello sviluppo dei lavori effettuati, sia nel campo della salvaguardia fisica (difesa dalle acque medio-alte, difesa dalle mareggiate, rinforzo dei moli foranei) che nel campo della salvaguardia ambientale (interventi per il recupero morfologico e per l'arresto del degrado del bacino lagunare).

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Tabella n. 1 - Stato di attuazione dei finanziamenti assegnati al Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2004 -

Importi in milioni di Euro

	DECORRENZA LIMITI DI IMPEGNO	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI	%	IMPORTI IMPEGNATI	%	IMPORTI SPESI	%
		(A)	(B)	(B)/(A)	(C)	(C)/(B)	(D)	(D)/(B)
LEGGE 798/84	(*)	401,380	401,380	100%	401,380	100%	399,252	99%
LEGGE 139/92	1993 - 1994	556,560	556,560	100%	556,560	100%	522,470	94%
LEGGE 539/95	1996 - 1997	124,051	124,051	100%	124,051	100%	114,319	92%
LEGGE 515/96	1997 - 1998	460,038	460,038	100%	460,038	100%	388,857	85%
LEGGE 345/97	1998 - 1999	239,000	239,000	100%	239,000	100%	168,098	70%
LEGGE 448/98	1999 - 2000 - 2001	261,423	261,423	100%	261,423	100%	162,996	62%
FONDI CIPE PER INTERVENTI AMBIENTALI	(*)	50,096	50,096	100%	50,096	100%	4,992	10%
LEGGE 488/99	2001 - 2002	208,000	208,000	100%	208,000	100%	91,267	44%
LEGGE 388/00	2002 - 2003	154,000	154,000	100%	154,000	100%	86,280	56%
LEGGE 448/01	2002 - 2003 - 2004	225,000	225,000	100%	225,000	100%	33,505	15%
LEGGI 448/01 - 166/02 DELIBERA CIPE 29/11/02 PER "SISTEMA MOSE"	2003	450,000	450,000	100%	450,000	100%	71,881	16%
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - MONTEDISON (ora Edison S.p.A.)	(*)	271,140	271,140	0%	271,140	100%	7,540	3%
TOTALE PARZIALE		3.400,688	3.400,688	100%	3.400,688	100%	2.051,457	60%
LEGGI 166/02 - 350/03 DELIBERA CIPE 29/09/04 PER "SISTEMA MOSE"	2005	638,100	0,000	0%	0,000	0%	6,250	0%
TOTALE GENERALE		4.038,788	3.400,688	84%	3.400,688	100%	2.057,707	61%

LEGENDA

Negli importi indicati non sono compresi i fondi provenienti da Accordi di Programma con altri Enti.

IMPORTI FINANZIATI: gli importi complessivamente stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova alla data del 31.12.2004.

IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2004: gli importi relativi ad Atti Attuativi sottoscritti a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2004: gli importi impegnati a tale data con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque registrato da parte della Sezione per il Veneto della Corte dei Conti.

IMPORTI SPESI AL 31.12.2004: gli importi prodotti a tale data.

NOTE

(*) Fondi in conto capitale.

(**) Attività di progettazione avviate nelle more della formalizzazione del nuovo Atto Attuativo da formalizzare a valere sulla 2^ assegnazione CIPE.



Tabella n. 2 - Stato di attuazione degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2004 -

importi in milioni di Euro

ATTO ATTUATIVO rep. n°	DATA SOTTOSCRIZIONE	LEGGE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DELL' ATTO ATTUATIVO	STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2004 (***)	
				IMPORTI SPESI (E)	% (E/D)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(E/D)
6479 (*)	12-lug-85	798/84 - 910/86	139,379	139,379	100%
6745 (*)	23-dic-87	910/86 - 67/88	98,824	98,088	99% (****)
7025 (*)	15-dic-89	67/88	64,144	63,568	99% (****)
7138 (*)	21-feb-91	67/88 - 360/91	41,317	40,991	99% (****)
7191 (*)	04-ott-91	67/88	2,582	2,486	96% (****)
7295 (*)	05-giu-92	67/88	30,740	30,346	99% (****)
1568 (**)	21-nov-87	798/84	3,868	3,868	100%
1685 (**)	20-apr-89	910/86	20,527	20,527	100%
7322 (*)	03-dic-92	139/92	388,260	378,367	97%
7395 (*)	23-nov-93	139/92	168,300	144,102	86%
7601 (*)	20-mar-96	539/95	44,000	36,957	84%
7637 (*)	29-ott-96	539/95	80,051	77,362	97%
7649 (*)	18-dic-96	515/96	315,038	284,189	90%
7695 (*)	28-lug-97	515/96	145,000	104,669	72%
7725 (*)	23-dic-97	345/97	111,000	88,220	79%
7760 (*)	14-lug-98	345/97	128,000	79,878	62%
7818 (*)	01-dic-99	448/98	154,000	94,950	62%
7844 (*)	24-feb-00	448/98	40,284	34,367	85%
7867 (*)	03-nov-00	CIPE	50,096	4,992	10%
7868 (*)	03-nov-00	448/98	67,139	33,678	50%
7894 (*)	30-mar-01	488/99	115,000	36,313	32%
7923 (*)	01-ago-01	488/99	93,000	54,955	59%
7952 (*)	21-giu-02	388/00	60,000	41,508	69%
7953 (*)	27-giu-02	448/01	39,000	6,697	17%
7962 (*)	21-ott-02	388/00	94,000	44,771	48%
7980 (*)	18-dic-02	448/01	63,000	12,124	19%
8007 (*)	01-ott-03	448/01	123,000	14,683	12%
8014 (*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	136,000	23,104	17%
8015 (*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	314,000	48,776	16%
8022 (*)	31-mar-04	FONDI EDISON	271,140	7,540	3%
TOTALE			3.400,688	2.051,457	60%

(*) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Non sono comprese le attività finanziate da altri Enti nell'ambito di specifici "Accordi di programma".

(**) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Genio Civile Opere Marittime e Consorzio Venezia Nuova.

(***) Sono riportati gli importi spesi ovvero realizzati al 31.12.2004. Non compreso l'avanzamento delle attività finanziate da altri Enti.

(****) Lo scostamento tra l'importo dell'Atto Attuativo e l'importo speso è dato dalle somme a disposizione (Atti Attuativi ultimati in attesa di collaudo finale).

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Tabella n. 3 - Attuazione del Piano Generale degli Interventi da eseguire in concessione dal Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2004 -


	fabbisogno totale	importi in milioni di Euro				
		importi finanziati	importi sottoscritti	importi impegnati	importi realizzati e in corso di realizzazione	importi spesi
1 difesa dalle acque alte eccezionali (*)	3.700	1.309	723	723	675	330
2 difesa locale dalle acque medio alte	911	911	911	911	815	582
3 ristrutturazione dei moli foranei	108	108	108	108	108	108
4 difesa dalle mareggiate	415	353	353	353	338	314
5 recupero morfologico	802	501	455	455	403	305
6 arresto del degrado dell'ecosistema lagunare	1.224	693	693	693	526	308
7 allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna	45	13	13	13	8	8
8 ausili luminosi alla navigazione	21	15	15	15	15	15
9 apertura valli da pesca	4	4	4	4	4	4
10 servizio informativo	161	102	96	96	91	77
11 ulteriori somme a disposizione	30	30	30	30	0	0
TOTALE	7.420	4.039	3.401	3.401	2.983	2.051
VALORI %			84%	100%	88%	60%
			degli importi finanziati	degli importi sottoscritti	degli importi sottoscritti	degli importi sottoscritti

(*) Il fabbisogno è stimato da progetto definitivo. E' in fase d'esame da parte del Magistrato alle Acque l'offerta del Consorzio Venezia Nuova per la valutazione a "prezzo chiuso" delle attività necessarie per il completamento del "Sistema MOSE".


Consorzio Venezia Nuova 

Grafici

Composizione del fabbisogno totale (7.420 Mln €)

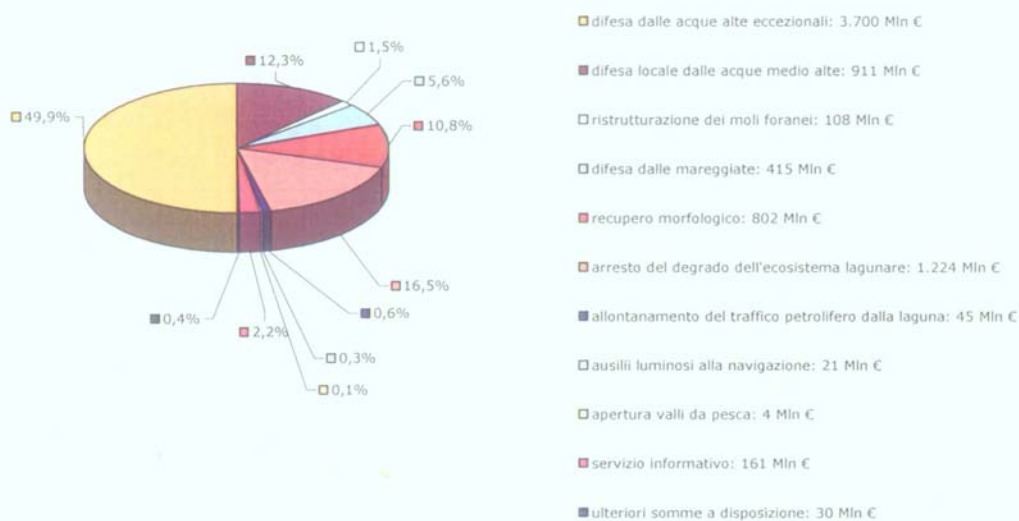

Distribuzione degli importi sottoscritti (3.401 Mln €)

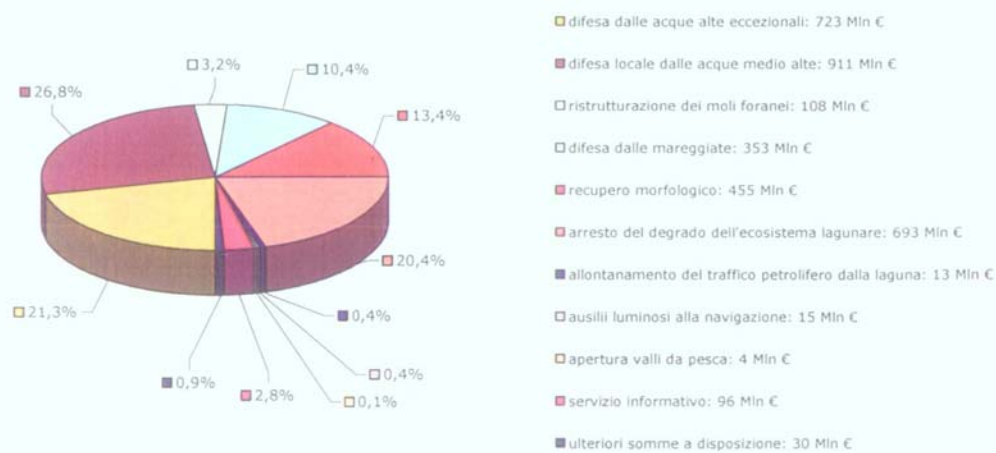

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Confronto fra importi sottoscritti (3.401 Mln €), importi realizzati e in corso di realizzazione (2.983 Mln €) e importi spesi (2.051 Mln €)

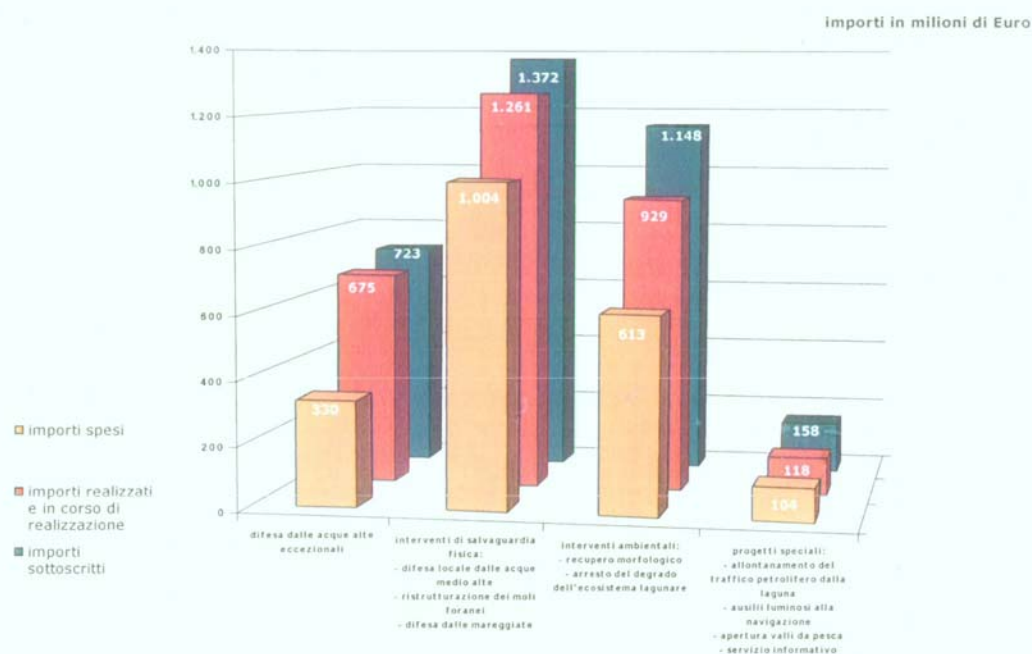




Tabella n. 4 - Le quantità realizzate e in corso di realizzazione. Aggiornamento al 31 dicembre 2004 -

SALVAGUARDIA FISICA

DIFESA DALLE ACQUE ALTE, INSULAE E MARGINAMENTI

Consolidamento, ristrutturazione e rialzo rive urbane e sponde lagunari

Sviluppo lavori ●	→	86 km
Superficie totale aree difese ●	→	1190 ettari

DIFESA DALLE MAREGGIATE

Rinforzo dei litorali

Sviluppo lavori di ricostruzione o ampliamento spiagge ●	→	45 km
Sviluppo dune ricostruite e naturalizzate ●	→	8 km
Sabbia impiegata ●	→	9,8 milioni di m ³

Ristrutturazione dei moli foranei

Sviluppo lavori ●	→	11 km
-------------------	---	-------

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

RECUPERO MORFOLOGICO

Ricalibratura di canali

Sviluppo lavori ●	→	150 km
Sedimenti dragati ●	→	9 milioni di m ³

Ricostruzione di velme e barene

Sviluppo lavori ●	→	928 ettari
Sedimenti impiegati ●	→	9,8 milioni di m ³

Protezione di barene, velme e bassifondali

Sviluppo palificate o burghe a protezione del bordo delle barene ●	→	14 km
Sviluppo fascinate di sedimentazione ●	→	8 km
Aree di trapianto vegetazione alofila e fanerogame ●	→	n. 28

Recupero isole.

Isole oggetto di intervento ●	→	n. 12
-------------------------------	---	-------

ARRESTO DEL DEGRADO

Messa in sicurezza delle ex discariche

Discariche oggetto di intervento ●	→	n. 5
Superficie totale aree messe in sicurezza ●	→	182 ettari

Messa in sicurezza di sponde dei canali industriali

Sviluppo lavori ●	→	11,8 km
-------------------	---	---------

Asportazione di sedimenti inquinati dai canali industriali

Sviluppo lavori ●	→	312.000 m ³
-------------------	---	------------------------

Copertura di fondali inquinati

Sviluppo lavori ●	→	12 ettari
-------------------	---	-----------

Ripristino di aree umide di fitobiodepurazione

Aree di intervento ●	→	n. 2
----------------------	---	------

Raccolta di macroalghe

Biomassa raccolta ●	→	221.000 m ³
---------------------	---	------------------------

3**Lo stato di attuazione delle attività****3.1 Studi e sperimentazioni**

(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Acquisire le conoscenze sul sistema fisico e sul sistema ambientale della laguna e sulle loro problematiche, al fine di poter disporre in un quadro unitario di tutti gli elementi necessari alla fase di progettazione degli interventi.

Descrizione degli interventi

La grande rilevanza attribuita dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova all'attività di studio trova la sua origine nella complessità insita nella definizione di un insieme di interventi con forti contenuti innovativi e inquadrati in una concezione sistemica dell'ambiente lagunare.

Dall'inizio della sua attività ad oggi, il Consorzio Venezia Nuova ha portato a compimento un rilevante programma di studi, compiutamente definito con il Piano generale degli studi del 1988, successivamente aggiornato in base alle conoscenze via via acquisite, riguardante circa 250 attività, per la maggior parte già realizzate.

La caratteristica principale della realizzazione di questo piano di studi è l'interdisciplinarietà dell'approccio adottato, che consente per la prima volta di inquadrare in una visione unitaria le complesse interrelazioni tra l'ambiente fisico, l'ambiente naturale e l'economia del territorio lagunare.

Il Consorzio Venezia Nuova, per realizzare questo compito, si è dotato di un nucleo di coordinamento altamente qualificato



composto da esperti, interni alla struttura e consulenti, che definisce e programma le diverse fasi di sviluppo del piano di attività e garantisce il controllo della qualità dei risultati raggiunti.

Gli studi e le sperimentazioni realizzati nell'ambito del progetto di salvaguardia di Venezia hanno prevalentemente un carattere applicato e una finalità operativa strettamente connessa alla progettazione.

Questi studi si differenziano notevolmente dall'attività condotta dagli enti, come il CNR o le Università, che hanno svolto e svolgono ricerche relative al territorio lagunare. Generalmente, infatti, l'obiettivo di tale attività di ricerca non è la formazione di una conoscenza di tipo interdisciplinare con finalità operative, come è nel caso del Consorzio Venezia Nuova, bensì lo sviluppo di linee settoriali di ricerca su specifici aspetti di interesse dei singoli ricercatori o delle strutture cui essi fanno riferimento.

In questo senso, i risultati delle ricerche di enti e istituzioni sono il fondamento su cui si basano gli studi promossi dal Consorzio per gli obiettivi della salvaguardia, i quali, invece, hanno principalmente lo scopo di fornire i necessari input all'attività di progettazione.²

² La realizzazione del programma degli studi e delle sperimentazioni svolto dal Consorzio Venezia Nuova richiede il contributo di alcune Università, di centri di ricerca pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, dei maggiori laboratori in Italia e all'estero, di società di ingegneria, di studi professionali, oltre che dei principali esperti del settore.

Lo sforzo compiuto con l'attuazione del Piano degli studi² non solo ha contribuito allo sviluppo della conoscenza dell'ecosistema veneziano, ma ha soprattutto consentito di mettere a punto un insieme di progetti ad alto contenuto innovativo al fine di affrontare compiutamente e in modo unitario tutte le grandi questioni della salvaguardia di Venezia.

Il Piano degli studi è stato concepito in maniera flessibile, per essere periodicamente aggiornato a seconda delle esigenze che si manifestano nello sviluppo dell'attività di sperimentazione e di progettazione.

Dal punto di vista del loro contenuto, gli studi possono essere classificati in:

Studi propedeutici agli interventi di salvaguardia fisica

Si tratta di *studi propedeutici alla progettazione di massima e, successivamente, esecutiva* del sistema di interventi volti alla difesa fisica della laguna.

Riguardano, pertanto, le *opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, la ristrutturazione dei moli alle bocche di porto, il*

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

rinforzo dei litorali, le difese locali dei centri abitati e delle "insulae".

Per questa tipologia di interventi, gli studi propedeutici sono in massima parte già conclusi, trattandosi di interventi già tutti passati alla fase di progettazione esecutiva e realizzazione.

In questo modo, la realizzazione degli interventi, in relazione alla natura delle opere, è stata preceduta da approfondimenti storici con riferimento ai metodi costruttivi e ai materiali utilizzati ed è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono stati valutati i complessi processi di interazione tra gli elementi fisici e la struttura delle opere, per l'ottimizzazione delle loro caratteristiche e per il loro dimensionamento.

Il complesso degli studi svolti per la progettazione preliminare, di massima e definitiva si può suddividere nelle tipologie di seguito elencate:

- a) *campagne di indagini geognostiche, di rilievi batimetrici, correntometrici e ondometrici* svolte in laguna, alle bocche di porto, lungo i litorali e in prossimità dei moli foranei;
- b) studi finalizzati alla conoscenza dell'idrodinamica e della propagazione del moto ondoso in laguna mediante *modelli matematici* della laguna di Venezia e delle tre bocche di Lido, Malamocco e Chioggia. In tale contesto è stato avviato lo sviluppo di un sistema di previsione dell'acqua alta e delle condizioni meteomarine, indispensabile alla gestione delle opere mobili. I modelli matematici nelle diverse tipologie oggi disponibili, con l'ulteriore fondamento che potrà ottenersi con nuove osservazioni e misure, potranno anche essere utilizzati per la futura gestione del sistema lagunare nei vari aspetti e implicazioni che presenta;
- c) *modelli fisici* presso il Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), che proprio a seguito dell'attività svolta per la salvaguardia di Venezia, oggi dispone di una attrezzatura che sicuramente lo qualifica come il più importante centro di ricerca italiano in questo campo.

Nel corso dello sviluppo dell'attività, sia per la modellistica matematica che per quella fisica, sono stati utilizzati, oltre al Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova),



anche altri centri sperimentali specializzati in Italia e all'estero quali: Estramed (Pomezia - Roma), Danish Hydraulics Laboratory (Danimarca), Delft Hydraulics Institute (Olanda) e Hydraulics Research di Wallingford (Inghilterra).

L'insieme di queste attività ha consentito di acquisire un bagaglio di conoscenze non immaginabile fino a pochi anni fa per gli approfondimenti raggiunti, ma soprattutto per la coerenza con cui sono stati affrontati. Ciò ha consentito anche di mettere a punto e di calibrare sofisticati modelli matematici con i quali prevedere gli effetti prodotti con gli interventi. Ha, infine, consentito di stabilire dove e come sia possibile utilizzare in modo sinergico gli effetti dei diversi interventi e quindi di stabilire, tra gli altri, l'importanza degli interventi morfologici sul miglioramento della qualità dell'ambiente e sulla riduzione (per altro contenuta) dei livelli di marea in laguna.

Studi propedeutici agli interventi di salvaguardia ambientale

L'importanza che hanno assunto, nel quadro dell'azione di salvaguardia, gli interventi di riequilibrio ambientale trova una precisa corrispondenza nel piano degli studi sviluppato dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, nell'ambito del quale un elevato numero di studi riguarda direttamente l'analisi dei processi inquinanti e delle condizioni dell'ecosistema.

E' stato, pertanto, possibile definire un programma generale di interventi di risanamento ambientale che non ha precedenti in Italia e che, per la sua qualità e dimensione, si colloca tra le esperienze più avanzate a livello internazionale.

Gli studi di carattere strettamente ambientale possono essere distinti in *studi di identificazione delle problematiche generali* e in *studi su aspetti specifici dell'ecosistema*, sia per quanto riguarda la morfologia lagunare, sia per quanto riguarda il processo di degrado ambientale. I primi costituiscono degli studi di inquadramento delle conoscenze e di ridefinizione in termini sistemici dell'approccio all'intervento di risanamento. Questi studi costituiscono il punto di arrivo di una serie molto ampia di analisi e di campagne di rilievi delle condizioni dell'ecosistema lagunare che riguardano la tendenza evolutiva della morfologia della laguna e le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque e dei sedimenti; i secondi riguardano, invece, aree della laguna o elementi settoriali dell'ambiente sui quali è necessario, a fini progettuali, condurre degli approfondimenti. Rientrano in questo ambito, ad esempio, lo studio degli effetti della navigazione interna sulla morfologia

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

lagunare o le prove condotte presso il centro Sperimentale di Voltabarozzo per verificare le strutture da collocare lungo le rive e i bordi delle barené, idonee ad assorbire il moto ondoso prodotto dai natanti e dal vento.

Maggiori dettagli sullo stato di attuazione sono riportate nelle singole schede per obiettivo.

**3.2 Difesa dalle
acque alte
eccezionali**
(interventi di cui
all'art. 3 lettera a)
legge n. 798/84)

Obiettivo

Attuare la difesa della laguna e dei centri abitati dalle alte maree eccezionali, ovvero quando il livello della marea in laguna supera la quota delle difese locali, fino a raggiungere i massimi livelli prevedibili in futuro, mediante la realizzazione di opere che isolano, momentaneamente, la laguna dal mare.

Descrizione degli interventi

Il fenomeno delle acque alte a Venezia ha registrato, negli ultimi 50 anni, una rilevante evoluzione negativa, sia sotto il profilo della frequenza, sia dal punto di vista della sua durata e intensità.

La causa è da tempo nota: si tratta, principalmente, dell'effetto congiunto tra l'abbassamento del livello del suolo -23 cm (in parte dovuto a processi naturali ma soprattutto fino agli anni '70, all'estrazione di acque per uso industriale dalle falde sotterranee), e l'innalzamento del livello medio del mare registrato in questo secolo.

A questi fenomeni se ne sono aggiunti altri che hanno contribuito a peggiorare le condizioni generali della morfologia lagunare: le alterazioni ambientali provocate dalle opere realizzate a fini industriali, come lo scavo del c. d. "canale dei petroli" e i vasti imbonimenti delle aree umide; il diffondersi di attività distruttive dell'ambiente, come la circolazione dei natanti a motore e la pesca secondo modalità non consentite.

La conseguenza di tutto ciò è stato l'aumento del rischio cui sono esposti Venezia e gli altri insediamenti storici del bacino lagunare di fronte a eventi mareali eccezionali e alla continua azione disgregatrice delle alte maree, che si verificano con crescente frequenza.



E' inoltre prevedibile che la situazione possa diventare ancora più critica in futuro per il sovrapporsi degli effetti del riscaldamento dell'atmosfera.

La complessità delle cause che nel tempo hanno messo a rischio i centri abitati lagunari ha indirizzato lo studio e la scelta della soluzione in grado di ricreare adeguate condizioni di sicurezza.

Si è previsto di attuare la difesa attraverso un piano organico di interventi che comprende le difese locali dagli allagamenti (vedi scheda specifica), gli interventi morfologici che, pur se in modo molto limitato, attenuano, i livelli del mare in laguna (vedi scheda specifica) e le opere per isolare momentaneamente la laguna dal mare quando il livello di marea in laguna supera comunque la quota delle difese locali, fino a raggiungere i massimi livelli prevedibili in futuro.

Gli interventi previsti per la protezione di Venezia e della sua laguna dagli effetti delle alte maree eccezionali si incentrano sul sistema di opere mobili alle bocche di porto ("*Sistema MOSE*"), in grado di isolare la laguna dal mare per il tempo necessario a evitare gli allagamenti degli abitati lagunari.

Il sistema delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto rappresenta nel campo dell'ingegneria un progetto originale e complesso. Il progetto di massima, presentato nel 1992, fu elaborato nel rispetto dei criteri indicati dal voto n. 209, espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1982, secondo il quale le opere non devono alterare lo scambio idrico tra mare e laguna, per evitare effetti ambientali negativi, non devono costituire un ostacolo alla navigazione e, quindi, una penalizzazione delle importanti attività economiche ad essa collegate, non devono, infine, costituire un'alterazione del paesaggio.

Il progetto, formulato sulla base degli indirizzi e dei pareri originariamente espressi dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, tiene conto degli elementi, delle prescrizioni e delle indicazioni emerse, sia in sede di approvazione del progetto di massima del 1992 che successivamente, di anni di confronti, approfondimenti e studi, e dei recenti pareri e dei nuovi criteri espressi dalle Istituzioni competenti.

Le opere progettate consistono, per ciascuna bocca di porto, nell'installazione di *dispositivi mobili* che si sollevano dalla

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

posizione di riposo negli alloggiamenti sul fondale del canale di bocca che si attivano quando il livello di marea supera i 110 cm rispetto al livello misurato al mareografo di Punta della Salute, e nella realizzazione di opere fisse, cosiddette *opere complementari*, (in ottemperanza a quanto richiesto dalla deliberazione del consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001) atte ad aumentare gli attriti nei canali di bocca al fine di smorzare la vivacità delle correnti di marea, attenuando i livelli di quelle più frequenti.

I dispositivi mobili, collocati nei canali di bocca, rappresentano il cuore del sistema e sono costituiti da paratoie a ventola a spinta di galleggiamento, a scomparsa, ciascuna delle quali è costituita da un cassone in acciaio a sezione rettangolare, vuoto all'interno. Le paratoie, quando si trovano in posizione di riposo, sono trattenute sul fondo dal proprio peso e da quello dell'acqua che contengono e sono incernierate lungo un lato sulla struttura di fondazione. In caso di attivazione, le paratoie vengono svuotate dell'acqua mediante immissione di aria compressa e si sollevano per effetto della spinta di galleggiamento, formando una barriera contro la marea.

Il numero totale delle paratoie è 78 per le quattro schiere (Lido-Treporti 21, Lido S. Nicolò 20, Malamocco 19 e Chioggia 18). Lo spessore varia tra i 3,6 m (schiera di Lido-Treporti) e i 5 m (schiera di Chioggia), la lunghezza varia tra i 18,5 m (schiera di Lido-Treporti) e i 29,6 m (schiera di Malamocco) e la larghezza è di 20 m per tutte le schiere. Il tempo medio di chiusura è di 4 o 5 ore, compresi i tempi di manovra per l'apertura e la chiusura delle paratoie. Il dislivello massimo sostenuto tra mare e laguna è di 2 m.

Le opere fisse cosiddette "opere complementari", consistono nella realizzazione di una scogliera all'esterno di ciascuna bocca di porto, realizzata con pietrame e accropodi³, della lunghezza di 1000 m per la bocca di Lido, 1280 m per la bocca di Malamocco, 520 m per la bocca di Chioggia, e nel rialzo del fondale alla bocca di Malamocco, da -16 m a -14 m, per diminuire il volume di acqua scambiato tra mare e laguna. Per la bocca di Malamocco, inoltre, è prevista la realizzazione di una conca di navigazione per le grandi navi, in modo da garantire l'operatività del porto anche con le paratoie in funzione. La conca avrà una lunghezza utile di 370 m e una larghezza di 48 m.

³ Elementi artificiali in calcestruzzo che verranno utilizzati per ricoprire le parti della scogliera più esposte al moto ondoso. Si tratta di elementi largamente utilizzati nella costruzioni marine, che per la loro particolare forma "a quattro teste" si incastrano tra loro e assicurano una forte resistenza alla forza disgregatrice delle onde.



Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

Fino al 31.12.2003, i finanziamenti resi via via disponibili per le opere alle bocche di porto sono stati impegnati e spesi per la *progettazione preliminare di massima*, per la successiva *progettazione di massima*, per una complessa e articolata serie di *attività di studio e di sperimentazione* propedeutiche alle suddette progettazioni, per lo svolgimento dello *studio di impatto ambientale* (S.I.A.) delle opere stesse, per le *attività di approfondimento del progetto di massima* richieste dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta dell'8 marzo 1999 e dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 15 marzo 2001 e per avviare il completamento della progettazione e, in particolare, per sviluppare la *progettazione definitiva* delle opere alle bocche di porto secondo quanto deliberato dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nella seduta del 6 dicembre 2001 e per avviare la progettazione esecutiva, secondo quanto deliberato dal Comitato stesso nella seduta del 3 aprile 2003.

Nel corso del 2004 si sono potute avviare le *prime opere alle bocche di porto*, una volta completato l'iter approvativi dei singoli stralci del progetto esecutivo.

In particolare, la progettazione dell'intero sistema delle opere di difesa dalle acque alte eccezionali ha richiesto l'approfondimento di tutte le conoscenze sul sistema fisico e sul sistema socio-economico della laguna di Venezia.

Parte rilevante degli *studi* è stata quindi indirizzata all'approfondimento delle problematiche di questo progetto.

E' stato costruito un prototipo in scala reale di una paratoia (*Modulo Sperimentale Elettromeccanico - MOSE*) costituito dalla paratoia stessa e da una struttura perimetrale, presente solo in questa fase di sperimentazione per il sostegno della paratoia e per il posizionamento degli uffici e dei laboratori con le strumentazioni di controllo.

Il MOSE è rimasto operativo per circa quattro anni (dal 1988 al 1992) presso la bocca di porto di Lido, nel canale di Treporti.

Le attività eseguite con il MOSE hanno consentito la prova sul campo del comportamento di un paratoia e della affidabilità e funzionalità dei componenti meccanici e impiantistici più significativi.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Il *progetto preliminare di massima* (Riequilibrio e Ambiente - REA) è stato completato nel luglio del 1989 e approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nello stesso anno. Nel 1990, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, con il voto del 20 marzo, che recepisce le osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha autorizzato il Consorzio Venezia Nuova a procedere alla redazione del progetto di massima.

Il *progetto di massima*, ultimato nel settembre del 1992, è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel novembre dello stesso anno e inviato, nel gennaio del 1993, ai Comuni di Venezia e di Chioggia e alla Regione del Veneto. Successivamente, il progetto è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che lo ha approvato in data 18 ottobre 1994.

Il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nelle sedute del 4 luglio 1995 e del 12 dicembre 1995, aderendo a una specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale di Venezia, ha stabilito di sottoporre il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto lagunari a una specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonostante il progetto non dovesse essere interessato dalla suddetta procedura ai sensi della specifica regolamentazione nazionale e sovranazionale. In particolare, il Comitato ha deciso che si dovesse sviluppare una speciale procedura di valutazione in cui, tra l'altro, al giudizio della Commissione di V.I.A. costituita secondo la normativa vigente, doveva affiancarsi quello di un "Collegio di esperti di livello internazionale", appositamente istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal 1995 al 2000, pertanto, si sono susseguiti numerosi eventi legati allo sviluppo della peculiare procedura che il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 aveva delineato per la valutazione della compatibilità ambientale del progetto delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.

In data 15 marzo 2001, infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in merito all'avvio della fase progettuale esecutiva, subordinandola allo svolgimento di alcune attività di approfondimento. La deliberazione recepisce tutte le diverse istanze di approfondimento emerse durante la procedura di V.I.A. e prescrive che la progettazione esecutiva delle opere mobili alle bocche di porto per la difesa dalle acque alte possa avvenire dopo un *ulteriore stadio progettuale*. La deliberazione specifica, infatti,



insieme ad altre indicazioni, che si proceda con la progettazione, contestualmente a quella delle opere di regolazione delle maree, di interventi atti ad aumentare gli attriti lungo i canali delle bocche di porto per attenuare i livelli delle maree più frequenti (opere cosiddette complementari), nonché con l'aggiornamento del Piano per il recupero morfologico della laguna per contrastare gli eventuali effetti derivanti da tali interventi complementari.

A seguito dei risultati degli studi condotti, nel corso del 2001, sono stati definiti gli interventi necessari per aumentare gli effetti dissipativi lungo i canali di bocca: *tre dighe foranee, con annessa protezione dei fondali, una di fronte a ciascuna delle tre bocche di porto.*

In data 6 dicembre 2001, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 ha preso atto dei risultati delle attività e degli approfondimenti condotti e ha, quindi, deliberato che si dia corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, nonché alla progettazione ed esecuzione delle opere cosiddette complementari e alla progettazione ed esecuzione delle opere tendenti al ripristino morfologico della laguna.

In data 21 dicembre 2001, il CIPE ha deliberato in merito al primo programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443/01 ("Legge obiettivo"), indicando, tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, il *Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: "Sistema MOSE"*.

Il *progetto definitivo* delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, redatto a seguito della deliberazione del Comitato del 6 dicembre 2001, è stato favorevolmente esaminato, con prescrizioni, dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nell'adunanza dell'8 novembre 2002, con voto n. 116.

Di seguito si riportano le fasi più significative che, dopo l'approvazione del progetto definitivo, hanno consentito di avviare concretamente i lavori.

29 novembre 2002⁴, il CIPE prende atto, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto finanziario, del progetto definitivo del "Sistema MOSE", esaminato sulla base di una specifica relazione istruttoria elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e assegna al "Sistema MOSE" un primo finanziamento di 450 milioni di euro.

⁴ Deliberazione n. 109 del 29.11.2002, successivamente rimodulata con deliberazione n. 63 del 25.07.2003 e n. 72 del 29.09.03.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

16 dicembre 2002, il Magistrato alle Acque consegna al Consorzio Venezia Nuova i lavori relativi alla *diga foranea* da realizzarsi al largo di Malamocco, dando così concreto avvio alla esecuzione della prima opera del sistema di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari.

4 febbraio 2003, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 si riunisce a Roma e delibera, tra l'altro, di assegnare alle Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti una quota parte dei limiti di impegno già assegnati dal CIPE al "Sistema MOSE" con la delibera del 29.11.2002, tenuto conto del disposto di cui all'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003).

3 aprile 2003, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 prende atto del parere sul progetto definitivo della Regione del Veneto, espresso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 401 del 21 febbraio 2003 e dei pareri espressi dalle Amministrazioni Comunali, e, cioè, quello del Consiglio Comunale di Chioggia con ordine del giorno del 1° aprile 2003, quello del Consiglio Comunale di Venezia con ordine del giorno del 1° aprile 2003, nonché quello del Consiglio Comunale di Cavallino - Treporti con delibera votata in data 31 marzo 2003.

I pareri espressi dalle Amministrazioni Comunali, pur confermando l'esigenza di garantire la difesa dei centri storici lagunari dalle acque alte mediante sistemi di chiusura temporanea delle tre bocche di porto, includono delle richieste di approfondimenti specifici volti a ribadire la complessità del sistema di salvaguardia nel quale deve essere inserito il progetto definitivo positivamente valutato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia.

Il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, tenuto conto di ciò, delibera, tra l'altro, *"di passare alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree, a valere sui finanziamenti da reperire ai sensi della delibera CIPE del 29.11.2002 e della L. 166/2002 e della Delibera di questo Comitato del 4.2.2003, sulla base del progetto definitivo approvato dal Magistrato alle Acque con D.P. n. 9304 del 16.01.2003 e valutato dal C.I.P.E. come dalla delibera del 29.11.2002."*

E' evidente come tale deliberazione costituisca un importante risultato per la salvaguardia di Venezia in quanto consente di sviluppare le attività di progettazione esecutiva e di realizzazione



delle opere alle bocche di porto lagunari recependo, al contempo, le indicazioni del Comune di Venezia che confermano il carattere sistemico e integrato degli interventi di salvaguardia, così come è stato, da sempre, affermato anche dal Consorzio Venezia Nuova che, proprio in questa ottica, ha operato fin dall'inizio della propria attività.

6 giugno 2003, il Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque esamina favorevolmente il "Piano degli studi, delle progettazioni e della realizzazione degli interventi a seguito delle decisioni assunte nella riunione del 3 aprile 2003 dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84"⁵.

⁵ Si tratta del Piano aggiornato delle attività che il Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova stanno realizzando e realizzeranno per ottemperare alle richieste del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, anche per quanto riguarda le attività di approfondimento richieste dalle Amministrazioni Comunali e recepite dal Comitato stesso

In tale Piano vengono presentati il programma delle attività per completare, entro il 2011, la realizzazione delle opere mobili e il programma delle attività necessarie per procedere allo sviluppo progettuale degli altri interventi chiesti dai Comuni lagunari.

Il programma di attuazione delle opere del "Sistema MOSE" comporta la realizzazione contemporanea delle opere nelle tre bocche di porto, con sviluppo, per fasi, della progettazione esecutiva e della conseguente realizzazione dei lavori, con termine delle attività entro il 2011, per complessivi 8 anni di lavoro.

Lo sviluppo delle progettazioni e della realizzazione delle opere è strettamente dipendente, da un lato, dalle tempistiche delle procedure autorizzative e, dall'altro, dalla disponibilità dei finanziamenti nella entità e scansione temporale richieste dal piano di realizzazione dell'opera.

20 gennaio 2004, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia⁶ esprime all'unanimità parere favorevole sul progetto definitivo, impartendo alcune prescrizioni da adottare nella fase di sviluppo della progettazione esecutiva.

⁶ Organo collegiale istituito dalla Legge n. 171/1973, Titolo II, comma 5

Gennaio – dicembre 2004: a seguito del parere positivo, della Commissione di Salvaguardia, il Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque di Venezia ha potuto esaminare e approvare i primi progetti esecutivi.

Aprile 2004, inizia la formalizzazione della consegna dei lavori dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova, relativamente agli stralci già esaminati dal Comitato Tecnico di Magistratura. Si avviano, pertanto, a tutti gli effetti, contemporaneamente nelle tre bocche di porto, i lavori per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Nel corso del 2004, in riferimento alle 9 opere finanziate con la prima assegnazione CIPE, il 100% delle opere è stato progettato a livello esecutivo e 7 opere su 9 sono già in corso di esecuzione, entro i primi mesi del 2005 avverrà anche la consegna delle rimanenti 2 opere.

20 e 21 maggio 2004, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Veneto esamina e rigetta, con sentenza depositata in data 24 luglio 2004, i numerosi ricorsi avverso provvedimenti amministrativi propedeutici o comunque connessi all'approvazione e all'avvio del "Sistema MOSE", presentati da alcune associazioni ambientaliste, nonché delle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Venezia.

29 settembre 2004, il CIPE assegna un volume di investimento pari a 709 milioni di euro, a valere su un "contributo" quindicennale con decorrenza dal 2005, come seconda tranche di finanziamento per la prosecuzione delle attività di realizzazione del "Sistema MOSE" e, in particolare, la parte di opere con avvio previsto da programma nel 2005 e che non trovano copertura finanziaria nell'ambito della prima assegnazione di fondi da parte del CIPE.

4 novembre 2004, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 si riunisce a Roma e delibera, tra l'altro, il riparto del volume di investimento assegnato dal CIPE al "Sistema MOSE", in data 29 settembre 2004, tra il concessionario Consorzio Venezia Nuova (90% dei fondi) e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di Chioggia e di Cavallino - Treporti (10% dei fondi).

17 dicembre 2004, il Consiglio di Stato - Sezione VI pronuncia il proprio dispositivo di decisione respingendo i ricorsi presentati in appello da alcune associazioni ambientaliste, nonché dalle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Venezia avverso alcuni provvedimenti amministrativi propedeutici all'avvio del "Sistema MOSE".

20 dicembre 2004, il CIPE, con apposita delibera, prende atto della nuova ripartizione del volume di investimento dei 709 milioni di euro effettuata dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nella seduta del 4 novembre 2004. Al Consorzio Venezia Nuova vengono assegnati 638,1 milioni di euro.



Con tale nuova assegnazione di fondi, viene assicurata continuità alle opere avviate alle bocche di porto, aprendo nuovi fronti di attività nel 2005.

Per le attività di studio e sperimentazione, nel corso del 2004 si sono sviluppate e sono state anche completate, in alcuni casi, numerose attività ritenute più urgenti per fornire alcuni dati necessari allo sviluppo della progettazione esecutiva, nonché alcune sperimentazioni e alcuni monitoraggi volti a fornire gli elementi richiesti dalle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e recepiti nella deliberazione del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 3 aprile 2004.

Si ritiene opportuno citare le attività più significative:

- *Sperimentazione della riduzione dei livelli alle bocche con le opere complementari;*
- *Caratterizzazione dei materiali da dragare nella bocca di Lido e alla bocca di Chioggia, seconda fase;*
- *Studio per l'inserimento di una conca per grandi navi commerciali alla bocca di Chioggia (studio richiesto dal Comune di Chioggia);*
- *Sperimentazione tecnologica di un simulatore della navigazione;*
- *Studio inserimento architettonico delle opere alle bocche;*
- *Monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche.*

Si segnala, infine, lo studio "*Sperimentazione in scala reale di un restringimento temporaneo del canale della bocca di Malamocco: studio degli effetti prodotti e Studio di Impatto Ambientale*". Lo studio, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 24 novembre 2004, permetterà di acquisire gli elementi necessari per poi realizzare un *restringimento sperimentale del canale alla bocca di Malamocco*, di cui alla deliberazione del 3 aprile 2004 del Comitato ex art. 4 Legge 798/84, la cui opportunità di esecuzione è stata ribadita dal Comitato stesso nella seduta del 4 novembre 2004, sulla base del progetto presentato dal Consorzio Venezia Nuova. L'avvio dello studio è previsto nel corso del 2005.

Per le opere avviate e in corso di esecuzione, si segnala, nel corso del 2004, la prosecuzione degli interventi avviati nel 2003 alle *digue foranee di Malamocco* e di *Chioggia*, l'avvio dell'intervento, realizzato nella bocca di Lido a S. Nicolò, del *campo prova dei pali*

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

di fondazione, finalizzato a reperire informazioni sui terreni in cui saranno realizzate le fondazioni dei cassoni di alloggiamento delle paratoie. Si segnala, inoltre, la prosecuzione delle indagini geognostiche, che sono in avanzata fase di realizzazione alle bocche di porto di Lido, di Chioggia e di Malamocco, mentre sono terminate, nel corso dell'anno, nella zona delle opere complementari.

Nel corso del 2004, inoltre, sono state avviate le campagne di indagine archeologica e di bonifica bellica, propedeutiche alla consegna dei lavori, nelle aree oggetto di intervento.

Sono stati completati e sottoposti all'esame dell'Amministrazione Concedente, che li ha esaminati e approvati con parere favorevole, i progetti esecutivi relativi alle prime, concrete attività relative alle opere alle bocche di porto individuate, prioritariamente, secondo quanto delineato nel *"Piano degli studi, delle progettazioni e della realizzazione degli interventi a seguito delle decisioni assunte nella riunione del 3 aprile 2003 dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84"*, esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 6 giugno 2003. Il "Piano" è stato successivamente sviluppato e dettagliato mediante approfondimenti specifici da parte del Consorzio Venezia Nuova, del progettista e delle Imprese esecutrici, fino a costituire il *"Piano Generale delle Attività" (PGA)* che rappresenta l'attuale riferimento generale, in continuo aggiornamento, per l'individuazione degli interventi prioritari, per lo svolgimento della relativa progettazione esecutiva e per la conseguente realizzazione, per fasi, degli interventi di regolazione delle maree.

Si è proceduto, quindi, alla consegna dei relativi lavori finanziati nell'ambito della prima assegnazione di fondi da parte del CIPE. In particolare:

nella bocca di Lido, sono stati avviati, ad aprile del 2004, i lavori relativi al progetto esecutivo "Lido Treporti - porto rifugio prima fase e tura", esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 30 gennaio 2004. Per esigenze di sicurezza e per evitare di interrompere il transito marittimo durante la chiusura dei varchi in occasione di eventi di acqua alta, il progetto definitivo prevede di attrezzare la bocca di Lido con un "porto rifugio". Tale struttura comprende due bacini, uno lato mare, di più ampie dimensioni, e uno lato laguna, situati nella zona di Punta Sabbioni, collegati da una conca di navigazione, per consentire il transito delle imbarcazioni minori



dalla bocca di porto di Lido verso Treporti, durante la chiusura dei varchi di Treporti e di S. Nicolò mediante le barriere mobili. Il bacino di rifugio lato mare ha la funzione di accogliere le imbarcazioni minori per il passaggio verso la laguna, tramite la conca di navigazione, ovvero per una attesa temporanea durante il periodo di impedimento del transito attraverso il varco. Il bacino sul lato laguna ha la funzione di accogliere le imbarcazioni in attesa di uscita verso il mare. Con la prima fase finanziata verrà realizzata la scogliera di protezione e il bacino che ne deriva verrà momentaneamente utilizzato quale tura per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie.

Sempre ad aprile del 2004, sono stati avviati i lavori relativi al progetto esecutivo "*Lido S. Nicolò - Spalla sud: rinforzo molo sud esistente*", esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 30 gennaio 2004. A sud della bocca di porto di Lido, in corrispondenza alla "spalla" sud della barriera di San Nicolò, il progetto prevede la realizzazione di un terrapieno sul quale sono ricavati gli edifici tecnici. Inoltre, lungo il tratto che congiunge tale "spalla" con il litorale, è previsto un terrapieno che sarà realizzato in modo tale da garantire la tenuta idraulica tra mare e laguna. Il molo sud della bocca di Lido, infatti, nel tratto compreso tra la barriera di S. Nicolò ed il litorale del Lido, in condizioni di chiusura della barriera assume una funzione di ritenuta idraulica poiché separa le zone a mare, soggette all'escursione di marea, da quelle interne, i cui livelli sono regolati dalle paratoie mobili. La struttura esistente non è in grado di rispondere a tale funzione di ritenuta, principalmente per problemi di instabilità generata dal flusso di filtrazione, per cui è risultato necessario procedere prioritariamente al suo rinforzo.

A giugno del 2004, invece, sono stati avviati i lavori relativi al progetto esecutivo "*Lido - Isola tra S. Nicolò e Treporti - prima fase*", esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 23 aprile 2004. Nella zona di bassi fondali che, lato laguna, costituisce lo spartiacque tra il canale di S. Nicolò e il canale di Treporti, è prevista la realizzazione di un'isola artificiale che avrà la funzione di collegamento tra la "spalla" della barriera mobile situata a Ovest del canale di Treporti e la "spalla" della barriera mobile situata a Nord del canale di San Nicolò. In quest'area dovranno trovare alloggiamento le opere che costituiscono le "spalle" delle barriere mobili situate sui due canali e gli edifici preposti alla gestione ed al controllo delle barriere. L'isola è ubicata a circa 2100 m dall'ingresso della bocca di Lido, dove inizia la divergenza dei canali di S. Nicolò e Treporti. Con la

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

prima fase di attività, avviata nell'ambito della prima assegnazione di fondi da parte del CIPE, si procede alla realizzazione di parte della conterminazione dell'isola.

Infine, nella seduta del 26 giugno 2004, il Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque ha esaminato favorevolmente il progetto esecutivo, *Lido S. Nicolò - Barriera: protezione del fondale*, i cui lavori si prevede verranno avviati entro il mese di febbraio 2005. Nell'area intorno alla barriera sono necessari interventi di adeguamento dei fondali alla quota di estradosso della fondazione della barriera stessa e di protezione del fondale, per evitare fenomeni di erosione in occasione delle manovre delle paratoie. La stabilizzazione dei fondali nell'area intorno alla barriera è garantita da una protezione in materiale lapideo, sia sul lato verso mare che verso la laguna. Il dimensionamento della protezione del fondale dipende dalle velocità delle correnti che si instaurano in concomitanza con le diverse condizioni di apertura delle paratoie e dal moto ondoso ed è stato concepito utilizzando i risultati di numerose sperimentazioni su modello fisico. Nel progetto sono previsti gli interventi di prima fase di protezione dei fondali, rinviando a fasi future quelli nell'area intorno ai cassoni andatori e ai cassoni di alloggiamento;

nella bocca di Malamocco, sono stati avviati, nel mese di aprile del 2004, i lavori relativi al progetto esecutivo "*Malamocco - Conca: di navigazione: opere civili della camera della conca*", esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 30 gennaio 2004. Il progetto definitivo prevedeva una grande conca di navigazione le cui dimensioni utili erano pari a 350 metri per 45 metri, tali cioè da consentire sempre e comunque anche il traffico delle navi porta containers. In fase di esame del progetto definitivo, l'Autorità Portuale di Venezia ha formulato il parere che sia necessario consentire il transito durante la fase di chiusura delle barriere mobili, attraverso la conca di navigazione, anche alle grandi navi da crociera, che devono rispettare, con maggior precisione delle altre navi, scadenze temporali. Dopo aver condotto le opportune verifiche, è stato presentato, durante la seduta del 3 aprile 2003 del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, l'inserimento, nell'ambito del progetto definitivo, della conca di navigazione opportunamente modificata. Con tale prima fase operativa finanziata con la prima assegnazione di fondi CIPE, vengono realizzate le opere relative alla "camera" della conca.

A settembre del 2004, invece, sono stati avviati i lavori relativi al progetto esecutivo, "*Malamocco - Conca: opere protezione sponda*."



territorio lato Forte S. Pietro prima fase", esaminato favorevolmente da parte del Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 19 luglio 2004. Nella bocca di Malamocco, l'imboccatura della conca verso la laguna si apre su un canale di accesso delimitato, a nord, dalla spalla della barriera poi confluyente nel canale della bocca e confinato, a sud, dalle mura del Forte San Pietro e dal Murazzo storico. La scarpata sud del canale interferisce con il muro del Forte e con il Murazzo. E', pertanto, necessaria la realizzazione di un elemento verticale che renda indipendenti la scarpata inferiore dalla scarpata superiore, quest'ultima da realizzarsi in massi naturali a protezione delle strutture storiche esistenti alla radice del molo sud di Malamocco. In questa prima fase di lavoro, vengono realizzate le opere di rinforzo del Murazzo, di rinforzo del piede del Forte San Pietro per un'estensione di circa 120 m e la realizzazione di opere di conterminazione provvisoria (piarda provvisoria).

Infine, è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque, nella seduta del 21 dicembre 2004, il progetto esecutivo "*Malamocco - Conca: opere protezione sponda territorio lato Forte S. Pietro, seconda fase*". L'avvio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2005. Le opere oggetto dell'intervento riguardano il recupero statico-architettonico del muro del Forte San Pietro, comprensivo anche della realizzazione della paratia in micropali prevista al piede del muro, in corrispondenza dello sperone del Forte, e interventi di scavo e protezione della sponda del canale di accesso alla conca di Malamocco, lato Forte San Pietro;

nella bocca di Chioggia, si rileva l'avvio, nel mese di aprile 2004, dei lavori relativi al progetto esecutivo "*Chioggia - Porto Rifugio: scogliera sud del porto rifugio*", esaminato favorevolmente da parte del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 30 gennaio 2004. La bocca di porto di Chioggia verrà dotata di strutture adatte per consentire il passaggio di piccole imbarcazioni e di pescherecci durante le chiusure della barriera mobile, mediante un porto rifugio e due conche di navigazione. Il bacino di rifugio sarà ubicato nella parte Nord della bocca di porto, come richiesto dal Comune di Chioggia al fine di consentire futuri sviluppi per il porto turistico nella zona a Sud-Est di S. Felice. Inoltre, le analisi di moto ondoso, condotte con modello matematico, hanno dimostrato che l'accesso al porto rifugio a Nord risulta più protetto, anche con mareggiate di scirocco, rispetto ad un accesso in posizione simmetrica lato Sud. Il bacino rifugio è suddiviso in un

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

avamporto e in una zona più ridossata, il vero e proprio porto rifugio, destinato all'ormeggio delle imbarcazioni in attesa di transito attraverso le conche. Con questa prima fase si realizza la scogliera a sud del porto rifugio stesso.

Nel mese di maggio del 2004, inoltre, sono stati avviati i lavori relativi al progetto esecutivo "*Chioggia - Conche: opere civili*", esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque, nella seduta del 27 febbraio 2004. Nel porto rifugio da realizzare nella bocca di Chioggia sono previste due conche di navigazione affiancate, per piccole imbarcazioni e pescherecci, aventi lunghezza utile di 134 metri, larghezza di 16 metri e profondità di 5,00 metri s.l.m.m.. La lunghezza è stata definita in modo tale da permettere un transito di pescherecci pari al valore di punta dei rientri delle imbarcazioni nella situazione attuale, per garantire, cioè, il passaggio di circa 100 pescherecci all'ora, come richiesto dal Comune di Chioggia. La larghezza di 16 metri permette di affiancare, all'interno della conca, un'imbarcazione da 26 x 6,5 metri a due da 15 x 4 metri. Il progetto esecutivo, nell'ambito di questa prima fase, prevede la realizzazione delle opere civili delle "camere" delle conche.

Oltre alla progettazione esecutiva relativa agli stralci già esaminati dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque, nel corso del 2004, è stata sviluppata la progettazione esecutiva generale; in particolare, al 31 dicembre 2004, la progettazione esecutiva finanziata nell'ambito della prima assegnazione di fondi da parte del CIPE è stata completata relativamente alle opere finanziate nell'ambito della prima assegnazione stessa; è in corso, già sostanzialmente completata o in avanzata fase di sviluppo, relativamente a quelle opere che troveranno il loro finanziamento nell'ambito della seconda assegnazione di fondi da parte del CIPE.

Attività da finanziare

Al 31 dicembre 2004 rimane da finanziare il completamento dei lavori alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, nonché alcune fasi di ulteriore approfondimento di aspetti specifici della progettazione esecutiva e la prima fase di avvio sperimentale del "Sistema MOSE".


Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

Consorzio Venezia Nuova



	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Progetto preliminare, progetto di massima e Studi di Impatto Ambientale	39,612	39,612	-
Studi per prog. Prel. e di massima delle opere alle bocche di porto	61,261	61,261	-
Interventi sperimentali	29,743	29,743	-
Indagini	52,125	49,625	2,500
Attività sperimentali per progetto definitivo e progetto esecutivo	71,942	59,442	12,500
Progetto definitivo delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto	4,021	4,021	-
Progetto esecutivo e realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto (*)	3.440,740	1.064,455	2.376,285
Somme a disposizione	0,778	0,778	-
TOTALE	3.700,222	1.308,937	2.391,285

(*) Il fabbisogno è stimato da progetto definitivo. E' in fase d'esame da parte del Magistrato alle Acque l'offerta del Consorzio Venezia Nuova per la valutazione a "prezzo chiuso" delle attività necessarie per il completamento del "Sistema MOSE".

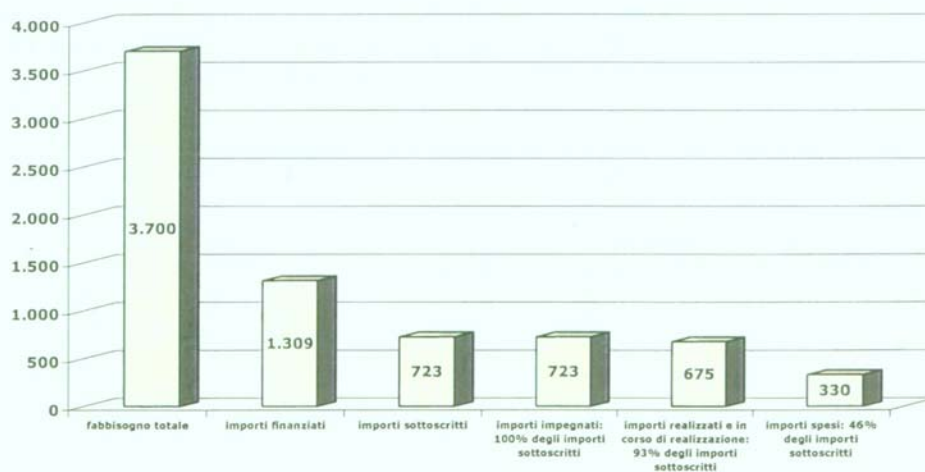

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

3.3 Difesa dalle acque medio- alte

(interventi di cui
all'art. 3 lettera a), c)
legge n. 798/84)

Obiettivo

Gli interventi di difesa locale degli abitati lagunari e dei centri storici di Venezia e di Chioggia sono finalizzati alla difesa dalle acque medio-alte fino a maree che raggiungono il livello di +100/120 cm rispetto al mareografo di Punta della Salute, e alla difesa dalle acque eccezionali in sinergia con la gestione dei futuri interventi alle bocche di porto per la regolazione delle maree.

Descrizione degli interventi

La difesa locale dei centri urbani è un ampio e articolato piano di messa in sicurezza degli abitati correlato alla futura gestione delle opere mobili.

Negli ultimi decenni, le maree superiori a +80 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta della Salute si sono verificate, in media, 45 volte all'anno rispetto alle 7-8 volte dell'inizio del secolo. Piazza San Marco viene, in parte, già allagata quando la marea supera +60 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta della Salute, assunto come riferimento. Il ripetersi degli allagamenti causa numerosissimi disagi per la popolazione, una pericolosa e lenta aggressione alle strutture architettoniche ed edilizie, e impedimenti alle attività economiche.

Le opere mobili alle bocche di porto sono in grado di difendere Venezia dalle alte maree per qualsiasi livello di marea. Una limitazione della frequenza di chiusura delle bocche può, tuttavia, consentire di ridurre la penalizzazione della navigazione e dello scambio idrico mare-laguna. Per questo motivo è stato progettato un insieme di interventi di difesa locale dei centri abitati lagunari. Essi consentono la difesa da alte maree fino a quote compatibili con la struttura degli abitati attraverso il rinforzo e il rialzo delle sponde, talvolta della quota delle pavimentazioni, e mediante la realizzazione di barriere antinfiltrazione.

La tematica delle difese locali delle terre emerse è stata considerata già anche in sede di definizione dello studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di salvaguardia di Venezia e della laguna ultimato nel 1981, il cosiddetto "Progettone".

Nell'esame del "Progettone", effettuato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e conclusosi con il voto di approvazione del 27 maggio 1982 (voto n. 209), le difese locali delle terre emerse



vennero già da allora considerate complementari alle opere di controllo delle maree da realizzare alle bocche di porto.

Analoghi orientamenti riguardanti la complementarietà di interventi locali ed interventi alle bocche di porto sono sempre stati ribaditi in modo esplicito da tutti gli atti legislativi e dai documenti che hanno accompagnato le fasi di progettazione degli interventi di salvaguardia, dopo l'approvazione della Legge 798/84.

Il Piano Generale degli Interventi del 1991 a questo riguardo prevede l'esecuzione di interventi sulle "insulae" del centro storico di Venezia con priorità per quelle allagabili alla quota di +100 cm cioè con un livello di salvaguardia a quota tale che la chiusura delle opere alle bocche di porto ad esso corrispondente non arrechi danno all'attività portuale. La fattibilità tecnico-economica è stata successivamente verificata mediante uno specifico studio di fattibilità.

Il Piano del 1991 prevede anche la realizzazione degli interventi di difesa locale nelle zone di Treporti, Pellestrina, Malamocco, S. Pietro in Volta, Sottomarina, Burano, S. Erasmo, nonché la realizzazione di marginamenti lagunari in zone residenziali e in zone agricole.

Gli studi, le indagini e gli interventi eseguiti in questi anni hanno avuto lo scopo di individuare, mettere a punto e realizzare le soluzioni appropriate per la difesa delle preziosissime tipologie urbane storiche lagunari, sulla base di un'attenta analisi della plurisecolare tradizione di trasformazione e di riadeguamento delle quote e dei marginamenti delle isole di cui i centri urbani lagunari sono composti.

In particolare, il Consorzio Venezia Nuova ha condotto, in modo propedeutico alla progettazione e alla realizzazione delle opere, numerose indagini fisiche; indagini storiche; indagini socio-economiche; indagini sulla mobilità delle persone e delle merci; definizione delle tipologie di intervento; verifica dell'applicabilità delle tipologie di intervento; verifica dell'impatto architettonico; definizione della quota ottimale di rialzo.

In sintesi, sono state individuate due situazioni tipiche cui corrispondono due diverse modalità di intervento e due differenti possibilità di difesa locale. La prima riguarda gli abitati situati lungo il cordone litoraneo ove l'edificato, più rado e meno fragile, ha consentito maggiori rialzi e, dunque, una quota di difesa relativamente alta (compresa tra 130 e 180 cm). La seconda

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

situazione interessa i centri storici interni alla laguna e dunque le zone più basse delle città di Venezia e di Chioggia, dove gli interventi risultano molto più delicati e complessi e anche la soglia di difesa raggiungibile è molto più bassa rispetto a quella degli abitati del litorale. I progetti approvati e gli interventi finora realizzati sono stati impostati in modo da non alterare in modo inaccettabile gli elementi architettonici delle città e i rapporti compositivi tra di essi, realizzando le difese a una quota generalizzata e omogenea, quindi funzionale alla gestione delle opere mobili, fino a +100 cm a Venezia e fino a +120 cm a Chioggia.

Nel centro storico di Venezia ciò significa intervenire in circa il 5% del territorio con tempi e costi non eccessivi, salvaguardando il patrimonio storico-monumentale presente.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 ha espresso l'indirizzo di realizzare le difese, nel centro storico di Venezia e delle isole minori, fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tendendo alla quota +120 cm, alla luce delle risultanze delle indagini e delle verifiche di fattibilità del rialzo fino a tale quota, condotte nel corso del 1999 a seguito di specifica richiesta da parte del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta dell'8 marzo 1999.

Lo stesso indirizzo è stato recepito anche dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nel parere espresso nel corso della seduta del 6 dicembre 2001, nonché dal Comitato stesso nella seduta del 3 aprile 2003, recependo una specifica richiesta del Comune di Venezia.

Mettere in sicurezza il centro storico di Venezia con interventi localizzati di sollevamento della pavimentazione fino a +120 cm significherebbe intervenire su circa il 35-40% del territorio.

A seguito degli accordi intervenuti tra le Autorità Italiane e la Commissione Europea (atto aggiuntivo rep. n. 7950 del 21 giugno 2002 alla Convenzione Generale rep. 7191/91), rimangono tra le attività la cui esecuzione è affidata in concessione al Consorzio Venezia Nuova le difese locali nei centri urbani lagunari e delle "insulae" dei centri storici di Venezia, fino alle quote di +100 cm rispetto a Punta della Salute, e di Chioggia, fino alla quota di +120 cm rispetto a Punta della Salute, se già finanziate nell'ambito di finanziamenti già destinati al concessionario.



Nel Piano Generale degli Interventi, aggiornato al 31 dicembre 2002, pertanto, non sono previsti ulteriori finanziamenti per procedere con la realizzazione delle difese locali che non trovano allocazione nell'ambito degli Atti Attuativi della "Convenzione Generale" già finanziati; né gli interventi di difesa delle "insulae" del centro storico di Venezia e di Chioggia fino a una quota tendente a +120 cm e a +140 rispettivamente.

Tali interventi, stralciati dal Piano affidato al concessionario, troveranno esecuzione mediante gare da indire da parte del Magistrato alle Acque di Venezia secondo la normativa europea.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova, fin dal 1988, hanno sviluppato specifici progetti generali di intervento di difesa, sia dei centri storici di Venezia e di Chioggia, sia dei centri abitati lagunari.

Da allora a oggi molto è stato fatto intervenendo, in pratica, in ogni località lagunare, mettendola in condizioni di sicurezza, ciascuna a una quota di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico e architettonico che la caratterizza.

In tempi più recenti, in base a quanto previsto dalla Legge n. 139/92, questi interventi hanno avuto particolare sviluppo tramite gli "Accordi di programma": strumenti operativi che assicurano l'esecuzione coordinata e unitaria di interventi che coinvolgono Enti e Istituzioni diversi.

Tale strumento si è rivelato indispensabile qualora, in presenza di interventi particolarmente complessi, si debba "garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie".

Le attività relative alla *difesa dei centri abitati lungo il litorale e gli abitati insulari*, sviluppate sin dal 1986, hanno consentito di realizzare la difesa dei principali abitati lagunari, fino ad una quota di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico ed architettonico che li caratterizza, spesso ricorrendo ai già citati "Accordi di programma". Sono ormai posti in sicurezza gli abitati di *Treporti, Malamocco, Alberoni, Pellestrina, San Pietro in Volta e Sottomarina*; si sta ancora lavorando a *Murano, Torcello e Sant'Erasmus*.

Caso per caso è stato necessario individuare tipologie costruttive e modalità di intervento adeguate e coerenti rispetto a un territorio molto vasto e diversificato con assetto, caratteristiche fisico-

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

morfologiche e funzioni diverse (aree urbane, zone agricole, valli da pesca, ecc.) e con una varietà di condizioni particolari (livello del suolo, natura dei terreni, stato delle strutture preesistenti, esposizione al moto ondoso, ecc.). Le soluzioni esecutive adottate sono state messe a punto in modo da mantenere, per aree omogenee, ma anche nel complesso, un disegno architettonico unitario.

Allo scopo di assicurare la completa difesa idraulica delle singole aree, gli interventi hanno spesso comportato anche la realizzazione di una serie di opere complementari come, per esempio, la sistemazione delle chiaviche di regolazione idraulica così da migliorarne gli aspetti funzionali e impiantistici.

In alcuni casi, inoltre, contestualmente agli interventi per la difesa dalle acque alte si procede anche alla realizzazione di opere di riqualificazione urbana, in base ai suddetti "Accordi di programma" tra il Magistrato alle Acque e le Amministrazioni comunali competenti.

Per quanto riguarda i centri storici, gli interventi a Venezia e Chioggia, in particolare, risultano molto più delicati e complessi, rispetto a quelli sugli abitati del litorale, così come la soglia di difesa raggiungibile molto più bassa. I progetti approvati e gli interventi finora realizzati mostrano come, senza alterare in modo inaccettabile gli elementi architettonici delle città e i rapporti compositivi tra di essi, nei centri storici ci si può difendere a una quota generalizzata e omogenea fino a circa +100 cm a Venezia e fino a +120 cm a Chioggia.

Queste quote (funzionali anche alla gestione delle opere mobili) sono quelle assunte nel progetto "insulae" e adottate e realizzate, per esempio, nell'"insula" dei *Tolentini* e nel Progetto esecutivo per la difesa dell'"insula" di *S. Marco*, che è stato approvato, tra gli altri, anche dalla Amministrazione Comunale di Venezia, dalla Soprintendenza ai Beni e alle Attività Culturali di Venezia e dalla Commissione per la Salvaguardia. Ciò conferma, di fatto, come le zone più preziose e più antiche non possano essere rialzate o comunque protette oltre a tale livello.

Contestualmente ai lavori di difesa locale dalle acque alte, si è proceduto e si procede alla realizzazione di opere di riqualificazione urbana, definite in appositi "Accordi di programma" con le Amministrazioni comunali.

Oltre al rialzo di rive e pavimentazioni, gli interventi di difesa locale nei centri storici in laguna hanno comportato anche una serie di opere complementari quali l'adeguamento di piani terra alle nuove



quote del piano di calpestio, il riordino dei sottoservizi, l'adeguamento del sistema fognario.

Lo sviluppo di questo tipo di interventi è molto avanzato: non soltanto per il numero di lavori eseguiti o che sono in corso di esecuzione, quanto per la realizzazione di interventi risolutivi, riguardanti quasi tutti i centri abitati della laguna, destinati ad evitare allagamenti fino ai livelli di salvaguardia, o di sicurezza, compatibili con la loro struttura edilizia e urbana, nonché all'eliminazione totale degli allagamenti di qualsiasi entità in concorso con la protezione offerta, in futuro, dalle opere mobili alle bocche di porto lagunari.

Numerose sono state le attività di progettazione e di realizzazione svolte, nel 2004, per la difesa locale dalle acque medio-alte, sia nei centri abitati lagunari, sia nel centro storico veneziano, sia nella città di Chioggia.

Per quanto riguarda i *centri abitati lagunari*, a Treporti, sono terminati i lavori relativi alla seconda fase del quinto stralcio riguardanti la sistemazione e il ripristino di chiaviche di regolazione idraulica. Sono proseguiti i lavori relativi alla terza fase, che prevedono ulteriori interventi di protezione di sponde e di difesa dell'abitato. E' stato, inoltre, approvato il primo stralcio del progetto per la sistemazione del marginamento del *canale Pordelio*. Questo primo stralcio prevede la realizzazione di un nuovo ponte apribile che collegherà la località Cà Savio e l'Isola Sud.

Al Lido, nella *zona dell'abitato di Alberoni*, sono terminati i lavori nella parte sud dell'abitato. Le opere realizzate hanno riguardato la difesa dagli allagamenti e dalle mareggiate, la valorizzazione ambientale, la predisposizione di strutture di servizio, il consolidamento del tratto iniziale del molo nord di Malamocco e il risanamento dell'area dell'ex batteria militare austriaca. Alcuni di questi interventi sono stati realizzati mediante un "Accordo di programma" tra Magistrato alle Acque e Amministrazione Comunale di Venezia.

Si segnala, inoltre, la prosecuzione degli interventi per la riqualificazione ambientale e urbana degli *abitati di Malamocco e Alberoni*, primo stralcio (centro urbano di Malamocco). L'opera riguarda interventi di marginamento e riqualificazione ambientale (consolidamento e valorizzazione ambientale di sponde e rive,

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

vivificazione e bonifica dei canali, predisposizione del sistema fognario); interventi di riqualificazione urbana (riqualificazione delle piazze e sistemazione delle pavimentazioni, predisposizione di percorsi e passerelle pedonali, adeguamento illuminazione pubblica e sottoservizi, realizzazione di un parcheggio). Anche questo intervento si sviluppa secondo uno specifico "Accordo di programma" tra il Magistrato alle Acque e l'Amministrazione comunale di Venezia.

Nell'abitato di Lido, infine, si è dato corso all'intervento di ristrutturazione delle rive in corrispondenza di *via Coletti*, anche nella parte sud a completamento di quanto già realizzato.

A Pellestrina, si segnala la prosecuzione dei lavori lungo il tratto tra Portosecco e il cantiere De Poli. I lavori riguardano la ricostruzione del marginamento esistente, in precarie condizioni dovute all'erosione delle strutture di sponda e ai forti moti di filtrazione innescati da fenomeni di sifonamento al di sotto delle strutture stesse.

A Murano sono terminati gli importanti lavori relativi al primo stralcio. I lavori hanno riguardato la ricostruzione e il rialzo di sei tratti di riva per complessivi 1,6 chilometri e la sistemazione, a quote adeguate, dei fondali dei canali stessi a ridosso delle nuove rive. E' stato, inoltre, approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi per il completamento della difesa dell'isola di Murano i cui lavori verranno avviati nei primi mesi del 2005.

A Sant'Erasmo, sono proseguiti, con un sviluppo significativo anche in termini di volume di produzione, gli importanti lavori di difesa e di riqualificazione ambientale dell'isola mediante l'esecuzione di due stralci funzionali; il primo avviato alla fine del 2000, il secondo avviato nel mese di febbraio del 2002.

A San Giuliano, si è concluso l'intervento di ristrutturazione e rinforzo delle rive. I lavori hanno riguardato la difesa delle sponde sul canale "Alle Rotte", la riva verso il "Seno della Seppa", la riva verso la "Punta San Giuliano" e la Punta stessa, fino all'estremità in corrispondenza del canale di "San Giuliano". In questo primo stralcio sono stati eseguiti anche i dragaggi del canale "Alle Rotte" e quelli prospicienti le rive interessate dalle opere.

Anche nel centro storico di Venezia sono proseguiti numerosi e importanti interventi per la difesa locale di rive e marginamenti.



Alle *Zattere*, gli interventi, nel loro complesso, interessano l'intero percorso della fondamenta, da Punta della Salute fino alla Stazione Marittima, per 1,3 chilometri, mentre alla *Giudecca* si sviluppano dall'estremità est della fondamenta, all'interno della caserma della Guardia di Finanza, fino al rio di San Biagio, per 1,7 chilometri. I lavori procedono per stralci successivi, individuati tenendo conto delle situazioni di particolare urgenza ma anche delle esigenze delle attività commerciali.

Sono attualmente in corso di realizzazione i lavori relativi al quinto stralcio, che consente di completare la ristrutturazione delle rive delle *Zattere* in due tratti distinti, in prossimità della zona di San Basilio e in quella della chiesa dei Gesuati, e i lavori relativi al sesto stralcio, onde completare gli interventi alla *Giudecca*.

Nel corso del 2004, sono proseguiti anche gli interventi per la ristrutturazione, il consolidamento o il restauro di rive e muri di sponda alla *Giudecca*, lato sud e a *sacca Fisola*, lato nord, con la realizzazione di rive urbane percorribili e ripristino di muri di cinta di spazi pubblici e privati, la ricalibratura dei fondali a ridosso delle rive, la predisposizione degli impianti per l'installazione dell'illuminazione pubblica.

Sempre nel centro storico veneziano, sono stati completati, nel corso del 2004, nell'*isola di San Giorgio*, gli interventi di restauro e di consolidamento del molo lungo il bacino di San Marco, delle lanterne e delle fondazioni dell'edificio che ospita gli uffici della Fondazione Giorgio Cini, nonché si sono conclusi i lavori di sistemazione delle *rive lungo i Giardini Napoleonici*, nel tratto di riva compreso tra il ponte San Domenico e il ponte dei Giardini, anche questi, in parte, realizzati mediante un "Accordo di programma" con l'Amministrazione comunale di Venezia.

E' stato, inoltre, approvato il progetto relativo alla sistemazione dei marginamenti lungo il *fronte est dell'isola di S. Elena*, si prevede di avviare i lavori nel corso del primo semestre del 2005.

Nel corso del 2004, si segnala, inoltre, la prosecuzione del primo stralcio degli importanti lavori di difesa dell'"*insula*" di San Marco dalle acque alte più frequenti. I lavori relativi al primo stralcio, avviati nel mese di marzo del 2003, comprendono il rialzo, il restauro e il consolidamento della riva, anche a protezione dal moto ondoso, l'intercettazione degli scarichi per la predisposizione della nuova rete per lo smaltimento delle acque piovane e il restauro della pavimentazione. Sempre nel contesto degli interventi di difesa delle rive del bacino di San Marco, sono proseguiti i lavori nel tratto di riva compreso tra il ponte della *Paglia* e il ponte del *Vin*. I lavori consistono nel restauro,

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

consolidamento e rialzo del marginamento, nell'adeguamento, restauro e rialzo della pavimentazione retrostante e nella sistemazione della rete per lo smaltimento delle acque e nel riordino dei sottoservizi.

Sono proseguite, inoltre, sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione, le importanti attività intraprese da Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova, riguardanti la ricostruzione dei marginamenti dell'area dell'*Arsenale di Venezia* e la messa in sicurezza e il restauro dei fabbricati prospicienti lo specchio acqueo, le cui murature perimetrali costituiscono il bordo del marginamento. In particolare, nel corso del 2004, sono terminati gli interventi per la messa in sicurezza e il restauro degli edifici storici delle "*Galeazze*" e delle "*Fonderie*", sono proseguiti i lavori relativi alla ricostruzione del muro di sponda dell'area edificata a nord dell'*Arsenale*, cosiddetta "*riva delle Casermette*" e sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza dei tre capannoni denominati di "*S. Cristoforo*", gli interventi di somma urgenza per due capannoni lungo la riva della "*Novissima*" e gli interventi di messa in sicurezza delle sommità dei muri perimetrali delle "*Galeazze*". Sempre nell'area dell'*Arsenale*, infine, è previsto nei primi mesi del 2005, l'avvio dei lavori di messa in sicurezza definitiva del "*Capannone n. 111*" e, nel corso del 2005, l'avvio dei lavori di risanamento e consolidamento delle rive della *Darsena Vecchia* e della *Vasca delle Galeazze* e l'intervento di recupero e adeguamento dei marginamenti ottocenteschi e novecenteschi dell'*area nord-est*.

Nel centro storico, infine, si rileva anche l'avvio del primo stralcio dei lavori di ripristino delle rive delle *Fondamente Nuove*. Il progetto generale prevede il restauro, il consolidamento e il rialzo delle rive comprese tra la "sacca" della Misericordia e il rio di Santa Giustina, l'adeguamento altimetrico delle soglie di unità immobiliari al piano terra rispetto alla nuova quota della pavimentazione esterna, il risanamento igienico ambientale del sistema fognario e il riordino dei sottoservizi. Nell'ambito di questo primo stralcio verranno eseguiti interventi nel tratto compreso tra la "sacca" della Misericordia e il rio dei Gesuiti.

Anche nella *zona di Chioggia*, nel corso del 2004, sono proseguite numerose attività finalizzate alla difesa dalle acque medio - alte e alla riqualificazione del centro storico. I lavori vengono realizzati mediante un "Accordo di programma" siglato il 17 settembre 1998, tra il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Amministrazione comunale di Chioggia. Si tratta di un programma di opere



finalizzato a un complessivo riassetto del territorio urbano che renda più semplice per i cittadini abitare, vivere e lavorare nella propria città.

Nel corso del 2004, in particolare, sono proseguiti i lavori di difesa locale dalle acque alte avviati nel 1998 con l'intervento pilota di rialzo della *fondamenta S. Domenico*, mediante due stralci funzionali. Sono in fase di sviluppo i progetti per la protezione della parte centrale della città (*Corso del Popolo e Canal Vena - in parte già conclusa*). Contemporaneamente, si ultimerà anche la progettazione delle principali opere di riqualificazione urbana. Gli interventi potranno essere avviati non appena si saranno espressi i diversi Enti competenti. Sono proseguiti i lavori, avviati nel 2001, per il restauro del *Ponte di Vigo*, primo di nove ponti sul Canal Vena che saranno tutti interessati dai lavori di restauro. Nel 2004, inoltre, è stato approvato il progetto di restauro funzionale ed architettonico dei ponti pedonali sul *Canal Vena*. Con il primo stralcio progettuale, sviluppato sulla scorta del progetto definitivo generale, si procede con il restauro statico e architettonico di due ponti pedonali che attraversano il Canal Vena, il *Ponte della Pescheria* ed il *Ponte Scarpa*. Si tratta di quelli che, allo stato attuale, versano nelle peggiori condizioni statiche. Viene ricompreso nella progettazione anche un piccolo tratto di riva urbana (circa 30 m), posto nelle immediate vicinanze del Ponte Scarpa, in parte crollata. Si prevede di avviare i lavori nel corso del 1° semestre del 2005.

Si fa osservare, infine, l'avvio dell'intervento per la riapertura del *canale Perottolo* e la riqualificazione urbana delle aree limitrofe - Quartiere Tombola. I lavori sono realizzati in "Accordo di programma" con l'Amministrazione comunale di Chioggia.

A Sottomarina sono stati sostanzialmente ultimati, nel corso degli esercizi precedenti, gli interventi di difesa locale dagli allagamenti che hanno comportato, mediante quattro stralci funzionali, il rialzo delle rive fino a quota + 130 centimetri per 900 metri di riva, congiuntamente agli interventi realizzati dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova d'intesa con il Comune di Chioggia, volti a valorizzare l'intero tratto del marginamento lungo la laguna e le piazzette che vi si affacciano.

Nel corso del 2004, sono proseguiti i lavori relativi al *quinto stralcio* che riguardano il consolidamento e il rialzo della *riva del forte San Felice* e l'estremità nord del centro urbano.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*


Per quanto riguarda le attività di progettazione si segnala: nel *centro storico* l'avvio dei progetti di messa in sicurezza e il restauro degli edifici 107 e 109, dell'edificio 110 e dell'edificio 111 all'Arsenale di Venezia, l'avvio del secondo stralcio del progetto per la difesa dell'insula di San Marco che riguarda l'area della piazza adiacente al campanile e l'avvio del secondo stralcio della sistemazione delle rive delle *Fondamente Nuove*; nella zona di *Lido*, l'avvio del terzo stralcio del progetto per il restauro e consolidamento di marginamenti delle rive tra Santa Maria Elisabetta e Città Giardino; nella zona di *Chioggia*, l'avvio del progetto per la protezione di Corso del Popolo.

I finanziamenti disponibili per le difese locali degli abitati sono appena sufficienti per portare a completamento le opere ancora in corso. Una volta esauriti tali fondi la continuità operativa dovrà essere garantita dal Magistrato alle Acque di Venezia che, in base a quanto stabilito negli accordi tra Autorità italiane e Commissione Europea, dovrà proseguire nella realizzazione delle opere di difesa non ancora, allora, oggetto di finanziamento, mediante procedure concorsuali per l'affidamento dei lavori

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi propedeutici alla progettazione	3,946	3,946	-
Indagini propedeutiche	22,268	22,268	-
Difesa insediamenti urbani situati lungo i litorali	239,730	239,730	-
Rive e marginamenti nella gronda lagunare	16,600	16,600	-
Protezione degli abitati insulari	176,488	176,488	-
Interventi di difesa delle rive, marginamenti e insulae nel centro storico di Venezia fino alla quota +100 cm	222,067	222,067	-
Difesa insediamenti urbani, marginamenti e rive nell'area di Chioggia; difesa dell'insula di Chioggia fino a quota +120 cm	161,334	161,334	-
Altri interventi	64,144	64,144	-
Somme a disposizione / Rev. Prezzi / Espropri	4,685	4,685	-
TOTALE	911,262	911,262	-

Consorzio Venezia Nuova 

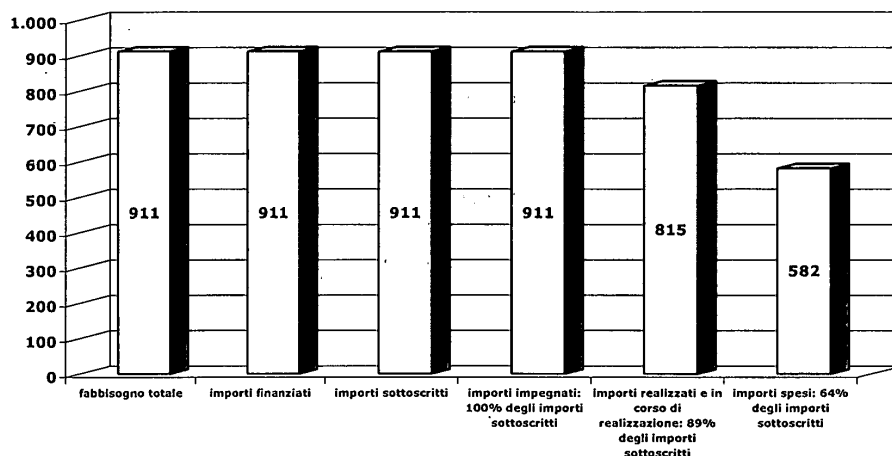

3.4 Ristrutturazione dei moli foranei (interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è il rinforzo della struttura dei moli per assicurare la continuità della difesa della laguna dal mare in coerenza con gli interventi necessari per rinforzare il cordone litoraneo e per difendere i centri abitati lagunari dalle alte maree anche nei casi eccezionali.

Descrizione degli interventi

La laguna è collegata al mare attraverso le tre bocche di porto e ciascuna di esse è "armata" con due moli guardiani la cui lunghezza varia tra 2 e 4 km.

I moli sono stati costruiti tra il 1840 e il 1934 in modo da creare un aumento della profondità dei fondali dei canali di bocca (a causa dell'aumento della velocità della corrente) per adeguarli alla stazza sempre maggiore delle navi moderne.

Le strutture dei moli e le loro funzioni sono diverse procedendo da mare verso terra.

Lato mare i moli hanno la tipica struttura di opera marittima che si deve opporre all'azione del moto ondosso; lato laguna i moli coincidono con le opere di contenimento del territorio.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

I moli foranei alle bocche di porto, che costituiscono un fattore di sicurezza per la navigazione, necessitavano di importanti lavori di ristrutturazione.

I moli sono stati realizzati ricorrendo a pietrame di grande dimensione che ha subito, per l'azione delle correnti e del moto ondoso, continui sprofondamenti nel tempo. Questi fenomeni avevano finito per compromettere la stabilità dell'intera struttura. I lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in passato avevano fronteggiato i dissesti più immediati senza però eliminare il problema.

La ricostruzione dei moli è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono state valutate le caratteristiche del moto ondoso lungo ciascuno dei moli, l'intensità delle correnti di marea al piede delle scogliere, la natura geotecnica dei terreni di fondazione, la profondità dei fondali lungo i moli e la loro tendenza evolutiva, la stabilità della struttura e delle mantellate in roccia.

La realizzazione delle opere non ha comportato modifiche dimensionali e fa ricorso, per le parti a vista, a materiali omogenei a quelli esistenti.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

Il progetto di massima degli interventi per il rinforzo dei moli, che era stato preceduto da specifiche attività di studio e sperimentazione, è stato assentito dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1991.

Durante il 1994 sono iniziati quasi tutti gli interventi previsti.

Nel 1996 sono stati completati i lavori sul *molo nord di Malamocco* mentre sono proseguiti quelli relativi agli altri moli.

Nel 1997 sono stati completati anche i lavori relativi ai *moli nord e sud di Chioggia e sud di Lido*, mentre nel 1998 sono terminati i lavori relativi al *molo sud di Malamocco*.

Nel 1998 sono anche state completate le opere per la messa in sicurezza e l'adeguamento dei *fari sulle testate dei moli nord di Lido e di Malamocco*, lavori segnalati dal Genio Civile per le Opere Marittime su indicazione del Comando zona fari di Venezia.

I lavori relativi al *molo nord di Lido* sono stati completati nel 1999.

Nel corso del 1999 sono stati avviati i lavori relativi alle *radici dei moli sud di Chioggia*, completati nel corso del 2002, e *nord di Malamocco*, sostanzialmente finiti nel corso del 2003; qui i lavori si




collocano in interventi più ampi che interessano l'intera zona e comprendono anche la difesa dalle acque medio-alte dell'abitato di Alberoni sud retrostante e si raccordano con le opere di rinforzo del molo già realizzate.

I lavori realizzati sono stati condotti secondo tre tipologie di intervento sostanzialmente comuni a tutti i sei moli foranei: rinforzo e risagomatura delle mantellate (gli strati di blocchi di roccia o calcestruzzo posti a difesa del molo dall'azione del moto ondoso); rifacimento dei tratti danneggiati dei massi di coronamento; protezione dei fondali mediante una platea di blocchi di roccia collocata sopra un filtro costituito da geotessili sintetici.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	0,620	0,620	-
Indagini e altri interventi minori	3,010	3,010	-
Moli bocca di Lido	21,515	21,515	-
Moli bocca di Malamocco	48,697	48,697	-
Moli bocca di Chioggia	34,086	34,086	-
Somme a disposizione	0,005	0,005	-
TOTALE	107,933	107,933	-

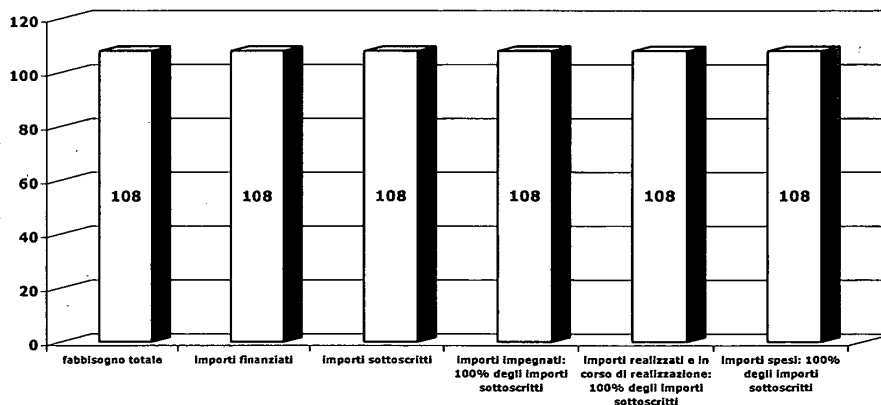

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

**3.5 Difesa dalle
mareggiate**
(interventi di cui
all'art. 3 lettera d)
legge n. 798/84)

Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è il rinforzo del cordone litoraneo che divide la laguna dal mare per proteggere i centri abitati dei litorali dall'azione diretta del moto ondoso e assicurare la continuità della difesa della laguna nel suo complesso da tutte le acque alte, anche dagli eventi estremi.

Descrizione degli interventi

Il cordone litoraneo che separa l'Adriatico dalla laguna, lungo circa 45 chilometri, rappresenta la prima e naturale difesa di Venezia e dei centri urbani lagunari dal mare. Il rinforzo dei litorali ha assunto un carattere di assoluta necessità e d'urgenza. Infatti, il cordone litoraneo si è fatto sempre più sottile e fragile a causa della quasi assenza di apporti fluviali, dei processi erosivi, delle azioni disgregatrici del moto ondoso e del vento e del degrado delle strutture storiche in pietra (i "murazzi") che sono state erette nel corso del XVIII secolo a protezione dalle mareggiate. L'insieme dei fenomeni ha determinato il generale arretramento della linea di costa e la scomparsa del cordone di dune che costituiva un'ulteriore difesa dei territori e degli abitati retrostanti. Il fenomeno è stato particolarmente evidente, fin dai secoli scorsi, nel caso dei litorali di Pellestrina e di Lido per interessare, più recentemente, anche i litorali di Jesolo, Cavallino, Sottomarina e Isola Verde. Il sistema di opere, in gran parte realizzato, persegue molteplici obiettivi: la protezione della laguna e dei suoi abitati; il ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove spiagge e l'ampliamento di quelle divenute inadeguate; la formazione, dove possibile, di un nuovo fronte di dune, il restauro dei "murazzi" e la ristrutturazione delle opere di difesa degradate.

Il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha, da tempo, messo in atto una serie di interventi per il rinforzo dei litorali veneziani, anche mediante la realizzazione di ripascimenti, finalizzati a difendere dalle mareggiate la laguna di Venezia, rafforzando opportunamente i punti più deboli lungo il cordone litoraneo.

La difesa di un litorale mediante la costruzione di una nuova spiaggia è senza dubbio la soluzione che, tra quelle possibili, è più compatibile con l'ambiente costiero in quanto ne riprende, anche se in modo artificiale, i caratteri naturali. Benché sia già stata adottata in altri casi, la soluzione mantiene, per la particolarità della zona, un elevato carattere di novità. Gli effetti conseguiti vanno



attentamente monitorati poiché dipendono strettamente dalle caratteristiche fisiche e dalle condizioni meteomarine della zona.

L'ideazione e la progettazione è stata supportata da numerosi approfondimenti di carattere scientifico, ma è stata possibile solo associando ad esse approfondimenti altrettanto completi e rigorosi riguardo alla ricerca delle cave per l'approvvigionamento delle sabbie, ai metodi costruttivi per il prelievo, il trasporto e il deposito delle sabbie in grado di limitare l'impatto sull'ambiente circostante alle zone di lavoro e riguardo ai controlli da effettuare sia in corso d'opera, che nei mesi e negli anni successivi all'intervento.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

A oggi si è intervenuti o si sta intervenendo su sei litorali per un tratto complessivo di costa di circa 45 chilometri, utilizzando per l'ampliamento o la ricostruzione delle spiagge circa 8,5 milioni di m³ di sabbia.

A Jesolo e a Cavallino si è proceduto anche alla ricostruzione di quasi 8 chilometri di dune.

Nel corso del 1990 è stato eseguito *l'intervento sperimentale* di difesa del litorale di Cavallino, *in località Ca' Pasquali*: si è messo in opera un tratto di barriera sommersa longitudinale, parallela alla costa e ne è stata misurata l'efficacia nell'evitare la dispersione della sabbia.

Nel 1991 sono iniziati i lavori per il *rinforzo della scogliera* nel punto più fragile del litorale di Pellestrina, *l'ansa di Caroman*, dove solo pochi metri separano il mare dalla laguna, completati nel 1995.

Nel corso del 1992 sono stati avviati i lavori per il *rinforzo* di 5 chilometri di *"murazzo"* a Pellestrina, completati nel 1997.

Nel corso del 2002 sono state avviate le attività di controllo degli interventi di ripascimento realizzati sul litorale da Jesolo a Isola Verde, allo scopo di verificare le necessità di reintegro della sabbia che, secondo le previsioni progettuali, sono dell'ordine del 10% in 10 anni.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Infatti, gli interventi già realizzati e in corso di realizzazione sono monitorati con continuità: i controlli effettuati mostrano che gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti, con una generale approvazione e soddisfazione dell'autorità marittima e delle Amministrazioni locali interessate; la stabilità delle nuove opere, già completate, dopo un periodo sufficientemente lungo di "stress" da parte del mare e degli agenti atmosferici, conferma pienamente la validità delle scelte progettuali e dei metodi costruttivi.

Litorale di Cortellazzo - Eraclea

I fenomeni erosivi nel corso degli ultimi anni, si sono resi particolarmente accentuati sul tratto di litorale compreso tra le foci dei fiumi Piave e Livenza in relazione, soprattutto all'esposizione particolare del paraggio alle mareggiate di scirocco.

La forte erosione in atto nel tratto di litorale di Cortellazzo ha messo in evidenza la significativa carenza di apporto sedimentario "naturale" dal fiume Piave e dal litorale di Eraclea.

Nel corso degli ultimi anni, il Magistrato alle Acque è, pertanto, intervenuto lungo il litorale di Cortellazzo realizzando piccole opere di emergenza per contrastare il grave fenomeno erosivo in atto.

Anche la Regione Veneto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti delle competenze in materia di difesa e gestione delle coste dallo Stato alle Regioni, ha da tempo avviato interventi per la protezione delle spiagge venete.

In particolare, la Regione Veneto ha elaborato la progettazione generale della difesa del litorale tra foci Piave e foci Livenza, e ha eseguito un primo stralcio di lavori, con l'allungamento di 9 pennelli nella zona di litorale prospiciente l'abitato di Eraclea, cui seguirà il ripascimento della spiaggia con circa 1,6 milioni di m³ di sabbia.

La realizzazione dei pennelli ha creato una situazione temporanea sfavorevole per il litorale di Cortellazzo, in quanto il flusso naturale di sedimenti ancora possibile è ora completamente intercettato. Per anticipare nel tempo la realizzazione del ripascimento del litorale di Eraclea, in modo da incrementare il trasporto solido longitudinale verso sud, in data 7 novembre 2001, è stato siglato un Accordo di Programma tra la Regione Veneto e il Magistrato alle Acque finalizzato a gestire in modo coordinato l'assetto della foce del fiume Piave e gli interventi di difesa dei litorali di competenza delle due Amministrazioni tenendo conto delle suddette interferenze.

In base a quanto sopra, il Magistrato alle Acque ha ravvisato la necessità di anticipare i tempi di realizzazione del ripascimento del



litorale di Eraclea mediante il proprio Concessionario e con co-finanziamento della Regione del Veneto, in quanto funzionale alla protezione del litorale di Cortellazzo, e, pertanto, ricompreso nel Piano Generale degli Interventi in quanto consente la difesa fisica del litorale veneziano.

Il progetto generale per il rinforzo del litorale di *Cortellazzo* prevede: la sistemazione e il riallineamento delle testate dei 4 "pennelli" esistenti e la realizzazione di 2 nuovi "pennelli" lungo il litorale, in funzione di lavori di ripascimento che verranno realizzati successivamente; il ripascimento del litorale di Eraclea; il rinforzo del molo sud della foce del Piave. Sono previsti quattro stralci di intervento. Nel corso del 2003 sono stati avviati il primo e il secondo stralcio, prima fase. Nell'intervento di primo stralcio, terminato nel maggio del 2003, si è proceduto all'adeguamento di "pennelli" esistenti e alla realizzazione di nuovi "pennelli" lungo il litorale di Cortellazzo, in funzione dei lavori di ripascimento successivamente previsti. Il secondo stralcio, prima fase, attualmente in corso, riguarda il ripascimento del litorale di Eraclea, realizzato con sabbie provenienti da cave marine già autorizzate dal Ministero dell'Ambiente e già parzialmente utilizzate per il ripascimento del litorale di Jesolo.

Litorale di Jesolo

Nell'autunno del 1998 sono state avviate le opere per la difesa del litorale di Jesolo che è soggetto a un significativo fenomeno di erosione; le opere, in fase di massimo sviluppo nel corso del 2001, sono sostanzialmente terminate nel corso del 2002. Nel corso del 2003 e del 2004 sono state realizzate alcune attività complementari per l'accessibilità e la fruizione della spiaggia.

Il litorale di Jesolo si estende per 12 chilometri tra le foci dei fiumi Piave, a nord, e Sile, a sud. A partire dagli anni '40 si è determinato un rapido sviluppo turistico che ha raggiunto la massima intensità dopo il 1970. La conseguente urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio ha profondamente modificato l'aspetto originario dell'ambiente litoraneo e ha contribuito alla progressiva erosione della spiaggia.

La situazione di erosione ha determinato la necessità, espressa anche dagli abitanti del litorale, oltre che dagli operatori economici locali, di un programma generale e unitario di opere, definite in accordo con il Comune di Jesolo. A questa necessità risponde il progetto esecutivo elaborato dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova.

Il *ripascimento della spiaggia* lungo 10 chilometri di riva, con la

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

movimentazione di un milione di metri cubi di sabbia, è avvenuto secondo criteri progettuali analoghi a quelli già adottati a Cavallino e Pellestrina.

A riva, per contenere il ripascimento, è stata prolungata la metà dei pontili su pali già esistenti (34 su 68), in relazione all'allargamento della spiaggia, e ne sono stati realizzati 16 nuovi.

I lavori hanno permesso di ottenere una larghezza omogenea di almeno 50 metri, con un avanzamento della riva, nelle zone più critiche, di circa 30 metri.

Complementare al ripascimento è stata la realizzazione, per complessivi 3,9 chilometri, della struttura di difesa tra la spiaggia e le aree abitate retrostanti, costituita da un'ampia *gradonata*.

Il progetto ha previsto anche la *ricostruzione delle dune*: i lavori hanno uno sviluppo di quasi 2,5 chilometri, a partire dalla foce del Piave.

Per quanto riguarda, infine, i lavori alla *foce del Sile*, sono stati realizzati lavori di rinforzo della scogliera attorno al faro sulla sponda destra; di rinforzo della scogliera che delimita la sponda sinistra; lavori di dragaggio.

Litorale di Cavallino

Nel 1999 sono state completate le attività iniziate nel gennaio 1994. Il progetto ha consentito la *realizzazione dell'ampliamento e del rafforzamento di 11 chilometri di spiagge già esistenti*. La spiaggia ricostruita è difesa da 31 "pennelli", 5 di nuova realizzazione e 26 ottenuti dalla ristrutturazione di parte dei 65 "pennelli" preesistenti. Di questi, la metà circa è stata demolita. I lavori di ripascimento del litorale sono stati eseguiti in progressione da sud verso nord e il versamento della sabbia è stato effettuato dopo la realizzazione di tutti i "pennelli". Sono stati versati complessivamente circa 2 milioni di metri cubi di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di Malamocco.

I lavori per la formazione della spiaggia sono stati integrati da una serie di interventi complementari; in particolare, lungo sei tratti del litorale, per complessivi 4,8 chilometri, la protezione del territorio alle spalle della spiaggia è stata completata, mediante la *ricostruzione del fronte delle dune*, che da sempre costituisce la naturale difesa dal mare ma che ora è assai degradato e, in molti punti, è ormai scomparso.

Nel corso del 2000 sono state completate alcune attività, specifiche, finalizzate a garantire la manutenzione delle specie vegetative messe a dimora sulle dune di Ca' Savio, Ca' Ballarin e valle Dolce, al fine di dare corso a eventuali sostituzioni e/o



trattamenti delle piante sofferenti.

Litorale di Lido

Durante il 2000 sono state completate le attività relative alla progettazione esecutiva delle opere di difesa del litorale di Lido; il progetto è stato anche approvato dall'Amministrazione Concedente. Il piano di intervento era già stato definito, nelle sue linee generali, in un progetto preliminare predisposto nel 1990 dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova.

Nel corso del 2001, l'Amministrazione Comunale di Venezia ha richiesto al Magistrato alle Acque di procedere a una revisione del progetto esecutivo, recependo le istanze del Consiglio di Quartiere di Lido e di alcuni gruppi e associazioni di cittadini. Si è proceduto, pertanto, alla revisione del progetto esecutivo, che è stato favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque nella seduta del 1° ottobre 2003. Nel febbraio del 2004, è stato avviato un primo stralcio dei lavori.

La zona di intervento si estende per circa 5 km a nord della spiaggia di Alberoni, di fronte al murazzo storico.

La soluzione individuata, prevede la realizzazione di una barriera sommersa a distanza media dalla costa di circa 300 m, in grado di abbattere l'energia del moto ondoso, provocando il frangimento dell'onda, e quindi di ridurre il moto ondoso contro i murazzi in modo da rendere non pericolosa la tracimazione, anche in caso di eventi eccezionali. La barriera si estende per una lunghezza di circa 4700 m, ed è realizzata in massi naturali

Per aumentare ulteriormente la dissipazione dell'energia associata alle onde si è previsto il versamento sommerso di sabbia nella zona retrostante la barriera (lato murazzo), conseguendo anche l'obiettivo di ricostituire i fondali storici soggetti a continua erosione. Si prevede il versamento di circa 680.000 m³ di sabbia, con la formazione di cumuli trasversali rispetto alla barriera sommersa, con sommità intorno alla -2 m.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di quattro nuovi pennelli, di lunghezza emersa variabile tra 160 e 220 m, collegati alla barriera sommersa da setti sommersi, e la realizzazione di ulteriori due setti sommersi in corrispondenza di pennelli esistenti.

A completamento dell'intervento di difesa, come richiesto dal Comune di Venezia, si prevede infine un intervento di tutela ambientale delle dune nella zona di Alberoni, attualmente in condizioni precarie e soggette ad un pesante carico antropico.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Litorale di Pellestrina

Il rafforzamento del litorale di Pellestrina, per conformazione fisiografica e per importanza dei fenomeni erosivi in atto, ha comportato l'esecuzione di un sistema di opere mai attuato prima in Italia. I lavori realizzati consistono nella formazione di nuove ampie spiagge protette, nel rinforzo della scogliera, nel rifacimento o restauro della lastricatura del murazzo per quasi 5 chilometri.

I lavori di *ripascimento* a Pellestrina sono stati eseguiti secondo una concezione di intervento e criteri esecutivi analoghi a quelli messi a punto per il litorale di Cavallino. La formazione della spiaggia è avvenuta con l'impiego di quasi 5 milioni di metri cubi di nuova sabbia prelevata da una draga in mare, a una distanza di circa 20 chilometri dalla costa.

Al fine di assicurare la stabilità della spiaggia, si sono costruiti 18 "pennelli" in *pietrame* collegati, mediante setti di prolungamento sommersi, a una *berma continua*, anch'essa *sommersa*, messa in opera a circa 300 metri dalla costa. In questo modo si sono formate delle aree (celle) di ripascimento.

Dal 1994 al 1999 sono stati realizzati otto stralci dell'opera mediante i quali sono stati costruiti 18 pennelli, circa 6 chilometri di berma sommersa e il ripascimento di 19 celle, realizzando così la nuova spiaggia che si estende per poco più di 9 chilometri.

Attualmente sono in corso di realizzazione delle opere complementari che consentiranno agli abitanti l'accesso alla spiaggia mediante il superamento attrezzato del "murazzo" preesistente.

Litorale di Sottomarina

Nel 1997 è stata completata la progettazione esecutiva della difesa del litorale di Sottomarina ed è stata approvata dall'Amministrazione concedente; le relative opere sono state avviate nel mese di maggio del 1998 e sono state completate nel corso del 2000 mentre sono state ultimate nel 2002 le opere di riqualificazione urbana previste dall'Accordo di Programma intervenuto tra il Magistrato alle Acque e l'Amministrazione Comunale di Chioggia. Sono ancora in fase di realizzazione alcuni nuovi lavori richiesti dall'Amministrazione Comunale, oggetto di una apposita perizia di variante esaminata favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel mese di giugno del 2003.

Il litorale di Sottomarina si sviluppa per più di 5 chilometri tra la bocca di porto di Chioggia e la foce del fiume Brenta.

Gli obiettivi degli interventi progettati sono la difesa fisica



dell'ambiente costiero, la protezione delle abitazioni e dei territori a ridosso della spiaggia e, indirettamente, la tutela delle attività che vi si svolgono. Contemporaneamente, così come è avvenuto per i litorali di Cavallino e di Pellestrina, si risponde anche all'esigenza di valorizzazione della costa dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

Nella parte nord del litorale il progetto ha riguardato, essenzialmente, la realizzazione di un "muro paraonde" con sommità a circa +3 metri – a una quota, cioè, di assoluta sicurezza – sul livello del medio mare. Il muretto, che si sviluppa dalla fine dell'attuale Lungomare Adriatico fino a Via S. Felice, è affiancato da un ampio marciapiede che prolunga quello esistente sul lungomare, configurando una passeggiata continua che raggiunge il centro abitato.

Nella parte sud del litorale è già stato realizzato il *ripascimento* dell'arenile (500 metri), mediante il quale è stata riportata la spiaggia a una quota adeguata. Il ripascimento ha richiesto il versamento di circa 120.000 metri cubi di sabbia ed è contenuto da un'opera foranea in scogliera sulla sponda sinistra della foce del Brenta.

Litorale di Isola Verde

Nel corso del 1998, sono stati avviati gli interventi di difesa del litorale di Isola Verde a Chioggia che si sono conclusi nel 2002.

Isola Verde si trova nel Comune di Chioggia, tra la foce del fiume Brenta, a nord; la foce dell'Adige, a sud; il canale Vecchio Adigetto, a ovest; l'Adriatico a est. Il litorale si estende per 2,7 chilometri ed ha alle spalle un territorio fortemente urbanizzato.

Da tempo il litorale è investito da processi erosivi che provocano l'arretramento della linea di riva.

Il Consorzio Venezia Nuova ha, quindi, realizzato il *ripascimento protetto* della parte meridionale del litorale (2 chilometri) mediante il versamento di circa 450.000 metri cubi di sabbia e la realizzazione di 7 "pennelli" di roccia.

Sono stati eseguiti lavori complementari di difesa a terra con la costruzione di un *muro "paraonde"*, che ha uno sviluppo di circa 700 metri, con il rinforzo della sponda destra della foce del Brenta e di quella sinistra della foce dell'Adige.

Nel corso del 2004 è stato avviato il progetto per la realizzazione di interventi integrativi per la difesa del litorale, quali ad esempio camminamenti, piste ciclabili e/o collegamenti, per permettere una migliore fruizione delle aree in questione nel rispetto delle realtà locali.

**Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova**

Uno specifico "Accordo di programma" tra la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque, il Comune di Chioggia e il Comune di Rosolina, ha permesso, infine, l'esecuzione coordinata e unitaria degli interventi alle *foci del Brenta e dell'Adige*, necessari per allontanare dal litorale di Sottomarina e di Isola Verde le acque dolci inquinate e tutelare la balneabilità delle spiagge. Questi interventi consistono nella realizzazione di lunghi palancolati metallici che, "prolungando" le sponde delle foci, sono in grado di veicolare verso il largo, per alcune centinaia di metri, le acque dolci superficiali.

Attività da finanziare


Con gli ulteriori finanziamenti che verranno resi disponibili, si completerà l'intervento generale di difesa dei litorali veneziani; in particolare, gli interventi lungo il litorale di Lido, di Cortellazzo, e di Isola Verde per completare alcune attività precedentemente avviate.

Dovrà essere garantito il finanziamento per le attività di monitoraggio e di gestione degli interventi già realizzati, con particolare riguardo ai ripascimenti che dovranno essere oggetto di manutenzione negli anni futuri.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	20,897	19,697	1,200
Indagini, monitoraggi e gestione dei litorali	44,120	19,120	25,000
Litorale di Jesolo - Cortellazzo - Eraclea	57,346	39,846	17,500
Litorale di Cavallino	54,595	54,595	-
Litorale di Lido	45,152	27,652	17,500
Litorale di Pellestrina	164,550	164,550	-
Litorale di Sottomarina	7,302	7,302	-
Litorale di Isola Verde	20,739	20,239	0,500
Somme a disposizione	0,142	0,142	-
TOTALE	414,843	353,143	61,700

Consorzio Venezia Nuova 

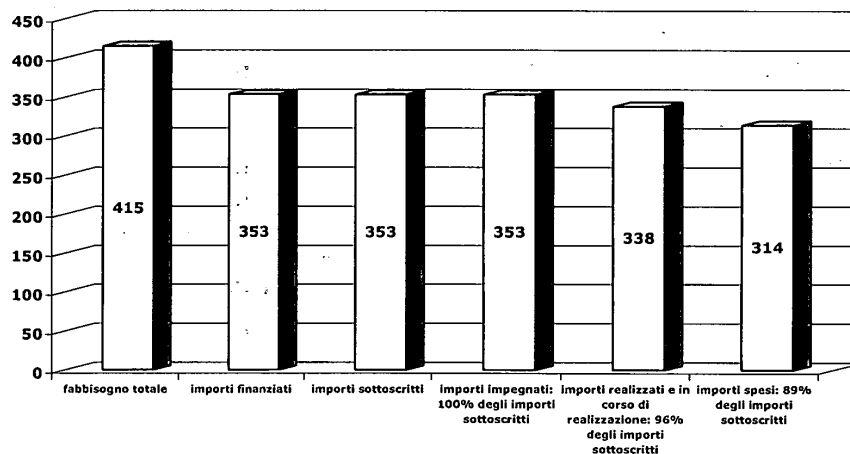

3.6 Recupero morfologico (Interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Obiettivo generale del recupero morfologico è la conservazione delle caratteristiche del sistema fisico ed ambientale della laguna contrastando l'erosione e la perdita di quota del territorio, ripristinando o tutelando le strutture morfologiche preesistenti, indirizzando i flussi mareali nelle diverse aree della laguna per migliorare di volta in volta le condizioni di vivificazione degli specchi acquei, confinando gli apporti di nutrienti e di sedimenti.

Gli interventi individuati hanno anche sempre l'obiettivo del ripristino dei dinamismi naturali tipici delle aree umide lagunari. Il principale riguarda il processo di accrescimento naturale delle zone umide e dei fondali per effetto congiunto di interventi atti a catturare i sedimenti e a favorire lo sviluppo della vegetazione, opponendosi così alla naturale perdita di quota del territorio lagunare per subsidenza e compattazione.

Descrizione degli interventi

La Legge n. 798/84 e, particolarmente, la Legge n. 139/92 dispongono che gli interventi ambientali siano integrati e contestuali alle opere per la difesa dalle acque alte.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Condizione per la sopravvivenza della laguna di Venezia è, infatti, il suo riequilibrio ambientale.

Due fenomeni hanno contribuito al rapido degrado dell'ecosistema lagunare:

- l'erosione, che sottrae sabbia e sedimenti con una dinamica che provoca l'appiattimento dei fondali e la scomparsa delle strutture fisiche proprie dell'ambiente lagunare (canali, bassifondi, velme e barene);
- l'inquinamento che, divenuto imponente negli ultimi quarant'anni, ha causato il progressivo decadimento della qualità delle acque.

Le opere per contrastare i fenomeni suddetti sono state definite in due diversi progetti: quello del recupero morfologico e quello dell'arresto del degrado (v. paragrafo 3.7).

La ricchezza e la complessità morfologica dell'ecosistema lagunare vanno via via scomparendo per effetto di una serie di fattori che si alimentano tra loro. Erosione, acque alte e moto ondoso stanno gradualmente trasformando la laguna: essa sta perdendo le sue caratteristiche fisiche di zona umida per assumere, invece, quelle semplificate e indifferenziate dell'ambiente marino.

Contrastare l'erosione, trattenendo in laguna parte dei sedimenti che, per cause naturali o artificiali, si disperderebbero a mare o nella laguna stessa è il primo obiettivo degli interventi per il recupero morfologico che sono finalizzati a ripristinare le funzioni ambientali, idrodinamiche e naturalistiche dei singoli elementi dell'ambiente lagunare, concorrendo a una complessiva rinaturalizzazione dell'ambiente.

Mediante studi, sperimentazioni e monitoraggi prima, durante e a fine lavori, le opere stanno acquisendo progressivamente una specializzazione naturalistico-ambientale sempre più accentuata.

Il programma degli interventi va dalla manutenzione dei canali lagunari soggetti all'interramento, al riuso dei sedimenti dragati per la realizzazione di zone umide e piane a marea (velme e barene); dalla protezione dei bordi e della vegetazione delle barene esistenti con le più avanzate tecniche dell'ingegneria naturalistica, al sovralzo dei fondali per contrastare il moto ondoso e al consolidamento dei fondali attraverso il trapianto di fanerogame. Di questo programma fanno parte anche i lavori per il



ripristino; delle sponde delle isole minori degradatesi a causa della crescita del livello del mare e del moto ondoso.

Le aree di intervento vengono individuate anche sulla base di una serie di studi specifici che hanno consentito una suddivisione della laguna in aree omogenee definite a seconda delle locali condizioni idrodinamiche, morfologiche, del valore ambientale ed a seconda degli usi.

Tutti gli interventi sulla morfologia mantengono nel loro insieme un carattere di costante attività locale con contenuti di innovazione e di sperimentaltà.

Un continuo monitoraggio degli effetti consente di ottimizzarne via via l'efficacia. Le attività di monitoraggio, infatti, costituiscono l'indispensabile supporto ad alcuni tra i principali lavori realizzati e in corso e forniscono un quadro completo e dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

Specifici *interventi sperimentali* sono stati realizzati anche nell'ambito degli interventi di riequilibrio ambientale. In tali sperimentazioni, uniche nel loro genere eseguite in questo campo, sono state applicate strategie operative del tutto originali e tecnologie, per molti aspetti, innovative.

Anche sulla base dei risultati ottenuti con gli interventi sperimentali, il Consorzio Venezia Nuova ha, successivamente, predisposto un *progetto generale di massima per il ripristino della morfologia lagunare*, approvato dall'Amministrazione Concedente nel 1992, che prevede la realizzazione di una serie di interventi secondo le seguenti tipologie:

- a) *Ricalibratura dei canali, sollevamento dei bassi fondali e ricostruzione di velme e barene, anche attraverso il riuso dei sedimenti dragati e reintroducendo sedimenti in laguna; ricostruzione morfologica degli argini di conterminazione lagunare.*

A seguito dell'approvazione da parte del Magistrato alle Acque dei relativi progetti esecutivi, gli interventi di ricalibratura dei canali lagunari e di ricostruzione delle strutture morfologiche lagunari hanno riguardato circa 90 aree di intervento.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Il quantitativo di sedimenti riutilizzato è stato, mediamente, di circa 500.000 metri cubi all'anno, realizzando così circa 900 ettari di velme, barene e sovralti di fondale.

Nelle opere di recupero morfologico di questo tipo si utilizzano i sedimenti presenti in laguna, i quali hanno caratteristiche chimiche e fisiche fortemente variabili da zona a zona ed il loro riuso dipende anche dalle condizioni meteomarine variabili nel tempo.

Le aree di intervento sono già state individuate, in linea di massima, sulla base delle attività di studio ed analisi contenute nel Piano Generale degli Interventi morfologici del 1992, tuttavia, la loro effettiva localizzazione e le modalità di esecuzione sono state e sono oggetto di continui affinamenti.

Pertanto, solamente attraverso il monitoraggio protratto per lunghi periodi (dell'ordine dei 5-10 anni) è possibile acquisire le conoscenze che consentono di raggiungere gli obiettivi di ricostruzione dell'ambiente lagunare attraverso progressivi affinamenti dei progetti, dei materiali impiegati e dei mezzi d'opera.

Attualmente, in questo ambito di attività, sono in fase di progettazione interventi di ricalibratura dei canali e di ricostruzione di velme e barene per complessive 7 aree di intervento; con i finanziamenti ancora disponibili verranno realizzati circa 200 ulteriori ettari di velme, barene e sovralti di fondale. Sono in corso di realizzazione attività che riguardano la ricostruzione del tessuto morfologico di numerose zone lagunari in situazioni particolarmente critiche, in particolare: la zona di velme e barene e canali intorno all'isola di *Santa Cristina*; l'area lagunare in prossimità del canale di *Tessera*; i canali *Santo Spirito*, *Rezzo* e *Fasiol* ove vengono risagomate le sezioni; interventi per la sistemazione delle *Casse di Colmata D/E* e del canale *Fossetta dei Barambani*. Nel corso del 2004 è stato avviato l'intervento di *ripristino morfologico dell'area del lago dei Teneri* (primo stralcio). Questo primo stralcio, prevede la ricalibratura del canale "Taglio vecchio" e il ripristino di tre barene lungo il canale "Taglio vecchio" e il canale "Tezze fonde" con sedimenti idonei, provenienti da lavori di dragaggio previsti nell'ambito di questo progetto e di ulteriori progetti morfologici. Il secondo stralcio, che comporta il ripristino di due barene in corrispondenza di valle Zappa, assentito dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta di giugno 2004, verrà avviato nei primi mesi del 2005. E' stata, inoltre, avviata la



prima fase dell'intervento di *realizzazione di barene lungò il canale S. Leonardo*; l'intervento di *ricalibratura e rinforzo del Canal Morto* tratto tra l'idrovora Cà Bianca e l'innesto del canale Barbegara. Si segnala infine l'ultimazione dell'intervento per la *vivificazione dell'area lagunare in corrispondenza dell'isola del Tronchetto*.

- b) *Protezione delle barene; riavvio dei dinamismi naturali nei bassifondi e nelle barene; naturalizzazione delle barene già realizzate.*

La naturalizzazione dell'ambiente lagunare di fondale e di barena è un obiettivo importante per il recupero morfologico in quanto consente di potenziare le capacità di automantenimento e di riorganizzazione del sistema lagunare attraverso processi naturali di accrescimento, per sedimentazione e sviluppo, della vegetazione che garantiscono la conservazione dell'identità del territorio. Inoltre, le barene artificiali, al termine della loro realizzazione mediante il refluento dei sedimenti, non costituiscono l'opera finita. Esse sono solo il presupposto indispensabile per l'avvio di processi naturali (l'assestamento della quota, le variazioni delle caratteristiche pedologiche, lo sviluppo della vegetazione) che trasformano il semplice deposito dei nuovi sedimenti, attuato per contrastare la perdita di quota, in un ambiente che progressivamente acquista i caratteri e le funzioni tipiche delle zone umide lagunari (elevata biodiversità, alta produzione biologica, capacità di automantenimento). Si ha:

- *protezione barene*: ad oggi gli interventi in corso di esecuzione o già realizzati hanno riguardato 42 aree.

Negli interventi di protezione delle barene naturali vengono impiegati materiali diversi a seconda del grado di esposizione ai processi erosivi e nel rispetto dei vincoli di natura archeologica e paesaggistica.

In generale sono state impiegate: palificate; piccole scogliere in pietra contenute entro reti (le burghe); sovralti sabbiosi; piantumazione di specie vegetali alofile secondo tipologie operative e modalità costruttive che ben si inseriscono nel paesaggio lagunare senza rinunciare ad una loro sufficiente durata; in alcuni casi si è iniziato a sperimentare materiali biodegradabili;

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

- *interventi di riavvio dei dinamismi naturali*: sono in corso di realizzazione, ovvero sono stati realizzati, interventi in 17 aree con fascinate di sedimentazione (aree confinate in cui è facilitata la cattura dei sedimenti sospesi); in 12 aree con refluitamento di sedimenti; in 28 aree con trapianto di vegetazione.

- *naturalizzazione delle barene artificiali*: si è intervenuti su 12 barene.
Allo scopo di accelerare i processi di naturalizzazione delle barene artificiali, si procede alla rimozione delle palificate di contenimento delle barene artificiali, una volta completato il consolidamento del materiale refluito. Ciò, per facilitare lo scambio con le acque circostanti, e, quindi, lo sviluppo naturale della vegetazione. E' anche previsto lo scavo di "ghebi" e "chiari" all'interno delle barene artificiali per aumentare la diversificazione degli habitat.

Le suddette tipologie di intervento sono tra loro interconnesse. In questo ambito di attività, sono in fase di progettazione gli interventi relativi alla protezione delle barene esposte al moto ondoso realizzando sovralti sabbiosi di fondale lungo i bordi, strutture morfologiche a lato del cosiddetto "canale dei petroli" per ridurre l'erosione dei fondali adiacenti, impiegando i sedimenti sabbiosi provenienti dal dragaggio del Porto di Chioggia, la rinaturalizzazione del fondale e delle barene nell'area di Sant'Erasmo, la costruzione di strutture morfologiche a barena nella zona del lago dei Teneri, Cornio e Millecampi impiegando i sedimenti provenienti dal dragaggio dei canali lagunari per la vivificazione mareale delle aree di gronda. Sono in fase di esecuzione, per la protezione delle barene in erosione, gli interventi che prevedono la realizzazione di *cordoni sabbiosi sommersi* in laguna centrale. Il primo stralcio dell'intervento, che si è concluso nel 2003 ha riguardato la realizzazione di quattro cordoni sabbiosi tra "punta La Vecia" e valle "Millecampi", con l'impiego di sabbia proveniente da dragaggi nell'area lagunare di Chioggia. Il secondo stralcio, la cui prima fase è attualmente in corso prevede la realizzazione di sei cordoni sabbiosi nell'area compresa tra il canale "Acque Negre" e la palude del "Fondello", la realizzazione di due cordoni sabbiosi e il ripascimento di due barene in località "punta La Vecia".



c) *Arresto dell'erosione e del degrado ambientale delle isole minori*

E' stata completata, ovvero è in corso di esecuzione, la protezione di 12 isole (Campalto, Fisolo, San Servolo, Isola dei Laghi, Certosa, Lazzaretto Nuovo San Lazzaro degli Armeni, San Michele - completate; San Giacomo in Paludo, Poveglia, Lazzaretto Vecchio, San Francesco del Deserto - in corso).

Sono in fase di progettazione gli interventi riguardanti le isole di Mazzorbetto; Santa Caterina, Santo Spirito, Vignole, San Michele, San Giorgio in Alga, San Pieretto, Madonna del Monte, Isola Campana, S. Angelo delle Polveri.

Gli interventi riguardano il rinforzo di margini di isole in cui non era possibile ridurre l'azione erosiva del moto ondoso generato dal vento con interventi di protezione e sollevamento dei fondali lagunari ed in cui non era nemmeno eliminabile il moto ondoso da natanti.

I risultati finora osservati assicurano che il livello di conseguimento degli obiettivi progettuali è elevato e che le scelte concettuali ed i metodi di realizzazione (sperimentali e gradual) del progetto morfologico sono sicuramente validi.

Lo stato di avanzamento è pure molto soddisfacente: non soltanto per la quantità e l'estensione degli interventi eseguiti o che sono in corso di esecuzione, quanto per la circostanza di poter disporre di un progetto generale "certificato" dal successo di un cospicuo numero di interventi da considerarsi, appropriatamente, come progetti "pilota".

Nel corso del 2004 si sono sviluppate numerose attività di studio, sperimentazione e monitoraggio nel settore ambientale.

Per quanto concerne gli studi propedeutici agli *interventi ambientali*, è proseguito il monitoraggio dei parametri fisici, chimici e ambientali del sistema lagunare per controllare le tendenze in atto e, al tempo stesso, fornire una base di dati necessari per interpretare i processi con i modelli matematici. I dati sono utilizzati per simulare gli apporti di acque dolci e degli inquinanti dal bacino scolante, la qualità delle acque marine prospicienti le bocche di porto, la circolazione delle acque, la loro salinità o temperatura, i processi sedimentari di erosione, trasporto, deposizione e compattazione, i processi biochimici ed il ciclo del carbonio nelle catene trofiche principali della laguna di Venezia.

Sono proseguite le campagne di misura di salinità e di torbidità in laguna per la taratura dei modelli idrodinamici e morfologia e

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

l'archiviazione e la redazione di rapporti sui dati meteomarini necessari per la gestione della laguna ed, in particolare, per interpretare il monitoraggio dell'erosione dei fondali e delle spiagge, la qualità delle acque, i processi distrofici dell'ambiente lagunare.

Si segnala, in particolare, la prosecuzione, delle attività inerenti gli approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali in sede di Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 3 aprile 2003.

Come ricordato in altra parte della presente relazione, nel corso della seduta del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 3 aprile 2003, le Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia, nell'esprimere il loro parere sul progetto definitivo delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, hanno richiesto che venissero eseguiti degli approfondimenti su alcuni aspetti specifici, riassunti in 11 punti distinti.

Facendo seguito a ciò, nell'adunanza del 6 giugno 2003, il Comitato Tecnico di Magistratura ha esaminato favorevolmente il *"Piano degli studi, delle progettazioni e della realizzazione degli interventi a seguito delle decisioni assunte dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 3 aprile 2003"*.

Tale documento di programmazione comprende: il piano delle attività per realizzare le opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e il programma delle attività necessarie per procedere allo sviluppo progettuale degli 11 punti richiesti dai Comuni lagunari.

Lo sviluppo progettuale delle richieste delle Amministrazioni Comunali avviene parallelamente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere mobili.

Nel Piano programma sono state indicate, con precisione, le attività da realizzare. Di seguito viene illustrato lo stato di tali attività con riferimento agli aspetti morfologici. Per gli aspetti più strettamente riferiti alle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, si rimanda al relativo capitolo (3.2).

In particolare, a seguito degli approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali sono stati definiti i seguenti studi:

- *Studio degli interventi per rinaturalizzare la bocca di Lido*, lo studio è stato avviato ad aprile del 2004;
- *Analisi della possibilità di reperimento di sedimenti dal fiume Brenta*, lo studio è stato avviato a novembre del 2003;
- *Interventi per immettere in laguna acqua dolce e sedimenti trasportati dai fiumi. Analisi della disponibilità di sedimenti nel*



fiume Piave, lo studio è stato avviato a marzo del 2004;

- *Verifica della possibilità di approvvigionamento dei sedimenti per gli interventi morfologici in laguna da invasi idroelettrici*, lo studio è stato avviato a giugno del 2004.

Tali attività si concluderanno nei primi mesi del 2005.

Si ritiene importante, infine, segnalare che, nel corso del 2004, è stato completato l'aggiornamento del Piano Generale degli Interventi per il recupero morfologico, richiesto dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 15 marzo 2001, e dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 recependo, in particolare, con deliberazione del 3 aprile 2003, la richiesta delle Amministrazione Comunale di Venezia.

Le linee guida dell'Aggiornamento del Piano sono state illustrate alla Commissione degli Esperti del Magistrato alle Acque e all'Ufficio di Piano e, infine sottoposte all'esame del Comitato Tecnico nella seduta del 20 ottobre 2004. Il Comitato ha definitivamente espresso il proprio parere nella seduta del 23 novembre 2004, mentre alcuni approfondimenti specifici sono ancora in corso da parte dell'Ufficio di Piano.

Il nuovo Piano è stato elaborato alla luce di una sempre maggiore attenzione verso i molteplici aspetti dell'ecosistema, verso i reciproci rapporti di causa ed effetto tra le dinamiche e i processi che in esso avvengono, verso l'insieme di relazioni che legano ciascuna componente agli "habitat" propri della laguna. Gli indirizzi adottati mirano cioè, nell'ambito di una visione sistemica della funzionalità ambientale generale, a un'azione di recupero complessiva del bacino lagunare, considerato dal punto di vista naturalistico, ecologico, biologico e paesaggistico. Sulla base di tali indirizzi, delle verifiche sugli esiti degli interventi realizzati in passato e sulla loro evoluzione nel tempo, delle analisi sugli effetti di specifiche sperimentazioni in aree campione e della disponibilità di un quadro informativo costantemente aggiornato e ampliato, è stato possibile individuare una serie di linee-guida per una gamma di opere che si integrano con quelle previste nel Piano del 1992 e ne completano l'impostazione originaria.

Pertanto, l'attuale Piano, oltre ad avere l'obiettivo fondamentale della conservazione dell'integrità fisica della laguna (già presente nel Piano precedente) si pone, contestualmente, anche l'obiettivo della tutela delle caratteristiche chimico-fisiche delle matrici ambientali (acqua e sedimento) e quello della salvaguardia degli "habitat" lagunari caratteristici, marini e terrestri.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova***Attività da finanziare**


Si segnalà la necessità di disporre di ulteriori finanziamenti per poter proseguire, senza soluzione di continuità, gli interventi di ripristino morfologico nelle zone lagunari più critiche, secondo le linee-guida recentemente delineate nell'ambito dell'aggiornamento del Piano morfologico.

In particolare è necessario disporre di finanziamenti per sviluppare attività di rinaturalizzazione e riattivazione dei dinamismi naturali estese al bacino lagunare; la realizzazione di interventi sperimentali specifici per testare sul campo le problematiche emerse in sede di revisione del Piano morfologico; il completamento di ricostruzione morfologica e ambientale nelle zone di Burano, di Sant'Erasmus, lungo il canale dei Marani, lungo il canale S. Leonardo-Marghera nella zona di Lago dei Teneri, nonché nelle zone di gronda lagunare, per citarne solo alcuni.

E necessario, infine, disporre di finanziamenti per avviare studi sulla biodiversità dell'ambiente lagunare ed in particolare sull'ambiente di barena e di fondale, in modo da ottimizzare gli interventi di rinaturalizzazione.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	58,302	40,320	17,982
Progetto generale, indagini, interventi sperimentali	14,781	14,781	-
Interventi morfologici strettamente connessi alle opere alle bocche	135,000	50,000	85,000
Ricalibratura canali, sollevamento bassi fondali e ricostruzione velme e barene, sistemazione argini di conterminazione	317,238	238,938	78,300
Protezione barene, riavvio di dinamismi naturali, naturalizzazione barene	128,484	49,984	78,500
Interventi per l'arresto dell'erosione e del degrado ambientale delle isole minori	144,499	102,916	41,583
Somme a disposizione	3,707	3,707	-
TOTALE	802,011	500,646	301,365

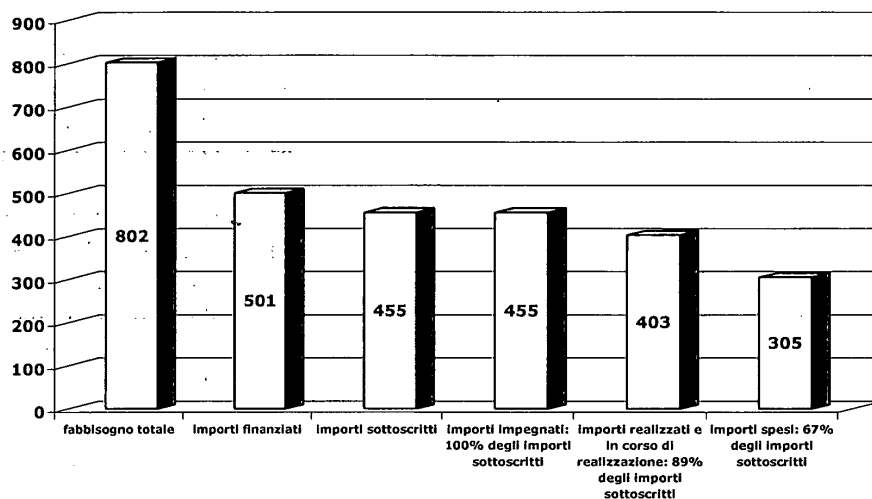

3.7 Arresto del degrado dell'ecosistema lagunare

(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Gli obiettivi degli interventi per l'arresto e l'inversione del degrado sono così raggruppabili:

- difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dai depositi di rifiuti abbandonati e dai suoli inquinati emersi;
- difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dalle sponde e dai fondali dei canali industriali;
- difesa della qualità delle acque, limitando la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari;
- difesa della qualità, delle acque controllando gli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante in laguna.

In accordo con la Direttiva 2000/60/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo, pubblicata il 22 Dicembre 2000 sulla GUCE, che ha istituito un quadro di riferimento comunitario per le politiche dell'acqua, la qualità delle acque non si definisce più solo in base alle caratteristiche chimiche e fisiche delle stesse ma sulla base dell'insieme degli aspetti che ne definiscono i caratteri e sostengono i processi ecologici. Gli obiettivi degli interventi devono quindi tener adeguatamente conto anche degli aspetti biologici e

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

delle interazioni tra gli ecosistemi costituenti il Sistema lagunare.

Descrizione degli interventi

La situazione di degrado ambientale degli ecosistemi della laguna dovuta all'inquinamento ancora significativo (ancorché il picco degli apporti sia ormai stato superato da circa vent'anni) è indicata in modo macroscopico da: riduzione del numero delle specie animali e vegetali; distorsioni dei processi trofici; alterazioni nei processi metabolici, nelle capacità riproduttive e nella durata tipica della vita di molte specie animali; morie occasionali di pesci per scarsità di ossigeno nell'acqua; torbidità dell'acqua e conseguente ridislocazione della vegetazione acquatica (comprese le fanerogame, che con il loro apparato radicale, contrastano l'erosione dei fondali).

Gli studi condotti in questi anni, principalmente dal Magistrato alle Acque, hanno permesso di mettere gradualmente a fuoco anche gli aspetti meno appariscenti ma sempre significativi del degrado ambientale, e di affinare quindi gli interventi di contrasto ed eliminazione degli apporti inquinati e di correzione degli effetti indotti sul Sistema lagunare.

La scomparsa di una fascia di transizione tra terraferma e laguna, ai margini del bacino lagunare, ha aggravato la situazione in quanto tale fascia catturava una grande quantità di nutrienti ed altre sostanze realizzando una "depurazione" naturale degli apporti e sosteneva "habitat" caratteristici e complementari di quelli lagunari per molta parte della fauna superiore.

Il disinquinamento delle acque che pervengono nel bacino lagunare dall'entroterra è, prevalentemente, di competenza della Regione del Veneto. Gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque si attuano all'interno della conterminazione lagunare ed hanno come obiettivo la difesa e/o il miglioramento della qualità delle acque e dei sedimenti e, quindi, della biosfera lagunari.

Il Progetto Generale sviluppato dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova per l'arresto dei processi di degrado prevede diversi tipi di intervento che:

- eliminano, o limitano, gli apporti al sistema lagunare di inquinanti provenienti:
 - dai siti inquinati emersi interni alla conterminazione lagunare e dalle fonti puntuali e diffuse dislocate nel bacino



scolante in laguna a questa recapitati tramite i corsi d'acqua superficiali e sotterranei;

- dai sedimenti lagunari.

- migliorano la capacità delle diverse componenti di sopportare l'azione degli inquinanti, di reagire e di eliminare e disperdere gli inquinanti stessi.

Le azioni devono svilupparsi secondo una strategia volta, parallelamente, a:

- contrastare ed eliminare le situazioni critiche che possono causare collassi e crisi irreversibili del sistema, almeno localmente;
- ridurre, fino ad eliminarli, gli apporti inquinanti indesiderati e, successivamente, eliminare gli accumuli di inquinanti interni al sistema, intervenendo infine anche per re-indirizzare la produttività biologica del sistema e ripristinare l'habitat e i processi ecologici che erano stati alterati dall'inquinamento, in stretto coordinamento con gli interventi di recupero e ripristino morfologico.

Mentre procede la riduzione degli apporti dai corsi d'acqua del bacino scolante e dagli scarichi diretti in laguna, l'azione del Magistrato alle Acque si è concentrata sulla difesa delle acque lagunari dal degrado causato dagli inquinanti provenienti da:

- rilasci, risospensioni e dispersioni di sedimenti, in ambito portuale, molto inquinati e tali da essere una fonte significativa interna alla laguna stessa;
- rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminanti dalle discariche incontrollate (ante DPR 915/1984), utilizzate in passato per smaltire rifiuti di diversa origine, tra cui scorie delle produzioni industriali, che ora si trovano abbandonate all'interno della conterminazione lagunare;
- rilasci e dispersioni di inquinanti da sedimenti esterni all'area critica di Porto Marghera: nuove tecniche di risanamento dei fondali vengono sperimentate in zone lagunari esterne alle aree più critiche per bloccare il rilascio di inquinanti via via accumulatisi nei sedimenti;
- rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminanti dalle sponde dei canali di Porto Marghera afferenti suoli artificiali realizzati utilizzando anche residui delle lavorazioni industriali;

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Le aree industriali di Porto Marghera, infatti, sono state realizzate negli anni dal 1920 al 1960 imbonendo zone lagunari di barene con riporti di materiali eterogenei quali: terre da dragaggi portuali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani.

Oggi, in alcuni casi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono a contatto con le acque lagunari per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge. Sui fondali dei canali, inoltre, si sono accumulate, negli anni, sostanze inquinanti provenienti dai reflui delle lavorazioni portuali e industriali: un problema che solo da alcuni anni è apparso in tutta la sua gravità e viene oggi affrontato in modo sistematico e organico.

Si ricorda che, in data 21 ottobre 1998, anche alla luce del Decreto del Ministro dell'Ambiente del giugno 1998 sugli scarichi in laguna di Venezia, è stato siglato l'Accordo di Programma sulla chimica a Porto Marghera (approvato con D.P.C.M. del 12 febbraio 1999, successivamente integrato il 15 dicembre 2000 con un atto approvato con D.P.C.M. del 15 novembre 2001) in cui sono inserite anche le azioni di competenza del Magistrato alle Acque.

Gli interventi del Magistrato alle Acque vengono attuati secondo un piano concordato con l'Autorità Portuale di Venezia mediante specifici atti d'intesa e riguardano, principalmente, la realizzazione di opere di conterminazione delle sponde e di dragaggio dei sedimenti inquinati depositati sul fondale e sulle rive dei canali industriali.

In questo ambito, il Magistrato alle Acque ha incaricato il proprio concessionario di predisporre un inquadramento tecnico generale degli interventi di propria competenza nonché di svolgere la progettazione esecutiva e di realizzare gli interventi considerati prioritari.

L'azione sui sedimenti inquinati esterni all'area critica di Porto Marghera (nella zona lagunare fra questa e Venezia, in prossimità delle foci di corsi d'acqua recapitanti in laguna sostanze inquinanti, in zone di accumulo di materiali contaminati, nella zone lagunari contigue ai depositi di rifiuti) può essere sviluppata solo a valle della eliminazione degli apporti e deve essere orientata alla eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana e per quella degli ecosistemi lagunari. Questo può essere raggiunto mediante:



- l'eliminazione o il confinamento degli accumuli più pericolosi per quantità ed intensità della contaminazione;
- il contrasto della contaminazione diffusa.

Nuove tecniche di risanamento dei fondali vengono, pertanto, sperimentate in zone lagunari esterne alle aree più critiche per bloccare il rilascio di inquinanti via via accumulatisi nei sedimenti. Per migliorare la capacità delle diverse componenti del sistema di sopportare l'azione degli inquinanti, per prevenire il rischio di crisi ambientali dovute alla proliferazione di macroalghe alimentate dall'abbondanza di nutrienti disponibili nelle acque lagunari, vengono eseguite periodiche campagne di raccolta.

Le conoscenze sullo stato di inquinamento dei sedimenti e sulle problematiche di protezione dell'ambiente e della salute umana crescono rapidamente in parallelo con l'attuazione degli interventi e con l'emergere di nuove normative e direttive di tutela.

Gli interventi da attuare in laguna hanno, quindi, un forte contenuto sperimentale conseguente alla necessità di tener conto delle problematiche che via via emergono.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

I primi *interventi sperimentali* di riequilibrio ambientale sono stati realizzati nella *zona tra i canali S. Spirito e delle "Scoasse"*, una zona di fronte all'isola di Lido caratterizzata da abnorme crescita di macroalghe, nel *Lago dei Teneri*, un tratto di laguna retrostante le casse di colmata, e in *Palude della Rosa*, vicino all'isola di Torcello. Si è potuta verificare la risposta locale dell'ecosistema ai trattamenti compiuti per il miglioramento della qualità dei sedimenti del fondale.

Il Consorzio Venezia Nuova ha redatto un *progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado* che è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994.

Per poter realizzare le attività previste dal progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado, è necessario acquisire dati e informazioni mediante indagini e monitoraggi propedeutici alla progettazione esecutiva degli interventi e monitoraggi ex ante e ex post rispetto alla realizzazione degli interventi.

In particolare, obiettivi delle *indagini* sono:

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

- definire e mantenere aggiornato lo stato degli ecosistemi lagunari e delle loro linee di evoluzione tendenziale, individuando priorità, opportunità e sinergie di intervento;
- ottenere una mappatura delle caratteristiche chimiche, fisiche, idrogeologiche e geotecniche dei depositi di rifiuti e dei sedimenti su cui questi giacciono;
- ottenere una mappatura delle caratteristiche chimiche, fisiche, mineralogiche e geotecniche dei sedimenti, sia dei bassifondali che dei canali;
- ottenere una mappatura dei popolamenti bentonici e delle loro dinamiche;
- avere una mappatura dei popolamenti vegetali ed animali degli ecosistemi lagunari che potrebbero essere bersaglio e poi veicolo di propagazione dell'inquinamento;
- ottenere una mappatura delle caratteristiche chimiche, fisiche, idrogeologiche e geotecniche dei materiali costituenti le sponde dei canali;
- stabilire le profondità a cui eventualmente scavare e bonificare i fondali, i relativi volumi di sedimenti da prelevare e le modalità di gestione;
- definire la possibile destinazione dei sedimenti e le modalità di trattamento;
- verificare le condizioni che hanno portato e che potrebbero portare alterazioni dei sedimenti sul fondo dei canali;
- acquisire elementi sulla pericolosità per la salute umana e per gli ecosistemi lagunari dei diversi depositi di inquinanti, anche in relazione alla graduale evoluzione dello stato complessivo dell'ecosistema;
- valutare la compatibilità degli interventi previsti con quanto indicato dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Per quanto riguarda i *monitoraggi*, questi hanno tre finalità principali strettamente correlate:

- tenere aggiornate le basi conoscitive generate dalle indagini a supporto della programmazione e della progettazione degli interventi;
- controllare l'efficacia diretta ed indiretta degli interventi realizzati, al fine di migliorare l'efficienza dell'azione del Magistrato alle Acque e di correggere eventuali insufficienze;
- sostenere il Magistrato alle Acque nella sua azione di gestore generale del sistema lagunare attribuitagli dalla legge, in



collaborazione con la Regione, le Province e i Comuni interessati.

La progressiva realizzazione del progetto generale degli interventi per l'arresto ed inversione dei processi di degrado prevede una serie di *interventi* secondo le seguenti principali tipologie:

- a) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che eliminano gli apporti di inquinanti provenienti dai depositi abbandonati di rifiuti e dai suoli inquinati emersi.*

Il Progetto generale degli interventi per l'arresto ed inversione dei processi di degrado ha messo in luce l'importanza, quale fonte di inquinamento per le acque lagunari, di depositi incontrollati di rifiuti realizzati nel passato nell'ambito lagunare. In molti casi il sedime artificiale è stato realizzato in passato (1930/1970) con terre di dragaggio, anche inquinate e con significativi apporti di rifiuti industriali impiegati come materiali aridi di consolidamento.

In altri casi le aree barenali sono state utilizzate per collocare rifiuti industriali e urbani.

Questi depositi rappresentano una importante fonte di inquinanti per l'ecosistema. Questi vengono ridistribuiti in laguna a seguito dei processi di erosione delle sponde, di dilavamento dei sedimenti inquinati ad opera delle acque lagunari continuamente pompate dentro e fuori per effetto dell'alternarsi delle maree, di immissione in laguna delle acque di falda da loro inquinate.

Sono stati individuati 17 siti di deposito di rifiuti che rappresentano una fonte di inquinanti per la laguna; 14 di questi siti si affacciano direttamente sulla laguna, sviluppando un fronte di contatto con la laguna di circa 14,5 km.

Sono stati attivati numerosi interventi (*Messa in sicurezza della Barena del Passo Campalto, Conterminazione delle Isole delle Trezze e dell'Ex-Inceneritore, messa in sicurezza della zona di Val da Rio* - già completati) e sono in corso indagini, rilievi e progettazioni per ulteriori interventi.

Nel corso del 2004 si segnala l'ultimazione dell'importante intervento per la sistemazione ambientale della zona della *Barena del Passo, a Campalto*.

Il progetto definisce una serie di interventi che fanno fronte a un'autentica emergenza ambientale. In passato, infatti, la Barena del Passo a Campalto è stata utilizzata come discarica per collocare 800.000 m³ di rifiuti e materiali inquinanti di diversa origine, tra cui oltre 300.000 m³ di fosfogessi.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

La presenza di rifiuti pericolosi e fosfogessi ha determinato una grave situazione di rischio ambientale e sanitario riconducibile, in parte, all'irraggiamento gamma, all'emanazione di gas Radon e alla diffusione di microinquinanti tossici e radioattivi e di microinquinanti organici e inorganici. Per mettere in sicurezza l'area sono state, quindi, studiate numerose alternative di intervento. La soluzione adottata comporta la separazione del deposito di rifiuti in due settori, ognuno con problematiche omogenee, e, quindi, il loro completo isolamento dall'ambiente circostante, rendendo possibile anche il futuro riutilizzo dell'area nell'ambito del parco pubblico previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

Nel corso del 2004 si segnala, inoltre, l'approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio di emergenza dell'intervento di bonifica, con misure di sicurezza, dell'area demaniale c.d. dei "Pili" a Venezia - Porto Marghera. L'intervento nell'area denominata "Pili" si inserisce in un quadro generale nazionale che presenta, a partire dal 1998, un importante sviluppo delle procedure per la bonifica ed il risanamento ambientale dei siti contaminati. Questo primo stralcio, i cui lavori verranno avviati nel primo semestre del 2005, a valere sui fondi provenienti dall'Accordo transattivo Stato - Montedison (ora Edison S.p.A.), prevede:

- la realizzazione di una struttura di marginamento definitiva, comprendente un palancolato metallico strutturale e un diaframma plastico in cemento bentonite in funzione di barriera impermeabile per il contenimento degli inquinanti;
- la bonifica dei fondali antistanti le sponde, mediante il dragaggio dei sedimenti direttamente contaminati;
- il refluento dei sedimenti in riserva temporanea all'interno di contenitori in geotessuto in poliestere (collocati in bacini di accumulo appositamente predisposti nella zona), allo scopo di mettere in sicurezza i materiali dragati per il tempo necessario a ottenere una riduzione del loro volume per essiccamento in vista di un successivo smaltimento finale;
- la predisposizione del sistema di drenaggio; la sistemazione e l'ampliamento della recinzione per impedire l'accesso all'area.

b) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano la disponibilità delle sostanze inquinanti provenienti*



dalle sponde e dai fondali dei canali industriali di Porto Marghera.

Gli interventi nel Piano Generale degli Interventi realizzati, in corso e in fase di progettazione per raggiungere questo obiettivo sono:

- interventi di sistemazione dei sedimenti nei canali dell'area portuale (dragaggi e/o messe in sicurezza permanente mediante copertura, o interventi in situ);
- interventi di messa in sicurezza e di marginamento delle sponde lagunari o di canali collegati alla laguna afferenti a depositi incontrollati di rifiuti o a imbonimenti realizzati con materiali inquinati;
- realizzazione di installazioni di messa in riserva e/o di stoccaggio temporaneo dei materiali inquinati, di impianti di condizionamento dei materiali inquinati, di impianti di trattamento e di smaltimento;
- sperimentazioni di confinamento in situ dei sedimenti superficiali mediamente inquinati, in estese aree lagunari in cui gli interventi di bonifica appaiono poco efficienti.

Il Magistrato alle Acque, con il Consorzio Venezia Nuova, di concerto con l'Autorità Portuale secondo specifici atti d'intesa, ha messo a punto un programma di interventi per la realizzazione di *opere di contenimento e impermeabilizzazione delle rive dei canali industriali di Porto Marghera.*

Le opere progettate hanno la finalità di tutelare la laguna contro i rilasci di inquinanti provenienti dalle aree a tergo delle sponde e di arrestare i fenomeni erosivi in atto lungo le sponde non protette ed il conseguente progressivo arretramento della linea di riva.

Buona parte dei progetti degli interventi devono tener conto delle esigenze portuali ed essere sviluppati per fasi, per non interferire in modo significativo con le attività produttive in essere sui suoli prospicienti le sponde.

Nella scelta delle soluzioni tecniche da adottare si è privilegiato l'affidabilità e la rapidità di realizzazione consentita dal ricorso a componenti prefabbricati rispetto alla realizzazione di barriere in opera.

Gli interventi realizzati prevedono la costruzione di un marginamento non erodibile e a bassissima permeabilità (in genere un palancolato metallico a tenuta idraulica), la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque di falda

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

retrostanti per controllare le pressioni sui marginamenti, la riorganizzazione degli scarichi delle acque reflue e delle acque di pioggia. Tali drenaggi sono poi collegati con una rete di trasferimento delle acque inquinate agli impianti di depurazione.

In questo ambito si ritiene significativo segnalare che, su precisa indicazione impartita dall'Amministrazione Concedente, d'intesa con l'Autorità Portuale di Venezia, il Consorzio Venezia Nuova ha sviluppato, in questi ultimi anni, numerosi progetti che riguardano, per citarne alcuni: la sistemazione della *sponda sud del canale industriale Sud*; la sistemazione della *sponda ovest del canale San Leonardo - Marghera* compresa tra il canale industriale Ovest a Fusina; la sistemazione delle *sponde dell'isola dei Serbatoi Petroliferi*; la sistemazione delle *sponde e dei fondali del canale industriale Brentella*; la sistemazione delle *sponde e dei fondali del canale Lusore-Brentelle*; la sistemazione delle *sponde della Darsena della Rana*; la sistemazione delle *sponde sud ed est del canale industriale Ovest*; la sistemazione della *sponda nord del canale industriale Nord*; la sistemazione di un tratto della *sponda nord del canale Vittorio Emanuele III*; la sistemazione della *sponda lagunare dell'area demaniale c.d. "Terzo Argine"*.

Quale area prioritaria di intervento è stata individuata la *sponda nord del canale industriale Sud*, ove l'erosione della riva e i rilasci di inquinanti, soprattutto fanghi di bauxite, i cosiddetti "fanghi rossi", erano particolarmente evidenti. La necessità e l'urgenza di procedere con la progettazione e la successiva esecuzione dei lavori è stata affermata anche dall'ordinanza n. 4498, del 1° ottobre 1996, del Ministro dell'Ambiente.

Il primo e il secondo stralcio sono stati completati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Il terzo stralcio, avviato nel 1999, è ancora in corso di esecuzione. Nel 2004, inoltre, è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque il quarto stralcio, 1° e 2° lotto. I relativi lavori verranno avviati nel corso del 2005. Il 1° lotto riguarda la sistemazione della sponda in corrispondenza dell'area in concessione a Sirma S.p.A. Il 2° lotto riguarda la sistemazione delle sponde in corrispondenza della zona denominata "area 43 ettari". L'area, sostanzialmente formata da rifiuti industriali, la cui sponda non ha nessuna protezione, rappresenta una delle principali fonti di



inquinamento del canale.

Tra le opere in corso si ricorda, in particolare, la prosecuzione dei lavori avviati nel 2002 per la sistemazione della *sponda sud del canale industriale Ovest*; la sistemazione delle sponde del canale industriale *Bretella*; *l'avvio dei lavori di sistemazione della sponda ovest dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi*; l'approvazione del secondo stralcio dell'intervento di sistemazione delle sponde del canale industriale *Brentella a Porto Marghera*.

Tutti i tre interventi sono finanziati con i fondi derivanti dall'Accordo transattivo Stato - Montedison (ora Edison S.p.A.).

Nel corso del 2004, infine, sono proseguite le *attività di asportazione dei sedimenti inquinanti dal fondale del canale industriale Nord a Porto Marghera*.

L'intervento, avviato nel 1996, con una prima fase sperimentale del primo stralcio completata nel 2000, risponde alla finalità di realizzare uno scavo dello specchio acqueo in prossimità della banchina in concessione alla Fincantieri S.p.A., allontanando dal sito il materiale inquinante ivi depositato e che, nel tempo, continuava a rilasciare sostanze provenienti dalle lavorazioni industriali.

La sperimentale dell'intervento è consistita nel realizzare un ciclo di disidratazione del materiale dragato presso un impianto pilota appositamente attrezzato ove viene verificato quale sia il metodo di disidratazione più idoneo a trattare il fango, tra la filtropressatura e la nastropressatura, come peraltro richiesto dalla Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente nel voto di approvazione dell'impianto del 12 giugno 1997.

- c) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari.*

Gli interventi del Piano Generale già realizzati, in corso e in fase di progettazione per raggiungere questo obiettivo sono:

- confinamento mediante ricopertura dei sedimenti dei bassifondali inquinati ma di dimensioni tali da non poter essere asportati e sostituiti, ricostruendo così habitat adatti alla flora e alla fauna lagunari (interventi effettuati con interessanti risultati nel corso degli anni novanta ma ormai non più realizzabili con le nuove norme di tutela

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

ambientale);

- realizzazione di installazioni di messa in riserva temporanea dei sedimenti inquinati in attesa del loro trattamento;
- realizzazione di impianti di condizionamento dei sedimenti inquinati a supporto dei successivi processi di trattamento e di smaltimento;
- raccolta selettiva delle macroalghe nitrofile e riutilizzo delle stesse.

In particolare a partire dal 1989, il Consorzio Venezia Nuova ha svolto periodiche *campagne di raccolta delle macroalghe*, predisponendo anche un sistema di monitoraggi che indirizzano gli interventi nelle aree maggiormente a rischio (Burano, Tesserà, Campalto, Lido, Giudecca e Chioggia). Fino ad oggi sono stati raccolti 221.000 metri cubi di alghe, con un massimo di 50.000 metri cubi nel 1989.

Parte del materiale raccolto è stato utilizzato, per la prima volta, nella produzione di carta. Ne è stato studiato, tra l'altro, anche il possibile uso come ammendante in agricoltura.

d) *Difesa della qualità delle acque lagunari mediante interventi di controllo degli apporti inquinanti dal bacino scolante.*

Gli apporti di inquinanti dal bacino scolante in laguna, compreso il territorio delle isole lagunari e delle isole del litorale si sono significativamente ridotti negli ultimi due decenni per effetto degli interventi di collettamento e depurazione degli scarichi civili e del miglioramento della gestione dei reflui degli impianti produttivi.

I livelli di inquinanti, nutrienti e bioalteranti (inorganici ed organici di sintesi) immessi in laguna dai corsi d'acqua sono tuttavia ancora significativi, per cui appare necessario sviluppare interventi volti ad integrare, agendo sull'interfaccia tra laguna e bacino scolante, l'importante programma che la Regione del Veneto sta attuando secondo un proprio "Piano Direttore", periodicamente aggiornato.

Gli interventi affidati al Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova riguardano:

- realizzazione di strutture morfologiche in prossimità delle foci atte a favorire i processi di sedimentazione degli apporti solidi e dei residui dei processi di flocculazione dei soluti quando le acque da dolci diventano salmastre, in modo da confinare e ridurre le aree di influenza degli apporti inquinanti e, al contempo, realizzare zone a vegetazione



palustre salmastra, un tipo di habitat lagunare in progressiva perdita di area;

- regolazione ed eventuale diversione temporanea dei flussi idraulici immessi in laguna in condizioni di piena, quando è massimo il carico di inquinanti veicolato dalle acque immesse;
- trasferimento di parte delle acque dolci che arrivano in laguna in bacini di sedimentazione e fitodepurazione, prima della loro definitiva immissione in laguna.

Sono state ultimate o sono in corso di realizzazione alcune *aree umide in zone di transizione*, localizzate alla Foce del fiume Dese in Palude di Cona, a lato del canale Nuovo e alla foce Cavaizza e delle *aree sperimentali di fitodepurazione* a lato del fiume Brenta, nel ramo abbandonato del canale Novissimo, a servizio delle acque provenienti dal canale Montalbano; un impianto sperimentale è stato in parte realizzato nell'ambito dell'isola demaniale del Lazzaretto Nuovo, per evitare l'immissione di scarichi civili non trattati in laguna.

Inoltre sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione, manufatti di regolazione delle immissioni in laguna delle acque dolci nella zona di Botte Trezze.

Con gli interventi di creazione di aree umide in zone di gronda si intende raggiungere il duplice obiettivo di ripristinare l'ambiente di transizione tra acque dolci e salate di particolare pregio ambientale per la complessità biologica e l'interesse paesaggistico e di ridurre il carico inquinante immesso nel sistema lagunari dagli apporti dal bacino scolante.

Con gli interventi di regolazione dei manufatti idraulici, sarà invece possibile controllare nel tempo le quantità di acqua dolce da immettere in laguna, aumentando così l'estensione delle aree a canneto.

Tali interventi consistono talvolta nella realizzazione di veri e propri impianti; più spesso invece si tratta di interventi di adattamento mirato dell'ambiente esistente al fine di indirizzarne la funzionalità per il trattamento delle acque dolci provenienti dal bacino scolante.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Attività da finanziare

Le attività di monitoraggio degli ambienti lagunari dovranno essere garantite per tutto l'arco di attuazione degli interventi programmati, a supporto della cui progettazione verranno eseguite le necessarie indagini.

Gli interventi, organizzati negli stessi quattro macro-obiettivi, sono:

- a) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che eliminano gli apporti di inquinanti provenienti dai depositi abbandonati di rifiuti e dai suoli inquinati emersi.*

Dovrà essere completato il programma di isolamento dalla laguna dei suoli di Porto Marghera, realizzando anche le connesse opere di captazione e convogliamento delle acque retrostanti agli impianti di depurazione.

Verranno anche effettuati interventi sulle falde potenzialmente adettrici di inquinanti al sistema lagunare, sia mediante interventi di puro confinamento, captazione e trattamento, sia mediante realizzazione di barriere semi-permeabili capaci di catturare o di modificare gli inquinanti senza alterarne significativamente i flussi.

Una volta realizzato il marginamento di messa in sicurezza, nelle aree demaniali interessate da depositi incontrollati di rifiuti si potrà procedere alla bonifica selettiva, all'isolamento delle aree con particolari caratteristiche di inquinamento e, infine, al completamento della sistemazione ambientale delle aree.

In questa fase verranno in particolare interessate le aree a nord del Ponte della Libertà e le sponde dei canali di collegamento tra Mestre e la laguna.

- b) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano la disponibilità delle sostanze inquinanti provenienti dalle sponde e dai fondali dei canali industriali di Porto Marghera.*

Gli interventi di messa in sicurezza, mediante confinamento in situ dei sedimenti inquinati, dovranno progressivamente essere sostituiti da interventi di bonifica generale e di bonifica con misure di sicurezza, procedendo alla definitiva sistemazione ambientale delle aree.



- c) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari.*

Una volta drasticamente ridotti gli apporti inquinanti al Sistema lagunare, si potrà procedere al risanamento della laguna mediante sostanziale riduzione degli apporti inquinanti provenienti dai sedimenti lagunari.

Complessivamente gli interventi anzidetti riguarderanno meno del 10% dei 49.000 ettari di laguna aperti all'escursione della marea.


- d) *Difesa della qualità delle acque lagunari mediante interventi di controllo degli apporti inquinanti dal bacino scolante.*

Gli interventi di *diversione* saltuaria e controllata delle immissioni di acque dolci dal bacino scolante dovranno interessare diverse foci fino a permettere di regolare almeno il 50% dei flussi annualmente recapitati in laguna.

Le aree di fitobiodepurazione dovranno essere integrate con gli interventi di rinaturalizzazione delle fasce di gronda e di ricostituzione di zone di graduale transizione tra terra ed acqua, estendendosi complessivamente (considerando anche quelle realizzate negli interventi di competenza regionale) per una superficie pari almeno al 5% di quella lagunare.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	35,889	22,561	13,328
Progetti generali, Indagini e monitoraggi generali, interventi sperimentali	59,181	53,018	6,163
Interventi che limitano gli apporti di inquinanti provenienti da depositi di rifiuti abbandonati e da suoli inquinati emersi	151,233	100,084	51,149
Interventi che limitano gli apporti inquinanti provenienti dalle sponde e dai fondali dei canali industriali	772,777	416,398	356,379
Interventi che limitano la disponibilità di sostanze inquinanti provenienti dai sedimenti lagunari	105,781	50,952	54,829
Interventi di controllo degli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante	97,940	49,408	48,532
Somme a disposizione	0,971	0,971	-
TOTALE	1.223,772	693,392	530,380

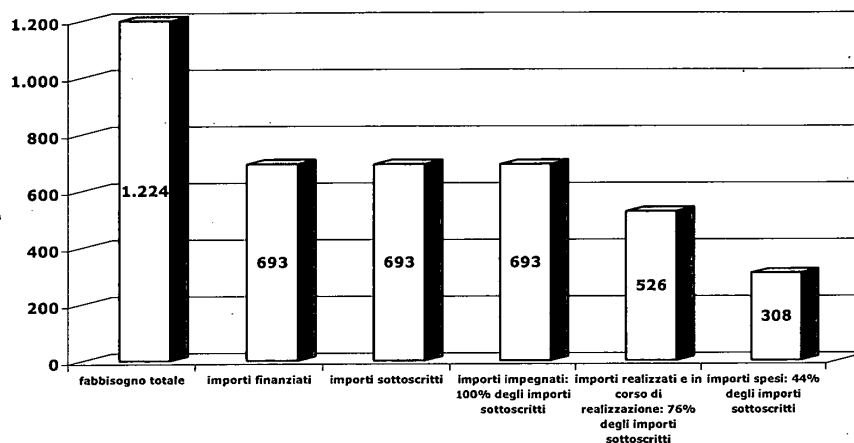**Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova****3.8 Allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna**

(interventi di cui all'art. 3 lettera l) legge n. 798/84)

Obiettivo

Studiare la fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto in laguna di petroli e derivati, al fine di eliminare i rischi derivanti da sversamenti accidentali di prodotti pericolosi per l'ecosistema lagunare.

Descrizione degli interventi

Nella laguna di Venezia transitano mediamente, ogni anno, circa dodici milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e chimici liquidi. Oltre 1200 navi, di diverso tonnellaggio, sono interessate da questo traffico.

Il traffico petrolifero costituisce un rischio potenziale gravissimo per l'ambiente lagunare: per la sua struttura morfologica, la laguna non è in grado di tollerare alcun consistente sversamento di sostanze inquinanti che immediatamente si diffonderebbero nel fitto tessuto delle barene e nei bassi fondali ove è impossibile l'azione dei mezzi di soccorso. I centri abitati lagunari e Venezia subirebbero danni irreversibili.

Si ricorda che per l'eliminazione di rischi derivanti da sversamenti accidentali di prodotti petroliferi all'interno del bacino lagunare, il



legislatore, a partire dalla legge n. 171/73 in poi, ha chiaramente indicato la necessità di approfondire la fattibilità di estromettere dalla laguna i traffici di prodotti pericolosi per l'ecosistema lagunare, affidandone la competenza allo Stato; in particolare, la legge n. 798/84 all'Art. 3 lettera l) indica come interventi di competenza dello Stato la realizzazione di "studi e progettazioni ... per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati...", mentre la legge n. 139/92 prevedendo l'esecuzione degli interventi di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti), secondo il Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 19 giugno 1991, indica, tra gli interventi da realizzarsi secondo il Piano stesso, quelli "relativi alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna" (cfr. Art. 3 comma 2).

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

In questo ambito di attività, il Magistrato alle Acque, attraverso il proprio concessionario, ha nel corso degli anni realizzato numerosi studi propedeutici e un progetto operativo volti ad esaminare e approfondire le diverse soluzioni possibili di intervento per l'estromissione del traffico petrolifero dalla laguna.

Tra le attività più recenti, si ricorda che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 25 ottobre 2001, ha invitato il Magistrato alle Acque di Venezia a considerare l'ipotesi di realizzare un "punto di scarico" esterno alla laguna e collegato con "pipeline" al Porto di Marghera, per estromettere il traffico petrolifero dalla laguna.

A seguito di tale richiesta, è stata presentata al Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nell'adunanza del 6.12.2001, una scheda progettuale di fattibilità di un terminale "off-shore" al largo dei lidi veneziani, collegato a terra con un oleodotto ancorato al fondo del mare fino al cordone litoraneo e posto all'interno di una apposita galleria, in laguna, fino al Porto San Leonardo per l'estromissione del greggio, in modo da eliminare il rischio connesso al mantenimento del traffico dei petroli in laguna garantendo, comunque, lo svolgimento delle attività produttive presenti.

Il Comitato ex art 4 legge n. 798/84 ha approvato la soluzione proposta; conseguentemente il Magistrato alle Acque ha invitato il

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Concessionario a sviluppare il progetto preliminare. Nello sviluppo della progettazione e' emersa la necessità di estromettere dalla laguna tutti i prodotti a rischio e, quindi, non solo il greggio ma anche prodotti chimici derivati dal petrolio. E' stata, pertanto, sviluppata la progettazione di una struttura "off-shore" in collegamento, sempre attraverso pipeline, con la zona industriale di Porto Marghera.

Il progetto preliminare è stato favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nell'adunanza del dicembre 2002. Il Comitato ha, altresì, invitato il Magistrato alle Acque a sviluppare un'analisi di benefici - costi della soluzione proposta, le cui conclusioni sono state sottoposte all'attenzione del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nella seduta del 4 febbraio 2003. In quella sede il Magistrato alle Acque è stato incaricato di avviare la progettazione definitiva della soluzione presentata, provvedendo alla preventiva acquisizione dei pareri di legge in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

In ottemperanza a tale prescrizione, il Magistrato alle Acque ha conferito specifico incarico al Concessionario di svolgere il relativo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e, una volta concluso lo stesso, ha avviato la procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), che ha interessato tutto il 2004 ed è attualmente ancora in corso.

Contemporaneamente, è in fase di sviluppo il progetto di un intervento pilota per il contenimento di sversamenti accidentali, mediante "panne" lungo il canale Malamocco - Marghera.


Attività da finanziare

Il Piano Generale degli Interventi prevede il finanziamento da reperire per l'esecuzione dell'intervento pilota e, successivamente, dell'intervento complessivo per la protezione da sversamenti accidentali mediante la realizzazione di panne di contenimento lungo il canale Malamocco - Marghera. Prevede anche il finanziamento di alcune attività preliminari e la progettazione esecutiva di un approdo off-shore in Alto Adriatico.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).



	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	16,871	3,871	13,000
Progetti	14,160	7,728	6,432
Interventi sperimentali	14,270	1,270	13,000
Somme a disposizione	0,017	0,017	-
TOTALE	45,318	12,886	32,432

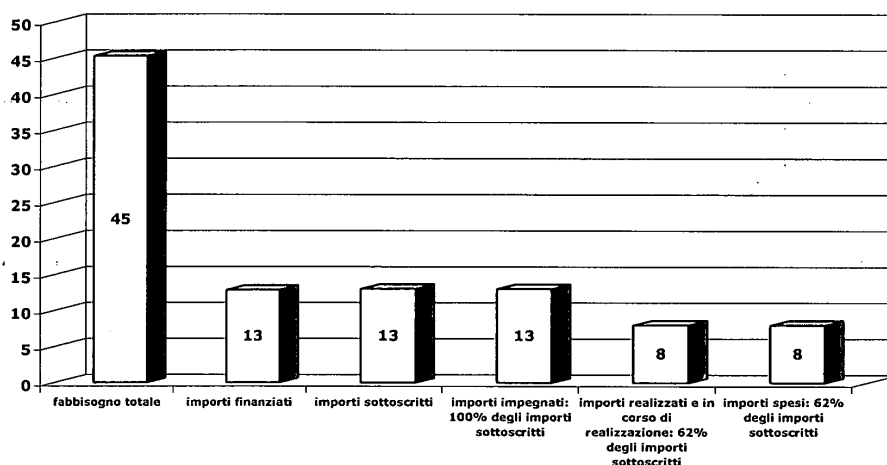

3.9 Ausilli luminosi alla navigazione (interventi di cui all'art. 3 lettera d) legge n. 798/84)

Obiettivo

Realizzare un sistema di illuminazione del canale Malamocco - S. Leonardo - Marghera, per consentire la navigazione anche nelle ore notturne e nelle giornate nebbiose in condizioni di sicurezza, quale intervento di mitigazione per recuperare gli eventuali "ritardi" imputabili alla chiusura delle bocche di porto durante i fenomeni di acqua alta.

Descrizione degli interventi

Per rendere più sicura la navigazione in laguna, nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità dovuta alla nebbia, sono stati messi in

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

opera un sistema di illuminazione e una serie di strumentazioni ausiliarie lungo il canale tra la bocca di porto di Malamocco e la zona industriale di Porto Marghera. Il sistema predisposto consente di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare la capacità operativa delle aree portuali di Venezia.

In futuro, inoltre, esso potrà soddisfare nuove esigenze: bilanciare i periodi di forzata inagibilità delle bocche lagunari dovuti alla chiusura dei varchi in occasione di alte maree eccezionali e migliorare, comunque, la competitività portuale.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

Mediante l'esecuzione di *studi specifici* sono stati valutati gli interventi in grado di migliorare l'agibilità e la sicurezza complessiva del porto: in questo ambito sono stati forniti gli elementi per la progettazione e la realizzazione dell'intervento detto "sentiero luminoso".

Su entrambi i lati del canale tra Malamocco e Marghera, per complessivi 15 km, sono stati disposti 340 segnali luminosi, installati a 80 metri l'uno dall'altro, 111 riflettori radar, collocati sulla sommità dei pali di supporto dei segnali luminosi, e 4 "fog detectors" per rilevare le condizioni di visibilità.

I punti luce, situati a circa 8 metri sopra il livello del mare, sono costituiti da lampade a vapori di sodio a bassa pressione montate su uno stelo di acciaio inossidabile.

L'intero *intervento* è stato completato nel 1996.

Nel corso del 1997 è stata completata l'attività di *videomonitoraggio* che, mediante l'impiego di telecamere equipaggiate con intensificatori di luminosità, ha consentito la memorizzazione delle immagini del traffico in una apposita banca dati.


Il "sentiero luminoso" è stato definitivamente consegnato all'Autorità Portuale nel corso del 1997.

E' previsto un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto al fine di ottimizzare la protezione del sistema delle linee elettriche subacquee.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

Consorzio Venezia Nuova 

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	7,414	7,414	-
Interventi sperimentali e monitoraggi	13,263	8,066	5,197
TOTALE	20,677	15,480	5,197

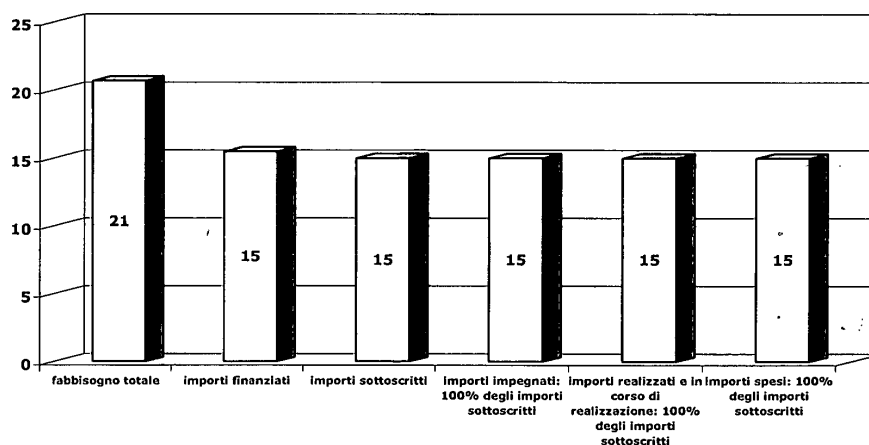

3.10 Apertura delle valli da pesca

(Interventi di cui all'art. 3 lettera l) legge n. 798/84)

Obiettivo

Migliorare la qualità delle acque e dei sedimenti nelle zone immediatamente prossime alle valli da pesca nell'ambito del più ampio obiettivo di recupero morfologico e ambientale delle diverse aree della laguna di Venezia

Descrizione degli interventi

Le valli da pesca sono ambienti naturali, da secoli utilizzati per l'allevamento di specie ittiche pregiate e per la maricoltura. Le valli sono separate dalla "laguna viva" mediante argini dotati di aperture che consentono il ricambio dell'acqua al loro interno in modo regolato dagli allevatori sulla base delle esigenze della produzione. Attualmente le aree vallive sono 23 per una superficie

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

complessiva di quasi 9000 ettari: un sesto dell'intero bacino lagunare.

Negli anni passati le valli da pesca sono state oggetto di studio per valutare l'efficacia della loro riapertura, durante le alte maree eccezionali, ai fini della diminuzione del livello dell'acqua in laguna.

La questione è stata affrontata fin dal 1981 nel corso dello studio di fattibilità delle opere di difesa dalle acque alte e successivamente, con ulteriori approfondimenti, nell'ambito del progetto preliminare di massima delle opere mobili alle bocche di porto (progetto REA). In entrambi i casi è risultato che gli effetti della riapertura sono del tutto ininfluenti.

Anche le simulazioni realizzate nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) del progetto di massima delle opere mobili hanno portato alle medesime conclusioni.

Negli ultimi anni, quindi, la riapertura delle valli da pesca è stata studiata in relazione all'obiettivo del miglioramento ambientale dell'ecosistema in quanto può produrre effetti positivi sulle condizioni idrodinamiche locali con benefici per ampie zone lagunari.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

Gli *studi* sulla pesca e sulla vallicoltura hanno consentito di evidenziare il rapporto tra interventi di risanamento ambientale e produttività di questo importante settore dell'ecosistema lagunare. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla vallicoltura, soprattutto per verificare gli effetti sull'economia valliva del progetto della riapertura delle valli da pesca alla libera espansione delle maree.

Il Consorzio Venezia Nuova ha esaminato diverse soluzioni alternative per consentire l'espansione mareale e mantenere i livelli produttivi qualitativamente e quantitativamente.

A seguito di specifica indicazione del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 (riunione del 20 marzo 1990), il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il Consorzio Venezia Nuova, ha dedicato a questo aspetto del problema un *progetto operativo generale*, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel luglio del 1993, che ha definito criteri, modalità, durata e frequenza dell'apertura



delle valli allo scopo di verificare se ciò comporta un effettivo miglioramento della qualità ambientale nelle aree contigue.

Vista la complessità realizzativa e gestionale delle soluzioni di apertura proposte, il progetto operativo suggeriva la necessità di procedere a un intervento sperimentale.

Nel corso del 1995, pertanto, il Consorzio ha redatto anche il progetto esecutivo *dell'intervento sperimentale di apertura di una valle da pesca*, che è stato realizzato e completato nell'estate del 1999.


L'intervento pilota è stato effettuato in valle Figheri, una valle della laguna sud, scelta come campione, seguendo precise modalità di gestione. La valle è stata divisa in due parti tramite un argine di terra ("teragio") lungo oltre 2 chilometri, e le due parti sono state gestite in modo differenziato: una è stata tenuta chiusa e gestita in base agli orientamenti produttivi consolidati; l'altra, più piccola della prima, è stata aperta al flusso di marea.

Le attività hanno anche compreso la realizzazione di un ampio programma di *monitoraggi* eseguiti prima, durante e dopo i lavori. I risultati della sperimentazione hanno dimostrato la possibilità di mantenere la produzione ittica anche nella porzione valliva lasciata aperta al flusso mareale, mentre i miglioramenti nell'ambiente circostante sono risultati poco apprezzabili.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	0,412	0,412	-
Progetti	0,431	0,431	-
Interventi sperimentali	3,003	3,003	-
Somme a disposizione	0,003	0,003	-
TOTALE	3,849	3,849	-

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*



**3.11
Costituzione e
potenziamento
del servizio
informativo**
(Interventi di cui
all'art. 3 lettera a)
legge n. 798/84)

Obiettivo

Il Servizio Informativo ha il compito di acquisire, ordinare e aggiornare tutte le informazioni sull'ambiente lagunare, cooperando con gli altri Enti che operano sul territorio, in modo da facilitare la definizione delle politiche di intervento in un quadro conoscitivo generale.

Descrizione degli interventi

La conoscenza del territorio, ai fini della sua gestione, può essere completa ed efficace se i diversi strumenti disponibili per la sua conoscenza sono correlati in un sistema informativo completo ed articolato; in sintesi occorre che le risorse disponibili (umane, tecniche, scientifiche ed economiche) concorrano in modo integrato alla creazione delle diverse percezioni del territorio, delle sue dinamiche e dei fenomeni che su di esso avvengono.

Il Servizio Informativo, per assolvere ai compiti di conoscenza dello stato di fatto e di salute dell'ambiente lagunare, di studio del territorio, di progettazione e di esecuzione degli interventi, di gestione dei monitoraggi e dei controlli degli effetti degli interventi stessi, ha utilizzato diversi strumenti tecnologicamente avanzati che, nel corso degli anni, sono diventati strumenti di lavoro e di



controllo dei diversi uffici tecnici ed amministrativi preposti, sia all'interno del Consorzio Venezia Nuova che all'interno del Magistrato alle Acque.

E' stato creato, quindi, un centro tecnico operativo a supporto dell'intera collettività tecnica che è coinvolta nei diversi progetti di salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e del suo bacino scolante.

Il Servizio Informativo ha compiuto, in 19 anni di attività, un'evoluzione, oltre che tecnica, anche funzionale in rapporto all'evolversi e allo specializzarsi delle richieste di supporto tecnico ed operativo provenienti dal Magistrato alle Acque e dagli altri uffici del Consorzio Venezia Nuova. Questa evoluzione funzionale viene di seguito descritta in modo da essere di supporto alla comprensione delle attività dell'ufficio che ha in gestione una delle banche dati territoriali ed ambientali più complesse ed, al tempo stesso, più interessanti del mondo.

La funzione del Servizio Informativo resta quella di realizzare un quadro conoscitivo generale del territorio e dell'ecosistema a supporto del risanamento e della gestione della laguna di Venezia e può essere così riassunta:

- gestire tutte le informazioni territoriali sull'ecosistema (incluse quelle per il controllo conoscitivo delle tendenze evolutive);
- cooperare con gli altri enti che interagiscono sul territorio;
- costruire il necessario supporto conoscitivo per il futuro Centro Operativo della laguna (struttura che avrà il compito di gestire gli interventi di salvaguardia compiuti dallo Stato attraverso il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova e monitorare l'evoluzione dello stato dell'ambiente lagunare).

In questo contesto diventa essenziale l'unità, se non della conoscenza, quantomeno del complesso di informazioni che la generano; a tal fine occorre rendere consultabile il patrimonio informativo esistente, occorre cioè ordinare le informazioni territoriali con precisi criteri.

I criteri di ordinamento adottati dal Servizio Informativo perseguono:

- l'ordine fisico dei documenti (Biblioteche dei materiali);
- l'ordine geografico dei dati (Banca Dati Geografica);
- l'ordine funzionale dei dati, finalizzato alla soluzione di specifici problemi (sistemi di supporto alle decisioni).

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Il mantenimento della coerenza e dell'integrità di tali "ordini" viene garantito attraverso una serie di attività che si succedono secondo un piano di aggiornamento e di verifica continua che viene perseguito attraverso i seguenti strumenti:

- studi per la verifica dell'efficacia di metodologie e strumenti tecnici e scientifici;
- sistemi di consultazione per l'accessibilità ad utenti differenziati ai diversi stati della conoscenza del territorio;
- centro servizi per la disponibilità di risorse umane, tecniche ed informatiche finalizzate al supporto dell'intero scenario delle attività.

I diversi gradi della conoscenza ed i diversi strumenti operativi creati hanno, quindi, permesso di differenziare le attività del Servizio Informativo secondo le seguenti finalità:

- a) *Biblioteche* ovvero raccolta, catalogazione informatica e aggiornamento di informazioni tecniche, scientifiche, storiche e socioeconomiche relative alla documentazione sulla Laguna di Venezia, sul suo bacino scolante, sugli studi e sui progetti effettuati, sugli interventi realizzati; queste "informazioni di base" sono state raccolte e mantenute nel loro formato originario (testi storici, mappe, fotografie, diapositive, filmati, materiale digitale, relazioni tecniche e scientifiche, studi, progetti, leggi, ecc.);
- b) *Banca dati* ovvero la trasformazione dei dati cartografici e tecnici in dati informatizzati su computer e rappresentabili mediante i moderni strumenti di analisi e riproduzione del territorio (GIS o Sistemi Informativi Territoriali e strumenti di riproduzione). La base della banca dati territoriale del Servizio Informativo è dotata di circa 30 livelli tematici informatici differenziati (uso del suolo, canali lagunari, reti idrografiche, sezioni di censimento, fanerogame, alghe, sondaggi, reti tecnologiche, ecc.) che vengono aggiornati mediante rilievi da compiersi in proprio o mediante acquisizione dei dati da Enti che ne sono preposti per competenza;
- c) *Sistemi di supporto alle decisioni* ovvero utilizzo di sistemi informatici predisposti ad hoc per la gestione dei dati cartografici, modellistici e tecnici finalizzati alla comprensione di fenomeni ambientali, morfologici, socioeconomici in evoluzione



e, quindi, alla loro facile comprensione da parte di chi deve prendere decisioni sulla progettazione e realizzazione degli interventi;

- d) *Studi* ovvero approfondimenti sugli aspetti tecnici delle attività connesse con il Servizio Informativo; tali studi sono stati svolti in modo integrato con le attività di studio previste ed in corso da parte del Consorzio Venezia Nuova, ovvero gli uffici del Servizio Ingegneria e del Servizio Ambiente;
- e) *Sistemi di consultazione* ovvero realizzazione di sistemi informatici personalizzati per la fruizione dei dati archiviati dal Servizio Informativo ed utilizzabili da più utenti della rete Magistrato alle Acque – Consorzio Venezia Nuova;
- f) *Centro servizi* ovvero la dotazione e l'utilizzo di strumenti, di persone e di materiali finalizzati al supporto delle attività tecniche ed amministrative del Magistrato alle Acque e del Servizio Informativo; sono parte di questa sezione le attività svolte dal personale del Servizio Informativo presso la sede di Venezia del Magistrato alle Acque e di Voltabarozzo (PD), la creazione e la gestione di due laboratori chimici attrezzati per l'analisi della qualità dell'acqua, dell'aria e dei sedimenti prelevati in laguna di Venezia, la creazione e la gestione di 10 stazioni fisse di monitoraggio ambientale collocate in laguna e dotate di strumentazioni per la misura in tempo reale di parametri chimico-fisici dell'acqua e dell'aria (sonde multiparametriche, autocampionatori, deposimetri, anemometri, ecc.). E' infine da sottolineare la disponibilità all'utilizzo di attrezzature tecniche di rilievo e di misura della morfologia terrestre e lagunare.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2004

Attività finanziate

Il lavoro del Servizio Informativo si è articolato fin dalla sua origine in *sezioni di lavoro* ovvero in unità di lavoro singolarmente riconoscibili ed associabili alle finalità di cui si è già riferito (biblioteche, banche dati, sistemi di supporto alle decisioni, sistemi di consultazione, centro servizi).

Le *sezioni di lavoro* hanno, quindi, il significato di singoli progetti per la realizzazione e il conseguimento di obiettivi diversificati.

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

Sino a questo momento sono state sviluppate quasi 80 sezioni di lavoro ciascuna articolata, se necessario, in più fasi.

I risultati fin qui raggiunti dal Servizio Informativo possono essere così sintetizzati:

- E' stata costituita una raccolta ordinata di documenti (libri, mappe, nastri, audiovisivi) attinenti l'ecosistema, raggiungendo l'obiettivo istituzionale che si prefiggeva di raccogliere e conservare in una unica sede il vastissimo patrimonio di conoscenze tecniche, scientifiche, storiche, legislative, ecc., riguardanti il problema di Venezia e della sua laguna;
- E' stata informatizzata insieme ai principali parametri descrittivi del territorio la complessa e stratificata geografia dell'ecosistema che rimane a disposizione (come G.I.S. di base - ovvero sistema informatizzato di gestione ed analisi delle rappresentazioni delle componenti territoriali) per le future applicazioni;
- I sistemi informatici sono basati su una struttura hardware e software che si mantiene all'avanguardia e rimane bilanciata nei suoi componenti anche dopo alcuni anni di lavoro nonostante l'accelerata dinamica evolutiva del mercato dell'informatica. La struttura informatica del Servizio Informativo è stata, inoltre, integrata alla struttura informatica costituita presso il CED del Magistrato alle Acque di Venezia; da esso è, infine, possibile connettersi al Centro Sperimentale di Voltabarozzo (PD), al Laboratorio di analisi chimiche di Venezia ed al Genio Civile Opere Marittime di Venezia;
- La tipologia dei dati gestiti semplifica e minimizza i tempi di aggiornamento degli stessi, permette di analizzare e rappresentare la loro evoluzione temporale, quantitativa e qualitativa e, infine, può ridurre i costi ed i tempi di operazioni di verifica e controllo degli scenari territoriali necessari per la progettazione degli interventi;
- L'architettura delle strutture informatiche preposte alla gestione dei dati (banche dati) è modulare e flessibile agli ulteriori sviluppi (Sistemi di supporto) ed è adattabile agli obiettivi ampi e complessi che per legge sono assegnati all'intero progetto Venezia.

Consorzio Venezia Nuova



L'impostazione adottata e i risultati finora ottenuti consentono ulteriori sviluppi verso la gestione vera e propria dell'ecosistema lagunare.

Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico del mondo dell'informatica, delle tecnologie di rilievo, di misura e delle telecomunicazioni e, in particolare, l'attendibilità sempre maggiore dei dati territoriali digitali che ha consigliato il loro utilizzo per la progettazione e lo sviluppo degli interventi, hanno indotto il Servizio Informativo a programmare la propria attività in settori produttivi che, sempre attraverso la definizione di sezioni di lavoro, possa permettere di far fronte alle maggiori richieste di "sicurezza" e "certificazione di qualità" delle proprie metodologie e dei processi di lavoro.

Sono in fase di implementazione le procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i settori tecnici del Servizio Informativo. A tale fine il Servizio Informativo, sulla base delle finalità precedentemente descritte, ha intrapreso un percorso di riorganizzazione delle proprie attività in *settori operativi* che, sottoposti a certificazione secondo gli standard del sistema qualità, permettono di perseguire l'obiettivo dello sviluppo e della gestione delle attività del Servizio Informativo.

I *settori operativi* che si svilupperanno nei prossimi anni a supporto dei processi di controllo e gestione dell'ecosistema lagunare e di progettazione degli interventi e degli effetti degli stessi sull'ambiente, sono i seguenti:

a) *Gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche di Venezia e di Voltabarozzo (PD).*

Questo settore riguarda le attività alla gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche siti a Venezia e a Voltabarozzo (Padova). Per il laboratorio di Venezia, le attività riguardano gli adeguamenti tecnici e strutturali, il potenziamento delle attrezzature e la gestione del personale tecnico.

Il laboratorio di Venezia ha già conseguito la certificazione di qualità SINAL, mentre il laboratorio di Voltabarozzo, operativo dall'aprile 2004, ha in corso la procedura per l'ottenimento della stessa certificazione.

b) *Acquisizione e gestione di attrezzature tecniche, informatiche e di rete a Venezia e a Voltabarozzo (PD).*

Nel corso degli anni il Servizio Informativo ha mantenuto

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

aggiornata la propria dotazione informatica e di rete nella sua sede originaria di Campo S. Stefano a Venezia. Le attività informatiche e i sistemi tecnici a supporto di esse sono stati diffusi in altre sedi ed uffici. I dati e i sistemi di consultazione, elaborazione e decisione sono ora implementati presso le seguenti sedi del Magistrato alle Acque: Ispettorato Generale, Centro Elaborazione Dati, Sezione Antinquinamento, Ufficio Concessioni, Centro Sperimentale di Voltabarozzo, Genio Civile Opere Marittime a Venezia.

c) *Attività di rilievi della morfologia terrestre e lagunare.*

La conoscenza puntuale ed estesa della morfologia della laguna di Venezia è condizione essenziale sia per la progettazione degli interventi, sia per il successivo monitoraggio degli effetti degli interventi stessi sull'ambiente e per la verifica delle modificazioni antropiche e naturali.

d) *Programmazione e gestione di monitoraggi ambientali in tempo reale e correlazione con indagini stagionali.*

Il Servizio Informativo, in accordo con la sezione antinquinamento del Magistrato alle Acque, ha predisposto una serie di strumenti di rilievo della qualità dell'acqua e dell'aria; la gestione di tali strumentazioni comporta la dotazione di mezzi tecnici adeguati, di personale tecnico specializzato e di un programma di manutenzione e di gestione dell'intero sistema. La presenza di 10 stazioni di monitoraggio dell'acqua e dell'aria, di 7 stazioni di misura dei parametri atmosferici, di strumentazioni e di sistemi informatizzati per il controllo remoto degli scarichi in laguna, comporta un adeguato gruppo di tecnici specializzati per la gestione la manutenzione degli strumenti e l'analisi e l'interpretazione dei risultati delle misure.

e) *Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati.*

La gestione del patrimonio informativo implementato dal Servizio Informativo si sviluppa attraverso la predisposizione di strutture tecniche ed informatiche adeguate. Il Servizio Informativo ha costituito un sito internet strutturato per accessi di consultazione, sia generale che tecnica, un centro, aperto al pubblico, dotato di attrezzature, materiali e sistemi di consultazione denominato "Punto laguna", una serie di attività atte alla predisposizione e alla distribuzione dei materiali tecnici cartacei ed informatici.



- f) *Predisposizione e gestione di banche dati territoriali e sistemi di consultazione e di elaborazione.*

In tale settore si svolgono attività di costituzione, controllo, validazione e gestione delle banche dati territoriali e dei rispettivi sistemi di analisi, consultazione e supporto alla decisioni. E' il cuore della produzione della base informativa territoriale relativa al Servizio Informativo.

- g) *Campagne di rilevamento satellitare ed aereo.*

L'utilizzo dell'esplorazione del territorio attraverso i rilievi satellitari ed aerei ha permesso di evidenziare e controllare un notevole numero di fenomeni di tipo ambientale e morfologico. Sono normalmente eseguiti i voli annuali fotogrammetrici a colori a media risoluzione ed i voli biennali fotogrammetrici in toni di grigio ad alta risoluzione sull'intera laguna.

Attività da finanziare

- a) *Gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche di Venezia e di Voltabarozzo (PD).*

Per il laboratorio di Voltabarozzo è prevista la gestione del laboratorio di analisi per microinquinanti organici e la gestione delle campagne di indagini e di campionamenti in laguna di Venezia. Viene, inoltre, prevista la realizzazione di una struttura tecnica a supporto della programmazione delle campagne e delle metodologie di campionamento, di analisi e di interpretazione dei dati ambientali acquisiti in Laguna di Venezia.

- b) *Acquisizione e gestione di attrezzature tecniche, informatiche e di rete a Venezia e a Voltabarozzo (PD).*

Nei prossimi anni si provvederà al mantenimento in efficienza delle attrezzature ed all'acquisto di nuovi e più completi sistemi informatici, all'aggiornamento dei software di base ed applicativi, alla fornitura di servizi tecnici ed informatici e di supporto per la gestione e l'utilizzo delle applicazioni informatiche implementate nei vari uffici.

- c) *Attività di rilievi della morfologia terrestre e lagunare.*

Nei prossimi anni si procederà all'attuazione di un programma di rilievi basati su utilizzo di strumenti topografici e fotogrammetrici per le zone emerse, e di ecoscandagli per le

*Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato
in concessione al Consorzio Venezia Nuova*

zone lagunari sotto il livello dell'acqua. Tali rilievi saranno necessari sia per evidenziare il fenomeno dell'erosione e della sedimentazione della morfologia lagunare, sia per rilevare, in zone precedentemente definite, la presenza di aree a rischio archeologico o di particolare pregio geomorfologico e paesaggistico.

- d) *Programmazione e gestione di monitoraggi ambientali in tempo reale e correlazione con indagini stagionali.*

E' necessario garantire la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio ambientale e l'analisi e l'implementazione delle misure effettuate.

- e) *Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati.*

Questa attività dovrà essere garantita anche nei prossimi anni attraverso un adeguato aggiornamento dei materiali per le diverse tipologie di strumenti di diffusione che verranno utilizzati.

- f) *Predisposizione e gestione di banche dati territoriali e sistemi di consultazione e di elaborazione.*

In questo ambito verranno sviluppate nuove banche dati ed aggiornate quelle ormai datate secondo un progetto di acquisizione controllata di nuove informazioni tecniche, morfologiche e ambientali.

- g) *Campagne di rilevamento satellitare ed aereo.*

Nel corso degli anni si procederà alla programmazione di tali rilievi anche utilizzando nuovi sensori e nuove tecnologie che il mercato dell'innovazione tecnologica metterà a disposizione. Vengono previsti, per l'enorme quantità e qualità dell'informazione che ciò rende disponibile, rilievi annuali con satelliti multispettrali ad alta risoluzione (Ikonos o QuickBird).

- h) *Gestione dell'interscambio dei dati tra i diversi sistemi ed uffici preposti alla loro gestione ed utilizzo.*

La totalità dei dati e della conoscenza del territorio, organizzata in sistemi di analisi e di consultazione presso il Servizio Informativo, dovrà essere organizzata in modo da poter essere distribuita ad uffici tecnici, società di progettazione e di monitoraggi, organi di controllo ed altri enti preposti alla gestione ed al controllo del territorio stesso. Dovrà essere anche garantito il percorso al contrario, ovvero l'inserimento nei




sistemi del Servizio Informativo di tutti i dati provenienti dalle altre entità.

La contemporaneità nella realizzazione e nella gestione dei succitati programmi di attività del Servizio Informativo serviranno a garantire al Magistrato alle Acque la disponibilità di una struttura tecnica, informatica e documentale sicuramente necessaria per il supporto di un così ampio e complesso sistema di interventi e di gestione dell'ecosistema lagunare.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Realizzazione e gestione del Servizio Informativo	160,501	101,701	58,800
TOTALE	160,501	101,701	58,800

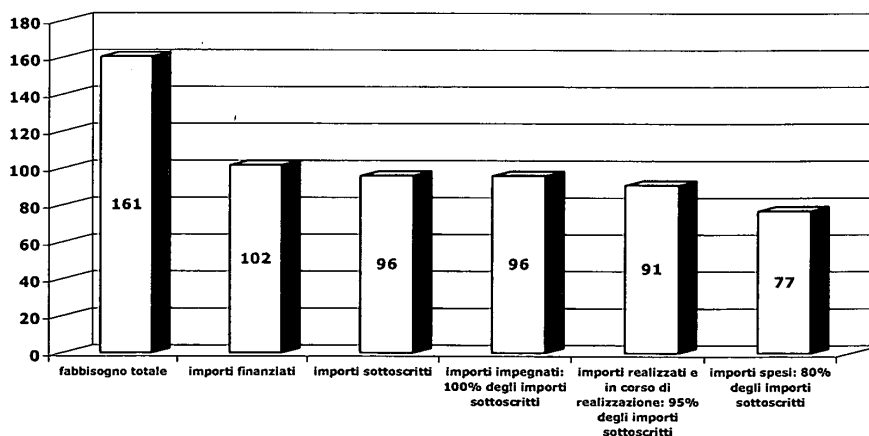


Elenchi

Mappe

Foto

DIFESA DALLE ACQUE ALTE ECCEZIONALI

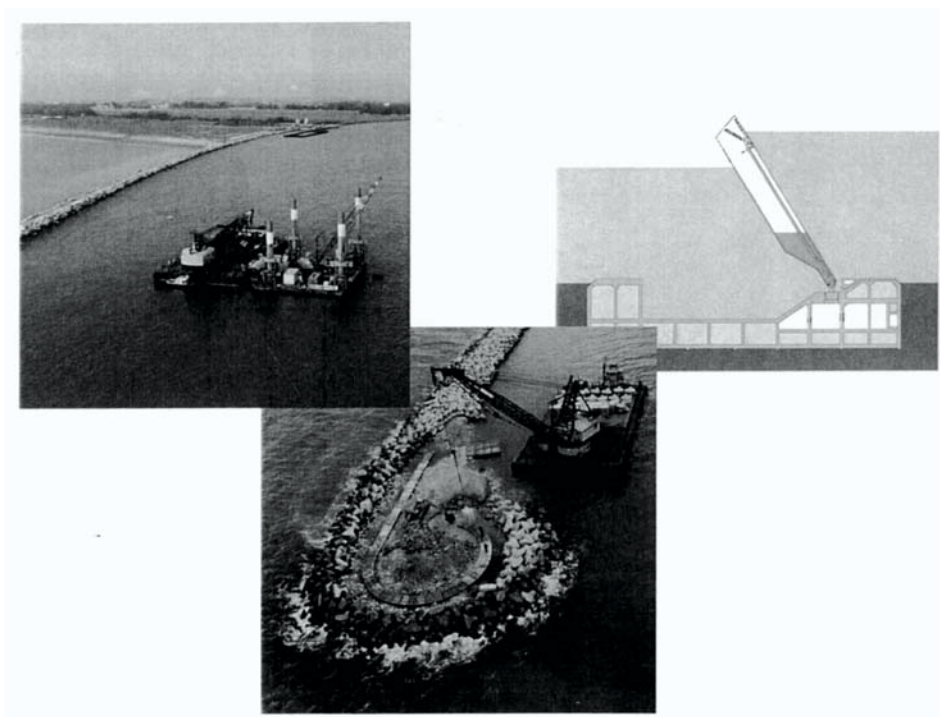



Attività finanziate:**Attività ultimate**

1. Progettazione preliminare e di massima
2. Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere mobili
3. Interventi sperimentali (Modulo Sperimentale Elettromeccanico: costruzione, sperimentazione, sorveglianza e '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' '10' '11' '12' '13' '14' '15' '16' '17' '18' '19' '20' '21' '22' '23' '24' '25' '26' '27' '28' '29' '30' '31' '32' '33' '34' '35' '36' '37' '38' '39' '40' '41' '42' '43' '44' '45' '46' '47' '48' '49' '50' '51' '52' '53' '54' '55' '56' '57' '58' '59' '60' '61' '62' '63' '64' '65' '66' '67' '68' '69' '70' '71' '72' '73' '74' '75' '76' '77' '78' '79' '80' '81' '82' '83' '84' '85' '86' '87' '88' '89' '90' '91' '92' '93' '94' '95' '96' '97' '98' '99' '100' '101' '102' '103' '104' '105' '106' '107' '108' '109' '110' '111' '112' '113' '114' '115' '116' '117' '118' '119' '120' '121' '122' '123' '124' '125' '126' '127' '128' '129' '130' '131' '132' '133' '134' '135' '136' '137' '138' '139' '140' '141' '142' '143' '144' '145' '146' '147' '148' '149' '150' '151' '152' '153' '154' '155' '156' '157' '158' '159' '160' '161' '162' '163' '164' '165' '166' '167' '168' '169' '170' '171' '172' '173' '174' '175' '176' '177' '178' '179' '180' '181' '182' '183' '184' '185' '186' '187' '188' '189' '190' '191' '192' '193' '194' '195' '196' '197' '198' '199' '200' '201' '202' '203' '204' '205' '206' '207' '208' '209' '210' '211' '212' '213' '214' '215' '216' '217' '218' '219' '220' '221' '222' '223' '224' '225' '226' '227' '228' '229' '230' '231' '232' '233' '234' '235' '236' '237' '238' '239' '240' '241' '242' '243' '244' '245' '246' '247' '248' '249' '250' '251' '252' '253' '254' '255' '256' '257' '258' '259' '260' '261' '262' '263' '264' '265' '266' '267' '268' '269' '270' '271' '272' '273' '274' '275' '276' '277' '278' '279' '280' '281' '282' '283' '284' '285' '286' '287' '288' '289' '290' '291' '292' '293' '294' '295' '296' '297' '298' '299' '300' '301' '302' '303' '304' '305' '306' '307' '308' '309' '310' '311' '312' '313' '314' '315' '316' '317' '318' '319' '320' '321' '322' '323' '324' '325' '326' '327' '328' '329' '330' '331' '332' '333' '334' '335' '336' '337' '338' '339' '340' '341' '342' '343' '344' '345' '346' '347' '348' '349' '350' '351' '352' '353' '354' '355' '356' '357' '358' '359' '360' '361' '362' '363' '364' '365' '366' '367' '368' '369' '370' '371' '372' '373' '374' '375' '376' '377' '378' '379' '380' '381' '382' '383' '384' '385' '386' '387' '388' '389' '390' '391' '392' '393' '394' '395' '396' '397' '398' '399' '400' '401' '402' '403' '404' '405' '406' '407' '408' '409' '410' '411' '412' '413' '414' '415' '416' '417' '418' '419' '420' '421' '422' '423' '424' '425' '426' '427' '428' '429' '430' '431' '432' '433' '434' '435' '436' '437' '438' '439' '440' '441' '442' '443' '444' '445' '446' '447' '448' '449' '450' '451' '452' '453' '454' '455' '456' '457' '458' '459' '460' '461' '462' '463' '464' '465' '466' '467' '468' '469' '470' '471' '472' '473' '474' '475' '476' '477' '478' '479' '480' '481' '482' '483' '484' '485' '486' '487' '488' '489' '490' '491' '492' '493' '494' '495' '496' '497' '498' '499' '500' '501' '502' '503' '504' '505' '506' '507' '508' '509' '510' '511' '512' '513' '514' '515' '516' '517' '518' '519' '520' '521' '522' '523' '524' '525' '526' '527' '528' '529' '530' '531' '532' '533' '534' '535' '536' '537' '538' '539' '540' '541' '542' '543' '544' '545' '546' '547' '548' '549' '550' '551' '552' '553' '554' '555' '556' '557' '558' '559' '560' '561' '562' '563' '564' '565' '566' '567' '568' '569' '570' '571' '572' '573' '574' '575' '576' '577' '578' '579' '580' '581' '582' '583' '584' '585' '586' '587' '588' '589' '590' '591' '592' '593' '594' '595' '596' '597' '598' '599' '600' '601' '602' '603' '604' '605' '606' '607' '608' '609' '610' '611' '612' '613' '614' '615' '616' '617' '618' '619' '620' '621' '622' '623' '624' '625' '626' '627' '628' '629' '630' '631' '632' '633' '634' '635' '636' '637' '638' '639' '640' '641' '642' '643' '644' '645' '646' '647' '648' '649' '650' '651' '652' '653' '654' '655' '656' '657' '658' '659' '660' '661' '662' '663' '664' '665' '666' '667' '668' '669' '670' '671' '672' '673' '674' '675' '676' '677' '678' '679' '680' '681' '682' '683' '684' '685' '686' '687' '688' '689' '690' '691' '692' '693' '694' '695' '696' '697' '698' '699' '700' '701' '702' '703' '704' '705' '706' '707' '708' '709' '710' '711' '712' '713' '714' '715' '716' '717' '718' '719' '720' '721' '722' '723' '724' '725' '726' '727' '728' '729' '730' '731' '732' '733' '734' '735' '736' '737' '738' '739' '740' '741' '742' '743' '744' '745' '746' '747' '748' '749' '750' '751' '752' '753' '754' '755' '756' '757' '758' '759' '760' '761' '762' '763' '764' '765' '766' '767' '768' '769' '770' '771' '772' '773' '774' '775' '776' '777' '778' '779' '780' '781' '782' '783' '784' '785' '786' '787' '788' '789' '790' '791' '792' '793' '794' '795' '796' '797' '798' '799' '800' '801' '802' '803' '804' '805' '806' '807' '808' '809' '810' '811' '812' '813' '814' '815' '816' '817' '818' '819' '820' '821' '822' '823' '824' '825' '826' '827' '828' '829' '830' '831' '832' '833' '834' '835' '836' '837' '838' '839' '840' '841' '842' '843' '844' '845' '846' '847' '848' '849' '850' '851' '852' '853' '854' '855' '856' '857' '858' '859' '860' '861' '862' '863' '864' '865' '866' '867' '868' '869' '870' '871' '872' '873' '874' '875' '876' '877' '878' '879' '880' '881' '882' '883' '884' '885' '886' '887' '888' '889' '890' '891' '892' '893' '894' '895' '896' '897' '898' '899' '900' '901' '902' '903' '904' '905' '906' '907' '908' '909' '910' '911' '912' '913' '914' '915' '916' '917' '918' '919' '920' '921' '922' '923' '924' '925' '926' '927' '928' '929' '930' '931' '932' '933' '934' '935' '936' '937' '938' '939' '940' '941' '942' '943' '944' '945' '946' '947' '948' '949' '950' '951' '952' '953' '954' '955' '956' '957' '958' '959' '960' '961' '962' '963' '964' '965' '966' '967' '968' '969' '970' '971' '972' '973' '974' '975' '976' '977' '978' '979' '980' '981' '982' '983' '984' '985' '986' '987' '988' '989' '990' '991' '992' '993' '994' '995' '996' '997' '998' '999' '1000')
4. Indagini alla bocca di Lido
5. Indagini alla bocca di Malamocco 1^ fase e integrazioni
6. Campagne di sondaggi per le opere complementari
7. Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere complementari e della conca di navigazione a Malamocco
8. Studi e Sperimentazioni propedeutici alla progettazione preliminare, di massima e definitiva
9. Progetto definitivo delle opere mobili e delle opere complementari
10. Primi stralci della progettazione esecutiva delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto

 Attività in corso

Progetto esecutivo delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto

Bocca di Lido

1. Costruzione e gestione rilevato sperimentale per modello geotecnico del sottosuolo
2. Indagini archeologiche e bonifica bellica
3. Lido: Campo prova pali di fondazione
4. Lido: Rinforzo radice molo sud esistente
5. Lido - Treporti: Porto rifugio e tura 1^ fase
6. Lido: Isola tra S. Nicolò e Treporti 1^ fase
7. Lido - S. Nicolò: Protezione del fondale

Bocca di Malamocco

1. Indagini alla bocca di Malamocco 2^ fase
2. Indagini archeologiche e bonifica bellica
3. Realizzazione della diga foranea di fronte alla bocca di Malamocco
4. Malamocco: Conca di navigazione 1^ fase - opere civili a camera
5. Malamocco: Conca di navigazione - opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro 1^ e 2^ fase

Bocca di Chioggia

1. Indagini alla bocca di Chioggia
2. Indagini archeologiche e bonifica bellica
3. Realizzazione della diga foranea di fronte alla bocca di Chioggia
4. Chioggia: Porto rifugio 1^ fase scogliera sud


5. Chioggia: Conca opere civili - conche per pescherecci

Attività da avviare

1. Ulteriori approfondimenti, indagini e campi prova propedeutici al progetto esecutivo delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto
2. Completamento progettazione esecutiva
3. Ulteriori stralci funzionali delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto
4. Realizzazione della diga foranea di fronte alla bocca di Lido



Attività da finanziare:

1. Completamento della realizzazione degli interventi di regolazione delle maree alle bocche di porto
2. Avvio della fase sperimentale di esecuzione delle opere alle bocche di porto

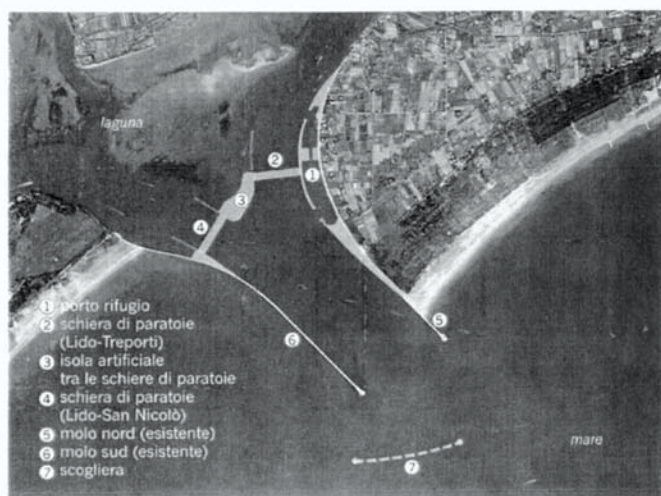

Bocca di Lido

Bocca di Malamocco

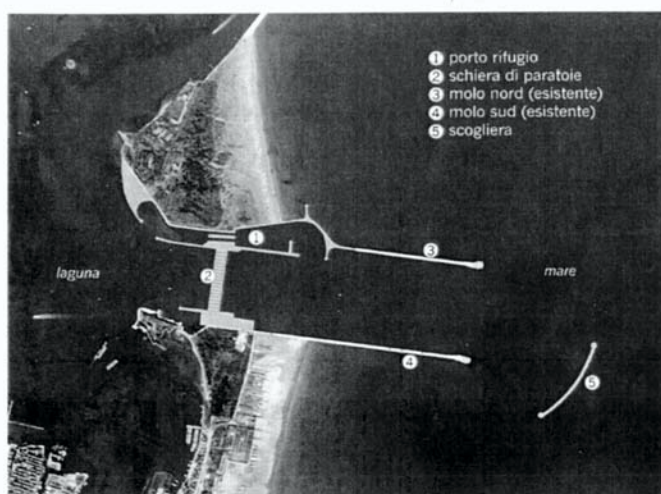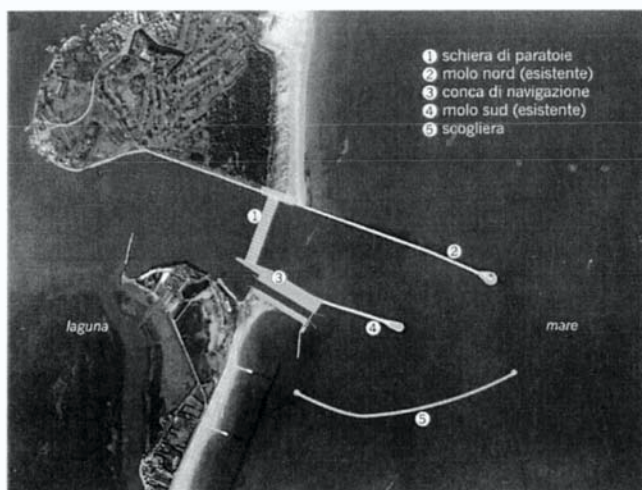

Bocca di Chioggia

Bocca di Lido




Bocca di Lido - Campo prova dei pali di fondazione

Obiettivi specifici: esecuzione di prove in sito e in laboratorio progettate per verificare la metodologia dei trattamenti studiati per i terreni di fondazione delle opere alle bocche, tesi a migliorare le caratteristiche geotecniche

Intervento in corso

Bocca di Lido - Campo prova dei pali di fondazione. Area di cantiere

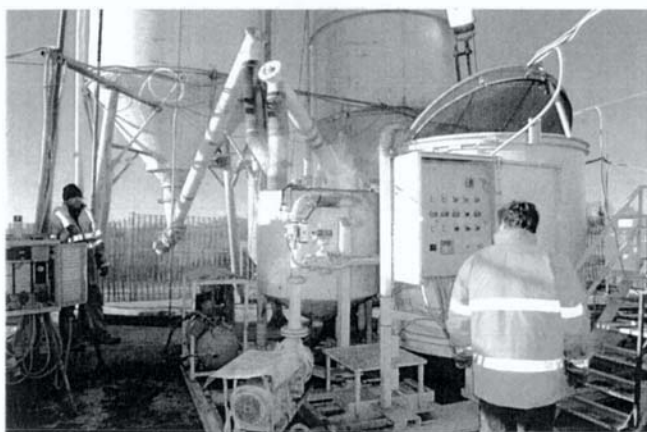

Bocca di Lido - Campo prova dei pali di fondazione. Attrezzature



Bocca di Lido - Campo prova dei pali di fondazione. Fasi di lavoro



Bocca di Lido - Porto rifugio a Treporti e Tura


Obiettivi specifici: realizzazione di un porto rifugio per evitare l'interruzione del transito marittimo durante la chiusura dei varchi in occasione di eventi di acqua alta

Intervento in corso

Bocca di Lido - Porto Rifugio a Treporti e Tura. Vista aerea del porto rifugio: le scogliere




Bocca di Lido - Porto Rifugio a Treporti e Tura. Refluimento del materiale di dragaggio per la realizzazione del terrapieno

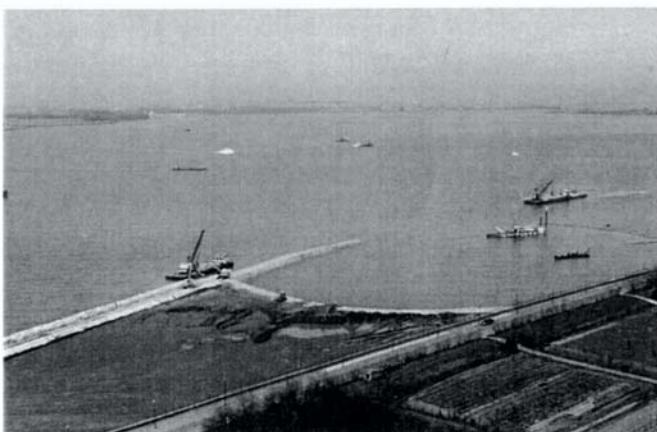

Bocca di Lido - Porto Rifugio a Treporti e Tura. Refluimento del materiale di dragaggio per la realizzazione del terrapieno

Bocca di Malamocco

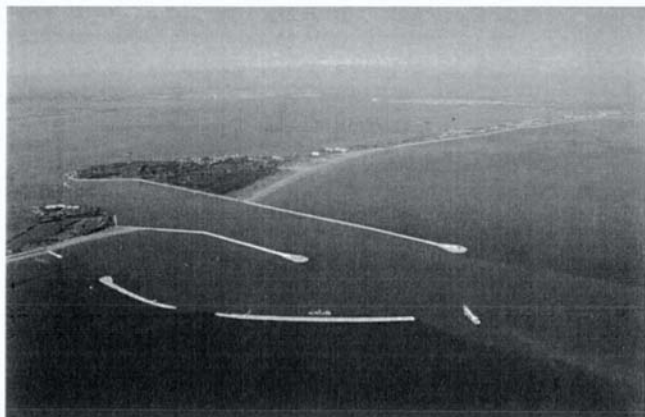

Bocca di Malamocco - Diga foranea

Obiettivi specifici: realizzazione di una diga foranea che svolge la duplice funzione di protezione della costruenda conca di navigazione ed il relativo canale di accesso e, allo stesso tempo, contribuisce a creare l'effetto dissipativo delle correnti nei canali di bocca

Intervento in corso

Bocca di Malamocco- Diga foranea. Vista aerea della diga



Bocca di Malamocco- Diga foranea. Mezzi in opera



Bocca di Malamocco- Diga foranea. Mezzi in opera




Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera della conca

Obiettivi specifici: realizzazione della camera della conca di navigazione la cui funzione è quella di consentire l'accesso alla laguna anche durante la chiusura dei varchi in occasione di eventi di acqua alta

Intervento in corso

Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera della conca. Opere provvisionali

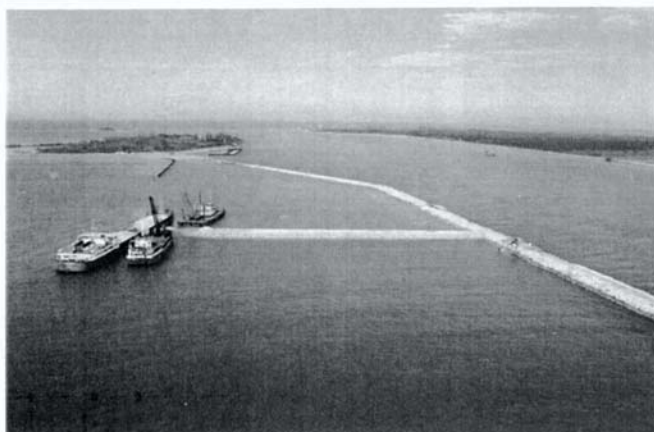


Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera della conca. Opere provvisionali di protezione dell'area dei lavori



Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera della conca. Pennello di scogliera e palancoiato metallico provvisionale

Bocca di Chioggia

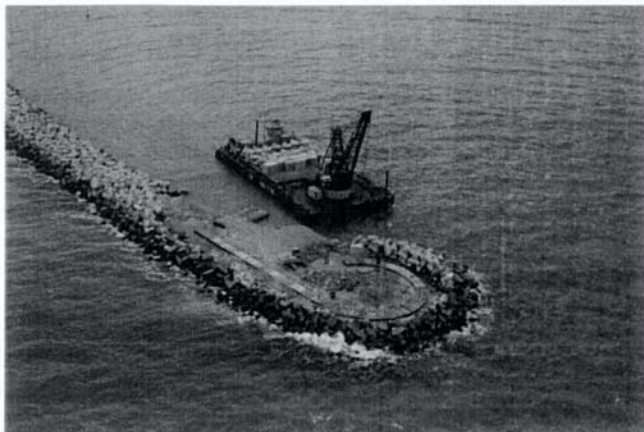


Bocca di Chioggia - Diga Foranea


Obiettivi specifici: realizzazione di una diga per creare effetti dissipativi delle correnti nei canali di bocca. Lo sviluppo della diga è di 522 m

Intervento in corso


Bocca di Chioggia - Diga foranea. Testata nord, getti di coronamento

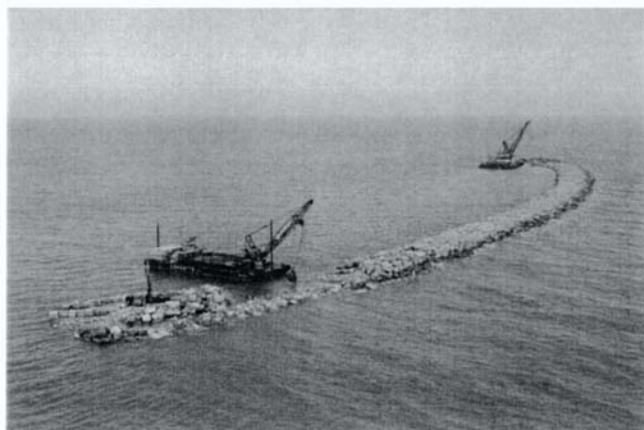

Bocca di Chioggia - Diga foranea. Vista della diga

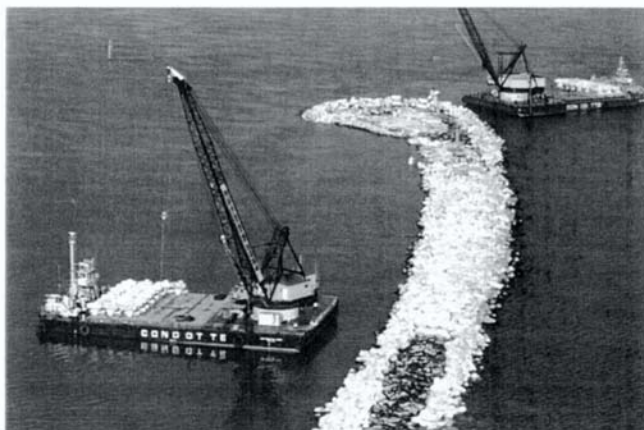

Bocca di Chioggia - Diga foranea. Testata nord, posa degli accropodi

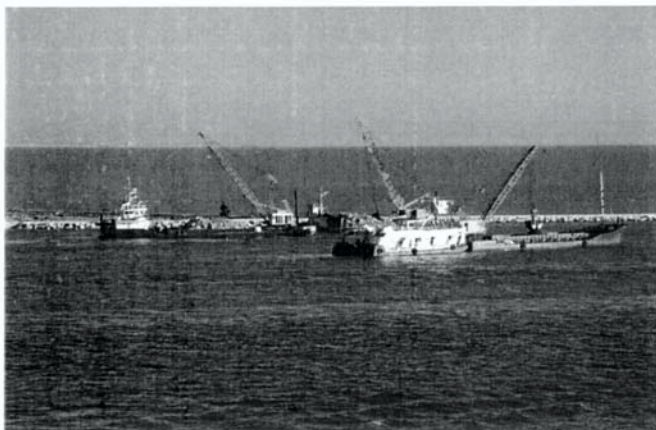


Bocca di Chioggia – Porto rifugio – Scogliera sud

Obiettivi specifici: realizzazione del Porto rifugio per consentire il passaggio di piccole imbarcazioni e di pescherecci durante le chiusure della barriera mobile. La scogliera sud del Porto rifugio ha uno sviluppo di 260 m

Intervento in corso

Bocca di Chioggia – Porto rifugio – Scogliera sud. Fase di dragaggio del canale

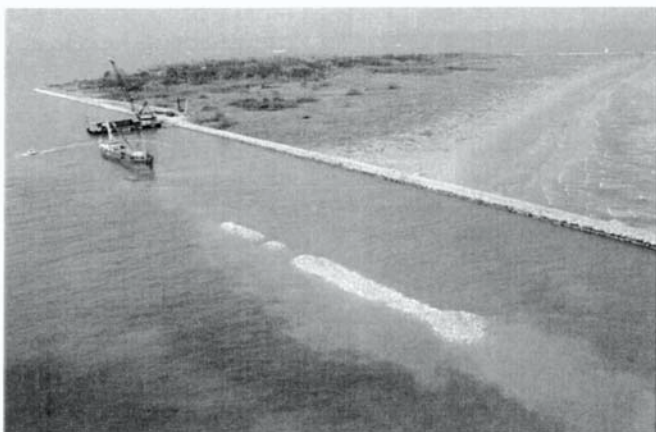



Bocca di Chioggia – Porto rifugio – Scogliera sud. Fasi di realizzazione



Bocca di Chioggia – Porto rifugio – Scogliera sud. Mezzi in opera

DIFESA LOCALE DALLE ACQUE MEDIO - ALTE

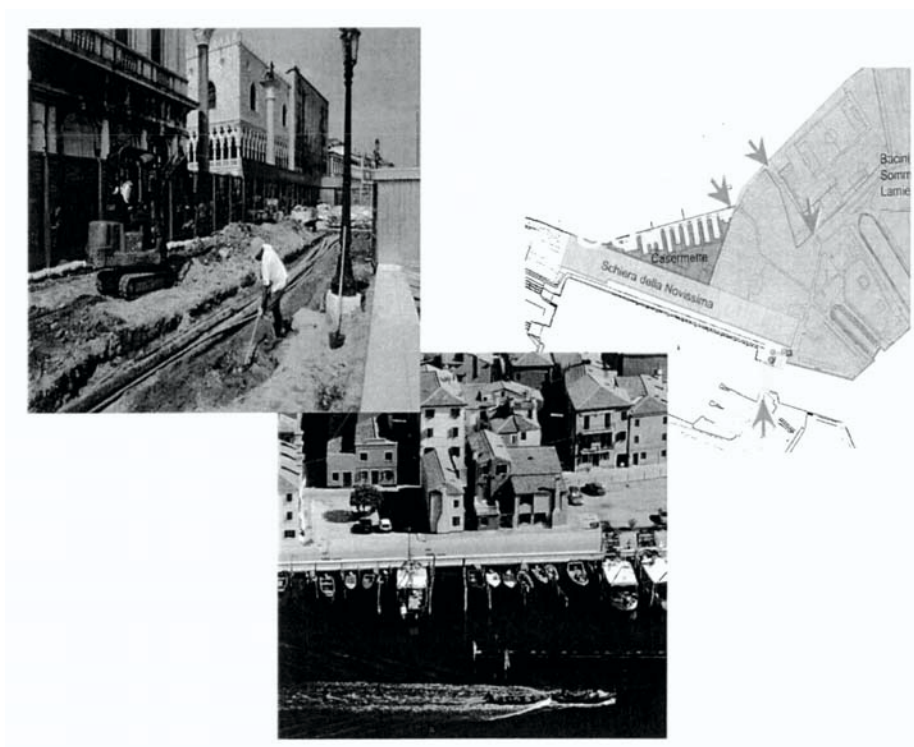

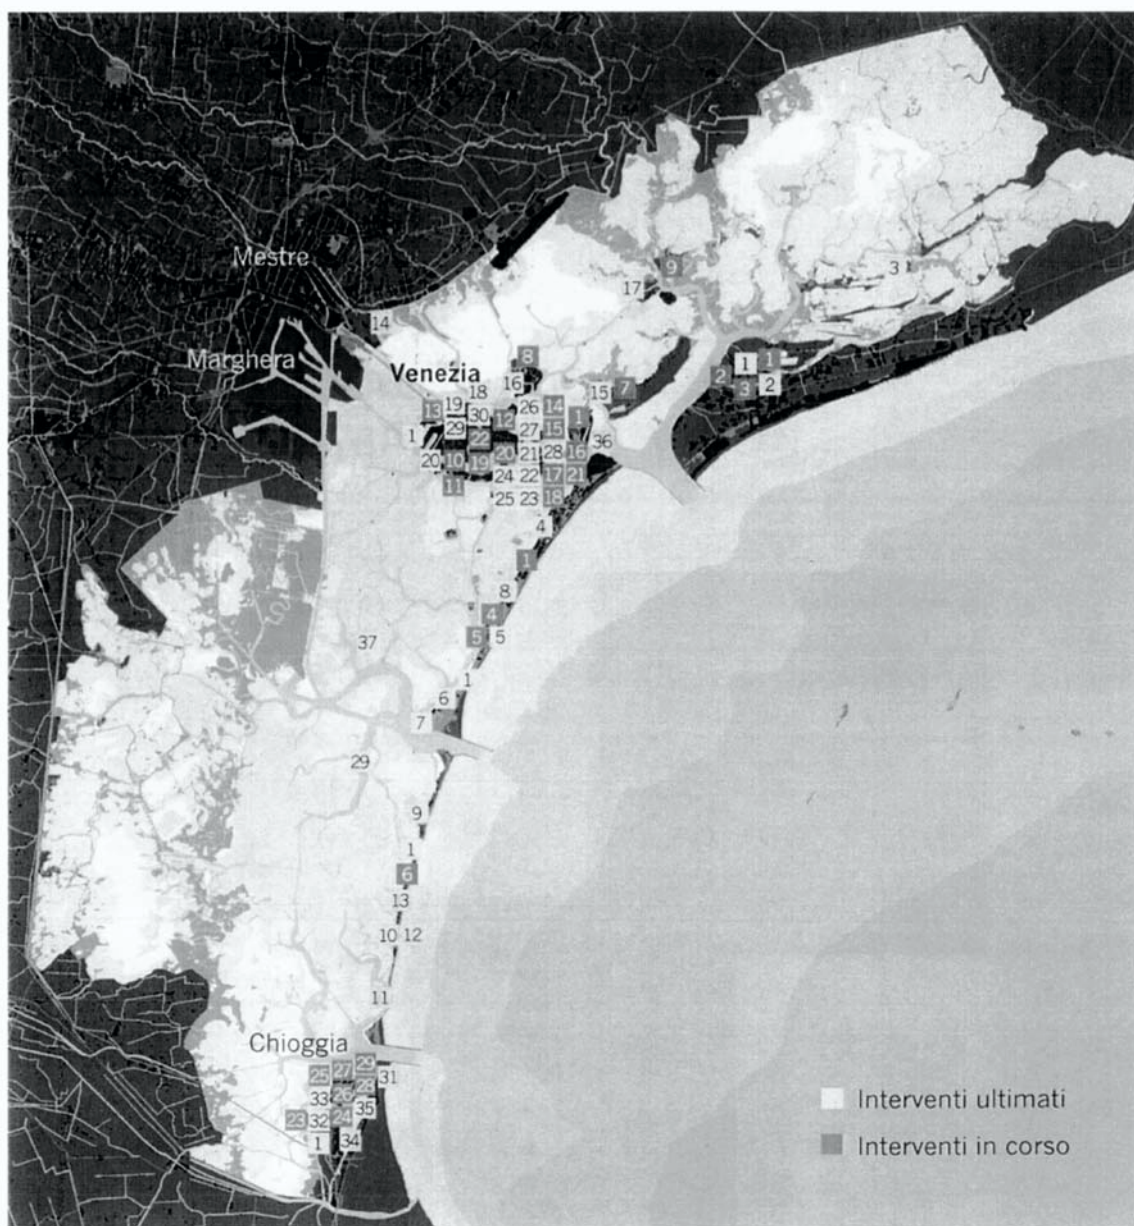

DIFESA LOCALE DALLE ACQUE MEDIO - ALTE
ATTIVITA' ULTIME E IN CORSO

Attività finanziate:**Attività ultimate**

1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero e difesa degli insediamenti 1[^], 2[^], 3[^], 4[^] e 6[^] fase
2. Ricostruzione di marginamenti e difesa dell'insediamento urbano di Treporti - primi quattro stralci (Cavallino) e 1[^] e 2[^] fase del 5° stralcio (marginamento via Vivaldi e sistemazione delle chiaviche)
3. Ricostruzione rive del canale dei Bari (Cavallino)
4. Ricostruzione riva in corrispondenza di via Navarrino (Lido)
5. Difesa dell'abitato di Malamocco (Lido)
6. Ristrutturazione riva in località Alberoni (Lido)
7. Difesa dell'abitato di Alberoni, lato sud-est (Lido) in Accordo di programma con il Comune di Venezia
8. Marginamento a Lido - via Coletti (Lido)
9. Difesa dell'insediamento urbano di S. Pietro in Volta 1° e 2° stralcio (Pellestrina)
10. Difesa dell'abitato di Pellestrina - quattro stralci funzionali (Pellestrina)
11. Sistemazione area banchinamento Cà Roman (Pellestrina)
12. Gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento e dei presidi posti a difesa dell'abitato di Pellestrina (Pellestrina)
13. Completamento in direzione nord delle opere di difesa dell'abitato di Pellestrina, lato laguna (Pellestrina)
14. Ristrutturazione rive a S. Giuliano 1° (gronda lagunare)
15. Ristrutturazione rive a S. Erasmo (laguna nord)
16. Difesa dell'abitato di Murano 1° stralcio (laguna nord)
17. Ristrutturazione rive a Mazzorbo (laguna nord)
18. Ristrutturazione riva a S. Alvise (Venezia)
19. Ristrutturazione riva cantiere ex Opere marittime a Cannaregio (Venezia)
20. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca 1°, 2°, 3° e 4° stralcio (Venezia)
21. Ricostruzione delle rive dei Giardini Napoleonici - in Accordo di programma con il Comune di Venezia (Venezia)
22. Ristrutturazione riva a S. Elena - Giardini (Venezia)
23. Ristrutturazione riva a S. Elena - Morosini (Venezia)
24. Messa in sicurezza del molo e delle lanterne dell'isola di S. Giorgio - interventi urgenti (Venezia)
25. Intervento di messa in sicurezza del molo di San Giorgio Maggiore 2[^] fase (Venezia)
26. Indagini storico architettoniche sull'Arsenale Militare (Venezia) e indagini propedeutiche alla progettazione degli interventi (Venezia)
27. Consolidamento banchine dell'Arsenale - interventi urgenti (Venezia)
28. Intervento di messa in sicurezza del "Reparto delle Galeazze" e "Fonderie" presso l'Arsenale (Venezia)
29. Difesa del percorso dei Tolentini (Venezia) - in Accordo di programma con il Comune di Venezia
30. Interventi per il ripristino delle rive delle Fondamente Nuove - messa in sicurezza del Ponte Donà (Venezia)
31. Sistemazione rive e difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, primi quattro stralci

32. Difesa dei quartieri Tombola e Borgo S. Giovanni (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, 1° stralcio
33. Difesa dell'“insula” di Chioggia dalle acque alte in Accordo di programma con il Comune di Chioggia: ponte lungo
34. Sistemazione zona Lusenzo interno (Chioggia)
35. Difesa dell'isola dell'Unione e Buon Castello (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia
36. Protezione del Forte di S. Andrea (bocca di porto di Lido)
37. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle stazioni mareografiche nella laguna di Venezia

Attività in corso


1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero a difesa degli insediamenti 5^e e 7^a fase
2. Interventi a difesa dell'abitato di Treporti (Cavallino) ed aree annesse dalle acque alte 5° stralcio: ulteriori interventi di protezione di sponda (3^a fase)
3. Marginamento canale Pordelio – Treporti 1^a stralcio Ponte girevole
4. Marginamento a Lido - Via Coletti lato sud
5. Interventi di difesa degli abitati di Malamocco e Alberoni (Lido) nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comune di Venezia
6. Interventi di difesa insediamenti urbani lungo l'isola di Pellestrina, lato laguna - tratto tra Portosecco e il cantiere de Poli
7. Difesa dell'abitato di S. Erasmo 1° e 2° stralcio (laguna nord)
8. Difesa Insula Murano – Canale S. Mattia
9. Difesa dell'abitato di Torcello (laguna nord)
10. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca (Venezia) 5° e 6° stralcio
11. Rive sud Giudecca e Sacca Fisola nord (Venezia)
12. Ripristino Fondamente Nuove 1^a stralcio (Venezia)
13. Ripristino del marginamento antistante l'ex macello a S. Giobbe (Venezia)
14. Ricostruzione della difesa spondale dell'area edificata a nord dell'Arsenale di Venezia – Rive Casermette (Venezia)
15. Arsenale di Venezia - Messa in sicurezza e restauro Capannoni S. Cristoforo (Venezia)
16. Arsenale di Venezia - Messa in sicurezza Capannoni Novissima (capannone 110 e 111) (Venezia)
17. Arsenale di Venezia - Risanamento e consolidamento delle rive della Darsena Vecchia e Vasca delle Galeazze (Venezia)
18. Intervento di recupero e adeguamento funzionale dei marginamenti dell'area a nord dell'Arsenale di Venezia (Venezia)
19. Difesa Insula di San Marco 1° stralcio (Venezia)
20. Difesa bacino San Marco tra il Ponte delle Paglia e il Ponte del Vin (Venezia)
21. Marginamento lungo il fronte est dell'isola di S. Elena
22. Difesa dell'insula di Rialto (Venezia) – progettazione
23. Difesa dei quartieri S. Giovanni e Tombola (Chioggia) 2° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia
24. Difesa dei quartieri San Domenico (Chioggia) 1° e 2° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

25. Difesa dell'insula di Chioggia dalle acque alte interventi sulle rive del canale Lombardo e del bacino Vigo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia
26. Difesa dell'insula di Chioggia dalle acque alte interventi sulle rive del canale Perottolo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia
27. Difesa dell'insula di Chioggia dalle acque alte sistemazione del ponte Vigo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia
28. Difesa dell'insula di Chioggia dalle acque alte sistemazione dei ponti sul canal Vena 1° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia
29. Interventi di difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina dalle acque alte 5° stralcio riva San Felice (Chioggia)

Attività da avviare

1. Prosecuzione sistemazione marginamento canale Pordelio – Treporti 2° stralcio
2. Completamento dell'intervento nella zona Malamocco – Alberoni a Lido
3. Prosecuzione degli interventi nella zona di Lido
4. Completamento della difesa di S. Erasmo
5. Prosecuzione della sistemazione di rive e marginamenti del centro storico di Venezia
6. Sistemazione sponde, ed edifici prospicienti, all'Arsenale di Venezia
7. Prosecuzione della difesa del centro storico di Chioggia

Venezia - Arsenale

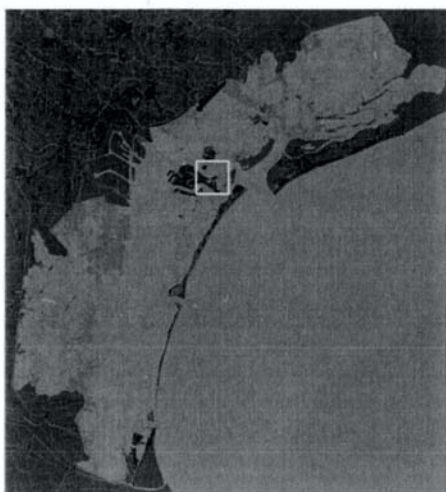

Obiettivi specifici: messa in sicurezza e restauro dei fabbricati prospicienti lo specchio acqueo, le cui murature perimetrali costituiscono il bordo del marginamento


Interventi principali: restauro e messa in sicurezza di edifici, restauro, consolidamento e adeguamento di marginamenti e mura

Interventi ultimati, in corso e da avviare

A lato: localizzazione dell'area

In basso: aree oggetto di intervento: **1.** Comparto delle Galeazze; **2.** Comparto delle Fonderie; **3.** Comparto S. Cristoforo; **4.** Tese della darsena Novissima; **5.** Area delle "Casermette"; **6.** Area "Lamierini"; **7.** Area ex Sommergebilisti; **8.** Bacini di carenaggio; **9.** Vasca delle Galeazze; **10.** Scali in pietra; **11.** Torre di Porta nuova; **12.** Darsena Vecchia; **13.** Darsena Grande (ex darsene Nuova e Novissima); **14.** Cantieri acquatici delle "Gagliandre"; **15.** Porta di terra; **16.** Cantieri acquatici e capannoni della darsena Nuova; **17.** Edificio delle Artiglierie; **18.** Edificio delle Corderie




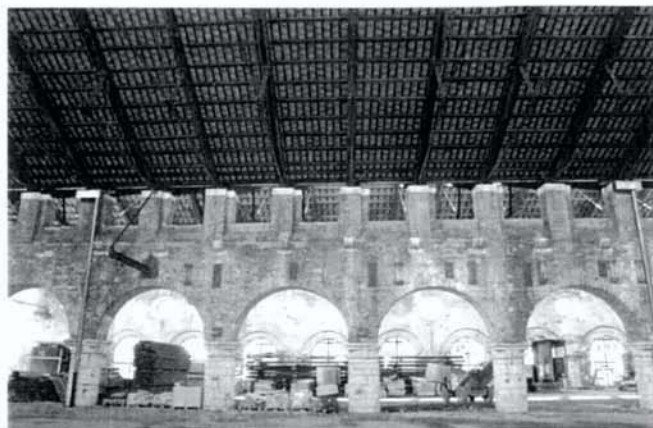


Capannoni delle Galeazze e Fonderie

Intervento ultimato


Comparto delle Fonderie. L'edificio 90 a lavori ultimati con la nuova copertura

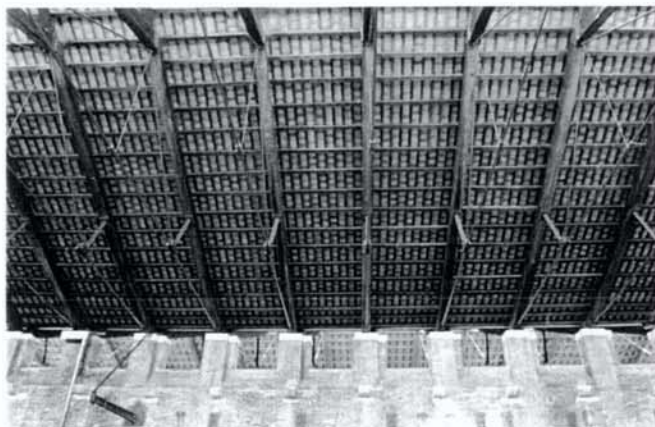

Comparto delle Fonderie. Particolare della copertura dell'edificio 90 a lavori ultimati

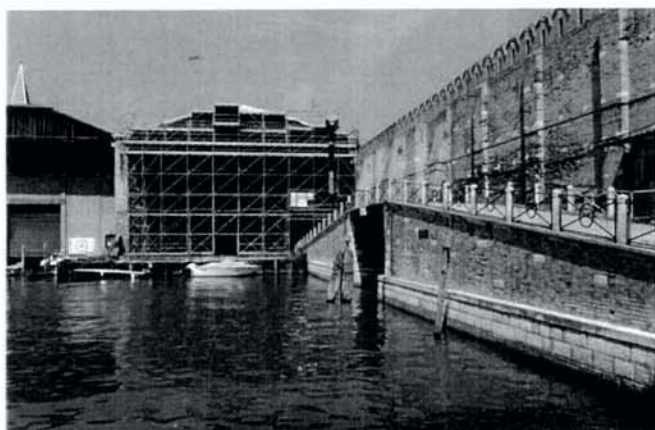


Comparto delle Galeazze. Lavori per la messa in sicurezza definitiva della Galeazza 3

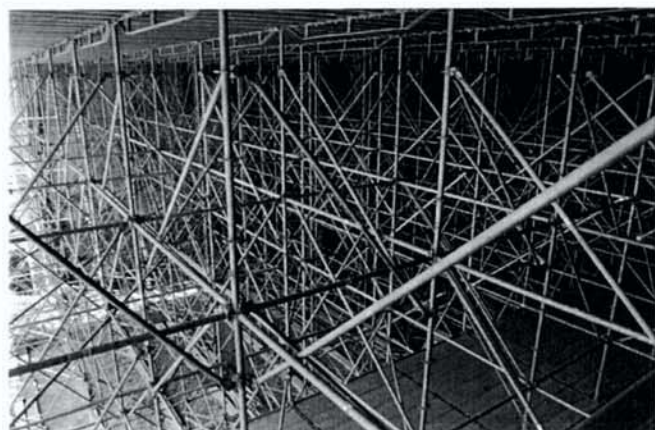

Comparto delle Galeazze. Lavori per la messa in sicurezza definitiva della Galeazza 3

Murano – rialzo e ristrutturazione delle rive

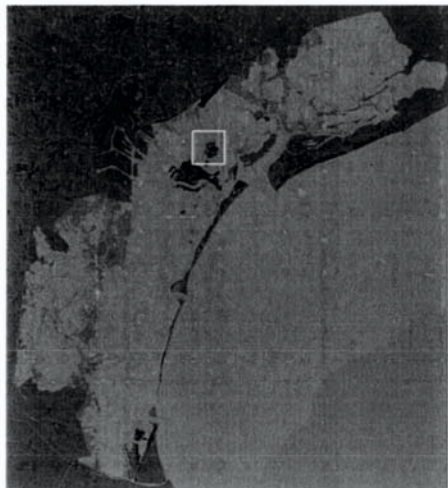

Obiettivi specifici: ridurre la frequenza degli allagamenti; contrastare il dissesto delle rive; proteggere dal moto ondoso.


Interventi principali: consolidamento statico e rialzo delle rive (1,8 km)

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: vista aerea dell'isola con localizzazione delle aree oggetto dell'intervento.



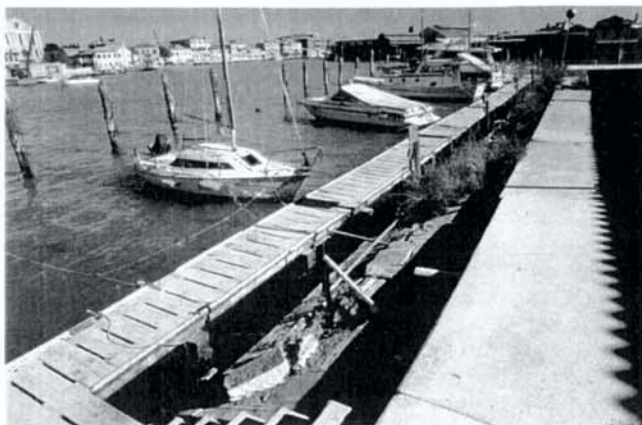


Murano - Canale degli Angeli. La riva prima dei lavori



Murano - Canale degli Angeli. La riva dopo i lavori





Murano - Canale Ondello la sponda prima degli interventi

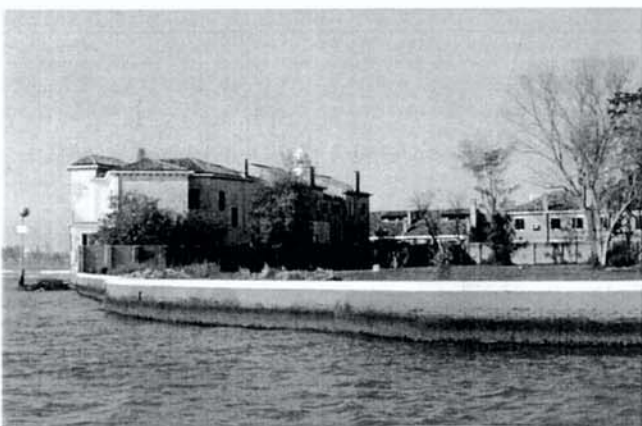

Murano - Canale Ondello la sponda a lavori ultimati

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI

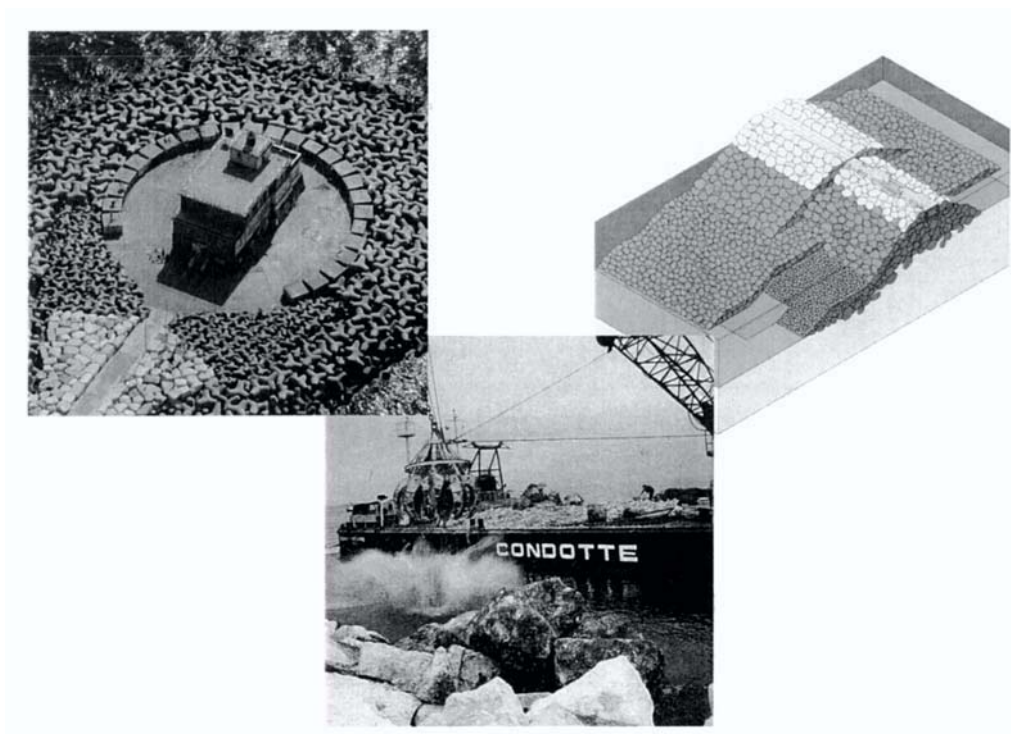

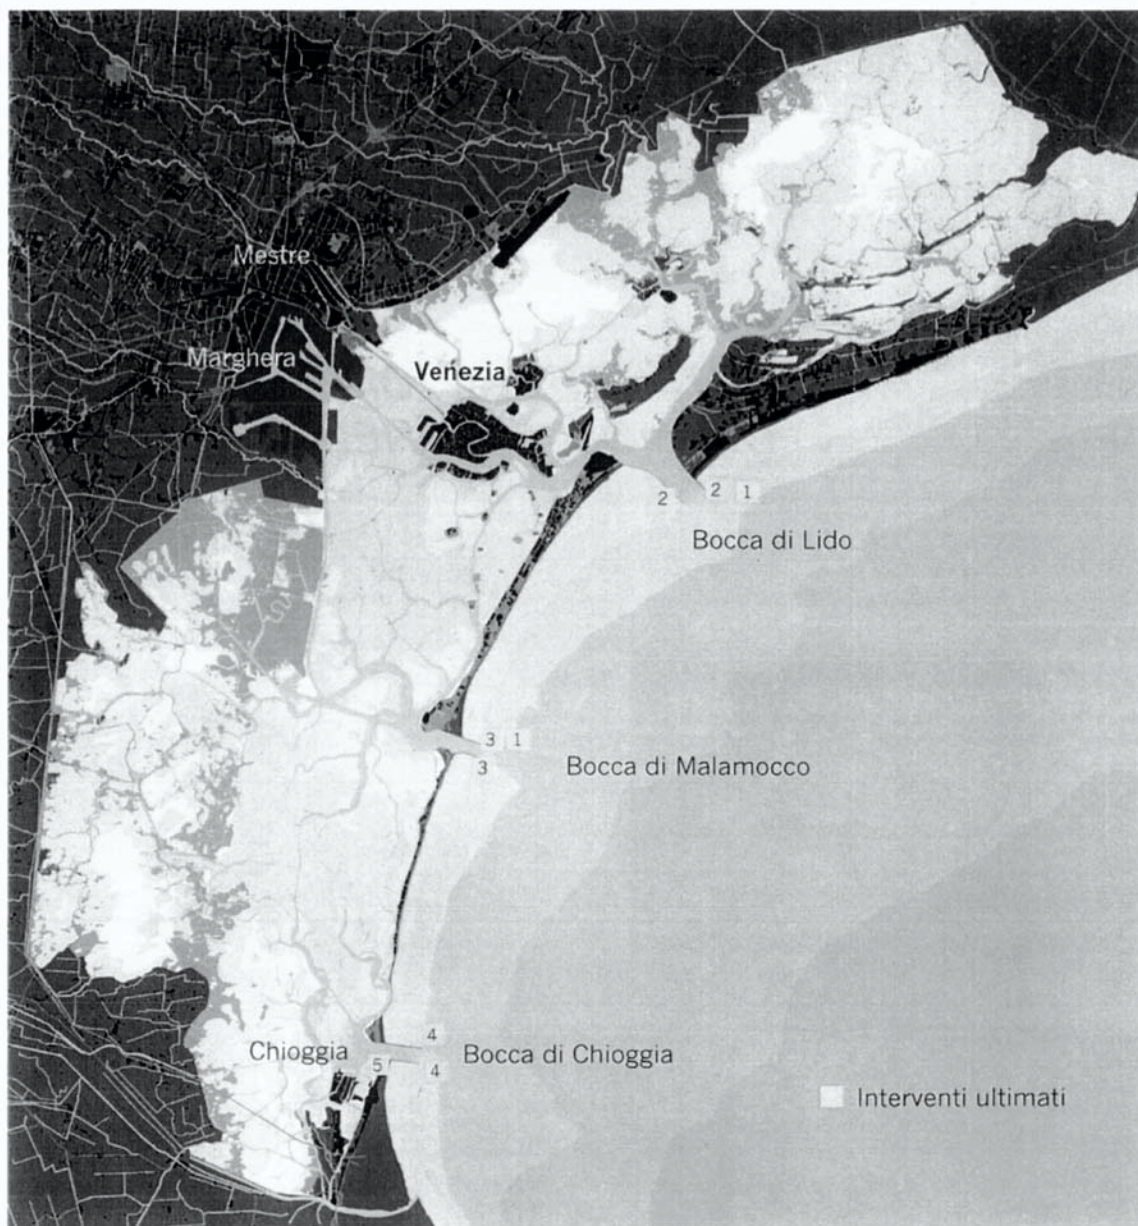


**RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI
ATTIVITA' ULTIME**
(nessuna attività è attualmente in corso)

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Messa in sicurezza e adeguamento dei fari sui moli foranei a nord di Malamocco e di Lido
2. Ristrutturazione dei moli nord e sud di Lido
3. Ristrutturazione del molo nord e sud di Malamocco
4. Ristrutturazione del molo nord e sud di Chioggia
5. Sistemazione della radice del molo sud di Chioggia

Malamocco – ristrutturazione del molo nord

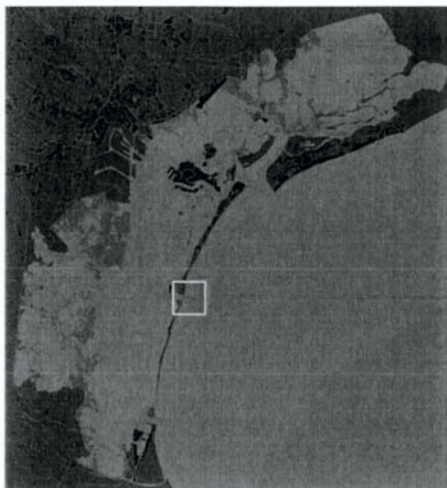

Obiettivi specifici: contrastare il dissesto e il degrado della struttura; aumentare la resistenza rispetto alle mareggiate


Interventi principali: rinforzo delle scogliere e protezione del fondale alla base del molo per impedire l'erosione (2 km)

Intervento ultimato


A lato: localizzazione degli interventi

In basso: la bocca di porto di Malamocco, attraverso cui transita la maggior parte del traffico navale, industriale, commerciale e petrolifero diretto in laguna




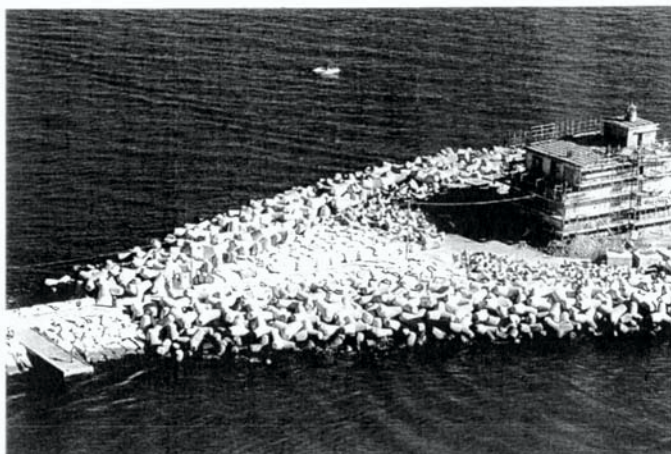

Molo di Malamocco. Lavori per l'adeguamento del faro, al termine degli interventi di ristrutturazione del molo

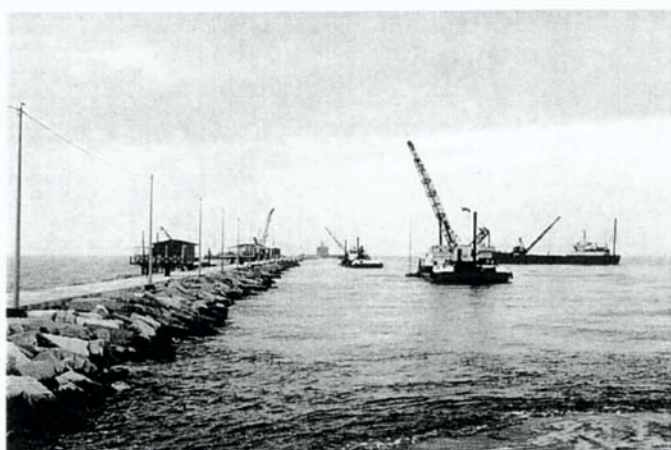



Molo di Malamocco. Un tratto del molo nord all'inizio degli interventi di rinforzo della scogliera

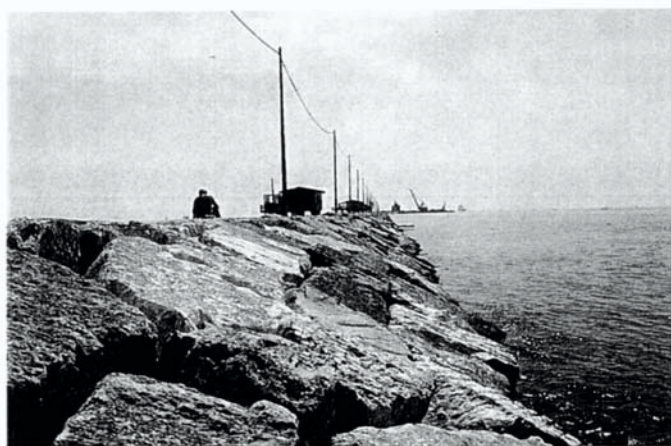

Molo di Malamocco. Un tratto del molo nord al termine degli interventi di rinforzo della scogliera

DIFESA DALLE MAREGGIATE

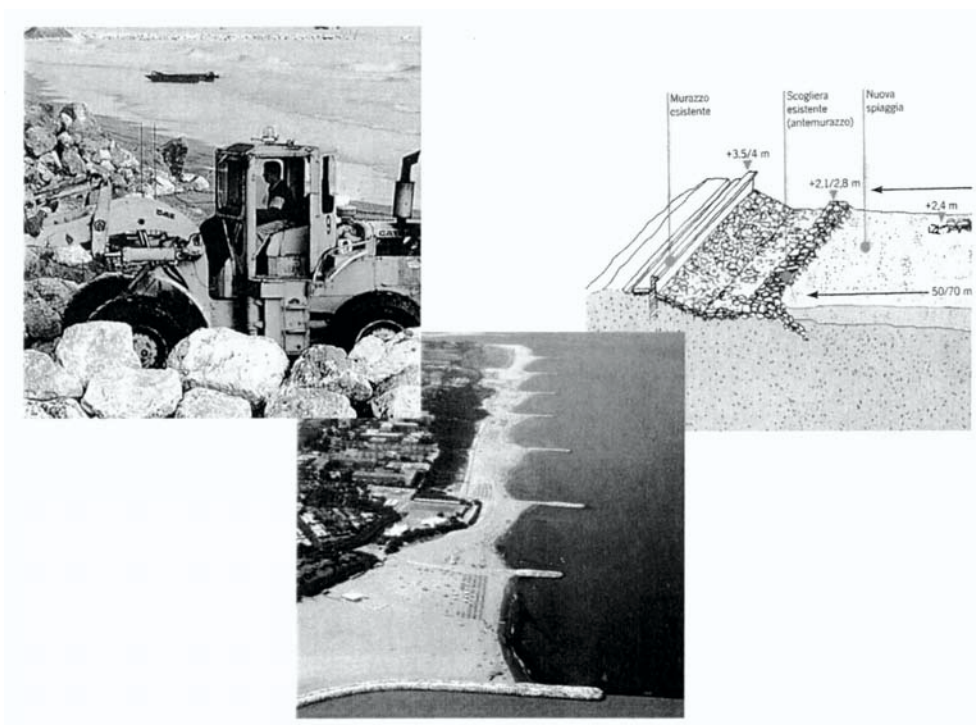

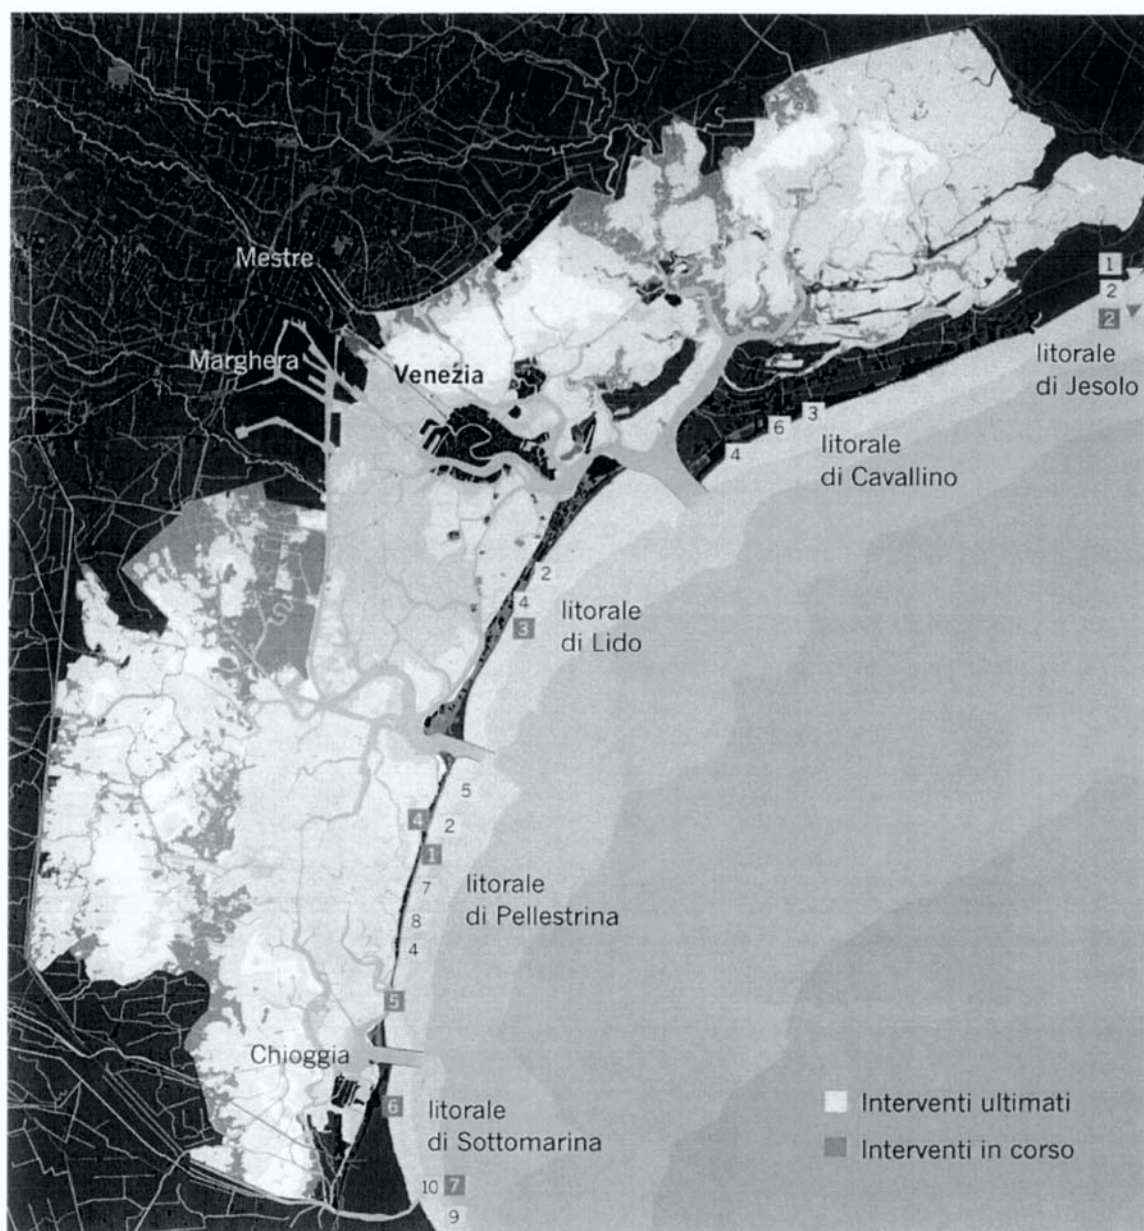

DIFESA DALLE MAREGGIATE
ATTIVITA' ULTIME E IN CORSO

Attività finanziate:**Attività ultimate**

1. Rinforzo del litorale di Jesolo 1° e 2° stralcio – in Accordo di programma con il Comune di Jesolo.
2. Sistemazione zona Cortellazzo e Foce Piave – 1° stralcio
3. Interventi sperimentali di difesa del litorale di Cavallino (località Cà Pasquali)
4. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
5. Monitoraggio del litorale da Cavallino a Pellestrina – prime fasi
6. Rinforzo e rinaturalizzazione del litorale di Cavallino
7. Rinforzo della scogliera tra S. Pietro in Volta e Pellestrina e del murazzo di Caroman (litorale di Pellestrina)
8. Rinforzo e ripascimento del litorale di Pellestrina
9. Rinforzo del litorale di Isola Verde/Chioggia
10. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige – in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina – 1^ fase

Attività in corso

1. Manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento in sabbia
2. Interventi di difesa del litorale di Cortellazzo – 2° stralcio 1^ fase – ripascimento litorale di Eraclea
3. Difesa litorale Lido 1° stralcio
4. Litorale di Pellestrina: accessi attrezzati alla spiaggia; ulteriori attività specialistiche e rilievi ambientali sommersi ed emersi
5. Restauro murazzo Cà Roman sul litorale di Pellestrina
6. Rinforzo del litorale di Sottomarina (Chioggia)
7. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige – in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina – 2^ fase


Attività da avviare

1. Completamento rinforzo litorale di Lido
2. Completamento rinforzo litorale di Isola Verde

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione della manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento
2. Completamento rinforzo litorale di Jesolo (zone Cortellazzo, Eraclea) e di Lido
3. Monitoraggi di controllo degli interventi realizzati

Litorale di Jesolo

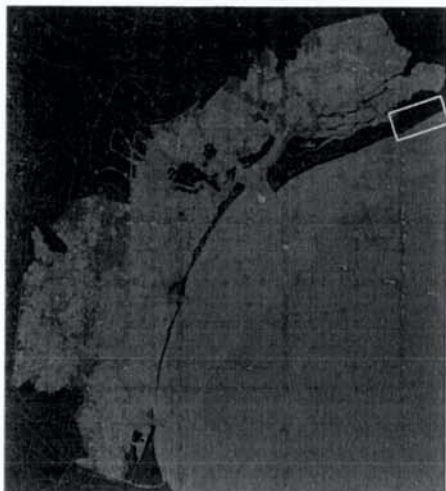


Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litóramei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (10 km); adeguamento dei pontili lungo la riva (34 pontili ristrutturati, 16 di nuova costruzione) e realizzazione di 4 scogliere di roccia ("pennelli")

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori

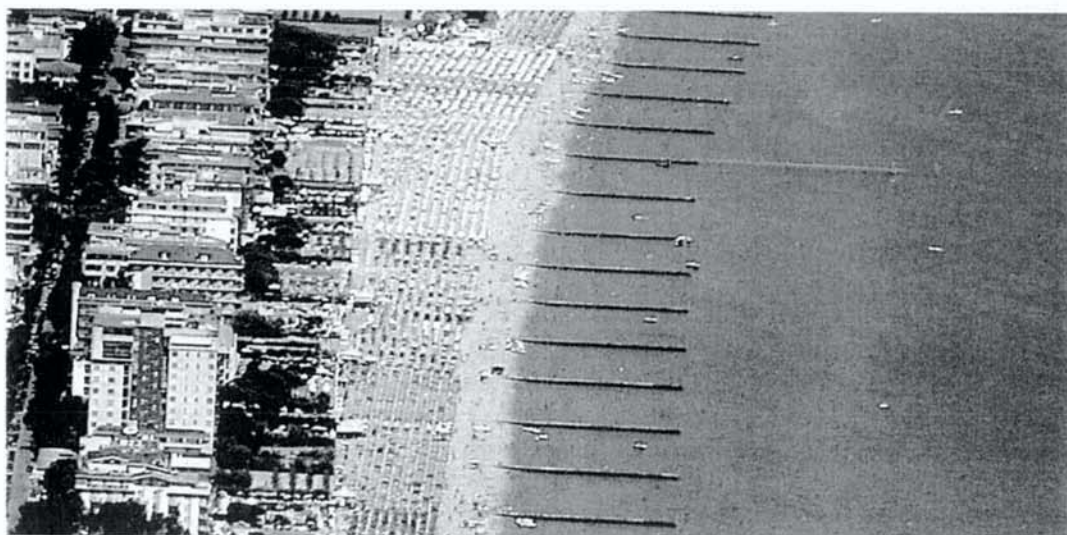

Litorale di Cavallino



Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (11 km) protetta da 32 "pennelli"


Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: la parte sud del litorale prima e dopo l'intervento



Litorale di Pellestrina

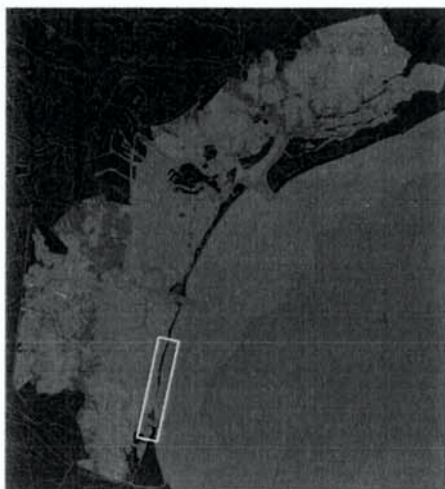

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; rinforzare le antiche difese a mare "murazzi".

Interventi principali: formazione di una nuova spiaggia (9 km) contenuta entro "celle" delimitate da 18 "pennelli" trasversali alla riva e da una scogliera sommersa longitudinale (9 km).


Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori



Litorale di Isola Verde

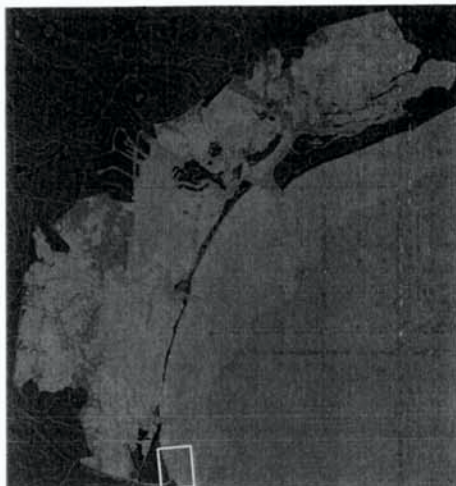

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde

Interventi principali: rinascimento della spiaggia (2,5 km) e costruzione di 8 "pennelli" di roccia a difesa del nuovo arenile


Intervento ultimato


A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori



RECUPERO MORFOLOGICO

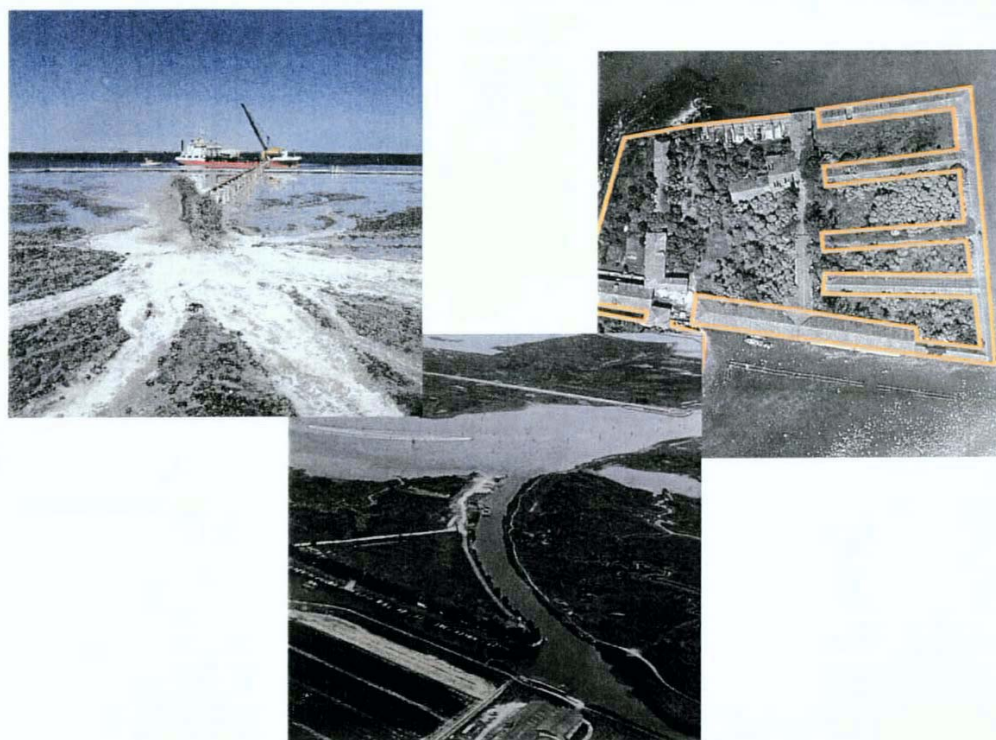

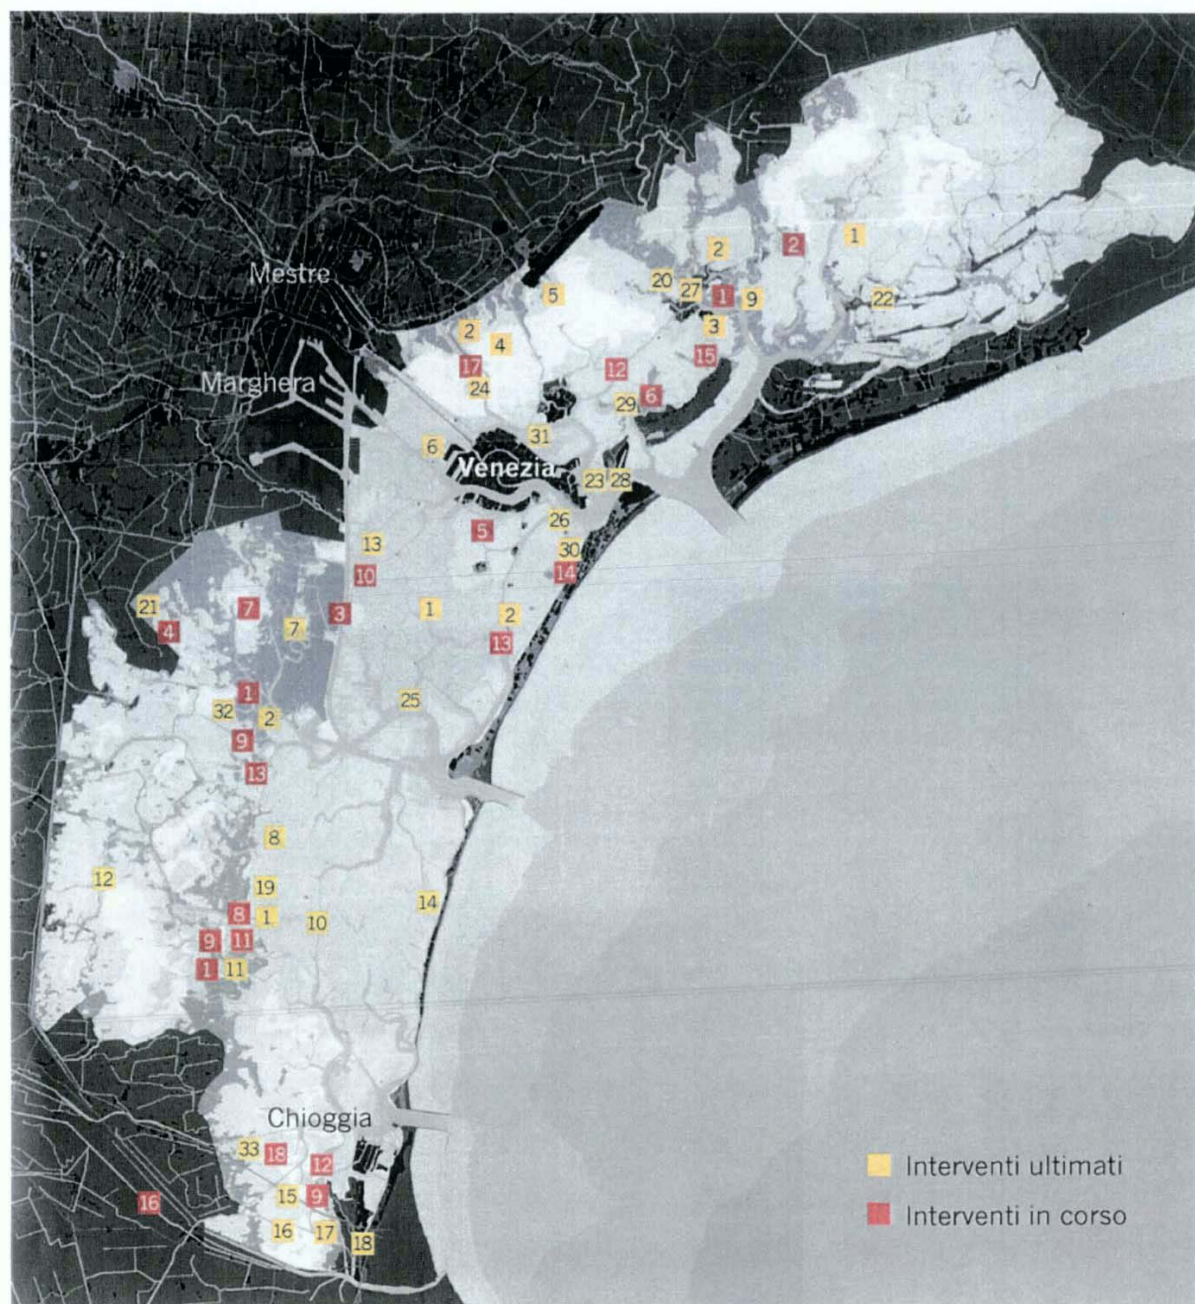

**RECUPERO MORFOLOGICO
ATTIVITA' ULTIME E IN CORSO**

Attività finanziate:**Attività ultimate**

1. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
2. Interventi sperimentali
3. Recupero morfologico zona Burano, Mazzorbo, S. Francesco del Deserto (laguna nord)
4. Recupero morfologico zona Tessera, Campalto, Osellino (laguna nord)
5. Interventi integrativi sul canale di Tessera (laguna nord)
6. Isola del Tronchetto – escavo per la vivificazione area sud-ovest in Accordo di programma con il Comune di Venezia (laguna centrale)
7. Ripristino dei canali nelle casse di colmata B e D/E e ricostruzione di barene a sud della cassa di colmata D/E (laguna centrale)
8. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 1° stralcio
9. Intervento di protezione barene 1° e 2° ciclo (laguna nord)
10. Dragaggio del canale Allacciante (laguna centrale)
11. Dragaggio di canali in valle Millecampi (laguna sud) e ricostruzione di barene
12. Dragaggio canale Scirocchetto e canale Buello (laguna centrale)
13. Dragaggio canali lagunari di Tessera, Fusina, e Contorta S. Angelo e ricostruzione di barene (laguna nord e centrale)
14. Dragaggio del canale S. Antonio dalla bocca di Malamocco a Caroman (laguna centrale)
15. Dragaggio dei varchi sotto il ponte translagunare tra Chioggia e la terraferma (laguna sud)
16. Dragaggio canali Sottomarina, Madonna, Alghero, Laghini 1- Alghero, Trezze, Otregan, Scarpion, S. Domenico e Borgo S. Giovanni (Chioggia)
17. Dragaggio canali nel bacino del Lusenzo e ricostruzione di barene lungo il canale Lombardo esterno sud e nord (Chioggia)
18. Sistemazione dei fondali del canale Fossetta (Chioggia)
19. Realizzazione di sovralti di sabbia a protezione delle barene in erosione (laguna nord e sud)
20. Recupero ambientale e morfologico delle barene – rilievi e monitoraggi; recupero barene con tecniche di ingegneria naturalistica (progetto Life Natura)
21. Ricostruzione argini di conterminazione lungo i canali Bondantino (laguna centrale)
22. Ricostruzione argine a Lio Piccolo (laguna nord)
23. Completamento dell'isola della Certosa
24. Recupero morfologico dell'isola di Campalto (laguna nord)
25. Recupero morfologico dell'isola Fisolo (laguna centrale)
26. Recupero morfologico dell'isola di S. Servolo (laguna centrale)
27. Recupero morfologico dell'isola dei Laghi (laguna nord)
28. Recupero morfologico dell'isola della Certosa (laguna nord)
29. Recupero morfologico dell'isola del Lazzaretto Nuovo (laguna nord)
30. Recupero morfologico dell'isola di San Lazzaro degli Armeni (laguna centrale)

31. Recupero morfologico dell'isola di San Michele (laguna centrale)
32. Opere di confinamento della barena Novisso (laguna centrale)
33. Manutenzione canale Novissimo (laguna sud)

Attività in corso

1. Monitoraggi sugli esiti dei lavori morfologici realizzati
2. Vivificazione e recupero morfologico lagunare della zona dell'isola di S. Cristina (laguna nord)
3. Intervento di recupero morfologico aree casse di colmata D/E Fossetta Barambani (laguna centrale)
4. Campagna di monitoraggio argine Bondantino (laguna centrale)
5. Interventi di ripristino morfologico e risagomatura del canale marittimo di S. Spirito e dei canali limitrofi Rezzo e Fasiol (laguna centrale)
6. Isola Lazzaretto Nuovo completamento impianto fitobiodepurazione e gestione (laguna centrale)
7. Ripristino fondali canali area lago Teneri 1° stralcio (canali Volpego e Fiumesino) e 2° stralcio (barena Casone Zappa A e B)
8. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 2° stralcio (1° fase)
9. Naturalizzazione e riqualificazione ambientale delle strutture morfologiche artificiali a velma e barena
10. Strutture morfologiche per la protezione dei bassofondali adiacenti il canale S. Leonardo - Marghera
11. Recupero ambientale Valle Millecampi
12. Intervento di ripristino morfologico e restauro statico murature perimetrali dell'isola di S. Giacomo in Paludo (laguna nord)
13. Recupero morfologico dell'isola di Poveglia (laguna centrale)
14. Recupero morfologico dell'isola di Lazzaretto Vecchio (laguna centrale)
15. Recupero morfologico dell'isola San Francesco del Deserto (laguna centrale)
16. Ricalibratura e rinforzo del canal Morto tratto tra l'idrovora Cà Bianca e l'innesto del Canale Barbegara
17. Manutenzione per lo scavo, riprofilatura e ripristino briccole di segnalamento sul canale di Campalto
18. Recupero morfologico dell'area lungo il canale Novissimo - barena Otregan


Attività da avviare

1. Prosecuzione degli interventi sperimentali per l'adeguamento del progetto morfologico
2. Interventi morfologici strettamente connessi alle opere alle bocche di porto
3. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene
4. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali
5. Interventi di ricalibratura degli argini lungo la conterminazione lagunare
6. Recupero morfologico e ambientale delle isole: Mazzorbetto e S. Caterina, San Giorgio in Alga

Attività da finanziare:

1. Interventi sperimentali per adeguamento progetto morfologico
2. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene
3. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali
4. Interventi per il recupero morfologico e ambientale nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (Prusst)
5. Completamento interventi di ricalibratura degli argini lungo la conterminazione lagunare
6. Prosecuzione del recupero morfologico e ambientale delle isole: Madonna del Monte, Isola Campana, S. Angelo delle Polveri, Santo Spirito, Vignole, San Pieretto, San Michele

Isola di Poveglia

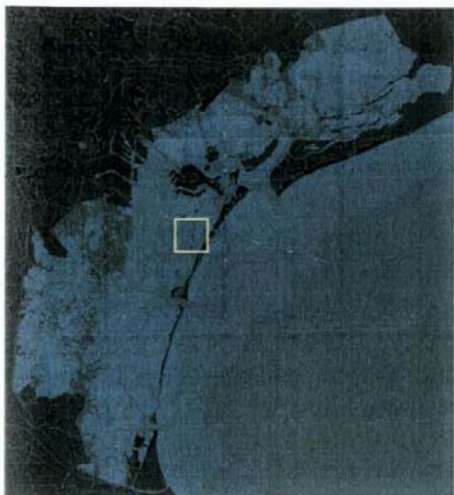

Obiettivi specifici: contrastare il degrado delle rive; sistemazione dei canali interni mediante dragaggio del fondo e rimodellamento delle sponde; restauro delle murature dell'Ottagono; restauro della "cavana" e realizzazione di ponteggi per garantire la sicurezza dei fabbricati prospicienti le rive durante l'esecuzione degli interventi sulle medesime

Interventi principali: ripristino delle sponde; restauro dei muri perimetrali dell'Ottagono a ridosso dell'isola; realizzazione di ponteggi a protezione dei fabbricati prospicienti le sponde; protezione delle rive del canale interno

Intervento in corso

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: vista aerea dell'isola





Isola di Poveglia. Un tratto della riva prima dei lavori



Isola di Poveglia. Un tratto della riva prima dei lavori




Isola di Poveglia. Un tratto della riva durante i lavori



Isola di Poveglia. Fase dei lavori di ripristino delle rive

Laguna nord ripristino ambientale di barene e bassifondali nell'area tra le isole di Burano e S. Francesco del Deserto

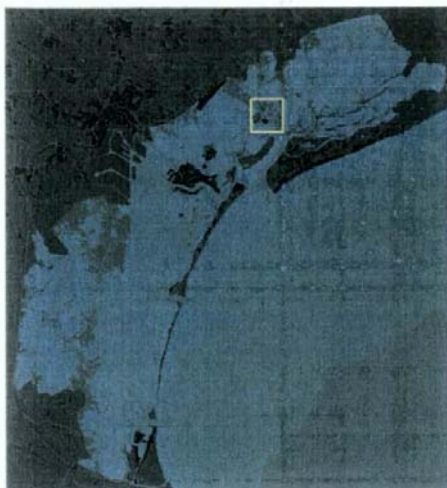

Obiettivi specifici: contrastare l'erosione di barene e bassi fondali; migliorare la circolazione idrica locale; migliorare le caratteristiche ambientali ed ecologiche locali; ripristinare habitat tipici della laguna

Interventi principali: ricostruzione di nuove barene; ampliamento di barene esistenti; protezione del bordo in erosione mediante palificate di legno; ripascimento di barene in deficit di quota; ricalibratura canali

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: erosione del bordo di una barena in laguna Nord







Burano. Situazione
barena a ridosso
dell'isola prima
dell'intervento



Burano. Situazione
della barena durante
i lavori

ARRESTO DEL DEGRADO DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE

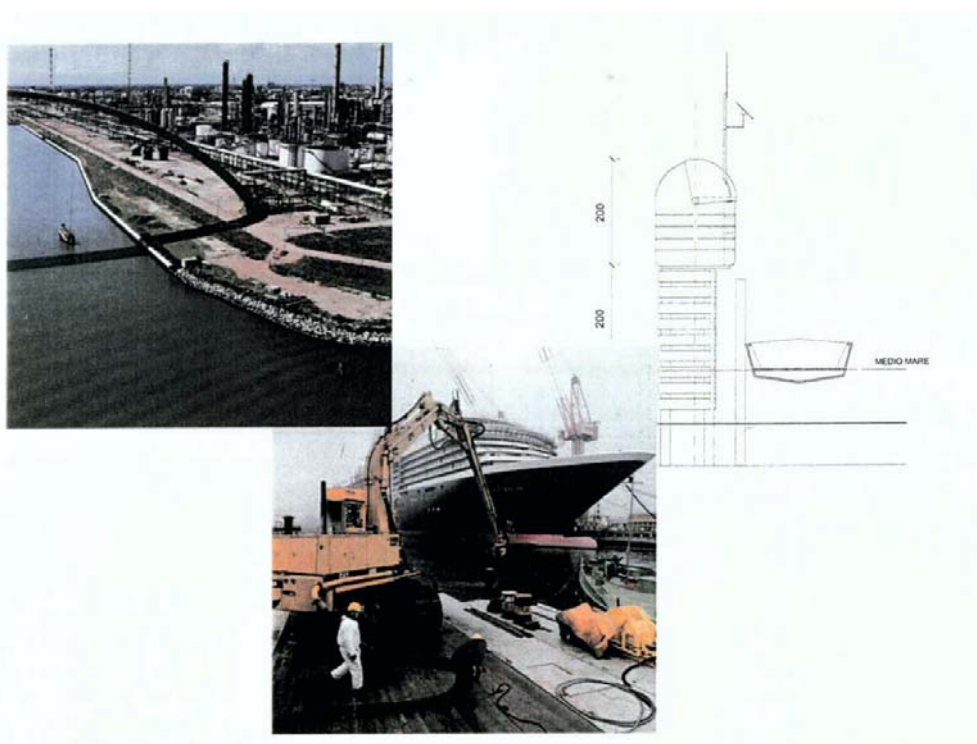

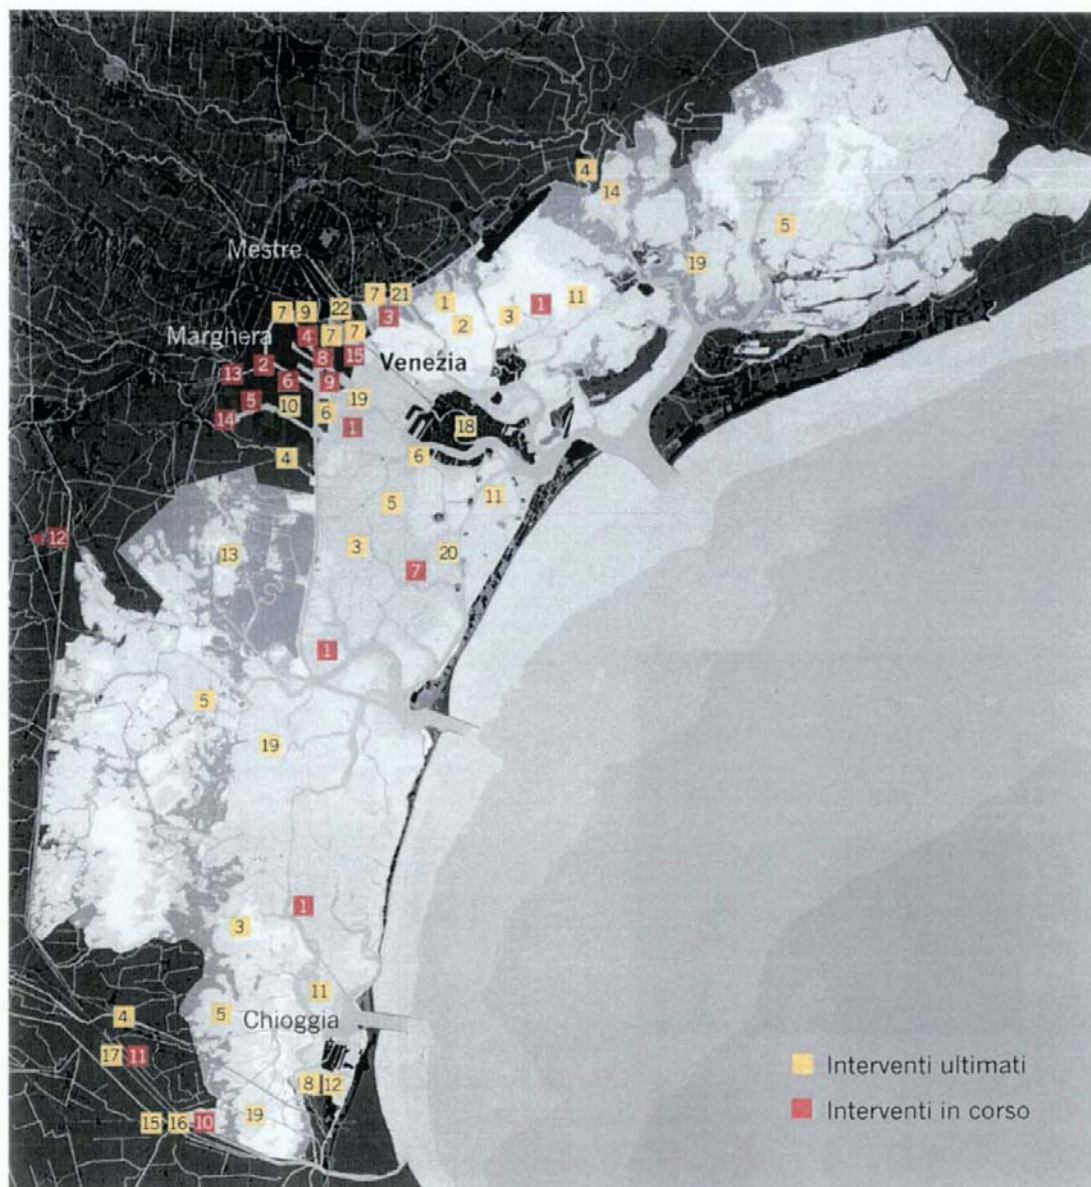

**ARRESTO DEL DEGRADO DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE
ATTIVITA' ULTIME E IN CORSO**

Attività finanziate:**Attività ultimate**

1. Verifica sperimentale di tecniche di arresto e di inversione del degrado della Laguna 1° e 2° fase (Mosambiente)
2. Interventi sui fondali e rimozione algale nella zona di Tessera – Campalto
3. Attività di approfondimento del quadro conoscitivo di riferimento per gli interventi ambientali (progetto 2023)
4. Determinazione degli apporti inquinanti dal bacino scolante (progetto Drain)
5. Indagine della qualità dei sedimenti e mappatura dell'inquinamento dei fondali Lagunari
6. Messa in sicurezza e risanamento ambientale delle isole: Trezze (Laguna centrale) e dell'ex inceneritore (Venezia)
7. Indagini per la caratterizzazione dei siti inquinati (Passo Campalto, Pili, Canale Industriale Nord, Brentella)
8. Messa in sicurezza della discarica di Val da Rio 1° stralcio (Chioggia)
9. Asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord di Porto Marghera - 1° stralcio (1^ e 2^ fase) (Laguna centrale)
10. Sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Sud di Porto Marghera – in Accordo di Programma con Autorità Portuale 1° e 2° stralcio
11. Raccolta di macroalghe anni 1989 – 1999 (Laguna nord, centrale e sud)
12. Interventi di risanamento della discarica di borgo S. Giovanni in zona Val da Rio a Chioggia – completamento (Laguna sud)
13. Risanamento del fondale nel Lago dei Teneri (Laguna centrale)
14. Vivificazione della Palude di Cona (Laguna nord)
15. Indagini propedeutiche agli interventi di controllo degli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante: Botte delle Trezze (Laguna sud)
16. Realizzazione di opere di regolazione delle acque scolanti in Laguna attraverso la Botte delle Trezze (Laguna sud)
17. Intervento sperimentale di fitobiodepurazione nel tratto abbandonato del Canale Novissimo, realizzazione e monitoraggio (Laguna sud)
18. Monitoraggio della qualità dell'acqua dei canali del centro storico di Venezia – Sistema Waters 1^ fase e integrazione
19. Monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia 1^
20. Intervento per l'arresto del degrado connesso alla proliferazione delle macroalghe in Laguna di Venezia – Campagna 2000 – 2002
21. Messa in sicurezza della discarica della barena di Passo Campalto 1^ fase (Laguna nord)
22. Ristrutturazione rive a S. Giuliano – piano di caratterizzazione dell'area

 Attività in corso

1. Monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia 2^ e 3^ fase
2. Indagini integrative a supporto della progettazione degli interventi sulle sponde dei canali di Porto Marghera 1^ fase e 2^ fase
3. Monitoraggio Post Operam Passo Campalto (laguna centrale)

4. Asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord a Porto Marghera 2° stralcio
5. Sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Sud di Porto Marghera 3° stralcio
6. Sistemazione della sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera
7. Intervento per l'arresto del degrado connesso alla proliferazione delle macroalghe in Laguna di Venezia – Campagne 2003 – 2004
8. Sistemazione ambientale del Canale Brentella 1° e 2° stralcio
9. Sistemazione della sponda ovest dell'Isola dei Serbatoli Petroliferi 1° stralcio
10. Messa in sicurezza della Botte delle Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione 1^ fase in Laguna sud
11. Monitoraggio fitobiodepurazione del canale Novissimo (laguna sud)
12. Sistemazione nodi idraulici e ricalibratura canale Piovego di Villabozza 1° stralcio
13. Sistemazione del Canale Lusore Brentelle
14. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio 1° e 2° lotto (area nuova Sirma e area 43 ettari)
15. Intervento di messa in sicurezza dell'area demaniale i Pili a Porto Marghera 1° stralcio di emergenza

Attività da avviare

1. Completamento delle caratterizzazioni dell'area 43 ettari, dell'area Lusore Brentelle, dei fondali del Brentella, dell'area dei Pili, dell'area "Terzo Argine", della Rana
2. Sistemazione sponde canali industriali: Darsena della Rana e completamento Canale Industriale Ovest sponda Sud, Canale Industriale Ovest sponda Est, Canale S. Leonardo – Marghera sponda Ovest, messa in sicurezza dell'area demaniale c.d. "Terzo Argine"

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione di monitoraggi ambientali e gestione sperimentale degli interventi già realizzati
2. Completamento interventi di messa in sicurezza delle discariche abbandonate situate all'interno della conterminazione Lagunare
3. Completamento asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord a Porto Marghera
4. Asportazione selettiva dei sedimenti della Darsena della Rana e del canale Industriale Brentella a Porto Marghera
5. Prosecuzione interventi di sistemazione sponde dei canali industriali a Porto Marghera: Canale Industriale Sud sponda sud e darsena terminale, Canale Industriale Ovest sponda ovest, Canale Vittorio Emanuele III sponda nord, Canale Brentella, Canale Industriale Nord sponda nord, Isola Serbatoli Petroliferi sponde nord e sud, Canale S. Leonardo – Marghera, completamento, area Porto San Leonardo, zona c.d. "Terzo Argine" completamento, San Giuliano, completamento.
6. Realizzazione di un sistema di gestione delle terre inquinate risultanti da scavi, dragaggi e bonifiche eseguiti a Marghera e in Laguna
7. Prosecuzione degli interventi per l'arresto del degrado connesso alla proliferazione delle macroalghe in Laguna di Venezia
8. Bonifica anche mediante soprizzo di alcune aree di basso fondale inquinate poste tra Venezia e Porto Marghera


- 9.** Sperimentazione di interventi di indirizzo dei processi autodepurativi dei bassifondali
- 10.** Estensione degli interventi di indirizzo dei processi autodepurativi dei bassifondali
- 11.** Prosecuzione messa in sicurezza della Botte delle Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione e la Botte a sifone sottopassante il fiume Brenta
- 12.** Prosecuzione ed estensione interventi di sistemazione nodi idraulici

Interventi di sistemazione delle sponde dei canali portuali dell'area di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera


Intervento del Magistrato alle Acque di Venezia	Lunghezza in metri	Stato di avanzamento al 31.12.2004
1 Conterminazione Isola delle Tresse lato canali (tratto H2)	1.730	LAVORI ULTIMATI
2 Conterminazione Isola delle Tresse lato laguna (tratti I1 + I2 + I3)	2.080	LAVORI ULTIMATI
3 Canale Industriale Sud sponda nord (1° stralcio) (parte di tratto E1)	550	LAVORI ULTIMATI
4 Canale Industriale Sud sponda nord (2° stralcio) (parte di tratto E1)	1.187	LAVORI ULTIMATI
5 Canale Industriale Sud - sistemazione sponda nord (3° stralcio) (parte di tratto E1)	1.308	LAVORI IN CORSO
6 Canale Industriale Ovest - sistemazione sponda sud prima fase (tratto D4/1)	1.570	LAVORI IN CORSO
7 Canale Industriale Brentella - 1^ fase sistemazione sponde (compreso 1° stralcio Canale Vittorio Emanuele III) (tratto G1/1 + G2/2 + G2/3 + G1/2 + G2/1 + F1/1 + A2/1)	3.450	LAVORI IN CORSO
8 Canale S. Leonardo Marghera - sistemazione sponda est corrispondente all'Isola dei serbatoi petroliferi (tratto H/1)	890	LAVORI IN CORSO
9 Canale Lusore-Brentelle - sistemazione sponde (tratto Z1/1)	1.910	LAVORI IN CORSO
10 Canale Lusore-Brentelle - sistemazione sponde completamento (tratto Z1/2)		
11 Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 1^ fase (Nuova Sirma) (tratto E2/1)	290	LAVORI IN FASE DI AVVIO
12 Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 2^ fase (43 ettari e sponda sud darsena) (tratto E2/3)	980	LAVORI IN FASE DI AVVIO
13 Canale S. Leonardo Marghera - sistemazione sponda ovest tra i Canali Industriali Ovest e Sud (2A) (tratto H3)	1.480	PROGETTO IN CORSO
14 Canale S. Leonardo Marghera - sistemazione sponda ovest tra il bacino di evoluzione 4 (Can. Ind.le Sud) e Fusina (2B), 1° stralcio (tratto Vesta-CCID-Dalla Pietà) (tratto H4/1)	410	PROGETTO IN CORSO
15 Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 3^ fase (altre sponde e vascone Progetto Integrato Fusina) (tratti E2/6 + E2/7)	1.150	PROGETTO IN CORSO
16 Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 4^ fase (sponda sud vasca di equalizzazione) (tratto E2/6 E2/7)	1.150	PROGETTO IN CORSO
17 Canale Industriale Ovest - sponda sud - 2^ fase (tratto D4/2)	400	PROGETTO IN CORSO
18 Canale Industriale Ovest - sistemazione sponda est - 1^ , 2^ E 3^ fase (tratto D2)	3.240	PROGETTO IN CORSO
19 Canale Vittorio Emanuele III - completamento sponda nord (tratto F1/2 + F2 + F3)	1.480	PROGETTO IN CORSO
20 Darsena della Rana - sistemazione sponde e completamento Canale Industriale Ovest sponda sud (tratti D5/1 + D5/2 + D4/2)	1.800	PROGETTO IN CORSO
21 Sponda lagunare c.d Terzo Argine	1.100	PROGETTO IN CORSO
22 Sponda lagunare S. Giuliano 2° stralcio	1.200	PROGETTO IN CORSO
23 Canale Industriale Ovest - sponda ovest tratto vecchio petrolchimico (tratto D3/1)	690	PROGETTO IN CORSO
24 Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 5^ fase (sponda ovest della darsena) (tratto E2/2)	420	PROGETTO IN CORSO
25 Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 6^ fase (Abibes + Decal + Alcoa) (tratto E2/4)	1.250	PROGETTO IN CORSO
26 Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 7^ fase (Enel) (tratto E2/5)	390	PROGETTO IN CORSO
27 Canale Industriale Nord - sponda nord completamento (tratto A2/2 + A2/3 + A2/A + A2/5)	1.500	PROGETTO IN CORSO
28 Isola dei Serbatoi petroliferi - sistemazione sponda nord e sponda sud (tratto F4 + K)	2.110	PROGETTO IN CORSO
TOTALE	35.715	

Sponde lungo i canali industriali di Porto Marghera oggetto di intervento

I colori servono a distinguere i tratti di marginamento oggetto di intervento

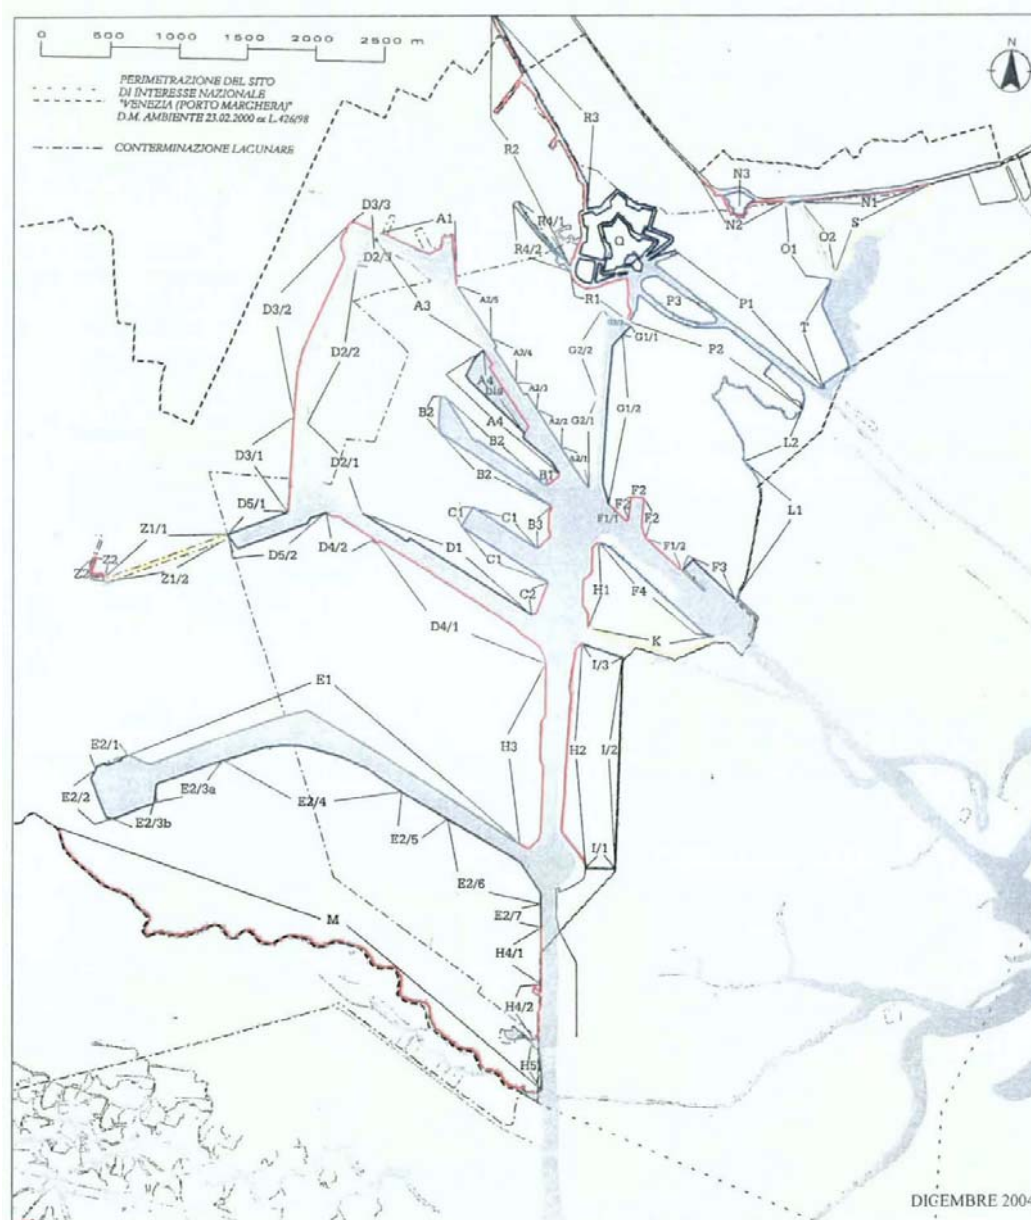

Barene del passo a Campalto

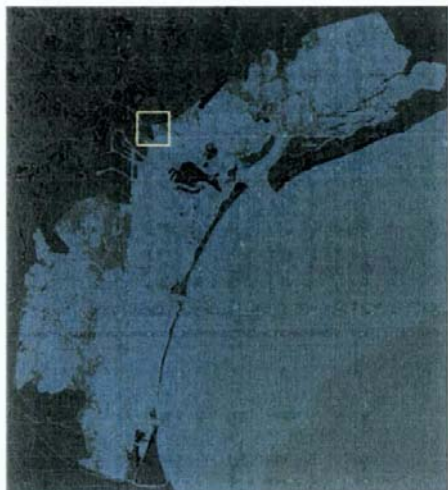

Obiettivi specifici: isolare i materiali depositati nelle barene e bloccare la diffusione nell'ambiente di inquinanti e l'emissione di radiazioni dai rifiuti contenuti; proteggere il perimetro del sito dal moto ondoso; consentire il futuro riutilizzo dell'area

Interventi principali: realizzazione di una barriera strutturale (palancolato metallico lato laguna, per 1,7 km); predisposizione di una barriera idraulica e di una barriera geochimica; copertura dell'area con un geocomposto bentonitico e strati di sabbia e terreno vegetale

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: veduta aerea dell'area durante i lavori





Barena del Passo a Campalto. Un tratto del palancolato metallico che delimita il bordo dell'area lungo la laguna



Barena del Passo a Campalto. Realizzazione del diagramma di bentonite granulare (area fosfogessi). Riempimento del cassero della benna



Barena del Passo a Campalto. Copertura dell'area con geocomposto bentonitico sopra il quale vengono stesi materiali diversi (sedimenti di dragaggio, sabbia e terreno vegetale)





Barena del Passo a Campalto. Preparazione di piste per la movimentazione dei mezzi di cantiere

ALLONTANAMENTO DEL TRAFFICO PETROLIFERO DALLA LAGUNA



Movimento del traffico petrolifero
per categorie di prodotti, in milioni di tonnellate

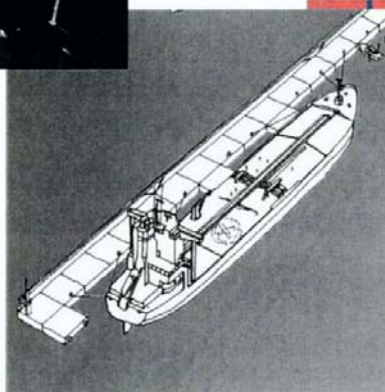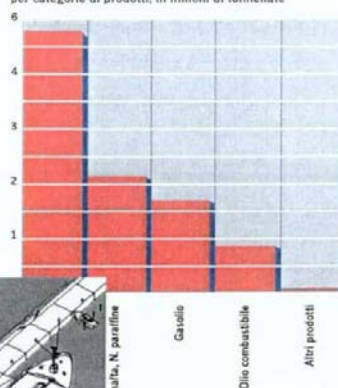

Attività finanziate:**Attività ultimate**

1. Studi propedeutici al progetto operativo
2. Progetto operativo per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna.
3. Progetto preliminare fattibilità di un approdo off shore in alto Adriatico

Attività in corso

1. Esame dei provvedimenti per il contenimento di spandimenti accidentali in laguna
2. Analisi costi – benefici e V.I.A. della realizzazione di un approdo off shore in Alto Adriatico
3. Progetto definitivo di un primo intervento pilota per il contenimento di spandimenti accidentali



Attività da avviare

1. Intervento sperimentale per il contenimento di spandimenti accidentali lungo il canale Malamocco – Marghera

Attività da finanziare:

1. Panne di contenimento lungo il Canale dei Petroli (presidi per protezione della laguna da sversamenti accidentali da natanti)
2. Attività preliminari alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un approdo off shore in Alto Adriatico

Realizzazione di un approdo off – shore in Alto Adriatico

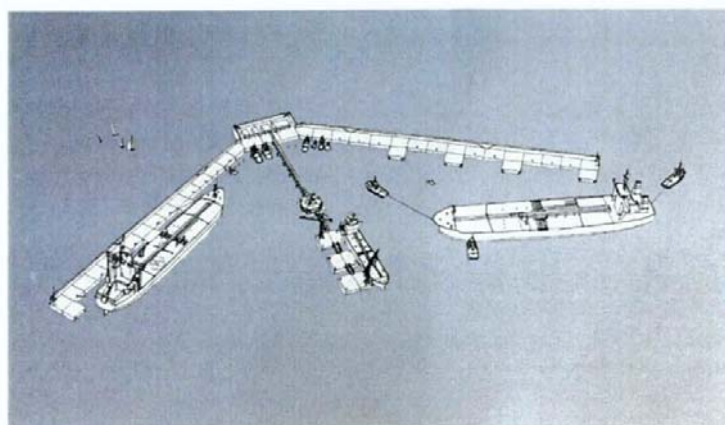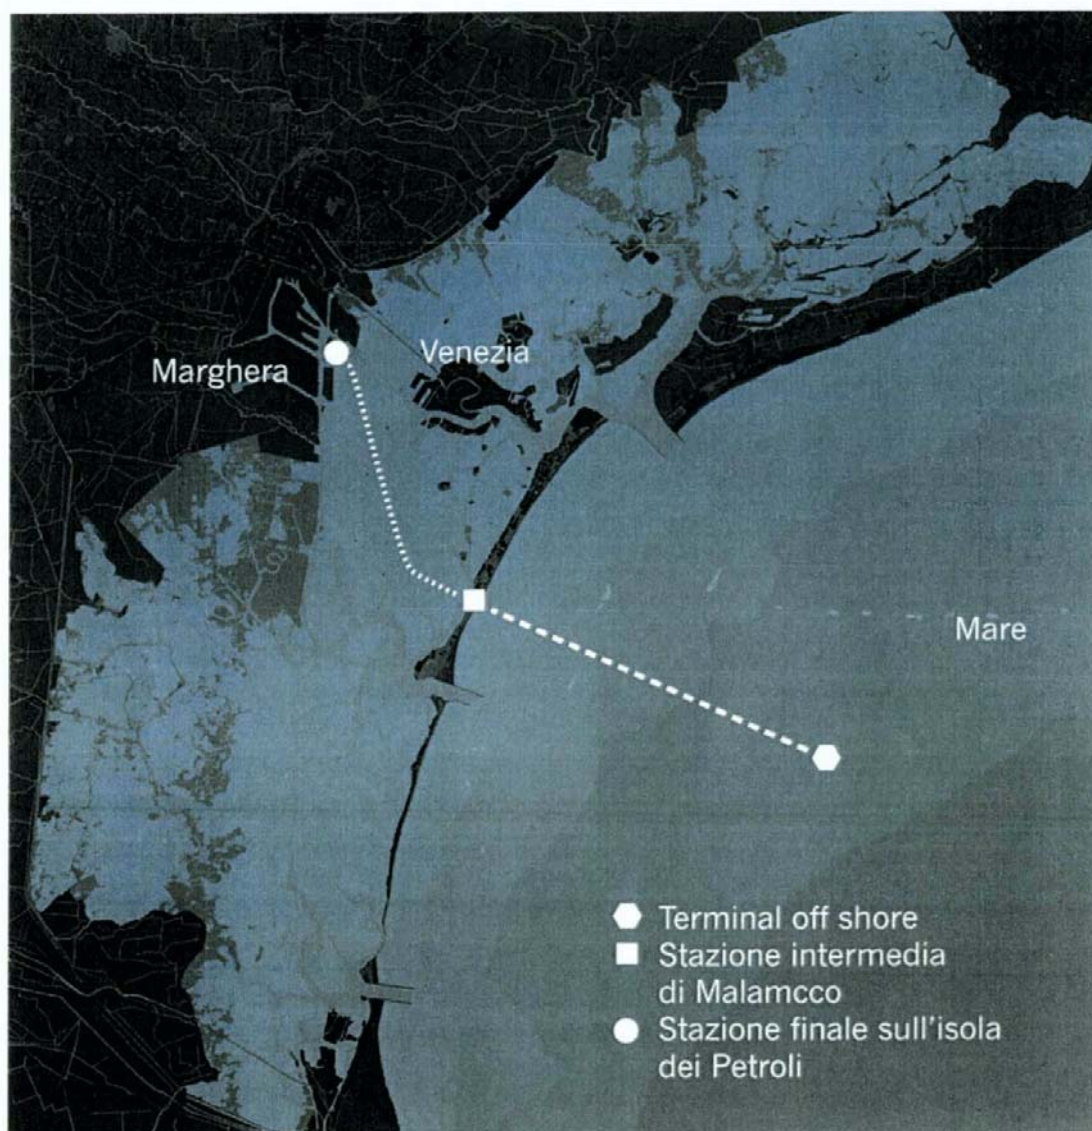

In alto: localizzazione dell'intervento

A lato: vista dell'approdo off - shore

AUSILII LUMINOSI ALLA NAVIGAZIONE



Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Analisi della convenienza della realizzazione del traffico portuale di notte e con nebbia
2. Realizzazione sistema di illuminazione e radar lungo il Canale Malamocco - Marghera

Attività da avviare

1. Intervento di manutenzione straordinaria

Ausili alla navigazione lungo il canale Malamocco / Marghera



Obiettivi specifici: ridurre i rischi derivanti dal trasporto in laguna di prodotti petroliferi e chimici; facilitare la navigazione di notte e con la nebbia

Interventi principali: installazione di segnali luminosi, riflettori radar e "fog detectors" lungo il canale tra la bocca di Malamocco e la zona industriale (15 km)


Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: installazione di un segnale luminoso



APERTURA DELLE VALLI DA PESCA

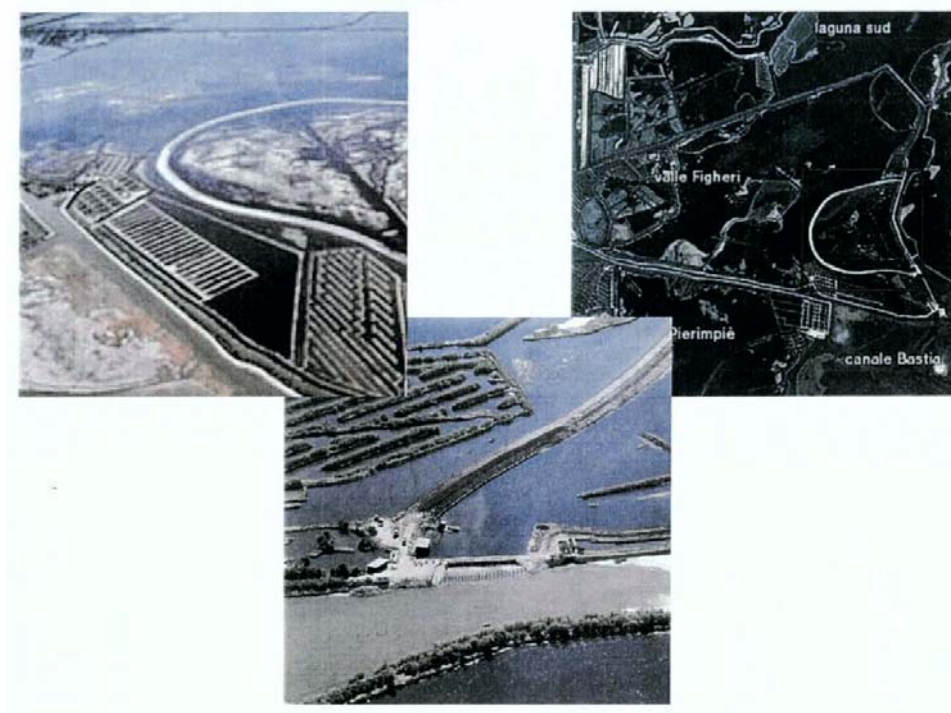

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Studi propedeutici alla progettazione dell'intervento sperimentale
2. Progetto preliminare e di massima
3. Intervento sperimentale di apertura di Valle Figheri e monitoraggio

Valle Figheri – intervento sperimentale



Obiettivi specifici: migliorare la qualità delle acque in aree periferiche delle laguna in cui circolazione e ricambi idrici avvengono con difficoltà; monitorare gli effetti di questo tipo di opere attraverso un intervento pilota in una valle scelta come campione.

Interventi principali: realizzazione di un argine di terre (2 km) per dividere la valle in due parti, di cui una "riaperta"; realizzazione di un manufatto per regolare il flusso della marea tra valle aperta e laguna e di due manufatti tra valle aperta e valle chiusa.


Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: il manufatto di regolazione tra valle aperta e laguna



SERVIZIO INFORMATIVO

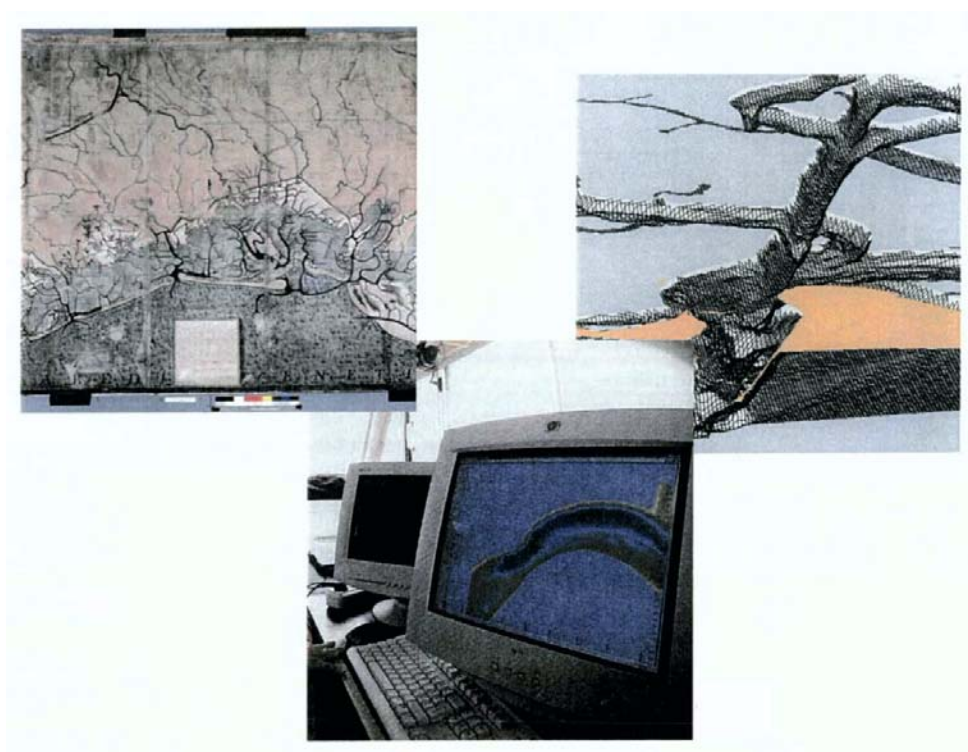

Attività finanziate:

Attività ultimate

n. 71 perizie

Attività in corso

n. 29 perizie

Attività da avviare

n. 25 perizie

Attività da finanziare:

Almeno n. 80 stralci delle varie sezioni di lavoro per garantire continuità alle attività dal 2006 fino al 2015

Centro sperimentale di Voltabarozzo



Nuovo laboratorio: di analisi chimiche del Centro Sperimentale di modelli idraulici di Voltabarozzo


Il laboratorio, operativo dal mese di aprile del 2004, costituisce un importante strumento per l'analisi dei campioni di acque, sedimenti e biota che vengono prelevati nel corso dei sistematici controlli ambientali effettuati dalla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (SAMA) nella laguna di Venezia. In particolare, il laboratorio è dedicato allo studio di micropollutanti organici ed è organizzato in modo da consentire il trasporto dei campioni, l'analisi degli stessi e la certificazione dei risultati. E' predisposto per analizzare oltre 1 000 campioni l'anno

A lato: veduta aerea del Centro Sperimentale di Voltabarozzo



A lato: esterno dell'edificio tecnico

In basso: a sinistra aula attrezzata per l'analisi di micropollutanti organici, a destra fase di preparazione dei campioni da analizzare

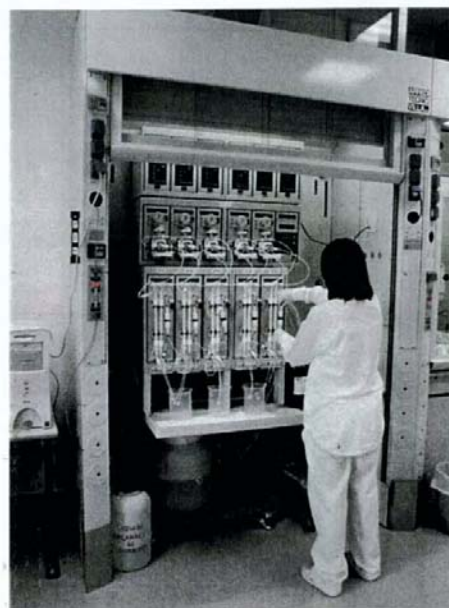

Immagini da satellite



Le campagne di rilevamento satellitare ed aereo costituiscono un elemento di fondamentale importanza per l'esplorazione del territorio in quanto permettono di evidenziare e controllare le modificazioni di tipo ambientale e morfologico. I rilievi vengono effettuati con cadenza annuale, voli fotogrammetrici a colori a media risoluzione e biennali, con voli fotogrammetrici in toni di grigio ad alta risoluzione sull'intera laguna. Ad oggi sono stati schedati oltre 3 000 files

A lato: immagine di Marghera da satellite, infrarosso

Lo studio del sito portuale ed industriale di Porto Marghera viene effettuato anche con il contributo di analisi all'infrarosso di immagini satellitari che permettono di valutare lo "stress vegetazionale" dei terreni e di ipotizzarne, quindi, un possibile inquinamento

In basso: litorale di Cavallino da satellite

L'elaborazione delle immagini acquisite da satellite e l'utilizzo di immagini provenienti da sensori iperspettrali e multispettrali montati su aereo costituiscono un importante mezzo per la verifica della qualità ambientale e delle modificazioni morfologiche sul territorio oggetto degli interventi di salvaguardia



Cartografia



L'archivio che contiene le mappe cartografiche del territorio dell'ecosistema di varia provenienza e di diversa scala, costituisce la fonte principale di dati (insieme alle immagini da satellite) per il caricamento in Banca dati della cartografia numerica. Attualmente sono state catalogate e conservate oltre 2 000 mappe diverse

A lato: laguna di Venezia rappresentata su una carta dell'Archivio di Stato di Venezia - presente sull'archivio digitale del Servizio Informativo



A lato: cartografia urbanà di Mestre - Venezia centro storico - particolare delle zona di Porto Marghera e di Mestre

Lo sviluppo urbano della città di Venezia - Mestre è visibile in questa cartografia digitale; l'aggiornamento è stato possibile grazie alle riprese aeree annuali effettuate sul territorio lagunare e sulla gronda che permettono di avere un potente strumento di verifica e di controllo dell'evoluzione dell'abitato sul territorio

■	Edificato dopo il 1984	■	Canali lagunari
■	Edificato fino al 1984		
■	Terra emersa		



A lato: particolare della laguna di Venezia - zona di Chioggia

I dati territoriali rappresentati nella cartografia digitale sono predisposti a partire dalle campagne di rilievo topografico, batimetrico e fotogrammetrico effettuate dal Servizio Informativo e necessarie per mantenere aggiornata la conoscenza sull'evoluzione morfologica della laguna di Venezia sia ai fini progettuali che di controllo e monitoraggio degli interventi

Documento C Regione del Veneto

Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi della legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2004



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEGRETERIA REGIONALE

13 LUG. 2005



Protocollo N°

307337/4610

Allegati N°

1

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia al 31.12.2004.



Al Presidente
Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato
ex art.4, L.798/1984
Palazzo X Savi- Rialto
30100 VENEZIA

Con riferimento a quanto richiesto con nota n. 349/GAB in data 24 maggio 2005, concernente l'oggetto, si inviano, aggiornati al 31 dicembre 2004, la relazione illustrativa ed i quadri analitici dello stato dei finanziamenti, suddivisi per Leggi e per Soggetti Attuatori.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Segretario Regionale
All'Ambiente e Lavori Pubblici
ing. Roberto Casarin



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEGRETERIA REGIONALE ALL'AMBIENTE E AI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE REGIONALE TUTELA DELL'AMBIENTE

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI CON I FONDI DELLA
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA**

ANNO 2004

RELAZIONE AL PARLAMENTO



Servizio Legge Speciale per Venezia

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Quadro normativo e programmatico

I fondi messi a disposizione dalla legge speciale per Venezia dal 1984 ad oggi costituiscono una imponente massa di finanziamenti che hanno consentito di avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna.

Tenuto conto delle competenze attribuite alla Regione Veneto dalla legislazione, la quasi totalità dei fondi stanziati è stata destinata dalla Regione ad opere mirate al disinquinamento delle acque.

Nei primi tempi, fino al 1991, specificatamente alla realizzazione di fognature e impianti di depurazione delle acque negli otto comuni della gronda lagunare, secondo il dettato delle leggi 171/73 e 798/84. Successivamente, negli anni dal 1991 in poi, con l'entrata in vigore della legge 360/91, anche ad opere finalizzate al risanamento ambientale in senso lato, e quindi, oltre alle opere per il disinquinamento delle acque da fonti puntuali quali sono appunto i depuratori e le reti di fognatura, anche opere volte a limitare l'effetto dell'inquinamento diffuso proveniente dall'agricoltura e dalla zootecnia, concernenti la razionalizzazione del sistema idraulico della bonifica, il risanamento dei suoli contaminati, impianti di compostaggio e per il trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino scolante, ecc.

Una parte dei fondi stanziati della legge speciale sono stati infine destinati ad opere acquedottistiche e ospedaliere, secondo il dettato della legge 798/84.

La Regione ha normato le proprie attività conseguenti l'applicazione della legge speciale per Venezia con apposite leggi regionali.

La legge regionale 49/74 ha normato le attività fino al 1990, quando, con l'entrata in vigore della legge 17/90, è stato radicalmente modificato l'assetto normativo. La legge 17/90 è stata successivamente modificata con la legge 8/92 e con la legge 35/93.

La legge regionale 17/90 stabilisce che il disinquinamento della laguna di Venezia deve essere definito da uno strumento programmatico di carattere generale chiamato "Piano Direttore".

Peraltro già in precedenza, sin dal 1979, la Regione si era dotata di un Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna. Detto piano è servito per coordinare i primi interventi di disinquinamento.

Nel 1991, in ottemperanza alla citata legge 17/90, è stato predisposto e approvato dal Consiglio Regionale il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

Detto Piano affronta le problematiche dell'inquinamento lagunare nella loro complessità, e tiene conto delle varie fonti che lo possono originare. Fornisce quindi gli indirizzi da seguire per individuare le azioni più efficaci e le opere più idonee a conseguire i risultati voluti.

Successivamente, nel 1994, la Giunta Regionale, nell'intento di individuare azioni specifiche per limitare il carico di sostanze nutritive immesse in laguna, e controllare quindi il fenomeno dell'eutrofizzazione, ha predisposto ed adottato un documento denominato "Piano pluriennale degli interventi in attuazione del Piano per il disinquinamento della laguna di Venezia" al fine di meglio individuare gli interventi da finanziare con i fondi messi a disposizione dalla legge n. 139/92.

In data 1 marzo 2000, infine, il Consiglio Regionale ha approvato un aggiornamento al Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, in ottemperanza all'incarico affidato alla Regione dal Ministro dell'Ambiente Ronchi con l'ordinanza n. 4498 dell'1.10.1996. Tale aggiornamento è denominato "Piano Direttore 2000".

I principali obiettivi di Piano sono i seguenti:

- ridurre l'apporto annuo di sostanze nutritive a livelli tali da evitare la fioritura di alghe ed il rischio di crisi ambientali;
- ridurre le concentrazioni di microinquinanti nell'acqua e nei sedimenti entro i limiti di assoluta sicurezza per il consumo alimentare di pesci, crostacei e molluschi della Laguna prevedendo lo "scarico zero" per le 10 sostanze tossiche;
- garantire che la qualità dell'acqua dei fiumi del Bacino Scolante sia compatibile con l'uso irriguo e con la vita dei pesci.

Il Piano prevede inoltre azioni per abbattere l'inquinamento di origine civile, industriale ed agricola mediante interventi di:

- prevenzione che mirano ad abbattere all'origine l'inquinamento;
- riduzione tramite la depurazione delle acque di scarico;
- autodepurazione intervenendo sui corsi d'acqua per aumentarne le capacità autodepurative al fine di ridurre ulteriormente l'inquinamento residuo prima del loro sbocco in Laguna di Venezia.

I settori di intervento sono:

1. **Fognatura e Depurazione:** gli interventi nella rete fognaria mirano alla riduzione degli scarichi diretti in Laguna, attraverso il completamento dei sistemi fognari, con la separazione della fognatura delle acque nere dalle acque di prima pioggia, la eliminazione delle acque parassite e la costruzione di vasche di prima pioggia sull'intero territorio del bacino scolante.

Gli interventi finora finanziati puntano, da una parte, allo sviluppo della rete di raccolta minore (sviluppo dei "pettini"), laddove già esistono le principali linee di collettamento, e dall'altra alla realizzazione di nuove linee principali dove esistano zone convenientemente servibili e non ancora raggiunte da pubblica fognatura. L'obiettivo è quello di estendere gli allacciamenti di fognatura all'84% degli abitanti

residenti all'interno del bacino scolante (percentuale fissata sulla base di un'analisi costi-benefici a seguito di una capillare ricognizione del reale stato di consistenza delle reti di fognatura, dello stato degli allacciamenti e del tipo di urbanizzazione esistente).

Gli interventi agli impianti di depurazione finora finanziati si possono essenzialmente suddividere in tre categorie:

- interventi di affinamento dei processi di depurazione e di adeguamento della qualità degli scarichi ai limiti legislativi;
- interventi di incremento della potenzialità dell'impianto in termini di abitanti equivalenti;
- collettamento di impianti minori ad impianti più grandi, per una migliore economia di gestione, e per la diversione dello scarico in corpi ricettori sfocianti fuori dalla Laguna.

2. **Acquedotti:** questa tipologia di interventi è finalizzata alla razionalizzazione dei prelievi dai corsi d'acqua del bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, al fine di garantire sia una maggiore portata dei corsi d'acqua e l'incremento, così, dei processi di autodepurazione naturale, sia la riduzione dei consumi idropotabili finalizzata ad un miglioramento dell'efficienza degli impianti di depurazione. Le principali azioni sono:

- realizzazione di nuove linee di distribuzione;
- interconnessione di sistemi di produzione ad uso idropotabile del Veneto centrale e del basso Veneto al fine di ridurre gli attingimenti di punta e riequilibrare, nel lungo periodo, i prelievi nel loro complesso. In questo modo verranno rifornite con acqua di buona qualità le aree oggi sfavorite del basso Veneto;
- rendere il sistema acquedottistico veneto di tipo reticolare, ad anello chiuso;
- gestione, su base pluriennale, delle risorse idriche, anche mediante monitoraggio e riuso di acque depurate all'interno dei cicli industriali e a scopo irriguo.

All'interno della programmazione regionale rientra il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, previsto dall'art. 14 della L.R. 5/1998, che individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche del Veneto, nonché le fonti da salvaguardare per risorse idriche ad uso potabile. La Legge Speciale per Venezia interviene finanziando specificamente lo Schema del Veneto Centrale che alimenterà con acque di buona qualità i territori della Provincia di Rovigo, della Bassa Padovana e delle aree limitrofe della Provincia di Venezia.

3. **Territorio:** questo settore rappresenta, in termini di finanziamenti ripartiti, il secondo grande settore di intervento a favore del disinquinamento della Laguna, dopo quello di fognatura e depurazione. Gli interventi finanziati hanno come obiettivo primario l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua del Bacino Scolante, in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento veicolato dalla rete idrografica scolante in Laguna. Vale, infatti, il principio secondo il quale quanto più a lungo l'acqua inquinata risiede in un sistema naturale biologicamente attivo, tanto più i processi naturali di assimilazione dei nutrienti e di abbattimento dei microinquinanti possono agire e favorire la depurazione di quell'acqua.

4. **Agricoltura e Zootecnia:** le azioni nel settore agricolo e zootecnico rispondono all'esigenza di ridurre l'apporto di macronutrienti (azoto e fosforo) nella Laguna di Venezia, attraverso il miglioramento della qualità delle acque superficiali che scolano nel sistema idrografico che sfocia in Laguna.

Tipici del settore sono i carichi diffusi, cioè quelli presenti nelle acque di pioggia, o di irrigazione, drenate dal territorio, quindi di origine agricola o zootecnica che scolano dalle superfici coltivate verso i corsi d'acqua portando con sé parte delle sostanze nutrienti fornite alle colture con i fertilizzanti chimici, con le deiezioni animali (liquami), con la letamazione e sostanze microinquinanti contenute nei fitofarmaci

I carichi di sostanze nutrienti provenienti dal settore agricolo e zootecnico dipendono soprattutto da alcune componenti, come la tipologia delle colture, i metodi di irrigazione, il tipo di fertilizzazione, le pratiche agricole adottate, il rapporto tra carico di bestiame e dimensione dei fondi, e le modalità di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni. Le attività di questo settore si articolano in cinque sottosectori:

- Incentivi all'agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante
- Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo culturale con finalità ambientali nel Bacino Scolante
- Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante
- Gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia a tutela dell'ambiente nel Bacino Scolante
- Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante

5. **Bonifica dei Siti Inquinati:** le azioni finanziano interventi siti all'interno del territorio del Bacino Scolante atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo: siti inquinati, ex-discariche, depositi abusivi, ecc.... La destinazione dei fondi si specifica in due distinti settori territoriali: il primo è specifico per l'area industriale inquinata di Porto Marghera, il secondo sono le aree inquinate nel territorio del Bacino Scolante.

6. **Monitoraggio e Sperimentazione:** il sistema di monitoraggio costituisce lo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Bacino Scolante - Laguna - Mare. E' quindi essenziale che la rete di monitoraggio fornisca dati, sia qualitativi sia quantitativi, sulle acque superficiali in modo tale da permettere una corretta valutazione dei carichi di inquinanti. La Regione Veneto è sempre attenta alle evoluzioni tecnologiche nel settore del disinquinamento e nelle sue azioni continua a finanziare studi, approfondimenti e sperimentazioni nell'ambito della riduzione dell'apporto di nutrienti e sedimenti in Laguna. Queste attività si esplicano essenzialmente tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), e sono essenzialmente concentrate nelle attività di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali nei seguenti settori:

- monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici del bacino scolante;

- monitoraggio qualità dell'aria e gestione del rischio industriale;
 - monitoraggio e previsione meteorologica;
 - realizzazione della carta dei suoli;
 - studi e servizi nel settore agro-zootecnico ed agro-meteorologico;
 - sviluppo del sistema informativo ambientale.
7. **Ospedali:** i finanziamenti assegnati a questo settore riguardano interventi di risanamento igienico sanitario presso l'ospedale S. Giovanni e Paolo di Venezia, secondo quanto stabilito dalla legislazione speciale per Venezia.

INTERVENTI SPECIALI

1) Progetto Integrato Fusina

In tale contesto di programmazione si inserisce il Progetto Integrato Fusina (PIF), realizzato dalla Regione Veneto in regime di Project Financing. L'importo dell'intervento ammonta a circa 200 milioni di euro, IVA esclusa. Di questi 92,8 milioni di euro sono messi a disposizione dalla Regione Veneto; la quota rimanente è a carico di capitali privati.

Il Progetto nasce dall'idea di coordinare gli interventi per la depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la trasformazione dell'attuale impianto di depurazione in centro di trattamento polifunzionale per gli scarichi civili, le acque di pioggia di Mestre, Marghera e del Mirese, il post-trattamento degli scarichi industriali di Porto Marghera, la depurazione delle acque di falda e per la produzione di acque per il riuso industriale.

Il progetto si pone come raccordo tra le pianificazioni regionali costituite dal Piano Direttore 2000, dal Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, dal Modello strutturale degli acquedotti – Schema del Veneto Centrale e dalle attività del Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) consistenti nel ripristino morfologico della laguna e nell'estromissione del traffico petrolifero.

In particolare, il PIF prevede il riutilizzo nell'area industriale di Porto Marghera di quota parte dei reflui depurati. Ciò libererà risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per un utilizzo più pregiato, a scopo potabile che saranno destinate in particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale, quali sono quelle meridionali.

La creazione di un'area umida in Cassa di Colmata A permetterà, inoltre, l'utilizzo di tale volume per la collocazione dei fanghi lagunari scavati dal Magistrato alle Acque di Venezia nell'ambito degli interventi previsti dal Master Plan.

Contestualmente il materiale di buona qualità presente in Cassa A potrà essere utilizzato per gli interventi di ripristino morfologico attuati dal Magistrato alle Acque di Venezia, mentre per lo scarico finale a mare potranno essere utilizzate le condotte previste nel progetto per l'estromissione del traffico petrolifero dalla Laguna di Venezia, predisposto sempre dal MAV, qualora l'intervento venga realizzato.

Per quanto attiene l'iter amministrativo si precisa quanto segue.

La Giunta regionale con deliberazione n. 386 del 14 febbraio 2003 ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed approvato il progetto preliminare.

In data 31 dicembre 2003, è stata depositata presso gli uffici della Regione Veneto una proposta, ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994 e s.m.i., per la progettazione, realizzazione e gestione del Progetto Integrato Fusina.

La proposta presentata, oltre a contenere uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale del Progetto, riporta uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, un piano economico-finanziario, nonché idonee garanzie economiche offerte dal promotore stesso alla Amministrazione regionale, come previsto dall'art 37-bis della legge n. 109/1994 e s.m.i.

Tenuto conto della rilevanza dell'intervento la Giunta Regionale ha inteso aderire alla sua realizzazione mediante il concorso di capitali privati, in quanto suscettibile di gestione economica, procedendo con il sistema della cd. "finanza di progetto" come disciplinata dalla legge Merloni in combinato disposto con la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27, in materia di opere pubbliche.

Considerata la natura dell'intervento, che certamente riveste l'urgenza e l'indifferibilità del caso, rientrando nel novero delle opere in favore della tutela e dell'igiene ambientale per la salvaguardia dell'ambiente lagunare veneziano, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 282 del 6 febbraio 2004 ha approvato e stabilito di pubblicare, secondo le modalità dettate dalla normativa, apposito avviso indicativo per l'avvio delle procedure di ricerca di eventuali altri soggetti promotori per la progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento denominato Progetto Integrato Fusina.

Detto avviso, pubblicato nella GUCE in data 5 marzo 2004, è scaduto il giorno 3 giugno 2004, senza che siano pervenute ulteriori proposte.

Nel frattempo la Conferenza dei Servizi per gli interventi a Porto Marghera, istituita ai sensi dell'art. 14 ex Lege 241/90 e ss.mm., con Deliberazione n. 1 del 22 aprile 2004, ha approvato il Master Plan per la Bonifica dei Siti Inquinati di Porto Marghera che definisce il Progetto Integrato Fusina *quale impianto strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai retromarginamenti, nonché delle acque di processo industriale e delle acque pluviali.*

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1906 del 18 giugno 2004, che prende atto dell'esito della gara andata deserta, viene nominata un'apposita Commissione per l'esame della documentazione presentata dal Promotore (costituito dall'A.T.I. di cui fanno parte Delta Po S.p.A. (ora Veneto Acque S.p.A.) - capogruppo mandatario -, VE.S.T.A. S.p.A. e l'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.), e per formulare le proposte per le successive determinazioni dell'Amministrazione Regionale.

Nel frattempo, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 4532 del 29 dicembre 2004, ha stabilito l'acquisizione al patrimonio regionale della Cassa di Colmata A e delle aree all'interno dell'impianto di Fusina destinate alla realizzazione del Progetto Integrato

Fusina. Inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4531 del 29 dicembre 2004, è stato approvato l'Accordo di Programma con il Magistrato alle Acque di Venezia "regolante le modalità di attuazione di alcuni interventi di salvaguardia ambientale della laguna da attuarsi a Porto Marghera e in aree lagunari vicine".

Si ritiene, entro la prima decade del mese di Luglio 2005, di sottoscrivere il contratto di affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, previo parere favorevole del N.U.V.V (Nucleo Regionale Verifica e Valutazione) in merito alla convenienza economico e finanziaria dell'opera e previo espletamento della gara europea per l'affidamento dell'intervento in concessione.

2) Master Plan

Il Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera è stato redatto a seguito dell'accordo sottoscritto nel 1998 tra lo Stato, le Amministrazioni locali e Aziende al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni ambientali di tutta l'area di Porto Marghera, interessata da grandi attività industriali a partire dagli anni '20.

I principali obiettivi del Master Plan sono:

- definizione delle strategie di intervento e delle tecnologie più appropriate per il risanamento dell'area;
- individuazione delle priorità, della tempistica, della logistica, delle necessità finanziarie, delle procedure per monitorare l'avanzamento delle attività e promuovere il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Il Master Plan si prefigge inoltre di:

- realizzare barriere idrauliche finalizzate alla messa in sicurezza in emergenza;
- cofinanziare i suoli contaminati e le acque di falda con realizzazione di circa 78 km di marginamenti;
- provvedere all'escavo di circa 6.400.000 m³ di sedimenti dai canali industriali, in parte fortemente contaminati;
- bonificare i suoli, in accordo con quanto previsto dal D.M. 471/99;
- approntare soluzioni logistiche finalizzate alla gestione delle bonifiche.

Il Master Plan prevede inoltre la completa caratterizzazione dell'intero sito, lo sviluppo di modelli matematici per le condizioni di flusso sotterraneo, l'approfondimento di analisi di rischio di area vasta, la realizzazione di una rete di monitoraggio e di un sistema di gestione dei dati acquisiti.

Il Master Plan per la Bonifica dei Siti Inquinati di Porto Marghera è stato approvato con Deliberazione della Conferenza dei Servizi per gli interventi a Porto Marghera n. 1 del 22 aprile 2004.

3) Modello Strutturale degli Acquedotti - Schema del Veneto Centrale

Nell'ambito degli interventi speciale di programmazione merita particolare interesse anche il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, previsto dall'art. 14 della L.R. 5/1998, al fine di coordinare le azioni delle otto Autorità d'ambito istituite, e approvato

dalla Giunta Regionale del Veneto nel 2000, che consiste nell'individuazione degli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche del Veneto, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse idriche per uso potabile:

I principali obiettivi sono:

- fornitura di acqua di buona qualità alle aree oggi sfavorite del basso Veneto;
- ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato;
- salvaguardia delle risorse idropotabili;
- riduzione dei costi dell'acqua potabile conseguenti all'abbattimento degli sperperi di acqua e di risorse finanziarie di esercizio.

Le principali azioni sono:

- realizzazione di nuove linee di distribuzione;
- interconnessione di sistemi di produzione ad uso idropotabile del Veneto centrale e del basso Veneto;
- resa del sistema acquedottistico veneto di tipo reticolare, ad anello chiuso;
- gestione su base pluriennale delle risorse idriche, anche mediante monitoraggio.

Lo Schema del Veneto Centrale, in corso di esecuzione da parte del concessionario Veneto Acque S.p.A., è strettamente connesso al Progetto Integrato Fusina. Tra gli obiettivi del Progetto Integrato Fusina, infatti, c'è anche il riuso delle acque depurate per scopi non potabili all'interno dell'area di Porto Marghera. In questo modo si potranno liberare risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per un utilizzo più pregiato, a scopo potabile, che saranno destinate in particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale, quali sono quelle del Basso Veneto.

Sarà, quindi, possibile garantire servizi acquedottistici migliori (caratterizzati da maggiori portate, elasticità e ridondanza della rete) nell'area compresa fra la bassa padovana ed il Polesine e una adeguata gestione del ciclo integrato delle acque con considerevoli vantaggi per la tutela ed il risparmio delle risorse ambientali.

La realizzazione dello Schema del Veneto Centrale è finanziata con i fondi della Legge Speciale per Venezia, che finora ha complessivamente destinato € 91.968.268,89.

STATO DELLA SPESA

I fondi complessivamente messi a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia sommano a 1.762,5 Milioni di EURO di cui :

- impegnati con progetti approvati, per circa 1.005,1 Milioni di EURO pari a circa il 56,32% delle somme finanziate;
- erogati (spesi) per circa a 674,9 Milioni di EURO corrispondenti a circa il 37,82% delle somme finanziate.

La suddivisione dei finanziamenti per i settori di intervento è riportata nella tabella che segue:

SETTORI	Fondi Finanziati	Fondi Impegnati	Fondi Erogati
Fognatura e depurazione	1.120,4 MLN €	712,17 MLN €	514,63 MLN €
Territorio	262,55 MLN €	90,59 MLN €	56,80 MLN €
Agricoltura e zootecnia	150,23 MLN €	67,28 MLN €	29,40 MLN €
Bonifica siti inquinati	59,72 MLN €	16,33 MLN €	2,75 MLN €
Acquedotti	107,23 MLN €	76,20 MLN €	34,52 MLN €
Monitoraggio e Sperimentazione	42,09 MLN €	25,20 MLN €	19,57 MLN €
Ospedali	20,30 MLN €	17,30 MLN €	17,26 MLN €
TOTALE	1.762,5 MLN €	1.005,1 MLN €	674,9 MLN €

Il totale degli interventi a cui è stato concesso il finanziamento alla data del 31.12.2004 è pari a 892. Nella tabella che segue tale numero di interventi viene suddiviso a secondo del settore di appartenenza.

SETTORI	Numero Interventi
Fognatura e depurazione	647
Territorio Acquedotti	21
Territorio	135
Agricoltura e zootecnia	23 ⁽¹⁾
Bonifica siti inquinati	30
Monitoraggio e Sperimentazione	31
Ospedali	5
TOTALE	892

(1) Sotto questa voce sono compresi i finanziamenti attribuiti ai 5 settori che costituiscono il comparto Agricoltura e Zootecnia:

1. Incentivi all'agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante
2. Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nel Bacino Scolante
3. Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante
4. Gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia a tutela dell'ambiente nel Bacino Scolante
5. Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante

Con successivi provvedimenti vengono finanziati i singoli interventi alle Aziende Agricole e ai Consorzi di Bonifica.

Si riporta, nel seguito e suddivisa per legge, la situazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2004.

Legge 798/84 - esercizi 1984-85-86 (€ 41.316.551,93, pari a 58 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 41.316.551,93	€ 36.049.897,79	87,3%	€ 30.913.038,96	74,8%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 33 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 41.316.551,93. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per l'87,3% ed erogati per il 74,8%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	27	19
Acquedotti	3	1
Territorio	2	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	
TOTALE	33	22

La maggior parte delle opere risultano ultimate e collaudate. Si rilevano alcuni interventi in itinere.

In particolare, i lavori per la realizzazione del progetto relativo all'estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera comunale presentato dal Comune di Mogliano Veneto, per un

importo di € 516.456,90 sono ancora in corso: tale finanziamento deriva dalla riallocazione dei fondi avvenuta con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 45 del 15 luglio 1999. Inoltre con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 2004 è stato approvato il cambio del soggetto attuatore, divenuto l'azienda Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

Anche per ciò che concerne il "Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud" i lavori sono tuttora in corso. I ritardi sono dovuti alla revisione del progetto definitivo presentato originariamente. Con il decreto della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 147 del 29 marzo 2001, è stato approvato il progetto definitivo.

Per quanto riguarda la fognatura di Pellestrina il Comune di Venezia ha presentato un progetto che definisce lo schema fognario dell'Isola ed individua i criteri per utilizzare i finanziamenti messi a disposizione. Tale progetto è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 26 del 19 marzo 1999 e le opere sono in avanzata fase di esecuzione.

Con deliberazione n. 677 del 25 febbraio 1997, la Giunta regionale ha aderito alla richiesta del Comune di Venezia di sottoscrivere accordi di programma relativi ad opere di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina, S. Pietro in Volta e S. Erasmo, destinando i fondi originariamente destinati alle fognature della Giudecca (€ 5.422.797,44) come segue: € 4.906.340,54 per il progetto di Pellestrina ed € 516.456,90 per le fognature di Campalto. Tale destinazione è stata approvata da parte del Consiglio Regionale con deliberazione n. 745 del 1 luglio 1988.

I fondi del progetto relativi alla costruzione della "vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre (VE)" sono stati revocati per la quota non ancora erogata (pari a € 444.697,73) e accantonati a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per finanziare interventi di risanamento igienico sanitario relativi ai "lavori di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute" con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Legge 910/86 - esercizio 87-88 (€ 51.645.689,91, pari a 100 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 51.645.689,92	€ 47.446.033,50	91,8%	€ 45.518.828,04	88,1%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 42 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 51.645.689,92. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 91,87% ed erogati per l' 88,14%.

	Int..	Collaudi
Fognatura e Depurazione	39	26
Acquedotti	1	
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali	1	
TOTALE	42	26

I lavori finanziati con i fondi della legge 910/86 esercizi 1987-88, sono stati per la maggior parte progettati ed eseguiti direttamente dalla Regione, con il supporto tecnico del Consorzio Venezia Disinquinamento. I lavori sono tutti conclusi e già collaudati.

Le economie di spesa degli interventi finanziati con questa legge i cui lavori, ultimati e collaudati, hanno determinato una spesa inferiore rispetto a quanto impegnato, saranno utilizzate per finanziare altre opere. Tra queste rientrano i "lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave", per un importo complessivo pari a € 45.900,53. La quota finanziata con le economie di questa legge è pari a € 26.788,59. La quota rimanente, pari a € 19.111,94, è finanziata con le economie della Legge 67/88 - Esercizio 1990. Alla data del 31.12.2004 il progetto è stato approvato e l'impegno di spesa è stato assunto con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 214 del 17 novembre 2004.

Legge 910/86 esercizio 1989 (€ 38.734.267,43, pari a 75 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 38.734.267,43	€ 37.757.647,44	97,5%	€ 24.839.866,19	64,1%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 16 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione, come evidenziato dalla

seguinte tabella. I finanziamenti ammontano a € 38.734.267,43. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 97,5% ed erogati per il 64,13%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	12	3
Acquedotti	1	
Territorio	2	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	1
TOTALE	16	4

Si tratta di 12 progetti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione di cui 9 ultimati e/o collaudati, 1 del settore Acquedotti, 2 del settore Territorio ed 1 relativo ad interventi presso l'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia.

In relazione all'intervento relativo al Dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio, la quota di cofinanziamento a carico della Regione del Veneto ammonta a € 2.582.284,50, pari a 5 miliardi. I lavori risultano già ultimati e collaudati.

Per quanto attiene la "Fognatura di S. Erasmo", è stato sottoscritto l'accordo di programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia ed il Magistrato alle Acque di Venezia. Il progetto è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 99 del 30 ottobre 2000, attribuendo la realizzazione delle opere al Magistrato alle Acque.

Il progetto relativo alla "nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud" presentato da VE.S.T.A. S.p.A., incaricata della realizzazione dell'opera, è stato modificato e la stessa VE.S.T.A. S.p.A. ha realizzato un nuovo progetto definitivo. Tale progetto è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 147 del 29 marzo 2001.

Infine, gli interventi relativi al settore Territorio sono due. Il primo, "Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta" di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, risulta ultimato.

Il secondo è rappresentato dagli "interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte", affidato al Magistrato alle Acque di Venezia (MAV). I finanziamenti relativi a questo intervento derivano da fondi riallocati, originariamente destinati al Comune di Venezia. In particolare, tale riallocazione è stata approvata con Determinazione del Consiglio Regionale n. 32 del 1997. A seguito della presentazione del progetto definitivo da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, è stato assunto l'impegno di spesa, con Decreto Regionale del Dirigente della Tutela Ambiente n. 99 del 30 ottobre 2000.

Legge 67/88 esercizio 1988 (€ 18.334.219,92, pari a 35,5 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 18.334.219,92	€ 11.851.990,41	64,6%	€ 4.709.224,67	25,7%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 7 interventi, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 18.334.219,92. Alla

data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 64,6% ed erogati per il 25,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	3	1
Acquedotti	4	
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	7	1

Di questi 7 interventi, 4 sono destinati ad opere acquedottistiche e 3 per impianti di depurazione nella terraferma veneziana. In particolare, i primi rientrano nell'ambito della progettazione generale del sistema degli acquedotti del basso Veneto e precisamente nei Comuni di Chioggia e Cavarzere in Provincia di Venezia, approvata con delibera di Giunta

Regionale n. 1688 del 16 Giugno 2000.

Per quanto riguarda gli acquedotti realizzati ad opera del Comune di Chioggia, i lavori relativi al rifacimento degli impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile), risultano ultimati.

In relazione agli impianti di depurazione, è stato assegnato il finanziamento a V.E.S.T.A. per il potenziamento dell'impianto di depurazione di Fusina al fine di portarlo alla potenzialità di circa 400.000 abitanti equivalenti.

Per quanto riguarda l'intervento relativo ad opere accessorie all'impianto di Campalto di competenza del Comune di Venezia, i lavori sono ultimati e collaudati.

Legge 67/88 esercizio 1990 (€ 53.969.745,95, pari a 104,5 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 53.969.745,96	€ 51.751.965,37	95,9%	€ 34.068.380,95	63,1%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 29 interventi, di cui 26 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 1 appartenente al settore Territorio e 2 al Monitoraggio e Sperimentazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 53.969.745,96. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 95,9% ed erogati per il 63,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	26	10
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	29	10

Di questi interventi, 21 risultano ultimati e/o collaudati e 4 in avanzata fase di esecuzione. Si descrive ora la situazione degli altri 4 interventi che invece non sono ancora avviati.

1) "Interventi di risanamento igienico sanitario relativi al restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute": l'intervento

è stato finanziato parzialmente con i fondi della legge 798/84, come evidenziato in precedenza, e parte con i fondi di questa legge (L. 67/88 Es. 1990) originariamente destinati al Comune di Chioggia/ASP e rassegnati, di recente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

2) "Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave", per un importo complessivo pari a € 45.900,53. I finanziamenti per quest'opera derivano dall'impegno delle economie di spesa degli interventi finanziati i cui lavori, ultimati e collaudati, hanno determinato una spesa inferiore rispetto a quanto impegnato. Tali economie fanno riferimento sia a questa legge (67/88 Es. 1990) sia alla legge 910/86 - esercizio 87-88. Si ribadisce che alla data del 31.12.2004 il progetto è stato approvato e l'impegno di spesa è stato assunto con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 214 del 17 novembre 2004.

3) "Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)": per quest'opera la Giunta Regionale ha recepito e fatto proprio, con Deliberazione n. 719 del 19/03/2004, il giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale. Questo intervento fa parte del Progetto Integrato Campalto.

Il Progetto Integrato Campalto (PIC) risulta sostanzialmente composto di tre parti:

- 1) collettore acque basse da Via Torino a Campalto (PIC1), per il quale di recente è stata approvata la procedura di VIA;
- 2) impianto di depurazione di Campalto che sarà potenziato da 130.000 a 160.000 abitanti equivalenti. Detto progetto è stato approvato ed è in corso di realizzazione (PIC2);
- 3) opere di finissaggio dei reflui tramite fitodepurazione al fine di raggiungere concentrazioni degli inquinanti in linea con i valori stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999 (PIC3), per le quali il Comune di Venezia sta redigendo il progetto.

4) Il Comune di Venezia, infine, in accordo con il Consorzio di Bonifica Dese Sile di Mestre (VE) sta procedendo ad una radicale riprogettazione di tutta la fase terminale delle fognature afferenti all'impianto di Campalto e finalizzata al controllo dell'inquinamento diffuso urbano. E' stato redatto il Piano Guida datato aprile 1999 e la Giunta Regionale ha recepito e fatto proprio, con Deliberazione n. 719 del 19/03/2004, il giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale. I lavori sono attualmente in corso. L'importo complessivo concesso dalla Regione Veneto all'intervento denominato Progetto Integrato Campalto ammonta a € 67.692.228,00

Legge 67/88 esercizio 1991 (€ 15.803.581,11, pari a 30,6 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.803.581,11	€ 15.803.581,11	100%	€ 15.373.362,35	97,3%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 8 interventi, di cui 7 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 15.803.581,16. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano totalmente impegnati ed erogati per il 97,3%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	7	2
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	8	2

Gli interventi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione risultano ultimati e/o collaudati. In particolare "l'impianto di trattamento R.S.U. di Venezia" risulta terminato. Questo progetto è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia e con i fondi F.I.O.

L'unico intervento rientrante nel settore Monitoraggio e Sperimentazione è il

sistema informativo regionale - progetto SINA, che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2558 del 27 luglio 1999. L'intervento è finanziato con fondi a valere su questa legge e sulla legge 139/92 Es. 1993. I lavori, condotti dall'A.R.P.A.V. sono in avanzata fase di ultimazione.

Legge 67/88 esercizio 1992 1^a tranche (€ 15.338.769,90 pari a 29,7 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.338.769,90	€ 10.305.557,67	67,2%	€ 8.766.726,98	57,2%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 11 interventi, di cui 10 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Territorio, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 15.338.769,90. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 67,2% ed erogati per il 57,2%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	10	3
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	11	4

Degli interventi di fognatura e Depurazione 3 risultano collaudati e 2 con lavori ultimati. In particolare tra questi rientra anche l'intervento dell'Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A. S.R.L.) di "potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - Impianti" per il quale si è utilizzata un'economia risultante dalla conclusione di un

intervento finanziato con la medesima legge.

Le tre opere che risultano con lavori in corso riguardano la "realizzazione di vasche di raccolta di prima pioggia e il completamento delle fognature nei comuni di Strà, Campagna Lupia e Fiesso D'Artico", tutte per conto dell'Azienda Consorzio del Mirese A.C.M. S.p.A.

Infine, l'intervento appartenente al settore Territorio riguarda il "1° stralcio dell'impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego". I lavori, eseguiti da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile, risultano collaudati e il Decreto Regionale del

Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 27 del 31 marzo 1999 ne approva la contabilità finale.

Legge 67/88 esercizio 1992 2^a tranche (€ 30.987.413,94 pari a 60 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,94	€ 14.782.680,23	47,7%	€ 8.347.367,02	26,9%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 10 interventi, di cui 7 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 3 appartenenti al settore Territorio, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,94. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 47,7% ed erogati per il 26,9%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	7	2
Acquedotti		
Territorio	3	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	10	3

Dei 7 interventi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 sono collaudati mentre 3 risultano con lavori in corso. In particolare, 2 di questi sono gestiti dall'Azienda Centro Veneto Servizi e riguardano "interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano" e "interventi di fognatura per impianti di depurazione

minori". Si rileva, inoltre, che gli interventi di fognatura per impianti di depurazione minori hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3178 del 04 dicembre 2003, in merito alla proroga per l'adeguamento degli scarichi ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 luglio 1999.

I 2 interventi del settore Fognatura e Depurazione che risultano ancora in progettazione fanno parte del Progetto Integrato Fusina, per le cui caratteristiche si rimanda a quanto descritto in premessa.

Degli interventi appartenenti al settore Territorio, i lavori per la "sistemazione del Fiume Marzenego - Ramo Beccherie" realizzati dal Consorzio di Bonifica Dese Sile sono stati collaudati e con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 132 del 25 novembre 2002 ne è stata approvata la contabilità finale.

Legge 360/91 (€ 8.263.310,39, pari a 16 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 8.263.310,39	€ 4.039.435,01	48,9%	€ 3.803.309,92	46,0%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 7 interventi, di cui 1 rientrante nel settore Fognatura e Depurazione, 1 appartenente al settore Territorio, 3 relativi all'agricoltura e Zootecnia e 2 relativi alla Bonifica dei Siti Inquinati, come

evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 8.263.310,39. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 48,9% ed erogati per il 46,0%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	1	
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia	3	1
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	7	1

L'unico intervento del settore Fognatura e Depurazione, i cui lavori risultano ultimati, è "l'impianto di trattamento R.S.U. di Venezia". Questo progetto, come già sottolineato in precedenza, è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia e con i fondi F.I.O.

Per quanto riguarda l'intervento rientrante nel settore Territorio, "ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego", il Consorzio di Bonifica Dese Sile ha predisposto il progetto e con Decreto regionale del Dirigente della Direzione Ambiente n. 133 del 13 luglio 2004 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto attiene il progetto relativo al recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano in Venezia e la creazione del cosiddetto "Bosco di Mestre", i lavori risultano ultimati relativamente al 1° stralcio. Il Comune di Venezia ha predisposto il progetto per quanto attiene il 2° stralcio.

Legge 139/92 - esercizio 1993 - I^a fase (€ 180.759.914,68, pari a 350 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 180.759.914,68	€ 178.483.372,67	98,7%	€ 149.966.213,75	83,0%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 68 interventi, di cui 63 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 3 appartenenti al settore Territorio e 2 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 180.759.914,68. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 98,7% ed erogati per l' 83,0%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	63	29
Acquedotti		
Territorio	3	3
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	68	32

Dei 63 interventi del settore Fognatura e Depurazione, 49 risultano essere ultimati e/o collaudati.

Tra gli interventi tuttora in fase di progettazione, rientrano gli "interventi di risanamento igienico sanitario relativi al restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute" della Diocesi Patriarcato di Venezia. In particolare per questo

intervento, è importante ribadire quanto espresso in precedenza: infatti, tale opera è finanziata parzialmente con la riallocazione di fondi delle leggi 798/84, 67/88 - Esercizio 1990 e di questa legge, che revoca fondi originariamente destinati al Comune di Venezia.

Tali revoche e riassegnazioni dei fondi sono state effettuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Una nota particolare la meritano i lavori per la realizzazione del Centro di Biotrattamenti di Camposampiero ad opera dell'azienda Servizi Territorio Ambiente, S.E.T.A. S.p.A.. Questo intervento beneficia di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50), 139/92 - I^a fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3^a fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4^a fase (per € 5.375.864,61) per un totale complessivo di € 24.174.895,74.

I lavori di realizzazione di tale opera hanno subito un rallentamento dovuto ad un ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale in relazione alla graduatoria finale di aggiudicazione dell'opera, presentato dalla seconda ditta classificata. La sentenza favorevole per la stazione appaltante, porta la data del 23 maggio 2002 ed è stata depositata il 15 gennaio 2003. A tutt'oggi i lavori sono in fase di esecuzione.

I 3 interventi rientranti nel settore Territorio sono stati tutti collaudati e riguardano le "sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)" del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta e "l'intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo" e l' "area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica" del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione.

Infine vi sono due interventi relativi al settore Monitoraggio e Sperimentazione. Il primo riguarda l' "estensione della rete agrometeorologica" di A.R.P.A.V. per il quale i lavori risultano ultimati. Il secondo è inerente ad "interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua", sempre dell' A.R.P.A.V., e rientra nel progetto SINA. L'intervento è finanziato con fondi a valere su questa legge e sulla legge 67/88 Es. 1991. I lavori, condotti dall'A.R.P.A.V. sono in avanzata fase di ultimazione.

Legge 139/92 - II^a fase (€ 165.266.207,71, pari a 320 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 165.266.207,64	€ 110.475.575,23	66,8%	€ 80.118.757,94	48,5%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 49 interventi, di cui 18 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 22 appartenenti al settore Territorio, 4 relativi al settore Agricoltura e Zootecnia e 5 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 165.266.207,64. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 66,8% ed erogati per il 48,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	18	4
Acquedotti		
Territorio	22	5
Agricoltura e Zootecnia	4	
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	5	
Ospedali		
TOTALE	49	9

Dei 18 interventi del settore Fognatura e Depurazione che sono tuttora in corso di progettazione, 7 riguardano opere di competenza del Comune di Venezia, di cui 4 relative ad opere rientranti nell'ambito del Progetto Integrato Campalto.

L'unica opera con progetto approvato ma i cui lavori non sono ancora avviati, riguarda gli *"Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V."* del Comune di Venezia. Per tale progetto la Giunta Regionale ha recepito e fatto proprio, con Deliberazione n. 719 del 19/03/2004, il giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale. Infine sono tuttora in corso i lavori per l'*"ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)"*.

Le opere relative al settore Territorio la cui progettazione è in corso sono 5. Di queste 2 sono di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile e riguardano il Progetto Campalto: si tratta, infatti, del *"risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego"* e della *"costruzione del I tronco del collettore Acque Basse"*.

Tra i progetti approvati ma i cui lavori non sono ancora partiti, si ricordano gli *"interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo"* del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e gli *"interventi di ristrutturazione della rete di bonifica dell'area centrale del medio corso dei fiumi Dese e Zero nei comuni Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe, Piombino Dese e Mogliano Veneto tributaria dei corsi d'acqua consortili Piovega di Cappella, Scolo Desolino, Rio S. Ambrogio e Piovega di Levada"*, del Consorzio di Bonifica Dese Sile. Si sottolinea che per quest'ultimo intervento il consorzio di bonifica Dese Sile ha appena concluso l'iter espropriativo, pagato le indennità di esproprio agli espropriandi e acquisito le aree necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Tra gli interventi i cui lavori stanno procedendo, si ricordano gli *"interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana"* del Consorzio di Bonifica Dese Sile e le opere di *"riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia"* ad opera del Comune di Noale. Con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 28 del 15 maggio 2000, è stato deliberato il non assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni di questo intervento. In particolare per la sua realizzazione si rileva l'importante collaborazione maturata tra l'amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica Dese Sile, sia in fase di progettazione che di conduzione dei lavori.

Nel settore Agricoltura e Zootecnia, con DGR n. 2876 del 28 luglio 1998, la Giunta Regionale ha avviato tutte le attività connesse con l'erogazione di contributi a soggetti privati operanti nell'agricoltura e nella zootecnia per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rilascio di eutrofizzanti nei corsi d'acqua sfocianti nella laguna di Venezia; l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti si è conclusa già da tempo, per alcuni interventi i lavori sono in corso di esecuzione, per altri sono già terminati e collaudati.

Verificato che nel settore zootecnico molti progetti non risultano realizzati, il Consiglio Regionale, con DCR n. 103/2002 ha provveduto a riallocare € 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire, per la gestione delle pratiche agricole nel Bacino Scolante, produzione di energia rinnovabile da culture a minor rilascio di nutrienti. Detti fondi sono stati definitivamente assegnati, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2834 del 10 settembre 2004, a Veneto Agricoltura, per € 3.300.000,00, e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 per € 12.181.000,00 a numerosi altri interventi.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione sono tutti in corso di realizzazione, mentre per quanto riguarda *"il potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto"* i lavori risultano ultimati

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92- II^a fase (€ 40.349.825,52, pari a circa 78,13 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 40.349.825,52	€ 10.418.248,02	25,8%	€ 1.690.148,62	4,1%

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002 ha provveduto a ripartire la somma complessiva di € 40.385.977,50 in ragione delle più favorevoli condizioni rinegoziate dagli uffici regionali per l'assunzione del mutuo per il finanziamento degli interventi di cui alle leggi n. 139/1992 - II^a fase e n. 515/1996 - IV^a fase

In questa sezione si analizza lo stato della spesa della quota riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla legge 139/92 - II^a fase (per la destinazione della quota di finanziamento riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla legge 515/96 - IV^a fase si rimanda alla sezione dedicata).

I fondi così ottenuti sono stati destinati al finanziamento di 33 interventi, soprattutto di fognatura e depurazione, come evidenziato dalla seguente tabella.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	27	
Acquedotti		
Territorio	4	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	33	1

Per il settore Fognatura e Depurazione, si tratta di 27 interventi, in gran parte per l'adeguamento degli impianti di depurazione ai limiti del D.M. 30 luglio 1999 e per la realizzazione di condotte fognarie.

Per la maggior parte di detti interventi la progettazione è in corso, mentre solo per 4 interventi i lavori sono in corso.

Nel settore Territorio, l'unica opera collaudata sono gli *"interventi di completamento ed adeguamento per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"* di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.

Per quanto riguarda il settore della Bonifica Siti Inquinati, i fondi sono stati assegnati per il finanziamento di due interventi, entrambi ancora in fase di progettazione: il primo è di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia e riguarda un *"impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia"*. Il secondo, invece, è stato assegnato alla Azienda Speciale del Porto di Chioggia per la *"bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio"*.

Legge 539/95 - esercizio 1996 - II^a fase (€ 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	100%	€ 14.576.754,50	94,1%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 16 interventi, tutti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 15.493.706,97. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano totalmente impegnati ed erogati per il 94,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	16	12
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	16	12

Di questi 16 interventi, 12 risultano collaudati e 2 con lavori ultimati: tra questi ultimi, rientrano le opere relative allo *scavo dei Rii del Centro storico di Venezia*.

Questo particolare intervento consiste nell'esecuzione di opere e di servizi di manutenzione urbana del Centro Storico e di parte delle isole di Venezia con particolare riferimento al

suolo, al sottosuolo e al sistema dei rii e dei ponti.

Il progetto prevede la manutenzione complessiva di tutte le infrastrutture di urbanizzazione comprensiva del recupero funzionale dei muri di sponda, il restauro e/o ricostruzione dei ponti, la manutenzione della pavimentazione, la difesa dalle maree medio-alte attraverso rialzi della pavimentazione.

Per quanto riguarda la quota a carico della Regione Veneto relativa al risanamento igienico-sanitario, il progetto prevede lo scavo dei rii ed il radicale ripristino ed adeguamento del sistema di collettamento e smaltimento fognario.

L'unico intervento i cui lavori sono ancora in corso riguarda la *"realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero"* ad opera dell'Azienda Servizi Territorio Ambiente, S.E.T.A. S.p.A.: e' importante ricordare che tale intervento beneficia anche di un altro finanziamento derivante dalla legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase.

Si ricorda, infine, un intervento dell'Azienda Piovese Gestione Acque, A.P.G.A. s.r.l., il cui progetto è stato approvato, per la realizzazione di "un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco" che utilizza fondi derivanti dall'utilizzo delle economie di spesa maturate da altri progetti già conclusi.

Legge 539/95 - esercizio 1997 - III^a fase (€ 30.987.413,95, pari a 60 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
	€	%	€	%
€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95	100%	€ 28.440.698,58	91,8%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 20 interventi, di cui 19 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Ospedali, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,95. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano totalmente impegnati ed erogati per il 91,8%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	19	8
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	
TOTALE	20	8

Per gli interventi del settore Fognatura e Depurazione solo 2 risultano tuttora con lavori in corso: si tratta della "Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon" ad opera della stessa amministrazione comunale e dell' "ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani" da parte dell'Azienda Servizi Territorio

Ambiente, SE.T.A. S.P.A.

Tra gli interventi ultimati, si ricorda quello relativo allo "scavo dei Rii nel centro storico di Venezia" ed quello relativo al "completamento dell'impianto R.S.U. di Venezia" ad opera dell'Ente di Bacino R.S.U. di Venezia 2.

Infine per quanto riguarda l'intervento relativo al "dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia - 2° stralcio", i lavori risultano ultimati.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento di biotattamento del Comune di Camposampiero, ad opera dell'Azienda Servizi Territorio Ambiente, SE.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato su questo progetto nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 - esercizio 1993 - I^a fase.

Legge 515/96 - esercizio 1997 - III^a fase (€ 103.291.379,82, pari a 200 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
	€	%	€	%
€ 103.291.379,82	€ 85.154.088,74	82,4%	€ 65.561.612,81	63,5%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 64 interventi, di cui 59 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 relativi al settore Territorio, 2 alla

Bonifica dei Siti inquinati in Porto Marghera e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 103.291.379,82. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per l'82,4% ed erogati per il 63,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	59	29
Acquedotti		
Territorio	2	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	64	29

Degli interventi relativi al settore Fognatura e Depurazione, 43 risultano ultimati e/o collaudati. Tra quelli ultimati rientra anche lo "scavo dei Rii nel centro storico di Venezia".

Tra le opere con lavori in corso si ricorda l' "ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme" dell'Azienda Servizi Territorio

Ambiente, S.E.T.A. S.p.A., l' "ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale" del Comune di Zero Branco e il "progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo" dell'azienda Consorzio del Mirese A.C.M. S.p.A. Per tutti gli altri interventi (20) del 28° Lotto, ricadenti nei comuni dell'A.C.M. i lavori risultano, invece, tutti ultimati e/o collaudati.

Tra gli interventi ancora in fase di progettazione rientrano i lavori di "restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute" ad opera della Diocesi Patriarcato di Venezia che, come più volte ricordato in precedenza, è finanziata parzialmente con la riallocazione di fondi delle leggi 798/84, 67/88 - Esercizio 1990, 139/92 - Esercizio 1993 e di questa legge, che revoca fondi originariamente destinati al Comune di Venezia. Tali revoche e riassegnazioni dei fondi sono state effettuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

I due interventi del settore Territorio che risultano in fase di attuazione, riguardano i lavori di "riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia" del Comune di Noale (si veda quanto già riportato per la Legge 139/1992 -II^a fase) e le opere di "miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulici delle Isole Treportine in comune di Cavallino Treporti" del Consorzio di Bonifica Basso Piave per le quali è stato stabilito un nuovo termine di fine lavori.

Infine, per quanto riguarda i lavori di "potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica" di A.R.P.A.V., i lavori sono in fase di ultimazione.

Maggiori e più favorevoli mutui dalle Leggi 539/95 e 515/96 - III^a fase (€ 21.342.612,00, pari a 41,32 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%
€ 21.342.612,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%

L'ammontare di tali fondi deriva, per € 3.954.247,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della legge 539/95 e per € 17.388.364,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della legge 515/96. Questo finanziamento è stato assegnato ad un unico intervento. Si tratta del Progetto Integrato Fusina. L'utilizzo di questi fondi viene previsto dall'ultimo riparto di spesa, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004.

Legge 515/96 - esercizio 1998 - IV^a fase (€ 61.187.231,14, pari a 118,475 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 61.187.231,12	€ 49.285.685,81	80,5%	€ 37.385.016,96	61,1%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 68 interventi, di cui 65 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 1 relativo al settore Territorio e 2 appartenenti al settore Monitoraggio e Sperimentazione, come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 61.187.231,12. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per l'80,5% ed erogati per il 61,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	65	10
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	68	10

I 65 interventi del settore Fognatura e Depurazione riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione.

Di questi progetti, 32 risultano già ultimati e collaudati od in fase di collaudo, mentre di altri 25 i lavori sono in avanzata fase di realizzazione.

Per quanto riguarda gli altri interventi di cui è stato approvato il progetto, si

tratta di alcune opere di fognatura la cui gestione è affidata a 3 aziende di servizi idrici Integrati: Azienda Servizi Territorio Ambiente SE.T.A. S.p.A., l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e i Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento del Centro di biotattamento del Comune di Camposampiero, ad opera Azienda Servizi Territorio Ambiente SE.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato per la Legge 139/1992 - esercizio 1993 - I^a fase.

Per quanto riguarda l'unico intervento del settore Territorio, si tratta degli interventi realizzati dal Magistrato alle Acque di Venezia per "il ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta". I lavori risultano in avanzata fase di realizzazione.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 - IV^a fase (€ 36.151,98, pari a 70 milioni di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 36.151,98	€ 36.151,98	100%	€ 6.501,93	17,9%

I fondi sono stati destinati ad una sola opera di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile inerente *"il completamento e l'adeguamento degli interventi per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"*. I lavori sono stati collaudati e gli atti sono stati approvati con il Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 105 del 8 giugno 2004. Tale intervento fa parte del riparto di spesa approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002.

Legge 345/97 - esercizio 1998 - V^a fase (€ 142.025.647,25, pari a circa 275 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 142.025.647,26	€ 77.604.790,96	54,6%	€ 49.812.954,57	35,1%

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 31 interventi, distribuiti su quasi tutti i settori di intervento, ad esclusione del settore degli Ospedali, come evidenziato dalla seguente tabella. Infatti gli interventi riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione, di riqualificazione di corsi d'acqua e di bonifica di siti inquinati ed opere acquedottistiche ed interventi nel settore agricolo e zootecnico. Infine 1 progetto è relativo allo *"scavo Rii nel centro storico di Venezia"*.

I finanziamenti ammontano a € 142.025.647,01. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per l'54,6% ed erogati per il 35,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	10	1
Acquedotti	4	
Territorio	10	
Agricoltura e Zootecnia	1	
Bonifica siti inquinati	4	1
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	31	1

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in corso di realizzazione. Alcuni di questi sono stati sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Inoltre 4 interventi sono già stati ultimati e 1 inerente gli *"interventi di fognatura in comune di S. Elena"* ad opera dell'Azienda centro Veneto Servizi è stato collaudato: il Decreto Regionale

del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 147 del 20 ottobre 2003 approva la contabilità finale dell'opera.

Per quanto riguarda le opere acquedottistiche, il finanziamento a favore dell'*"Acquedotto sostitutivo dei pozzi del Cavallino"*, affidato al Consorzio di Bonifica Basso Piave, è stato definitivamente revocato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3521

del 12 novembre 2004, per carenze progettuali. La quota revocata ammonta a € 12.857.632,91 ed è stata così ripartita: la quota più consistente, pari a € 10.857.632,91, è stata assegnata alla Diocesi Patriarcato di Venezia per i "lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute", mentre la parte rimanente pari a € 2.000.000,00 è stata assegnata alla Comunità Ebraica di Venezia sempre per i "lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia".

Il progetto di "interconnessione dei sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia", gestito dalla Società Delta Po S.p.A. (ora Veneto Acque S.p.A.), è stato approvato con Decreto Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 344 del 10 ottobre 2000 ed i lavori sono in corso di esecuzione.

Con la DGR n. 3968 del 9 novembre 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Magistrato alle Acque del Veneto per la realizzazione degli interventi Torre di Burri e Botte di Conche. Ai sensi del suddetto accordo detti lavori vengono cofinanziati per € 6.197.482,79, pari a 12 miliardi ciascuno, dalla Regione Veneto e dal Magistrato alle Acque di Venezia che provvede inoltre al coordinamento dell'intervento in parola.

Per quanto riguarda il settore Agricoltura e Zootecnia, l'unico intervento finanziato riguarda gli "incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole", per il quale i lavori sono in corso.

Tra gli interventi di Bonifica di Siti Inquinati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, rientra la "bonifica delle "Corti femminili" a Mestre" per opera del Comune di Venezia che è stata collaudata e la "bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)". Per questo ultimo intervento è stata erogata una quota per la progettazione, che è tuttora in corso.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione di competenza dell'A.R.P.A.V. e che riguardano il "potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto" e il "sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante", sono in avanzata fase di realizzazione.

Legge 448/98 - esercizio 1999-2000-2001 - VI^a fase (€ 235.504.345,99, pari a 456 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 235.504.345,99	€ 137.853.897,21	58,5%	€ 57.101.001,59	24,2%

Il Consiglio Regionale ha approvato il riparto dei fondi attribuiti dalla Legge 448/1999, individuando un cospicuo numero di interventi ed i relativi soggetti attuatori, con Deliberazione n. 23 del 1 marzo 2000. I finanziamenti ammontano a € 235.504.345,99.

Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per l'58,5% ed erogati per il 24,2%.

Si tratta infatti di 111 interventi di cui 75 relativi al settore Fognatura e Depurazione (di cui 1 relativo allo scavo *Rii nel centro storico di Venezia*), e 11 inerenti al settore Territorio. Gli altri si distribuiscono equamente tra tutti i rimanenti settori, ad esclusione degli Ospedali.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	75	2
Acquedotti	6	
Territorio	11	
Agricoltura e Zootecnia	5	
Bonifica siti inquinati	8	1
Monitoraggio e sperimentazione	6	
Ospedali		
TOTALE	111	2

La maggior parte degli interventi è in corso di realizzazione, in particolare 39 relativi ad opere di fognatura e depurazione.

Inoltre, 14 interventi di fognatura e depurazione sono stati ultimati mentre 2 sono stati collaudati, uno relativo agli *"interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X e Loria"* in gestione all'Azienda Servizi Idrici della

Castellana e l'altro relativo all' *"ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia"* di competenza dell'Azienda Servizi Territorio Ambiente S.E.T.A. S.p.A.

Una quota consistente di interventi, pari a 26, è ancora in fase di progettazione.

E' stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 2004 un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Mira ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira che consentirà:

- a) l'aumento della capacità fitodepurativa del sistema idraulico di scolo, in particolare dello scolo Giare, con interventi di rinaturalizzazione dell'alveo, la creazione di golene sommerse, adeguata piantumazione delle rive e la creazione di alcuni specchi d'acqua avendo come riferimento l'assetto morfologico storico dell'ambito;
- b) la creazione nell'estremo sud dell'area, a ridosso della Laguna di Venezia, di un ambito di interesse paesaggistico - naturalistico ed ecologico caratterizzato dalla presenza di un'area umida d'acqua dolce, fruibile anche per attività didattiche e ricreative, compatibilmente con le funzioni agricole presenti;
- c) migliorare complessivamente la qualità paesaggista e ambientale del sito;

In relazione al progetto relativo al centro di biotattamento di Camposampiero, ad opera dell'Azienda Servizi Territorio Ambiente S.E.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 - esercizio 1993 - I^a fase.

Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^a fase (€ 205.033.388,94, pari a 397 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,96	€ 75.813.267,83	37,0%	€ 13.158.196,55	6,4%

Il Consiglio Regionale, con DCR n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi, attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997, gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 102 interventi, la maggior parte suddivisi tra i settori Fognatura e Depurazione (66), Territorio (20) e Bonifica Siti Inquinati (11), come evidenziato dalla seguente tabella. I finanziamenti ammontano a € 205.033.388,96. Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per il 37,0% ed erogati per il 6,4%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	66	
Acquedotti	1	
Territorio	20	
Agricoltura e Zootecnia	3	
Bonifica siti inquinati	11	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	102	

Per quanto riguarda l'intervento relativo al "Progetto Integrato Fusina" valgono le considerazioni già riportate in precedenza.

Considerato che i finanziamenti relativi alla Legge 488/1999 riconosciuti agli Enti attuatori sono stati imputati nell'esercizio di spesa degli anni 2002-2003, la maggior parte degli interventi è

in fase di progettazione (49) o in fase di appalto, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo con provvedimento regionale (21).

E' importante sottolineare anche il cospicuo numero di interventi in corso di realizzazione (30).

Gli interventi i cui lavori sono già stati ultimati sono 2, entrambi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione. Il primo riguarda la "costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)", il secondo è costituito dagli "interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo", entrambi gestiti dall'Azienda Servizi Idrici Castellana e per i quali è in corso il collaudo.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. - Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della "sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia". I lavori di quest'opera sono in corso.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al "sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l'area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto". I lavori sono in avanzata fase di realizzazione.

Leggi n. 388/2000 e 448/2001 - esercizio 2002-2003-2004 - VIII^a fase (€ 286.824.446,15, pari a circa 555,37 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 3.710.000,00	1,3%	€ 795.580,56	0,3%

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le leggi 388/2000 e 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge 388/2000 e € 189.123.000,00 dalla Legge 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00.

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla legge 139/92 - II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle leggi n. 539/95 e n. 515/96 - III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

Alla data del 31.12.2004 i finanziamenti risultano impegnati per l' 1,3% ed erogati per lo 0,3%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	96	
Acquedotti	1	
Territorio	51	
Agricoltura e Zootecnia	7	
Bonifica siti inquinati	1	
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
TOTALE	165	

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto, come si evince dalla tabella, sono 165. La maggior parte di questi rientra nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

In particolare i finanziamenti assegnati ai Consorzi di Bonifica, sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi


consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il Progetto Integrato Fusina, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00, che verranno successivamente suddivisi in base alle richieste di intervento per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali, ... Tra gli interventi, in particolare, si prevede di stanziare € 3.000.000,00 per la bonifica del Basso Corso del Fiume Marzenego - Osellino, alla presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile del relativo progetto.

Infine, € 20.000.000,00 sono stati assegnati alla Delta Po S.p.A. (ora Veneto Acque S.p.A.) nell'ambito "del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – Schema Veneto Centrale, segmento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia".

**Il Dirigente del Servizio
Legge Speciale per Venezia
Dott.ssa Gisella Penna**



Segreteria Regionale all'Ambiente e ai Lavori Pubblici
Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente
Servizio Legge Speciale per Venezia

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI
INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE
VENETO CON I FONDI DELLA
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
SUDDIVISO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO



Aggiornamento al 31 Dicembre 2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	€ 41.316.551,93	€ 36.049.897,79 87,3%	€ 30.913.038,96 74,8%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	€ 51.645.689,91	€ 47.446.033,50 91,9%	€ 45.518.828,04 88,1%
Legge 910/86 Es. 1989	€ 38.734.267,43	€ 37.757.647,44 97,5%	€ 24.839.866,19 64,1%
Legge 67/88 Es. 1988	€ 18.334.219,92	€ 11.851.990,41 64,6%	€ 4.709.224,67 25,7%
Legge 67/88 Es. 1990	€ 53.969.745,96	€ 51.751.965,37 95,9%	€ 34.068.380,95 63,1%
Legge 67/88 Es. 1991	€ 15.803.581,11	€ 15.803.581,11 100,0%	€ 15.373.362,35 97,3%
Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a tranche	€ 15.338.769,90	€ 10.305.557,67 67,2%	€ 8.766.726,98 57,2%
Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a tranche	€ 30.987.413,94	€ 14.782.680,23 47,7%	€ 8.347.367,02 26,9%
Legge 360/91	€ 8.263.310,39	€ 4.039.435,01 48,9%	€ 3.803.309,92 46,0%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 139/92 Es. 1993	€ 180.759.914,68	€ 178.483.372,67 98,7%	€ 149.966.213,75 83,0%
Legge 139/92 II fase	€ 165.266.207,64	€ 110.475.575,23 66,8%	€ 80.118.757,94 48,5%
Legge 139/92 Magg. Mutui II ^a fase	€ 40.349.825,52	€ 10.418.248,02 25,8%	€ 1.690.148,62 4,2%
Legge 539/95 Es. 1996	€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97 100,0%	€ 14.576.754,50 94,1%
Legge 539/95 Es. 1997	€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95 100,0%	€ 28.440.698,58 91,8%
Legge 539/95 Magg. Mutui III ^a fase	€ 21.342.612,00	€ 0,00 0,0%	€ 0,00 0,0%
Legge 515/96 Es. 1997	€ 103.291.379,82	€ 85.154.088,74 82,4%	€ 65.561.612,81 63,5%
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	€ 61.187.231,12	€ 49.285.685,81 80,5%	€ 37.385.016,96 61,1%
Legge 515/96 Magg. Mutui IV ^a fase	€ 36.151,98	€ 36.151,98 100,0%	€ 6.501,93 18,0%
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	€ 142.025.647,26	€ 77.604.790,96 54,6%	€ 49.812.954,57 35,1%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	€ 235.504.345,99	€ 137.853.897,21 58,5%	€ 57.101.001,59 24,2%
Legge 488/99 Es. 2002, 2003	€ 205.033.388,96	€ 75.813.267,83 37,0%	€ 13.158.196,55 6,4%
Legge 388/00, Es. 2002,2003,2004 448/01	€ 286.824.446,15	€ 3.710.000,00 1,3%	€ 795.580,56 0,3%
TOTALE	€ 1.762.495.822,54	€ 1.005.104.987,89	€ 674.953.543,43
PERCENTUALE SU TOTALE		57,03%	38,30%

**SUDDIVISIONE PER LEGGE DI FINANZIAMENTO E PER SETTORI DI INTERVENTO
AL 31.12.2004**

	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	29.954.500,15	24.687.846,01	23.216.343,43
2	Acquedotti	5.164.568,99	5.164.568,99	1.499.212,75
3	Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79
TOTALE		41.316.551,93	36.049.897,79	30.913.038,96

	Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	45.448.207,13	41.248.550,71	40.049.678,39
2	Acquedotti	1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66
3	Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
TOTALE		51.645.689,92	47.446.033,50	45.518.828,03

	Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	32.020.327,74	31.043.707,75	22.257.581,69
2	Acquedotti	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00
3	Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50
TOTALE		38.734.267,43	37.757.647,44	24.839.866,19

	Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.005.081,94	1.522.852,43	1.388.275,63
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.320.949,04
3	Ospedali			
TOTALE		18.334.219,92	11.851.990,41	4.709.224,67

	Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	53.969.745,96	51.751.965,37	34.068.380,95
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		53.969.745,96	51.751.965,37	34.068.380,95

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35

	Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.338.769,90	10.305.557,67	8.766.726,98
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		15.338.769,90	10.305.557,67	8.766.726,98

	Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	30.987.413,94	14.782.680,23	8.347.367,02
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		30.987.413,94	14.782.680,23	8.347.367,02

	Legge 360/91	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.263.310,39	4.039.435,01	3.803.309,92
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		8.263.310,39	4.039.435,01	3.803.309,92

	Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	180.759.914,68	178.483.372,67	149.966.213,75
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		180.759.914,68	178.483.372,67	149.966.213,75

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legge 139/92 II fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	165.266.208,33	110.475.575,22	80.118.757,93
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		165.266.208,33	110.475.575,22	80.118.757,93

	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	40.349.825,52	10.418.248,02	1.690.148,62
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		40.349.825,52	10.418.248,02	1.690.148,62

	Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.493.706,97	15.493.706,97	14.576.754,50
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		15.493.706,97	15.493.706,97	14.576.754,50

	Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	27.630.444,10	27.630.444,10	25.123.288,55
2	Acquedotti			
3	Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04
TOTALE		30.987.413,95	30.987.413,95	28.440.698,59

	Legge 539-95 Magg. Mutui III fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	21.342.612,00	0,00	0,00
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		21.342.612,00	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515/96 Es. 1997		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	103.291.379,83	85.154.088,74	65.561.612,82
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		103.291.379,83	85.154.088,74	65.561.612,82

Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	61.187.231,14	49.285.685,85	37.385.016,99
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		61.187.231,14	49.285.685,85	37.385.016,99

Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	36.151,98	36.151,98	6.501,93
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
TOTALE		36.151,98	36.151,98	6.501,93

Legge 345/97 Es. 1998 - V fase		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	119.351.045,26	54.930.189,21	29.978.352,82
2	Acquedotti	22.674.601,75	22.674.601,75	19.834.601,75
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
TOTALE		142.025.647,01	77.604.790,96	49.812.954,57

Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	201.934.646,91	115.307.776,90	50.630.322,33
2	Acquedotti	33.569.698,44	22.546.120,32	6.470.679,26
3	Ospedali			
TOTALE		235.504.345,36	137.853.897,22	57.101.001,59

Legge 488/99 Es. 2002, 2003		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	194.704.251,17	65.484.129,86	10.059.455,15
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40
3	Ospedali			
TOTALE		205.033.389,16	75.813.267,84	13.158.196,55

Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	263.824.446,15	3.710.000,00	795.580,56
2	Acquedotti	20.000.000,00	0,00	0,00
7	Ospedali	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE		286.824.446,15	3.710.000,00	795.580,56

COMPLESSIVO LEGGI DI FINANZIAMENTO		Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	1.634.962.802,35	911.595.545,80	623.163.032,30
2	Acquedotti	107.231.714,14	76.208.136,02	34.528.764,86
3	Ospedali	20.301.306,12	17.301.306,12	17.261.746,32
TOTALE		1.762.495.822,61	1.005.104.987,93	674.953.543,48

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5541 DEL 10/11/1996	DDDA N.120 6/9/1990	1.885.067,68	1.885.067,68	1.838.810,70	Lavori collaudati	07/10/1997	26/10/1999	26/10/2000	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/12/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1986	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1986	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	02/10/1986	24/08/1992	29/04/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Vailli		DGR N. 3002 DEL 26/05/1987		149.772,50	149.772,50	149.772,50	Lavori collaudati			05/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 164.640,48. Supero di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4687 DEL 20/09/1995		883.141,30	883.141,30	629.320,45	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione aclarante
COMUNE DI JESOLO Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.146,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1996, un'economia pari a € 8.993,34 da rescrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
COMUNE DI MARCON Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDLP N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto del LL.PP n. 7 del 28/03/2000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	267.079,24	267.079,24	240.371,31	Lavori collaudati	25/06/2001	17/06/2002	14/01/2003	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo da parte del Comune di Marcon. Ente esecutore dei lavori. Consorzio Sille Piave
COMUNE DI MOGLIANO VENETO												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 994 DEL 09/10/1986	413.165,52	413.165,52	378.748,50	Lavori collaudati			14/11/1995	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1995, un'economia pari a € 34.417,02 impegnata sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
2	Fognatura frazioni di Bonisolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 875 DEL 12/09/1986	258.228,45	258.228,45	231.666,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/03/1988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
COMUNE DI VENEZIA												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudicecca.	1/3.6		DDEA N. 54 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05					L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo							Fondi riallocati nell'int. 2A				
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originato pari a € 516.456,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
3	Costruzione della fognatura di TREPONTI		DGR N. 1175 DEL 26/03/1985	DDLP N. 1190 23/12/1987	1.394.433,63	1.394.433,63	1.379.989,31	Lavori collaudati	14/11/1988	26/02/1991	16/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 55 del 09/02/1996, per € 1.379.989,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.357,55
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDLP N. 1006 26/10/1987	1.595.851,82	1.595.851,82	1.587.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	06/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.861,61.
5	Completamento scollmatore bacino S. Giuliano (VE)			DDLP N. 1003 26/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	16/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 23/08/1994, un'economia pari a € 3.795,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		DGR N. 2992 DEL 26/05/1987	DDLP N. 1002 26/10/1987	619.748,28	619.748,28	605.927,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/09/1988	26/01/1996	Registrata, con DDLP n. 285 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		DGR N. 5691 DEL 29/09/1987	DDL N. 1001 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	1.491.506,77	Lavori collaudati	18/01/1988	31/05/1989	08/04/1991	Registrata, con DDLP n. 118 del 11/05/1994, un'economia pari a € 625.966,51, destinata in parte all'intervento ZZA.
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		DGR N. 5590 DEL 29/09/1987	DDL N. 1000 26/10/1987	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori collaudati	13/01/1988	06/01/1989	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 32 del 23/02/1999. Con DDLP n. 75 del 31/03/1999 si concede un ulteriore finanziamento per € 6.201,73.
9	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		DGR N. 999 DEL 26/10/1987	DGR N. 999 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	2.077.719,51	Lavori collaudati	12/01/1988	25/05/1989	16/03/1992	Registrata, con DDLP n. 322 del 10/11/1994, un'economia pari a € 39.753,78.
10	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		DGR N. 2994 DEL 26/05/1987	DDL N. 1005 26/10/1987	852.153,88	852.153,88	823.357,07	Lavori collaudati	11/01/1988	15/12/1988	08/05/1997	Registrata, con DDLP n. 301 del 06/08/1997, un'economia pari a € 28.796,81.
11	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	676.558,54	676.525,62	675.525,62	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
12	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera (vasca di arrivo del collettore)			DDL N. 949 21/10/1987	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/10/1987	08/04/1988	22/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 95 del 11/05/1998. Con DDLP 255 del 15/10/1998 finanziato aumento revisione prezzi per € 10.940,59.
13	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	1/3.6.A		DDEA N. 54 17/10/1991	4.820.923,49	0,00	0,00	Progetto in fase di redazione				Interventi gestiti dalla società INSULA
CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DDL N. 909 10/12/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	1990	08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
2	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DR N. 762 08/08/1990	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	1989	30/11/1990	15/10/1992	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
ULSS 12 VENEZIA Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)			DPGR N.1523 16/12/1986	206.582,76	206.582,76	184.286,86	Lavori collaudati	23/03/1987	21/04/1987	16/01/1989	Registrata, con DDLP n. 422 del 11/12/2003, un'economia pari a € 20.183,39
2	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese		DPGR N. 621 DEL 20/07/1987	DEL 26/10/1987	2.375.701,74	2.375.701,74	2.375.701,74	Lavori collaudati	14/09/1987	16/07/1989	15/06/1989	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 424 del 11/12/2003
A.P.G.A.												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevizio			DDLP N. 471 26/07/1988	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08	Lavori collaudati	28/03/1988	24/05/1991	26/09/1996	Registrata, con DDLP n. 491 del 27/11/1996, un'economia di € 5.804,16
S.P.I.M.												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.B	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	54.110,77	Lavori in corso				
VE.S.T.A.												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	(Acquedotto di Venezia (ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo (94 della nuova centrale di sollevamento V.) sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.9		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	Progetto approvato				
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	DGR 4976 02/11/1993		444.697,73			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/5.1
TOTALE					41.316.551,93	36.049.897,79	30.913.038,96					87,25% 74,82%

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
3	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanello d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acciariante
COMUNE DI JESOLO												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
2	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE), 2° Stralcio	1/1.4.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DGR N. 158 27/9/1996	46.551,70	46.551,70	46.551,70	Lavori collaudati	03/07/1996	03/11/1996	29/01/1997	Registrata, con DDDA n. 29 del 15/05/2000, un'economia di € 54.485,00 reimpiegata nell'intervento 12
3	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 162 2/10/1996	95.639,10	95.639,10	95.639,10	Lavori collaudati	07/01/1997	16/04/1997	24/07/1997	Registrata, con DDDAn. 98 del 21/10/1999, un'economia di € 64.462,54 reimpiegata nell'intervento 11
4	Interventi alle reti - parte 1° parte 2ª	1/1.4.3 a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 71 23/6/1997	242.406,28	242.406,28	242.406,28	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
5	Opere di completamento fognario	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	59.686,88	59.686,88	11.312,06	Lavori in corso				Dati non forniti dall'ente
COMUNE DI JESOLO - ASI												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
11	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo (€ 64.462,00)	1/1.4.4 a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 27 12/3/2001	64.462,54	64.462,54	56.784,85	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				Finanziamento costituito dall'economia di € 64.462,54 dell'intervento 3 del comune di Jesolo
12	Progetto definitivo rete fognatura in Via Rusti - Comune di Jesolo (€ 54.485,00)	1/1.4.1 bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	54.485,86	54.485,86	54.485,86	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				Finanziamento costituito dall'economia di € 54.485,86 dell'intervento 2 del comune di Jesolo
COMUNE DI MUSILE												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
1	Lavori di costruzione del lotto n. 1 Impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DPGR N. 2817 28/12/1990	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
2	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/3.1bi s ECO	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA 214 17/11/2004	26.788,59	26.788,59	0,00	Progetto approvato				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 910-86 Es. 87-88

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	DGR N. 259 25/01/1994	DDDA N. 26 11/04/1991	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/04/1995	20/01/1997	20/11/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 102 del 20/11/2000
COMUNE DI VENEZIA												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
14	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocopa e via Canal - Marghera V. (VE)	1/1.5	DGR N. 259 DEL 25/01/1994	DDDA N. 9 12/09/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	919.192,17	Lavori collaudati	20/10/1997	22/06/1999	12/04/2000	La Regione ha utilizzato parte del finanziamento per € 15.493,70, destinando il rimanente pari a € 1.017.420,09 al Comune di Venezia. In attesa di ricevere la richiesta di saldo da parte del Comune di Venezia.
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9		DDDA N. 14 11/10/1990	133.601,63	133.601,63	133.601,63	Progetto approvato				Modifica del progetto approvato utilizzando il finanziamento regionale oltre a fondi propri del Comune: in attesa della documentazione da parte del Comune
16	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		DGR N. 4976 DEL 21/11/1993		2.582.284,50			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.582.284,50 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004.
17	Costruzione della rete di fognatura di S. Maria (VE)	1/3.7	DGR N. 4976 DEL 21/11/1993	DDDA N. 7 23/2/1993	2.065.827,60	2.065.827,60	1.859.244,84	Lavori collaudati	29/09/1997	09/03/2001	22/02/2002	Dati attesi da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale
18	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE) Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mil	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	3.615.198,29	3.615.198,29	2.975.311,14	Lavori ultimati				Dati attesi da parte del Comune di Venezia
REGIONE - DISINQUINAMENTO												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
1	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	424.340,91	424.340,91	424.340,91	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
2	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	1/1.3		DDDA N. 7 12/9/1990	1.549.370,70	1.549.370,70	1.632.913,17	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 81/96. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 55/2001
3	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chiripignano - Mestre (VE)	1/1.2		DDDA N. 6 12/9/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.885.581,27	Lavori collaudati			31/07/1997 30/03/1998	Variazione finanziamento con DDDA n. 76/96. D.C.F. 23 del 22/06/1998
4	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	1/1.11		DDDA N. 19 12/11/1990	1.931.597,89	1.931.597,89	1.931.597,89	Lavori collaudati			22/07/1995	Finanziamento originale pari a € 2.065.827,60. DCF 147 del 24/03/1998. Economia, pari a € 134.229,71, convogliata nell'int. 24
5	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	1/1.8	N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 12 12/9/1990	4.699.757,78	4.699.757,78	4.358.752,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 16/02/1998 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 15/1/999
6	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	1/1.14		DDDA N. 28 18/12/1990	1.344.229,74	1.344.229,74	1.344.229,74	Lavori collaudati			07/07/1994	Finanziamento originale pari a € 1.446.079,32. DCF 47/1996. Economia, pari a € 101.849,56, convogliata nell'int. 24
7	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	1/1.15		DDDA N. 29 18/12/1990	3.042.086,08	3.042.086,08	3.042.086,07	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 3.047.095,70. DCF 96 del 06/08/2001. Economia, pari a € 5.009,62, convogliata nell'int. 24
8	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	1/1.23	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 13 15/2/1991	995.302,79	995.302,79	995.302,79	Lavori collaudati			13/03/1997	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DGCA 16/1/1998. Economia, pari a € 37.611,00, convogliata nell'int. 24
9	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.13	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 12/12/1990	980.577,05	980.577,05	980.577,05	Lavori collaudati			22/10/1998	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DDDA 106 del 26/10/1999. Economia, pari a € 52.336,76, convogliata nell'int. 24
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	1/1.17		DDDA N. 31 18/12/1990	770.689,83	770.689,83	770.689,83	Lavori collaudati			14/08/1995	Finanziamento originale pari a € 774.685,35. DCF DDDA n. 48 del 14/05/1996. Economia pari a € 3.995,52 convogliata nell'int. 24

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Assegliano - bacino Gazzera (VE)	1/1.1	DCR N. 744 DEL 17/7/1988	DDDA N. 5 12/9/1990	835.121,92	835.121,92	835.121,92	Lavori collaudati			07/07/1995	Finanziamento originale pari a € 877.976,73 - DCF DDDA 42/1996. Economia, pari a € 42.854,81, convogliata nell'int. 24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	1/1.16		DDDA N. 30 18/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.052.547,83	Lavori collaudati			31/05/1997	Variazione finanziamento con DDDA n. 554 del 18/12/1997. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 16/02/1998
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	1/1.10		DDDA N. 15 11/10/1990	1.298.757,42	1.298.757,42	1.298.757,42	Lavori collaudati			21/06/1994	Finanziamento originale pari a € 1.497.725,01. DCF 48 del 20/03/1996. Economia, pari a € 198.967,59, convogliata nell'int. 24
14	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	1/1.12		DDDA N. 20 12/11/1990	972.642,76	972.642,76	972.642,76	Lavori collaudati			08/11/1994	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF 106 del 19/06/1996. Economia, pari a € 60.271,04, convogliata nell'int. 24
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	1/1.7		DDDA N. 11 12/9/1990	1.136.205,18	1.136.205,18	1.068.506,88	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 53 del 20/05/2002
16	Fognatura bacino San Giuliano	1/1.6		DDDA N. 10 12/9/1990	433.816,22	433.816,22	433.816,22	Lavori collaudati			16/05/1994	Finanziamento originale pari a € 464.811,21. DCF 18 del 03/03/1997. Economia, pari a € 30.994,99, convogliata nell'int. 24
17	Redazione del Piano Direttore				516.456,90	516.456,90	516.456,90	Intervento concluso				
18	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	1/1.4	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990		2.698.487,30	2.698.487,30	2.652.463,24	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 151/1998
19	Lavori di estensione della rete intama ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (l parte)	1/1.19	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990		3.352.130,39	3.279.236,61	3.279.236,61	Lavori collaudati			30/05/1996	Finanziamento originale pari a € 3.356.969,84. DCF n. 76/1997. Economia pari a € 77.733,23 convogliata nell'int. 24
20	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Phellos	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	627.508,56	627.508,56	624.095,07	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 84 del 12/08/2002
21	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	446.078,81	446.078,81	446.078,81	Lavori collaudati			28/06/1996	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 125/1998
22	Ispesioni televisive	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Lavori collaudati			22/03/1995	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 125/1998
23	Piano pilota W.R.C.	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	327.330,38	327.330,38	327.330,38	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 125/1998

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impiego	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Chiusura	Note
24	RIUTILIZZO ECONOMIE L. 910/86 Es. 1987/88	1/1. ECO	DGR 2517 DEL 13/09/2002		2.085.508,84	541.030,70	507.236,30	Lavori in corso				
25	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo. RIUTILIZZO ECONOMIA	1/1.23 ECO		DGR 1356 2/04/1998	28.077,39	28.077,39	28.077,39	Lavori ultimati				
ULSS.12 VENEZIA												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
Dipartimento urgenza Ospedale SS.												
2	Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
TOTALE					51.645.689,92	47.446.033,50	45.518.828,03					
					91,87%			86,14%				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 910-86 Es. 1989

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione s/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 910/86 Es. 1989 A.C.M.												
3	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	1/3.1b1 s	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 1249 DEL 4/6/1993	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Decreto di contabilità finale n. 92/2004, per € 1.394.433,63. Disimpegnati, con DGR 25/17/2002 € 154.937,07.
4	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	1/3.1A	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DPGR N.1365 25/6/1993	7.488.625,04	7.488.625,04	6.808.530,40	Primo appalto collaudato. Secondo appalto in attesa di collaudo	14/12/1994	27/10/2000	22/07/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso: manca relazione aclarante
5	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	1/3.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 41 DEL 8/11/1993	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	02/01/1995	20/06/1997	25/03/1998	Decreto di contabilità finale sospeso in attesa dell'integrazione della documentazione
COMUNE DI CHIOGGIA Legge 910/86 Es. 1989												
5	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.20	DCR N. 745 DEL 17/1988	DDDA N. 120 DEL 6/9/1990	5.164.568,99	5.164.568,99	4.359.929,32	Lavori collaudati	26/11/1996	31/07/1998	08/03/1998	Intervento suddiviso in opere elettromeccaniche (€ 2.840.512,94) e opere civili (€ 2.324.056,05). Esiste solo la relazione aclarante del collaudatore amministrativo. Manca il collaudo tecnico.
S.P.I.M. Legge 910/86 Es. 1989												
2	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.D	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Progetto approvato				
COMUNE DI VENEZIA Legge 910/86 Es. 1989												
20 V.	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.8	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 37 26/5/1994	1.807.599,15	1.807.599,15	1.597.613,90	Collaudo in corso	02/12/2002			Inizio dei lavori ritardato dal fallimento dell'impresa. Le opere sono finanziate, oltre che dal presente finanziamento, anche da € 568.102,59 (int. 84) e da € 413.165,52 (int. 64)

Legge 910-86 Es. 1989

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
21	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	DGR N. 745 DEL 17/1/1988	DDEA N. 59 11/12/1991	3.795.958,21	3.795.958,21	586.178,58	Lavori da appaltare				L'appalto sarà unificato all'int. n. 38. Dell'importo finanziato, una quota pari a € 206.582,76 è destinata al Consorzio Sinistra Medio Brenta.
22	Costruzione fognatura di via San Donà V. a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	DGR N. 4976 DEL 2/1/1993	DDDA N. 55 12/10/1994	1.936.713,37	1.936.713,37	2.202.677,43	Finanziamento convogliato nell'intervento 22A				Le erogazioni si riferiscono al finanziamento complessivo dell'int. 22A
22A	Costruzione fognatura di via San Donà V. a Carpenedo - Mestre (VE)		Riuniti i finanziamenti 7 (€ 593.925,43) + 22 (€ 1.936.713,37) = € 2.530.638,80					Lavori collaudati	06/05/1997	08/07/1999	28/11/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
23	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E		DDEA N. 63 11/6/1997	619.748,28	619.748,28	557.506,82	Lavori collaudati	14/07/1997	22/10/1997	04/05/1998	Registrata, con DDDA n. 17 del 02/03/1999, un' economia di € 62.241,46 destinata all'int. 24. Quota parte del finanziamento, pari a € 378.046,45, convogliati nell'int. 28. Utilizzate le economie dell'int. 23 pari a € 62.241,46.
24	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E 1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 32 26/4/1999	1.962.536,22	1.645.948,14	1.282.315,78	Lavori ultimati	01/05/2000			Intervento affidato al MAV
25	Fognatura S.Erasmo							Fondi riallocati				

VE.S.T.A.
Legge 910/86 Es. 1989

2	(Acquedotto di Venezia (ACQUEDOTTO) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto V.) dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.10		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Progetto approvato				
---	--	--------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	--------------------	--	--	--	--

CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA
Legge 910/86 Es. 1989

Legge 910-86 Es. 1989

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	DGR N. 2549 DEL 30/04/1992	DDEA N. 59 11/12/1991	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori ultimati.	-	-	-	Intervento inizialmente affidato al CVD poi revocato (DDEA N. 2549 del 30/04/1992) e affidato a questo consorzio. Le date non sono reperibili.
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA Legge 910/86 Es. 1989												
1	Interventi di difesa dell'isola di S. Erasmo dalle acque alte.	1/3.6.C 1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 99 30/10/2000	1.922.252,58	1.922.252,58	0,00	Progetto approvato				Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi ex "Fognature Giudecca" pari a € 2.582.284,49 riallocati con DCR 32/97, al finanziamento 1 (€ 1.922.252,58) e al finanziamento 2 (€ 660.031,92)
2	Fognatura S. Erasmo	1/3.6.C	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		660.031,92			Fondi disimpegnati sul capitolo 50511 con DGR 2517 DEL 13/09/2002				
REGIONE - DISINQUINAMENTO Legge 910/86 Es. 1989												
26	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - Il parte	1/1.18		DDDA N. 32 18/12/1990	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.584,63	Lavori collaudati			12/07/1996	Registrata, con DDDA n. 73 del 30/06/1997, un'economia di € 95.156,76
ULSS.12 VENEZIA Legge 910/86 Es. 1989												
3	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliati nell'intervent 4A				
TOTALE					38.734.267,43	37.757.647,44	24.839.866,19					97,48% 64,13%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ACM												
Legge 67/88 Es. 1990												
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	1/2.15	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR N. 1249 4/6/1993	516.456,90	516.456,90	446.735,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
6A	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE) (€ 2.065.827,60)		Finanziato con i fondi del finanziamento 3 (€ 1.549.370,70) + 6 (€ 516.456,90) = € 2.065.827,60					Lavori collaudati	28/12/1994	16/03/1998	29/09/2003	Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
COMUNE DI CHIOGGIA												
Legge 67/88 Es. 1990												
6	Collegamento a impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 109 20/6/1996	56.810,26	56.810,26	56.810,26	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 568.102,59, di cui € 511.292,33 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcale di Venezia Registrata, con DDDA n. 2 del 13/01/2003, un'economia di € 254.911,79 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
7	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 20/7/1993	7.436.979,35	7.436.979,35	7.191.067,31	Lavori collaudati	21/05/1997	15/06/2000	14/10/2002	
COMUNE DI CODEVIGO												
Legge 67/88 Es. 1990												
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2261 29/10/1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 381 del 02/10/1997
COMUNE DI JESOLO												
Legge 67/88 Es. 1990												
6	Ampliamento della rete fognaria di via Baffie in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 14 16/4/1993	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	Lavori collaudati	04/09/1995	01/05/1997	24/06/1998	L'erogazione comprende l'importo di € 226.367,16 (economia) reimpiegata nell'intervento 14, con DDDA n. 34 del 21/06/2000
7	Interventi alle reti -parte 1 ^a / parte 2 ^a .	1/1.4.3 b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 71 23/6/1997	126.343,95	126.343,95	126.343,95	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
8	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione comunale.	1/2.10b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 13 12/5/1997	1.142.673,28	1.142.673,28	1.062.635,11	Lavori collaudati	17/09/1997	13/11/1999	07/03/2002	Registrata, con DDDA n. 6 del 05/02/2003, un'economia di € 80.034,17

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Somme per ulteriori interventi per copertura supero di spesa progetto "ampliamento rete fognaria Via Baffie" (1/2.10a)		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02					Dati non forniti dall'ente
10	Progetto esecutivo per il trattamento dei parcolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 35 DEL 5/5/1999	6.527,10	6.527,10	6.527,10	Finanziamento riallocato nell'intervento 13A				
COMUNE DI JESOLO/ASI												
Legge 67/88 Es. 1990												
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei parcolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo	1/1.4.4 b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 12/3/2001	6.478,90	6.478,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				
13A	Trattamento dei parcolati da discarica (€ 77.468,53)		Riuniti i finanziamenti	10 (€ 6.527,10) + 13 (€ 6.478,90) + 11 (€ 64.462,54) = € 77.468,53				Lavori ultimati. Collaudo in corso	03/09/2001	30/04/2002		
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR N. 744 DEL 17/1/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	226.367,16	226.367,16	198.281,86	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				
14A	Costruzione della rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 280.853,02)		Riuniti i finanziamenti	12 (€ 54.485,86) + 14 (€ 226.367,16) = € 280.853,02				Lavori ultimati. Collaudo in corso	22/04/2002	08/10/2003		
COMUNE DI MUSILE												
Legge 67/88 Es. 1990												
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 111 15/10/1992	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	Lavori collaudati	11/02/1999	20/06/2002	18/11/2002	Importo originale del finanziamento € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 22 del 26/03/2003, un'economia di € 19.111,94 (reinvestita nell'int. 4)
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA 214 17/11/2004	19.111,94	19.111,94	0,00	Progetto approvato				
5	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 32 26/3/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/06/2002
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO												
Legge 67/88 Es. 1990												
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1047 28/4/1993	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30	Lavori collaudati	25/10/1996	20/07/1998	20/09/1998	Registrata, con DDDA n. 93 del 19/05/2004, un'economia di € 322.508,20
COMUNE DI VENEZIA												
Legge 67/88 Es. 1990												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
28	Ampliamento della fognatura del Cavallino V. (VE) - II stralcio	1/2.7	DGR N. 259 DEL 25/1/1994		3.098.741,39	3.098.741,39	2.881.295,30	Lavori collaudati	23/05/1996	10/04/1998	28/10/2002	L'importo dei lavori sale con perizia suppletiva di € 542.279,74, finanziato con parte dell'int. 24, pari a € 378.046,45 e con parte dell'int. 68 pari a € 163.727,74. In attesa di ricevere la richiesta di saldo
29	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.549.370,70			Progettazione in corso				Impegno pari a € 1.549.370,70 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
30	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	N. 23 DEL 15/4/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	1.573.080,41	Lavori collaudati	11/11/1996	26/05/1999	31/03/2003	In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale (importo € 2.883.521,17)
31	Vasca di accumulo acque meteoriche di V. Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DFGR 2436 3/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	722.403,66	Lavori in corso				L'erogazione è comprensiva delle spese di progettazione e dell'anticipo del 10%
32	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacchi - V. Marghera (VE)	1/2.3a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 24 DEL 7/4/1995	4.131.655,19	4.131.655,19	3.718.489,67	Collaudo in corso				Collaudate le opere civili. In appalto le opere elettromeccaniche
33	Razionalizzazione della rete fognaria di V. Marghera (VE) - via Asseglano a Chirignago	1/2.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DFGR 1182 9/6/1994	3.615.198,29	3.615.198,29	3.167.908,06	Lavori collaudati	24/02/1997	14/12/1998	18/10/1999	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
34	Ampliamento IV linea depuratore Fusina.							Fondi riallocati				
34B	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi V. "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	1/2.5.B	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	Progetto approvato				Finanziamento proveniente da fondi riallocati
CONSORZIO DESE SILE Legge 67/88 Es. 1990												
3	Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR N. 3324 DEL 29/07/1996	DFGR 2436 03/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	275.981,49	Lavori in corso				
REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 67/88 Es. 1990												
27	Aggiornamento Piano Direttore II* fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	1/2.16 Penna	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.614.488,62	1.529.665,48	1.444.059,51	Lavori in corso				

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
28	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/2.5.A	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		2.065.827,60	1.994.040,61	631.110,85	Lavori in corso				
29	Aggiornamento del Piano Direttore	1/2.16	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		967.795,88	969.871,43	959.662,38	Lavori ultimati				
30	Impianto integrato di Fusina - P.I.F. (linea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - I° stralcio)	1/2.5	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		96.506,54	96.506,54	96.506,54	Intervento concluso				Quota spesa per la sola progettazione
ULSS 12 VENEZIA/SETTORE DISINQUINAMENTO												
Legge 67/88 Es. 1950												
6	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Primo stralcio funzionale	1/2.9	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 68 16/10/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	04/72/1995	30/06/1998	25/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 21 del 26/03/2003
DIOCESI PTRIARCATO DI VENEZIA												
Legge 67/88 Es. 1950												
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b .1	DGR 4599 05/08/1991		511.292,33			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Chioggia/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b
TOTALE					53.969.745,96	51.751.965,37	34.068.390,95					95,89% 63,12%

Legge 67-88 Es. 91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ARPAV Legge 67/88 Es. 1991												
1	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	4a	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 2588 DEL 27/07/1999	258.228,50	258.228,45	274.484,19	Lavori in corso				Fondi derivanti da un finanziamento iniziale di € 7.950.853,96 suddiviso negli interventi 1 (€ 258.228,45), 2 (€ 1.032.913,80), 7A (€ 4.787.555,45), 8 (€ 839.242,46) e 11 (€ 1.032.913,80)
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA Legge 67/88 Es. 1991												
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DPGR 2267 DEL 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				Le opere eseguite vanno a far parte dell'intervento 1A SE.T.A. "Centro di biotratamento di Camposampiero", il cui nuovo termine dei lavori è stabilito al 19/11/2008 con DDDA n. 173/2003.
2	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 561 DEL 2/3/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori in corso	01/03/2000			
COMUNE DI CHIOGGIA Legge 67/88 Es. 1991												
8	Fognatura di Chioggia (VE)	3c	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 115 DEL 28/6/1996	516.456,90	516.456,90	514.127,07	Lavori collaudati	16/10/1996	29/04/1997	03/03/1998	Registrata, con DDDA n. 35 del 21/06/2000, un'economia di € 2.325,83 rescritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale.
COMUNE DI MEOLO Legge 67/88 Es. 1991												
1	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 DEL 20/1/1995	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Finanziamento diviso negli interventi 1A, 1B e 1C				
1A	Adeguamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura di via Cà Tron, via Verdi e via Toscanini (progetto complessivo € 428.963,36)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1B	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.913,49)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente

Legge 67-88 Es. 91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1C	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.564,87)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	coll. provvis. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
COMUNE DI VENEZIA Legge 67/88 Es. 1991												
35	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - V. Zelarino - Il lotto	1b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 12 12/2/1996	3.925.072,43	3.925.072,43	3.532.573,45	Lavori in via di ultimazione	12/12/1997			Mancano lavori di completamento. Integrazione di € 516.456,89 proveniente dall'int. 85. Ritardi dovuti al fallimento dell'impresa
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
36A	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	Riuniti i finanziamenti 11 (€ 676.559,54) + 19 (€ 877.976,73) + 36 (€ 258.228,45) + 58 (€ 1.545.239,04) = € 3.358.002,76					Lavori ultimati				
ENTE BACINO RSU VE 2 Legge 67/88 Es. 1991												
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	4a	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 863 09/03/1993	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69					
TOTALE					15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35					100,00% 97,28%

Legge 67-88 Es. 92 1^a tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ACM												
Legge 67/88 Es. 1992 - 1 ^a tranche												
7	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature (€ 4.131.665,19)	1/4.3	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		2.709.156,19	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso in 7A (€ 462.554,00), 7B (€ 499.945,00) e 7C (460.000,00)				Finanziamento originale pari a € 4.131.665,19
7A	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Strà	1/4.3c	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 144 23/07/2004	462.554,00	462.554,00	19.975,58	Lavori in corso				
7B	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Cambarina Lupia	1/4.3a	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 142 23/07/2004	499.945,00	499.945,00	19.635,77	Lavori in corso				
7C	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Fiesso d'Arfice	1/4.3b	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 143 23/07/2004	460.000,00	460.000,00	18.856,82	Lavori in corso				
APGA												
Legge 67/88 Es. 1992 - 1 ^a tranche												
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	1/4.4	DGR N. 2773 21/6/1994	DPGR N. 1293 8/6/1995	1.652.862,08	1.652.862,08	1.549.568,48	Lavori collaudati	10/07/1996	10/10/1999	09/04/2001	Registrata un'economia di € 103.093,6 destinata, con DDDA n. 26 del 25/03/2002, all'intervento 2 bis
2bis	Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - impianti (€ 103.093,60)	1/4.4bis	DGR N. 2773 21/6/1994	DDDA N. 126 6/1/2002			103.093,60	Lavori ultimati	10/07/1996	10/10/1999		Utilizzata l'economia di € 103.093,6 dell'intervento 2
COMUNE DI CAVARZERE												
Legge 67/88 Es. 1992 - 1 ^a tranche												
1	Fognatura comunale di Cavarzere	1/4.5	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 62 DEL 8/9/1995	568.102,59	568.102,59	566.906,86	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 19 del 26/02/2001, un'economia di € 1.195,73 reiscritta sui fondi impegnati con DGR n. 186/CR/1993
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	1/4.5bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DPGR 2293 9/1/1995	723.039,66	723.039,66	723.039,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 93 del 23/09/2002
COMUNE DI VENEZIA												
Legge 67/88 Es. 1992 - 1 ^a tranche												
37	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	N. 157 DEL 16/9/1996	2.840.512,95	2.840.512,95	2.666.908,82	Lavori collaudati	27/05/1997	08/05/1999	14/10/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia

Legge 67-88 Es. 92 1^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
38	Impianto di sollevamento in località V. "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR N. 2773 DEL 21/06/1994		2.324.056,05			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.324.056,05 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
CONSORZIO DESE SILE												
Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche												
4	Impianto Idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	1/4.1	DGR N. 2773 DEL 21/06/1994	DDDA N. 72 02/11/1995	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati	23/11/1996	30/06/1997	06/12/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 27 del 31/03/1999
TOTALE					15.338.769,90	10.305.557,67	8.766.726,98					67,19% 57,15%

Legge 67-88 Es. 92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche												
1	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DFGR 2207 31/10/1995	1.239.496,56	1.239.496,56	1.239.496,56	Lavori collaudati	04/12/1996	16/10/2001	12/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 30/10/2003
2	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DDDA N. 70 18/10/1995	2.633.930,19	2.633.930,19	2.633.907,51	Lavori collaudati	02/09/1999	23/07/1999	16/10/2001	Registrata, con DDDA n. 47 del 9/05/2002, una economia di € 22.688
AZIENDA CONSORZIALE VENETO SERVIZI Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche												
1	Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	1/6.2	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 146 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.370,70	343.685,16	Lavori in corso				
2	Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	4d	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 101 18/10/2002	3.615.198,29	3.615.198,29	763.610,22	Lavori in corso				
CONSORZIO DESE SILE Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche												
5	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherie		DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DGCA N. 367 24/09/1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche												
2	Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	4b	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		774.665,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				Impegno pari a € 774.665,35 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
3	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,5 MILD)	4 c	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 39 19/5/1999	1.291.142,25	1.291.142,25	1.145.525,32	Collaudo in corso	12/06/2000	03/06/2002		
DELTA PO Legge 67/88 Es. 1992 II tranche												
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/6.1.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR 3905 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	Lavori in corso				
REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche												
31	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR N. 2121 DEL 2004	7.229.437,96	62.400,00						Impegno di spesa a favore dello IUAV

Legge 67-88 Es. 92 2^a tranche

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Eregato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
32	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)		DGR N. 45 DEL 15/07/1999		8.253.310,39							
33	Quota regionale agenzia per Venezia											Finanziamento di € 5.164.568,99 revocato con DDDA n. 108 del 28/10/1999
TOTALE					30.987.413,94	14.782.680,23	8.347.367,02					
												47,71% 26,54%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 360-91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI VENEZIA Legge 360/91												
39	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993					Fondi riallocati nell'intervento 39A				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
39A	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.032.913,80	0,00	0,00	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
40	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	1/2.5	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991		1.032.913,80			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Impegno pari a € 1.032.913,80 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
CONSORZIO DESE SILE Legge 360/91												
6	Ricalibratura e sostegno nei sottobacini del Marzenego		DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		1.291.142,25			Finanziamento convogliato nell'intervento 16 per € 1.291.142,25				
ENTE DI BACINO RSU VE 2 Legge 360/91												
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DPRG N. 911 DEL 06/05/1992	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84					
REGIONE FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA Legge 360/91												
1	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	1/3.4	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDEA N. 33 DEL 28/9/1993	452.932,70	452.932,70	216.807,60	Lavori ultimati				Progetto affidato al Centro Veneto Disinquinamento (CVD) e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
2	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - Il stralcio	1/4.8	DGR N. 5211 DEL 18/11/1993	DGCA N. 542 DEL 10/12/1997	409.756,90	229.532,47	229.532,47	Lavori in corso				Progetto esecutivo e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)

Legge 360-91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio		DGR N. 5211 DEL 18/1/1993		686.681,09							Progetto esecutivo e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
TOTALE					8.263.310,39	4.039.435,01	3.803.309,92					48,88% 46,03%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ARPAV												
Legge 139/92 Es. 1993												
2	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	4/B/1	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori in corso				
3	Estensione rete agrometeorologica	6/C/1	DGR N. 4977 DEL 22/07/1993	DGR N. 156 27/1/1995	516.456,90	516.456,90	516.280,42	Lavori ultimati			15/06/1998	
ACM												
Legge 139/92 Es. 1993												
8	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	1/B/1	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 36 25/5/1995	929.622,42	929.622,42	929.622,42	Lavori collaudati	28/06/1996	24/09/1998	01/08/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 119 del 25/10/2002
9	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	1/B/2	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	06/11/1995	17/04/1997	18/10/1997	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 98 del 02/03/1998
10	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	1/B/3	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 67 16/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	11/04/1996	26/02/1999	21/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 8 del 15/02/2002
11	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	1/B/4	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 69 19/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	11/04/1996	26/11/1998	26/03/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 79 del 15/07/2002
12	Vasca di poggia di Noale	1/B/5	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 170 29/10/1996	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	01/09/1998	25/03/1999	21/02/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 15/02/2002
13	Interventi alle fognature del Consorzio del Miraseo (€ 1.225.167,42)	2/A/1	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993					Intervento suddiviso negli interventi 31 (€ 242.734,74), 32 (€ 142.025,65) e 33 (€ 844.407,03)				
14	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	2/A/7	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 7 27/1/1997	320.203,28	320.203,28	320.203,28	Lavori collaudati	27/01/1998	26/07/1999	29/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 07/01/2004
15	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	Lavori collaudati	11/04/1996	22/12/2000	24/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 151 del 30/10/2003
16	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	29/03/1996	31/07/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 07/07/2000
17	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.145,26	Lavori collaudati	18/09/1998	01/08/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 14/02/2001
18	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	16/07/1997	19/11/1998	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 87 del 30/10/2000
19	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesse d'Artico	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 21/1/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	27/11/1995	31/12/1997	07/10/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 88 del 30/10/2000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 3/3/1995	2.324.056,05	2.324.056,05	2.314.921,22	Lavori collaudati	27/11/1995	05/02/2003	15/09/2003	Registrata, con DDDA n. 10 del 07/01/2004, un'economia pari a € 9.134,83
21	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 DEL 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	25/11/1995	27/09/1997	25/11/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 07/07/2000
22	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	27/11/1995	09/07/1997	08/08/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 43 del 07/07/2000.
23	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 4 19/1/1995	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	Lavori collaudati	25/09/1996	25/09/1999	25/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 80 del 15/07/2002
24	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 5 19/1/1995	3.382.792,69	3.382.792,69	3.382.792,69	Lavori collaudati	31/05/1995	09/01/1999	07/05/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 07/01/2004
25	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	2/A/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 56 24/10/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	25/02/1995	16/10/1996	02/03/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 18 del 27/05/1998
26	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	2/A/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 7/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	23/02/1995	07/05/1997	04/05/1998	
27	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	2/A/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 146 31/12/1999	854.736,17	854.736,17	769.262,65	Collaudo in corso	20/12/2000			
28	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	2/A/1.2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 147 31/12/1999	671.393,97	671.393,97	604.254,57	Collaudo in corso	20/12/2000	10/11/2001		
29	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	2/A/1.3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 148 31/12/1999	539.697,46	539.697,46	539.697,46	Lavori collaudati	20/12/2000	31/07/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 138 del 16/07/2004
30	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	2/A/1.4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 149 31/12/1999	774.685,35	774.685,35	774.295,66	Lavori collaudati	20/12/2000	29/10/2002		Registrata, con DDDA n. 46 del 3/3/2004, un'economia pari a € 389,49
31	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquisite. 27° Lotto fognature.	2/A/1.5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 28/2/2002	242.734,74	242.734,74	242.734,74	Lavori collaudati	12/07/2002	10/02/2003	22/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 02/03/2004
32	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquisite. 27° lotto fognature.	2/A/1.6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 28/2/2002	142.025,65	142.025,65	127.823,08	Collaudo in corso	25/11/2002	09/04/2003		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
33	Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	2/A/1.7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 28/2/2002	844.407,03	844.407,03	648.931,60	Lavori in corso	03/07/2002			
APCA Legge 139/92 Es. 1993												
3	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR N. 2955 28/11/1994	3.064.204,68	3.064.204,68	3.064.204,68	Lavori collaudati	10/09/1996	16/12/1998	26/11/2001	Finanziamento originale pari a € 3.098.741,39. Registrata, con DDDA n. 39 del 23/04/2002, un'economia di € 34.536,72 destinata all'intervento 3 bis.
3bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1 ECO	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 169 13/09/2004	34.536,72	34.536,72	0,00	Progetto approvato				
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA Legge 139/92 Es. 1993												
3	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	1/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 51 2/16/1995	16.165.100,94	16.165.100,94	16.165.100,94	Lavori collaudati	29/01/1996 16/01/1996 23/05/1997	29/07/1999 28/12/1998 04/08/2000	15/10/2000 07/07/2001 28/12/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 95 del 23/09/2002
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR 2267 6/1/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1996	07/07/1999 28/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73
5	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero.	1/A/3	DGR 4977 2/11/1993	DPGR 2391 24/11/1995	4.338.237,95	4.338.237,95	4.338.237,95	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante S.E.T.A.				
6	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loredgia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 54 12/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/11/1995	30/11/1996	09/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 45 del 09/06/2002
7	Collettore di collegamento della rete di Borgorico alla rete consorzio a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgorico	1/A/5	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 53 12/10/1994	1.652.662,08	1.652.662,08	1.651.834,57	Lavori collaudati	02/09/1996 01/06/2000	26/07/1999 27/06/2001	30/10/2001 06/12/2001	Registrata, con DDDA n. 14 del 15/01/2004, un'economia di € 827,51
COMUNE DI ARQUA' PETRARCA Legge 139/92 Es. 1993												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DFGR N. 6 DEL 3/1/1995	516.456,90	516.456,90	513.763,48	Lavori collaudati	05/02/1999 01/05/1999	29/07/2002	08/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
COMUNE DI CHIOGGIA Legge 139/92 Es. 1993												
9	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 DEL 2/10/1995	4.622.289,25	4.622.289,25	1.154.906,22	Parte dei lavori collaudati	29/04/1996	16/04/1999	03/10/2000	Rescisso il contratto con la ditta appaltatrice
10	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	5/F/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 45 DEL 13/6/1995	542.279,74	542.279,74	505.435,40	Lavori collaudati	06/05/1996	05/12/1997	15/05/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
COMUNE DI ROGLIANO VENETO Legge 139/92 Es. 1993												
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/rieffluvio impianti di sollevamento	5/G/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 68 DEL 24/11/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.755.972,37	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
COMUNE DI MONSELICE Legge 139/92 Es. 1993												
1	Fognatura di Monselice	5/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 103 DEL 24/11/1995	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori collaudati	20/11/1995	03/12/1998	31/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 41 del 28/04/2002
COMUNE DI PIOVE DI SACCO Legge 139/92 Es. 1993												
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 80 DEL 24/11/1995	1.609.967,86	1.609.967,86	1.609.967,86	Lavori collaudati	14/04/1997	05/11/1998	06/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 19 del 26/3/2003
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 23 DEL 03/04/1995	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	Lavori collaudati	06/09/1995	28/08/1998	07/04/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 20 del 26/3/2003
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO Legge 139/92 Es. 1993												
3	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (il stralcio)	5/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDETA N. 6 DEL 20/11/1995	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	18/12/1996	05/08/1999	21/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 103 del 20/1/2000
COMUNE DI VENEZIA Legge 139/92 Es. 1993												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
41	Fognature di Pellestrina (VE)	6/B/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		520.588,55	0,00	0,00	Progettazione in corso				Interventi gestiti dalla società INSULA
42	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 17 12/2/1996	4.751.403,47	4.751.403,47	4.283.343,57	Lavori collaudati	14/01/1997	06/08/1999	22/01/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
43	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di Via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 20 12/2/1996	2.995.450,01	2.995.450,01	1.333.826,50	Lavori in corso	31/01/1997			Sospensione lavori per mancata tenuta dei diaframmi. Impresa fallita. Nuovo progetto che comporta un incremento di spesa di € 1.549.371,00 finanziato con parte dei fondi dell'int. 84.
44	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	1/C/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 16 12/2/1996	2.943.804,32	2.943.804,32	2.649.423,89	Lavori collaudati	15/05/1997	03/11/1999	07/01/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
45	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 13 12/2/1996	1.855.244,84	1.859.244,84	1.660.333,60	Lavori collaudati	10/03/1997	14/09/1999	04/11/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
46	Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera Mestre	1/C/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 14 12/2/1996	2.014.181,91	2.014.181,91	1.730.927,27	Lavori collaudati	07/01/1998	19/11/1999	05/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
47	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	1/C/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 22 12/2/1996	2.737.221,57	2.737.221,57	2.463.499,41	Lavori collaudati	23/03/1998	24/03/2000	09/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
48	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 19 12/2/1996	3.718.489,67	3.718.489,67	3.263.130,89	Lavori collaudati	16/11/1998	29/09/1999	18/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
49	Ricostruzione della fognatura della rete di fognatura nella zona di via Silvio Trentin - Mestre	1/C/8	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 18 12/2/1996	3.356.969,84	3.356.969,84	1.526.061,65	Lavori in corso	10/07/1997			Risolto il contratto in danno all'impresa con lavori al 45%. Completamento appaltato ad altra ditta in data 05/05/2003
50	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/9	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDA N. 15 12/2/1996	2.169.118,98	2.169.118,98	1.814.484,44	Lavori collaudati	05/05/1997	23/10/1998	06/12/1999	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
51	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Camnaito e Terebra	1/C/10	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 168 10/4/1998	1.755.953,46	1.755.953,46	13.578,74	Lavori in corso				In attesa dell'approvazione della variante urbanistica
52	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 528 1/12/1997	7.230.396,59	7.230.396,59	349.459,20	Lavori in corso	16/01/2001			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
53 V.	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 11 12/2/1996	4.957.986,23	4.957.986,23	2.912.123,66	Lavori in corso	06/04/1998			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta
54 V.	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	1/C/13	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 133 DEL 8/8/1996	1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,26	Lavori in corso				Consegna sospesa in attesa di risoluzione espropri
55 V.	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	1/C/14	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 21 12/2/1996	1.910.890,53	1.910.890,53	1.446.753,40	Lavori in corso	26/06/1997			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta il 12/12/2003
56 V.	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46 completamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcale di Venezia
57	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		18.075.991,47	18.075.991,47	18.075.991,47	Lavori in corso				
58	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	5/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	1.545.239,04	1.545.239,04	1.209.542,06	Finanziamento interamente convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
59 V.	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto-	5/B/2		DDDA N. 115 23/06/2004	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 6.894.700,00. Finanziato con parte dei fondi (€ 2.246.587,51) dell'int. 86
60 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	5/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 23 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	1.538.841,76	Lavori collaudati	15/01/1997	30/07/1999	04/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
61 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	5/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 24 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	1.846.270,63	Lavori collaudati	09/09/1999		06/06/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 139/92 Es. 1993												
1	Intervento di diversione idraulica dalla laguna - Incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 130 DEL 8/8/1996	12.844.589,35	12.844.589,35	12.844.589,35	Lavori collaudati	22/09/1997	20/03/2001	04/08/2001	Registrata, con DDDA n. 112 del 14/9/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis
1 bis	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12)	6/B/2		DDDA N. 35 19/4/2002	66.833,12	66.833,12	66.833,12	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				DDDA n. 35 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1. Decreto di contabilità finale DDDA n. 6 del 07/01/2004

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziate (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 139/92 Es. 1993												
1	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DDDA N. 71 27/10/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	22/07/1996	29/11/1997	20/03/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 12/7/2001.
ENTE DI BACINO RSU VEZ Legge 139/92 Es. 1993												
3	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	4/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGR N. 4977 02/11/1993	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18					
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA Legge 139/92 Es. 1993												
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15. 1	DGR 4977 02/11/1993		1.755.953,46			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/C/15
TOTALE					180.759.914,66	178.483.372,67	149.966.213,75					98,74% 82,96%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ARPAV Legge 139/92 II fase												
4	Interventi strutturali in rete di bonifica.		DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		103.291,60							Intervento soppresso per errore di attribuzione di ente
5	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	2/B/1	DGR N. 2238 DEL 21/5/1996	DGR 2584/96 DGR 2696/97	1.807.599,15	1.783.792,29	1.769.184,73	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso in 2 interventi: servizio agrometeo (€ 774.685,34) e radar meteo progetto 2RADMETEO (€ 1.032.913,80).
6	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrokimico della Regione Veneto	2/C/1pe nna	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	2.582.284,50	2.582.284,50	1.647.866,29	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso: parte attività agro-zootecnica (€ 1.807.599,15) lavori ultimati e parte ampliamento sede (€ 774.685,35)
7A	Progetto quadro di monitoraggio (€ 4.786.555,45)											
7B	S.I.R.A.V. (Sistema Informativo Regione Ambiente Veneto) (€ 1.409.927,33)											
7	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna (€ 6.197.482,79)	6/A/1	DGR 2516/98 DGR 2558/99	DGR 2516/98 DGR 2558/99	6.197.482,90	6.197.482,79	6.187.559,90	Lavori in corso				
8	Interventi strutturali in rete di bonifica.	6/B/6	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	839.242,80	839.242,46	147.448,45	Lavori in corso				
APGA Legge 139/92 II fase												
4	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	1/D/4	DGR N. 2203 21/5/1996	DDA N. 11 DEL 12/2/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	04/09/1997	09/10/1998	09/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 5 del 07/01/2004
5	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	1/D/5	DGR N. 2203 21/5/1996	DDA N. 11 DEL 12/2/1997	987.807,50	987.807,50	987.807,50	Lavori collaudati	16/09/1997	07/02/2000	25/01/2002	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. Registrata, con DDDA n. 38 del 14/04/2003, un'economia di € 45.106,24 destinata all'intervento 4 bis.
5bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - Interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona	1/D/5.1	DGR N. 2203 21/5/1996	DDA N. 136 14/07/2004	45.106,24	45.106,24	40.359,62	Collaudo in corso				

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	1/D/3	DGR N. 2203 DEL 21/05/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	23/09/1998	05/11/1999	26/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 74 del 02/07/2001
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 139/92 II fase												
3	Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	1/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DGCA N. 380 2/10/1997	2.091.650,44	2.091.650,44	2.091.650,44	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	30/03/1998 10/10/2001	17/07/2002 12/02/2003	09/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 63 del 30/03/2004
4	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	1/D/2	DGR N. 4987 DEL 3/10/1997	DGCA N. 387 2/10/1997	2.194.941,82	2.194.941,82	1.975.447,65	Collaudo in corso (eseguiti con 2 appalti)	08/07/1998 17/02/2003	04/08/2000	27/06/2002	
COMUNE DI NOALE Legge 139/92 II fase												
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziole nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Finanziato inizialmente al Consorzio DESE-SILE)	61B/3.3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 18 26/12/2001	774.686,35	774.686,35	774.686,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 774.686,35				
2B	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziole nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (€ 2.065.827,60)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.291.142,25) + 2 (€ 774.686,35) = € 2.065.827,60					Lavori in corso	01/07/2002 03/09/2003			Lavori in corso mediante due appalti
COMUNE DI VENEZIA Legge 139/92 II fase												
62 V.	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestretta	1/B/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progettazione in corso				Intervento facente parte del Progetto integrato
63 V.	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete Industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progetto definitivo				Integrazione del finanziamento, per € 1.549.370,69, con parte dei fondi dell'Int.96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
64 V.	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 110 14/12/2000	3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,72	Lavori in corso	16/01/2002			La differenza tra importo finanziato ed impegnato, pari a € 413.165,51, convalidato nell'int. 20
65	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	1/C/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.682.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
66	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	1/C/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		3.098.741,39	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
67	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	1/C/5	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		4.131.655,19	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
68 V.	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	1/E/1	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996		3.460.261,22	0,00	0,00	Progettazione in corso				Integra per € 115.686,34 l'int. 61, per € 163.716,84 l'int. 28 e per € 2.633.930,18 due interventi dell'appalto integrato.
69	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,77	Lavori in corso				
70 V.	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	5/B/6	DCR N. 45 DEL 15/7/1999		3.873.426,74	0,00	0,00	Progettazione in corso	16/01/2002			Finanziamento proveniente da fondi riallocati
71 V.	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiarificazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 57 27/6/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori in corso	16/01/2002			Finanziamento complessivo pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B. Impegno inerente alle spese di progettazione
COMUNE DI ZERO BRANCO												
Legge 139/92 II fase												
1	Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	2/A/1	DGR 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	258.228,45	258.228,45	206.582,76	Finanziamento convalidato nell'intervento 4A per l'importo di € 258.228,45				
CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE												
Legge 139/92 II fase												
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 21 26/2/2001	619.748,28	619.748,28	493.459,25	Lavori collaudati	26/02/2002			Registrata, con DDDA n. 163 del 31/08/2004, un'economia di € 126.289,03
3	Interventi strutturali: ricablazione e sostegni sul rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	5/B/4	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	DDDA N. 22 22/6/1998	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Lavori collaudati	21/06/2000	21/06/2003	03/11/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 205 del 22/10/2004

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	5/C/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 61 DEL 4/8/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50	04/08/2000	04/08/2003	04/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6.06/07/01/2004.
4A	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica. (€ 2.549.117,97)		Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62					Lavori collaudati				
CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 139/92 Il fase												
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 73 DEL 27/2/2001	619.748,30	619.748,28	413.760,65	Lavori in corso	03/09/2001			La somma impegnata è stata ridotta rispetto a quella finanziata in base alla riduzione dell'importo del progetto iniziale (da € 619.748,28 a € 616.466,90)
3	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (drovora Cambrosso)	5/B/7	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGCA N. 72 DEL 2/2/1998	1.649.370,70	1.549.370,70	1.272.486,29	Lavori in corso	12/10/1998	29/11/1997		Approvata perizia di variante
CONSORZIO DESE SILE Legge 139/92 Il fase												
7	Riquilibratura ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (il finanziamento di € 774.685,35 - DGR N. 6400 DEL 12/12/1995 - è stato assegnato al Comune di Noale)	5/B/3.3						Con D.D.A. n° 18 del 26/02/01 e successivo D.D.A. n° 38 del 09/04/01 il finanziamento è stato trasferito al comune di Noale				
8	Progetto Campalto: costruzione del tronco del collettore Acque Basse	1/C/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.005.081,94			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
9	Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	1/C/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.582.284,50			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
10	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante impianto per n. 24 stazioni.	5/B/5	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 59 DEL 15/05/2001	813.419,62	813.419,62	536.177,29	Lavori in corso	14/05/2002			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	5/B/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 33 19/08/1998	7.230.396,59	7.230.396,59	7.230.396,59	Lavori collaudati	18/11/1999	08/08/2003		Importo originale € 7.670.396,59. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004. L'economia registrata convogliata negli Int. 28 e 26
12	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: € 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995					Finanziamento di € 8.263.310,39 suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)	5/B/2.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 83 11/05/2004	4.131.655,19	4.131.655,19	337.101,31	Progetto approvato				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Piani, Peseggiana, Marocchessa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze (€ 4.131.655,19)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		4.131.655,19			Progettazione in corso				
13	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	5/B/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.014.181,91			Progettazione in corso				
14	Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherle in Venezia - Mestre. 1^ e 2^ partia supplementiva e di variante.	5/B/3.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 40 30/06/2000	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
15	Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana.	5/B/3.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 53 04/08/2000	4.648.112,09	4.648.112,09	3.738.028,97	Lavori in corso	02/01/2002			
CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 139/92 II fase												
4	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio)	1/A/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 40 19/05/1999	1.652.662,08	1.652.662,08	127.166,53	Lavori in corso				
6	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscare e Giare)	1/A/2.2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 100 22/10/1999	2.608.107,34	2.608.107,34	282.877,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	PARCO LAGUNARE DI MIRA - EX Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastia, Foscare e Giare)	1/A/2 .3	DGR N. 33 DEL 12/1/1999	DDDA N. 100 22/10/1999	1.187.860,87	1.187.860,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6A	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastia, Foscare, Giare) (€ 3.795.968,22)		Riuniti i finanziamenti 5 (€ 2.608.107,34) + 6 (€ 1.187.860,87) = € 3.795.968,22					Progettazione in corso				
7	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Potenziamento impianto idroforo di Donateo, in comune di Mira)	1/A/2 .1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 38 19/6/1999	2.556.461,65	2.556.461,65	2.260.796,61	Lavori in corso	12/06/2000	29/06/2002		
8	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all'impianto idroforo di Malcontenta	1/B/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 101 22/10/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	195.163,33	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				
8A	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all'impianto idroforo di Malcontenta (€ 2.840.512,95)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 774.685,35) + 8 (€ 2.065.827,60) = € 2.840.512,95					Progettazione in corso				
9	Progetto integrato Fusina P.I.F. (invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idroforo di Malcontenta)	1/B/3	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				Fondi riallocati con DGR N. 5087/99
10	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		619.748,28	619.748,28	0,00	Progetto approvato				In attesa di coordinamento con l'intervento di ARPAV codice 5/A/1
34	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004 (PCR 1115/95 di assegnazione dei fondi)		12.181.000,00			Finanziamento proveniente da fondi riallocati di cui alla legge 139/92 II fase (schede 4/A/1 e 4/A/2 destinati alla Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura)				

REGIONE DISINQUINAMENTO
Legge 139/92 II faseREGIONE
FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA
Legge 139/92 II fase

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4	Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a) (€ 15.493.706,97)	2/D/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	Vari	15.493.706,97	15.493.706,97	10.391.443,53		importo complessivo del finanziamento pari a € 15.493.706,97, di cui € 13.014.701,34 destinati ai Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni destinate ai consorzi di bonifica è pari a € 7.787.425,94			
5	Protezione zootecnica: gestione reflui zootecnici(3.3a)	4/A/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	Vari	4.203.125,32	2.424.788,70	1.671.034,65	Verifiche di collaudo				importo complessivo del finanziamento pari a € 6.713.939,69, di cui € 2.510.813,37 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento int. 44)
6	Protezione zootecnica: Interventi strutturali in zootecnia(3.3b).	4/A/2	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	Vari	10.988.089,33	10.988.089,33	7.891.211,73	Verifiche di collaudo				importo complessivo del finanziamento pari a € 20.686.275,96, di cui € 9.870.186,63 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento int. 44)
7	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	4/A/3	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	Vari	5.164.669,99	4.434.136,42	1.233.660,08	Lavori in corso				
TOTALE					165.266.208,33	110.475.575,22	80.118.757,93					66,85% 48,48%

Legge 139-92 Mag. Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ACM												
Legge 139/92 Magg. Mutui II ^a fase												
97	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Camponogara - 31° lotto	6/E/1.A	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 183 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Progetto approvato				
98	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Spinea - 31° lotto bis	6/E/1.B	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 184 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Progetto approvato				
APGA												
Legge 139/92 Magg. Mutui II ^a fase												
29	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Pontelongo e Peggolotte	6/D/1	DGR N. 1140 18/4/2003		1.540.000,00			Progettazione in corso				
AZIENDA SERVIZI IURICI DELLA CASTELI A.M.A.												
Legge 139/92 Magg. Mutui II ^a fase												
5	Costruzione dei collettori di fognatura nera (Riese Pio X - Castello di Godego - Altivole - Maser - Asolo) per un importo di € 2.500.000		DGR N. 1140 18/4/2003					Interventi unificati per l'importo totale di € 3.500.000 e poi suddivisi nei tre interventi 6A, 6B e 6C				
6	Costruzione dei collettori di fognatura nera in comune di Castello di Godego per un importo di € 1.000.000		DGR N. 1140 18/4/2003									
6A	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/2 e 6/F/1.1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 65 30/03/2004	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	Progetto approvato				
6B	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel Comune di Riese Pio X e Altivole - 4° stralcio (2° lotto)	6/F/1.2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 69 13/04/2004	1.367.000,00	1.367.000,00	90.350,60	Lavori in corso				
6C	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel comune di Altivole, Asolo e Maser - 4° stralcio (3° lotto)	6/F/1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 84 11/05/2004	1.100.000,00	1.100.000,00	84.880,00	Lavori in corso				
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE												
Legge 139/92 Magg. Mutui II ^a fase												
14	Realizzazione condotta di collegamento all'impianto di depurazione di Roncade d'Altino	6/C/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		200.000,00			Intervento sospeso e fondi dirottati all'interventi 15A				
15	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Montebelluna	6/C/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		1.300.000,00			Intervento sospeso e fondi dirottati all'interventi 15A				

Legge 139-92 Magg. Mutui

Int.	LEGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15A	Collegamento fognario tra Monastier di Treviso e Roncade (€ 1.992.158,63)		Riuniti i finanziamenti 14 (€ 200.000,00) + 15 (€ 1.300.000,00) + parte del 13 (€ 492.158,63) = € 992.158,63	DDDA N. 178 24/09/2004	1.300.000,00	1.300.000,00	64.630,00	Progettazione definitiva in corso				
16	Adeguamento all'impianto di Meolo dell'impianto di depurazione di Meolo	6/C/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		1.300.000,00	1.300.000,00	64.630,00	Lavori in corso				
SEITA												
Legge 139/92 Magg. Mutui II fase												
1 Completamento dell' impianto di depurazione di Camposampiero												
DGR N. 1140 DEL 18/4/2003												
Finanziamento convogliato nell'intervento 1A												
1A	Realizzazione del centro di biotratamenti di Camposampiero (importo progetto del 1998 pari a € 22.790.470,34, aggiornato al settembre 2003 in € 26.724.765,46)		Finanziato parzialmente con i fondi dei finanziamenti 1 S.E.T.A. (€ 1.000.000,00) + 2 Tergola (€ 2.582.284,50) + 5 Tergola (€ 4.338.237,95) + 18 Tergola (€ 11.878.509,68) + 38 Tergola (€ 6.249.128,48) + 54 Tergola (€ 516.456,50) = € 26.564.616,50									
2 Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza												
DGR N. 1140 DEL 18/4/2003												
Finanziamento convogliato nell'intervento 2A												
2A	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza e diversione scarico in fiume Brenta (€ 2.890.701,74)		Riuniti i finanziamenti 2 S.E.T.A. (€ 515.000,00) + 35G Tergola (€ 826.531,04) + 74 Tergola (€ 1.549.370,70) = € 2.890.701,74									
3	Adeguamento all' D.M. 30 luglio 1999; collegamento dell' impianto di depurazione minore di via Fabris di Camposampiero con l' impianto principale.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		480.000,00			Progettazione in corso				
4	Adeguamento all' D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Onara di Tombolo.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.115.000,00			Progettazione in corso				
5	Adeguamento all' D.M. 30 luglio 1999; collegamento (con dismissione) dell' impianto di depurazione di Battaglia Terme con l' impianto di depurazione di Montegrotto T. con relative opere di adeguamento dimensionale di quest' ultimo.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.750.000,00			Progettazione in corso				
6	Interventi di fognatura nei comuni di S. Martino di Lupatari frazioni Caprette e Borghetti, Villa del Conte e S. Giustina in Colle fraz. Fratte		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.000.000,00			Progettazione in corso				
AZIENDA CONSORTILE SERRA VERENA												
Legge 139/92 Magg. Mutui II fase												
11 Impianto di depurazione di Conselve - II stralcio												
DGR N. 1140 DEL 18/04/2003												
Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 667.086,20												
11A	Adeguamento all' D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio (€ 1.700.000,00)		Riuniti i finanziamenti 8A (€ 1.032.913,80) + 11 (€ 667.086,20) = € 1.700.000,00									
In fase di progettazione												

Legge 139-92 Magg. Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gozzone	6/B/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		450.000,00			In fase di progettazione				
13	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l' impianto di depurazione di Conselve	6/B/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		400.000,00			In fase di progettazione				
14	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna	6/B/4	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		300.000,00			In fase di progettazione				
15	Interventi di fognatura in comune di Cartura	6/B/5	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 250 23/12/2004	640.000,00	640.000,00	0,00	Progetto approvato				
PORTO DI CHIOGGIA												
Legge 139/92 Magg. Mutui II fase												
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio in comune di Chioggia		DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		2.500.000,00			Progettazione in corso				Vedi scheda riiepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante
COMUNE DI MONSELICE												
Legge 139/92 Magg. Mutui II fase												
7	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Via del Borgo	6/H/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		5.400.000,00			Progettazione in corso				
COMUNE DI MORGANO												
Legge 139/92 Magg. Mutui II fase												
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	6/G/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 222 22/11/2004	400.000,00	400.000,00	0,00	Progetto approvato				
COMUNE DI VENEZIA												
Legge 139/92 - Magg. Mutui II FASE												
88	PROGETTO INTEGRATO RII		DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		4.038.597,75	0,00	0,00	Progettazione in corso				
COMUNE DI ZERO BRANCO												
Legge 139/92 Magg. Mutui II fase												
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 ed ampliamento dell' impianto di depurazione comunale	6/I/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 52 16/03/2004	210.000,00	210.000,00	0,00	Progetto approvato				
CONSORZIO BRENTELLA DI PEDEROBBA												
Legge 139/92 Magg. Mutui II fase												

Legge 539-95 Es 96

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ACM												
Legge 539/95 Es. 1996												
34	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Milrese	1/E/3	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 44 DEL 1/6/1999	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,80	Lavori collaudati	05/09/2000	07/04/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 162 31/08/2004.
APGA												
Legge 539/95 Es. 1996												
7	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Poiverara	1/E/5	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 84 DEL 16/2/1998	1.285.319,40	1.285.319,40	1.248.823,93	Lavori collaudati	31/05/1999	28/04/2000	15/05/2002	Registrata, con DDDA n. 226 del 03/12/2004, un'economia di € 16.495,49
8	Progetto 2° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontalongo.	1/E/5	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 85 DEL 16/2/1998	1.420.256,47	1.420.256,47	1.276.477,19	Lavori collaudati	18/08/1998	25/08/2000	28/11/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte dell'ente
9	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	1/E/5	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 24 DEL 22/6/1998	1.586.627,28	1.586.627,28	1.586.627,28	Lavori collaudati	31/05/1999	13/10/2000	16/02/2002	Finanziamento originale pari a € 1.755.963,46. Registrata, con DDDA n. 37 del 14/04/2003, un'economia di € 169.326,17 destinata all'intervento 9 bis
9bis	Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco	1/E/5.3 ECO	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 168 DEL 13/09/2004	169.326,17	169.326,17	0,00	Progetto approvato				
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA												
Legge 539/95 Es. 1996												
8	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarie e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 82 DEL 9/12/1998	110.005,32	110.005,32	110.005,32	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
9	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 8/11/1996	DGCA N. 17 DEL 12/1/1998	129.114,22	129.114,22	129.114,22	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	18/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 13 del 21/02/2001
10	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 8/11/1996	DGCA N. 16 DEL 12/1/1998	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	27/11/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 69 del 08/06/2001
11	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 54 DEL 2/2/1998	356.355,26	356.355,26	356.355,26	Lavori collaudati	27/07/1998	05/07/1999	05/05/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 5 del 15/07/2001
12	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 53 DEL 2/2/1998	380.628,73	380.628,73	380.628,73	Lavori collaudati	12/10/1999	04/10/2000	21/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/05/2002

Legge 539-95 Es 96

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 124 DEL 13/3/1998	201.418,19	201.418,19	201.418,19	Lavori collaudati	06/07/1998	10/05/1999	15/09/2000	Registrata una economia di € 66.810,26, reimpegnata nell'intervento 13 bis come da DDDA N. 113 del 18/10/2002
13	Realizzazione rete fognatura nera nelle vie 13 Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Du' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	1/E/4.1	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 28 DEL 26/3/2003	66.810,26	66.810,26	66.810,26	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				Utilizzata l'economia di € 66.810,26 del finanziamento 13
14	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1° in comune di Camposampiero	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 160 DEL 1/4/1998	335.696,88	335.696,88	335.696,88	Lavori collaudati	05/03/1999	27/07/2000	08/03/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 163 del 30/10/2003
15	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	1/E/4	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 17 DEL 27/5/1998	289.215,86	289.215,86	289.215,86	Lavori collaudati	03/02/1999	20/09/2000	19/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 70 del 08/06/2001
COMUNE DI CHIOGGIA Legge 539/95 Es. 1996												
11	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	1/E/2	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 517 DEL 18/11/1997	4.906.340,54	4.906.340,54	4.318.989,01	Lavori collaudati	30/04/1998	10/11/2000	12/10/2002	Registrata, con DDDA n. 225 del 03/12/2004, un'economia di € 587.351,53
COMUNE DI VENEZIA Legge 539/95 Es. 1996												
72	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/6/1996		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
TOTALE					15.493.706,97	15.493.706,97	14.576.754,50					94,08%
						100,00%						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 539-95 Es 97

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA Legge 539/95 Es. 1987												
16	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	C/32/1	DGR N. 553 25/2/1997	DGCA N. 28 19/1/1998	1.962.536,22	1.962.536,22	1.962.536,22	Lavori collaudati	15/12/1998	28/02/2001	28/01/2002	Registrata una economia di € 268.228,45. Reimpegnata nell'intervento 16 bis come da DDDA N. 112 del 18/10/2002
16	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e bis della frazione Abbazia Pisani. (€ 268.228,46)	C/32/1. 1	DGR N. 553 26/2/1997	DDDA N. 27 26/9/2003	268.228,45	268.228,45	268.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				Utilizzata, con DDDA n. 27 del 26/03/2003, l'economia di € 268.228,45 dell'intervento 16
17	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	A/5.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 33 DEL 5/5/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
18	Impianto di biotratamento di Camposampiero	A/5/1	DGR N. 561 DEL 2/3/1999		11.878.508,68	11.878.508,68	9.998.606,69	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
19	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 1 DEL 3/2/1999	281.469,01	281.469,01	281.469,01	Lavori collaudati	22/04/1999	02/10/2000	08/01/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 143 del 12/11/2001
20	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 16 DEL 2/3/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	22/06/1999	21/12/2000	30/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 94 del 23/09/2002
21	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarite e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 82 9/12/1998	122.400,29	122.400,29	122.400,28	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
21A	Realizzazione fognatura nera lungo le vie Roma e Margarite e pista ciclabile lungo via Roma in Comune di S. Giorgio delle Pertiche (€ 232.405,60)		Riuniti i finanziamenti 8 (€ 110.005,32) + 21 (€ 122.400,29) = € 232.405,60					Lavori in fase di collaudo	18/11/1999	17/10/2002		L'importo del finanziamento regionale è pari a € 232.405,60. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 621.621,47 resta a carico dell'ente. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57/2004
22	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 83 9/12/1998	299.645,00	299.645,00	269.690,60	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				
23	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebaselleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 50 25/6/1999	1.259.121,92	1.259.121,92	1.259.121,92	Lavori collaudati	06/03/2000	19/10/2001	30/04/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 154 del 30/10/2003
24	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 52 25/6/1999	309.874,14	309.874,14	278.866,72	Collaudo in corso	07/06/2000			
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 539/95 Es. 1987												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 539-95 Es 97

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impiego	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	C/31/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 527 11/2/1997	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	26/08/1998 21/02/2000	21/01/2003 26/04/2002	26/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 52 del 30/03/2004
AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 539/95 Es. 1997												
1	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	C/30/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 126 13/3/1998	428.669,23	428.669,23	428.669,23	Per questo progetto sono stati utilizzati anche fondi CIPE (n.74/97) per un importo totale di € 1.032.913,80. Lavori collaudati	01/02/1999	08/02/2001	20/05/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 32 del 2/4/2003
COMUNE DI CHIOGGIA Legge 539/95 Es. 1997												
12	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	C/33/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 526 11/2/1997	320.203,28	320.203,28	270.796,96	Lavori collaudati	16/02/1998	27/04/1999	21/01/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
13	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	C/33/3	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 546 16/12/1997	118.785,09	118.785,09	111.541,41	Lavori collaudati	18/03/1998	24/07/1998	29/03/1999	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
14	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	C/33/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 366 24/9/1997	1.007.090,95	1.007.090,95	912.330,18	Lavori collaudati	13/11/1997	05/02/1999	28/03/2002	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
COMUNE DI GALZIGNANO Legge 539/95 Es. 1997												
1	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	C/30/1	DGR N. 553 DEL 25/02/1997	DDDA N. 62 11/06/1997	346.026,12	346.026,12	274.003,05	Lavori collaudati	14/05/1998	29/06/2002	19/09/2003	Registrata, con DDDA n. 119 del 23/06/2004, un'economia di € 72.023,06
COMUNE DI MARCON Legge 539/95 Es. 1997												
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/29/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 186 24/4/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.206.494,01	Lavori in corso	25/06/2001			
COMUNE DI VENEZIA Legge 539/95 Es. 1997												
73	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
ENTE DI BACINO RSU VEZ Legge 539/95 Es. 1997												
4	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	C/28/1	DGR N. 553 DEL 26/2/1997	DGR N. 553 25/02/1997	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32					

Legge 539-95 Es 97

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnate (euro)	Eregato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ULSS 12 VENEZIA/OSPEDALI Legge 539/95 Es. 1997												
4	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	C/27/1	DGR N. 563 DEL 28/2/1997	DOLLPP 167 1377/1998	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	Finanziamento convogliati nell'intervent 4A				
4A	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		Riuniti i finanziamenti 1, 2, 3 e 4					Lavori collaudati			30/09/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione
TOTALE					30.987.413,95	30.987.413,95	28.440.698,59					
							100,00%					91,78%

Legge 539-95 Mag. Mutui III fase

Inl.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Regione - Disinquinamento											
	Legge 539-95 Magg. Mutui III fase											
35	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		21.342.612,00							
	TOTALE				21.342.612,00	0,00	0,00					
						0,00%	0,00%					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 97 3^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ARPAV												
Legge 515/96 Es. 1997												
9	Potenziamento della rete di teleseguimento agrometeorologica	C/25/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGR 2696 29/07/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	946.275,27	Lavori in corso				L'importo finanziaria parte del progetto 28ADMETEO.
ACMI												
Legge 515/96 Es. 1997												
35	Opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Fiesse D'Arco	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 73 13/9/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	13/03/2001	21/03/2002	25/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 88 del 18/08/2003
36	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Salzano	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 109 14/12/2000	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	15/10/2001	30/05/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 239 del 20/12/2004
37	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 107 14/12/2000	284.051,29	284.051,29	255.646,17	Lavori in corso	16/07/2002			Con DDDA n. 195 del 13/10/2004 stabilito nuovo termine fine lavori: 14/11/2005
38	Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 28 21/3/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,96	Collaudo in corso	16/05/2002			
39	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolio.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 74 13/9/2000	568.102,59	568.102,59	465.400,54	Lavori in corso	13/04/2001			
40	Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Salzano settore "B". Progettazione esecutiva del 28° lotto.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 117 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	557.773,45	Lavori in corso	05/03/2002			
41	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Fossò	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 73 22/9/1999	413.165,52	413.165,52	393.860,72	Lavori collaudati	04/02/2000	04/04/2001		Registrata, con DDDA n. 113 del 16/06/2004, un'economia pari a € 19.304,81
42	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 74 22/9/1999	464.811,21	464.811,21	464.692,98	Lavori collaudati	13/03/2000	27/04/2001	10/05/2002	Registrata, con DDDA n. 141 del 12/12/2002, un'economia di € 118,23
43	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto - in comune di Noale (Vv)	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDA N. 75 22/9/1999	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Lavori collaudati	14/03/2000	22/03/2002	02/12/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57 del 27/05/2003
44	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDA N. 144 31/12/1999	534.209,07	534.209,07	534.209,06	Lavori collaudati	22/05/2000	30/10/2002	12/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 07/01/2004
45	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDA N. 145 31/12/1999	395.413,35	395.413,35	395.413,35	Lavori collaudati	11/02/2000	03/05/2001	22/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 68 del 27/05/2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 97 3^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
46	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Pianiga	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 22/9/1999	516.456,90	516.456,90	497.090,05	Lavori collaudati	14/09/2000	21/05/2002	11/12/2003	Registrata, con DDDA n. 100 del 01/06/2004, un'economia di € 19.366,85
47	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 79 22/9/1999	524.616,92	524.616,92	519.457,90	Lavori collaudati	07/03/2000	30/07/2001	10/09/2002	Registrata, con DDDA n. 7 del 7/02/2003, un'economia di € 5.159,02
48	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 80 22/9/1999	508.296,88	508.296,88	481.632,89	Lavori collaudati	22/05/2000	04/07/2001	04/11/2003	Registrata, con DDDA n. 94 del 19/05/2004, un'economia di € 26.663,99
49	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 81 22/9/1999	671.393,97	671.393,97	669.023,23	Lavori collaudati	05/09/2000	07/10/2002	01/09/2003	Registrata, con DDDA n. 8 del 07/01/2004, un'economia di € 2.370,74
50	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 82 22/9/1999	284.051,29	284.051,29	274.136,39	Lavori collaudati	05/09/2000	23/11/2001		Registrata, con DDDA n. 161 del 31/08/2004, un'economia di € 9.914,90
51	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 83 22/9/1999	748.862,50	748.862,50	748.862,49	Lavori collaudati	22/05/2000	22/02/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 231 del 06/12/2004
52	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di S. Maria di Sala	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 131 23/12/1999	774.685,35	774.685,35	750.580,99	Lavori collaudati	20/10/2000	27/05/2002	20/10/2003	Registrata, con DDDA n. 91 del 19/05/2004, un'economia di € 24.124,37
53	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Strà	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 132 23/12/1999	413.165,52	413.165,52	404.960,93	Lavori collaudati	14/09/2000	06/06/2002		Registrata, con DDDA n. 139 del 16/07/2004, un'economia di € 8.204,50
54	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Vigonovo	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 133 23/12/1999	490.634,05	490.634,05	490.634,05	Lavori collaudati	20/12/2000	16/12/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 241 del 20/12/2004
55	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Campolongo Maggiore	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 135 23/12/1999	516.456,90	516.456,90	508.825,66	Lavori collaudati	22/01/2001	20/06/2002		Registrata, con DDDA n. 112 del 16/06/2004, un'economia di € 7.631,24

AFGA

Legge 515/96 Es. 1987

10	Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio impianti	A/4/1.1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 39 DEL 10/4/2001	2.788.867,26	2.788.867,26	2.499.671,64	Lavori in corso	18/04/2001			
11	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese.	A/4/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 68 DEL 7/9/2000	4.957.986,23	4.957.986,23	4.462.187,60	Collaudo in corso	03/09/2001			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515/96 Es 97 3^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
AZIENDA CONSORZIO SILE PIAVE Legge 515/96 Es. 1997												
1	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione l'istralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 43 01/06/1999	1.549.370,70	1.549.370,70	116.608,77	Intervento sospeso e fondi dirottati per € 1.549.370,70 all'intervento 7A.				Intervento revocato con DDDA n. 71 del 11/06/2001
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 515/96 Es. 1997												
6	Progetto n. 7 - Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella.	A/3/1.a	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	408.000,95	408.000,95	369.156,83	Lavori collaudati	11/02/2003	07/10/2003	28/10/2003	Registrata, con DDDA n. 164 del 31/08/2004, un'economia di € 36.844,13
7	Progetto n. 8 - Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	A/3/1.b	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	1.996.105,92	1.996.105,92	1.996.105,92	Lavori collaudati	03/05/2000	01/12/2001	25/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
8	Progetto n. 6 - Scolmatore roggia Munara	A/3/1.c	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	436.406,08	436.406,08	436.406,08	Lavori collaudati	30/11/2000	30/11/2001	20/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 515/96 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	A/7/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 58 22/8/2000	568.102,59	568.102,59	468.442,37	Lavori in corso		31/07/2002		
AZIENDA CONSORZIO VENETO SERVIZI Legge 515/96 Es. 1997												
3	Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano.	A/2/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DPGR N. 63 12/11/1998	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	Lavori collaudati	19/04/1998	7/11/2001	07/12/2001 15/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 30 del 05/04/2002
COMUNE DI ARQUA/PETRARCA Legge 515/96 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 9/12/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati	16/06/1998 03/12/1998	25/01/2001	29/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo.
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Legge 515/96 Es. 1997												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 97 3^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/ impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronica	A/10/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1998	DDDA N. 25 19/03/1999	1.446.079,32	1.446.079,32	1.260.029,51	Lavori conclusi. Collaudo in corso	23/05/2000	29/11/2001		
COMUNE DI CAVALLINO												
Legge 515/96 Es. 1987												
1	Lavori di "ristrutturazione" e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1. 2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 38 23/4/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	2.488.097,95	Lavori in corso				
COMUNE DI CAVARZERE												
Legge 515/96 Es. 1987												
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 64 12/1/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 204 del 22/10/2004, un'economia di € 4.303,48. Richiesta la restituzione alla R.V. di € 12.354,14.
COMUNE DI CHIOGGIA												
Legge 515/96 Es. 1987												
16	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Vai da Rio	B/16/7	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 55 29/6/1999	250.998,05	250.998,05	0,00	Lavori in corso	10/09/1999			
16	Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nelle cailli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera	B/16/4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 95 30/10/2000	4.991.555,93	4.991.555,93	2.682.307,55	Lavori in corso	04/10/2002			Progetto riadottato
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia	B/16/8	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 135 29/11/2002	1.669.062,18	116.834,35	116.834,35	Progettazione in corso				Decreto di impegno ed erogazioni limitati alle sole spese di progettazione Registrata, con DDDA n. 39 del 14/04/2003, un'economia di € 19.777,51 da reinscrivere nel bilancio regionale 2003
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Vai da Rio	B/16/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 545 16/12/1997	209.705,25	209.705,25	189.927,74	Lavori collaudati	09/03/1998	07/05/1998	08/07/1998	Registrata, con DDDA n. 54 del 25/06/1999, un'economia di € 12.200 convogliata nel finanziamento 16
19	Progetto esecutivo per un sistema di disidratazione dei fanghi depuratore Vai da Rio-2° lotto	B/16/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 146 24/3/1998	194.381,98	194.381,98	194.381,98	Lavori collaudati	03/03/1999	10/06/1999	15/09/1999	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 97 3^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 430 DEL 22/10/1997	147.098,80	147.098,80	140.752,63	Lavori collaudati	29/11/1997	12/05/1998	19/12/1998	Documentazione relativa al collaudo dell'opera non ancora inviata da parte dell'ente.
21	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	B/16/6	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 12 DEL 2/3/1999	2.040.004,75	2.040.004,75	1.684.034,30	Collaudo in corso	19/07/1999	31/10/2000		L'importo complessivo dell'opera è pari a 3,1 MLD di lire, finanziato per 1,5 MLD dal CIPE e per 1,6 MLD dalla Legge Spec. 96
22	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	B/16/6	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 22 DEL 15/3/1999	826.331,04	826.331,04	500.688,08	Lavori in corso	15/07/1999			
COMUNE DI ESTE												
Legge 515/96 Es. 1997												
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Mennarà"	A/6/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 30 DEL 5/8/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	Collaudo in corso Lavori in corso	02/02/2000 09/06/2003	15/05/2001		
COMUNE DI GALZIGNANO												
Legge 515/96 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	A/7/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 185 DEL 24/4/1998	619.748,28	619.748,28	619.711,96	Lavori collaudati	11/01/1999	09/03/2001	31/02/2002	Registrata, con DDDA n. 61 del 31/05/2002, un'economia pari a € 36,32
COMUNE DI MEOLO												
Legge 515/96 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo (progetto complessivo € 538.335,67)	B/19/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 11 DEL 5/5/1998	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 13/11/2003
COMUNE DI MOGLIANO VENETO												
Legge 515/96 Es. 1997												
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/11/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 84 DEL 09/12/1998	2.582.284,50	2.582.284,50	2.324.056,05	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
COMUNE DI MONASTIER												
Legge 515/96 Es. 1997												
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/12/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 29 DEL 5/8/1998	1.401.642,79	1.401.642,79	1.401.642,79	Lavori collaudati	01/07/1999	26/10/2001	22/07/2002	Importo originale del progetto pari a € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 36 del 14/04/2003, un'economia di € 147.727,91, reinvestita per finanziare l'int. 2

Legge 515-96 Es 97 3^a

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monselice - opere di completamento	B/12/1. 1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 182 05/10/2004	147.727,91	147.727,91	0,00	Progetto approvato				Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003
COMUNE DI MONSELICE Legge 515/96 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	A/8/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 116 13/12/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.324.066,07	Lavori ultimati	18/01/2000	26/09/2002		Perizia suppletiva di variante approvata con DDDA 22/2001. Finanziamento invariato
COMUNE DI MUSILE Legge 515/96 Es. 1997												
6	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 93 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
6A	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) (€ 1.239.496,56)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 516.456,90) + 3 (€ 516.456,90) + 4 (€ 206.582,76) = € 1.239.496,56					Lavori collaudati	18/02/2000	20/06/2001	28/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
COMUNE DI NOALE Legge 515/96 Es. 1997												
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Casi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 18 26/2/2001	1.291.142,25	1.291.142,25	192.701,15	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 1.291.142,25				Importo complessivo dell'opera € 6.971.742,72 finanziato parzialmente con fondi della Legge Speciale per Venezia per € 2.065.827,60
COMUNE DI PADOVA Legge 515/96 Es. 1997												
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DGCA N. 213 03/05/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori ultimati	20/05/2002			
COMUNE DI VENEZIA Legge 515/96 Es. 1997												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
74 V.	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	C/23/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		7.521.618,25	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento € 27.372.215,65 suddiviso negli interventi 74A (€ 428.659,23), 74B (€ 4.343.402,52), 74C (€ 2.065.827,60) e uno di competenza del Comune del Cavallino (€ 4.648.112,09). Parte del finanziamento revocato.
74A V.	Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico.	C/23/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 179 24/12/2001	428.659,23	428.659,23	0,00	Progetto approvato				
74B V.	Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)	C/23/1/3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 27/6/2002	4.343.402,52	4.343.402,52	0,00	Progetto approvato				
76	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	Lavori in corso				Il DDDA n. 90 del 12/08/2002 che impegnava € 2.065.827,60 è annullato con il DDDA 77/03 in quanto l'intervento deve essere finanziato con i fondi CIPE
74C V.	Ristrutturazione della rete fognaria secondaria della zona Nord e Centro di Marghera (VE)	C/23/1/4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999		2.065.827,60							
74D V.	Completamento della rete di fognatura di tipo misto del Bacino della Gazzera.	C/23/1/5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 114 20/08/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				

COMUNE DI ZERO BRANCO

Legge 515/96 Es. 1997

2	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	B/14/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 67 13/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.070.893,88	Lavori in corso	25/10/2000			Con DDDA n. 52/2004 stabilito integrazione finanziamento di € 210.000,00. Con DGR 1234/04 stabilito nuovo termine fine e lavori: 31/12/2005
---	---	--------	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	------------	--	--	---

CONSORZIO BASSO PIAVE

Legge 515/96 Es. 1997

1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulico delle isole Trepontine	B/17/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 52 DEL 4/8/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	892.427,07	Lavori in corso	24/04/2002			
---	--	--------	---------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------------	-----------------	------------	--	--	--

REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI

Legge 515/96 Es. 1997

Legge 515-96 Es 97 3^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
1	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	C/24/1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 95/03 DGR 2382/03 DGR 1948/03	2.030.708,53	298.945,69	113.192,71	Lavori in corso				Fondi a disposizione della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
2	Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera - MASTER PLAN (Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Z. I. di Porto Marghera)	C/24/1. 1	DGR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 37 23/4/2002	551.575,97	551.575,97	551.575,97	Lavori ultimati	Date diverse			Esecuzione dei lavori affidata a 5 soggetti attuatori.
ULSS 12 VENEZIA / DISINQUINAMENTO Legge 515/96 Es. 1997												
7	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Secondo stralcio funzionale	B/22/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 152 27/9/1998	929.622,42	929.622,42	916.230,09	Lavori collaudati	25/10/1999	15/11/2000	30/04/2003	Registrata, con DDDA n. 153 del 30/10/2003, un'economia di € 14.392,33 reiscritta nel bilancio regionale.
8	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile e G.B. Giustinian in Comune di Venezia	B/22/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 425 27/10/1997	103.291,38	103.291,38	75.910,27	Lavori collaudati	13/06/1995	30/10/1998	27/03/2003	In attesa del decreto di contabilità finale di competenza dei lavori pubblici.
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA Legge 515/96 Es. 1997												
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1. 6	DGR 2613 22/07/1997		5.265.854,58			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
TOTALE					103.291.379,83	85.154.088,74	65.561.612,82					
						82,44%	63,47%					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 98 4^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
ACM Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
56	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Strà	A/11.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 33 DEL 2/4/2001	206.582,76	206.582,76	149.704,00	Collaudo in corso	06/03/2002	28/05/2003		
57	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Santa Maria di Sala.	A/11.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 44 23/4/2001	413.165,52	413.165,52	322.965,79	Lavori in corso	04/03/2002			
58	Lavori per la costruzione del 29° lotto di fognature. Intervento nel comune di Fossò	A/11.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 45 23/4/2001	103.291,38	103.291,38	87.780,79	Collaudo in corso	15/10/2001	13/12/2002		
59	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Noale.	A/11.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 58 14/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,23	Lavori in corso	18/02/2003			
60	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Scorzè	A/11.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 41 23/5/2001	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Lavori collaudati	13/02/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 03/12/2004
61	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campolongo Maggiore.	A/11.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 120 3/10/2001	309.874,14	309.874,14	222.937,40	Lavori in corso	07/10/2003			
62	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Vigonovo	A/11.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 32 DEL 2/4/2001	258.228,45	258.228,45	228.679,46	Collaudo in corso	06/03/2002	26/06/2003		
63	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Dolo.	A/11.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	196.534,26	Lavori in corso	03/07/2002			
64	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Fiesso d'Artico.	A/11.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 14/5/2001	154.937,07	154.937,07	139.443,36	Lavori in corso	10/09/2002			
65	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Martellago.	A/11.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 30/7/2001	361.519,83	361.519,83	275.917,82	Lavori in corso	09/10/2002			
66	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mira.	A/11.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 107 DEL 7/9/2001	723.039,66	723.039,66	650.735,69	Lavori in corso	28/08/2002			
67	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mirano.	A/11.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 119 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	557.773,46	Lavori in corso	28/10/2002			
68	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Salzano.	A/11.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 3/10/2001	413.165,52	413.165,52	328.098,44	Collaudo in corso	05/09/2002			
69	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Spinea.	A/11.14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 DEL 7/9/2001	154.937,07	154.937,07	154.937,07	Lavori collaudati	11/07/2002	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 240 del 20/12/2004
70	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campagna Lupia	A/11.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 89 30/7/2001	154.937,07	154.937,07	95.462,11	Lavori in corso	11/09/2002			

Legge 515-96 Es 98 4^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
71	Lavori per la costruzione del 2° lotto fognature. Intervento nel comune di Pianiga.	A/11.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 14/5/2001	258.228,45	258.228,45	208.974,10	Collaudo in corso	10/09/2002	26/07/2003		
72	Lavori per la costruzione del 2° lotto fognature. Intervento nel comune di Camponogara	A/11.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 90 30/7/2001	464.811,21	464.811,21	418.330,09	Collaudo in corso	12/07/2002			
AZIENDA SERVIZI IDRICI CASTELLANA Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV). 1° stralcio	B/17.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 48 DEL 1/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	Lavori collaudati	22/02/2001	14/11/2002	24/04/2003	Registrata, con DDDA n. 148 del 20/10/2003, un'economia di € 66.305,78 da reinscrivere nel bilancio regionale 2003
AZIENDA CONSORZIO SILE PIAVE Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
2	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 63 01/09/2000	2.052.399,45	2.052.399,45	2.052.399,45	Lavori collaudati	09/10/2001	30/06/2003		Registrata, con DDDA n. 229 del 03/12/2004, un'economia di € 13.428,15
3	Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callaita, Roncade per l'importo totale di € 5.422.797,44	A/8 IV fase	A/8 IV Finanziamento suddiviso negli interventi 4 (DDDA n. 78/2000), 5 (DDDA n. 94/2000), 6 (DDDA n. 51/2000) e 7 (DDDA n. 51/2000)									
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 78 15/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,65	Collaudo in corso	18/10/2001	25/01/2003		
5	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callaita - Ampliamento della rete - II stralcio.	A/8.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 94 30/10/2000	1.446.079,30	1.446.079,32	68.736,33	Fondi dirottati all'intervento 7A per l'importo di € 1.446.079,32.				
6	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	A/8.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 61 01/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori in corso	26/10/2001			
7	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callaita. Impianto di depurazione della Frazione Oimi - 2° stralcio	A/8.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 51 04/09/2000	877.976,75	877.976,75	0,00	Fondi dirottati nell'intervento 7A per l'importo di € 877.976,73.				
7A	Realizzazione di rete fognaria e relativi allacciamenti in conformità al nuovo Progetto Generale Definitivo (€ 3.873.426,75)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.549.370,70) + 5 (€ 1.446.079,32) + 7 (€ 877.976,73) = € 3.873.426,75									
AZIENDA CONSORZIO TERGOLA Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
25	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisanì	A/1.14 - IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 161 3/12/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
26	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	A/1,5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 92 30/10/2000	516.456,90	516.456,90	428.560,11	Lavori in corso	30/07/2001			Nuovo termine lavori al 30/10/2005 con DDDA n. 133 del 25/09/2003
27	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	A/2,2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 77 15/9/2000	387.342,67	387.342,67	387.342,67	Lavori collaudati	04/07/2001 09/12/2002	27/06/2002 31/12/2002	18/11/2002 25/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 170 del 17/11/2003
28	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero	A/1,8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 116 19/12/2000	89.347,04	89.347,04	89.347,04	Finanziamento convogliato nell'intervento 50A				
29	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/1,9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
30	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone e Muson in comune di Romadice	A/1,11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 85 30/7/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
31	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Camposampiero alla rete consortile principale	A/1,4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 76 15/9/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,46	Appalto A lavori in collaudati Appalto B lavori in corso	30/07/2001 26/05/2003	27/09/2002	26/02/2003	
32	Rete fognaria nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/2,1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
33	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd)	A/1,6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 93 30/10/2000	144.607,93	144.607,93	130.147,14	Lavori in corso	03/04/2002			
34	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	A/1,7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 30/10/2000	165.266,21	165.266,21	165.266,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
35	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	A/1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		2.190.698,87			Finanziamento suddiviso dall'ente in 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F e 35G				
35A	Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentin con Via Straelle San Pietro in Comune di Camposampiero (€ 88.364,63)	A/1,18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 35 04/02/2004	88.425,43	88.425,43	0,00	Progetto approvato				
35B	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: prolungamento e lottizzazione Fratina e Bassa I° in comune di Camposampiero - Rostrola in comune di Camposampiero (€ 516.456,90)	A/1,17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 10/09/2003	516.456,90	516.456,90	0,00	Progetto approvato				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 98 4*

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
35C	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straille, Bonora, S. Pietro, Straille di Rustega e del Graticciolo Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 1° stralcio (€ 51.645,69)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 06/09/2003	51.645,69	51.645,69	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35D	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: Rigotti e Matteotti in comune di Cadoneghe - S. Francesco, Goldoni e S. Chiara in Comune di Vigonza - Don Orione in Comune di Trebaseleghe (€ 1.032.813,80)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/06/2003	191.089,05	191.089,05	0,00	In fase di progettazione				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35E	Costruzione di una fognatura nera lungo Via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 191.089,06)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/06/2003	191.089,05	191.089,05	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35F	Interventi nei Comuni ex Tergola (€ 331.514,83)							Finanziamento convogliato nell'intervento 76G				
35G	Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta (€ 826.331,04)							Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
36	Estensione delle reti di fognatura nera nelle Vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	A/2.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 115 19/12/2000	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				
37	Progetto esecutivo per il collegamento della zona Industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzago.	A/1.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 22/8/2000	404.385,75	404.385,75	404.385,75	Lavori collaudati	02/07/2001	05/09/2002	19/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 96 del 18/08/2003
38	Completamento centro di biotattamento di Camposampiero	B/20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		6.249.128,48			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
39	Collettore di collegamento fognario Resana - Torressella	A/2.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 31 21/3/2001	2.065.827,60	2.065.827,60	1.853.120,36	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				
40	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Plovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	A/1.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 84 30/7/2001	206.562,76	206.562,76	206.562,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				
41	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	A/1.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 22/8/2000	65.073,57	65.073,57	65.073,57	Lavori collaudati	04/12/2001	01/07/2002	02/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 97 del 18/08/2003
42	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia	A/2.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	139.443,36	139.443,36	139.443,36	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
43	Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia	A/1.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	224.658,75	224.658,75	224.658,75	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 98 4^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione s/e impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
44	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	A/1.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 54 DEL 4/8/2000	774.685,35	774.685,35	489.212,60	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
44A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe (€1.807.599,15)		Riuniti i finanziamenti 17 (€ 1.032.913,80) + 44 (€ 774.685,35) = € 1.807.599,15					Opere in fase di collaudo	03/07/2000	24/04/2003		
45	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2 ^A fase	A/1.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 124 4/10/2001	2.117.473,29	2.117.473,29	249.027,29	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI												
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
9	Progetto "Laguna 9 ^a " - Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella e Fontaniva	A/10.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 70 13/9/2000	2.014.181,91	2.014.181,91	1.680.099,77	Lavori in corso	29/01/2001			
10	Progetto "Laguna 10 ^a " - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	A/10.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.529.125,57	Lavori in corso	27/03/2001			
11	Progetto "Laguna 11 ^a " - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupari.	A/10.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.579.788,84	Lavori in corso	27/03/2001			
AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEIO BERICO												
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
3	Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Galzignano T.	B/12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 4/6/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	929.822,42	Lavori in corso	18/07/2002			
AZIENDA CONSORZIO VENETO SERVIZI												
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
4	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	A/4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 171 12/12/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	26.261,49	Lavori in corso				
5	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	A/6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2000	DDDA N. 114 19/12/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	12/07/2001	19/09/2002	14/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 147 del 20/10/2003
6	Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P., Tribano.	A/3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2001	DDDA N. 87 30/07/2001	3.821.781,05	3.821.781,05	3.350.710,87	Lavori in corso	02/07/2002 02/07/2002 15/05/2002 02/07/2002			
7	Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Magglore - 13 ^a stralcio fognature in comune di Este	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2002	DDDA N. 136 30/10/2001	1.446.079,32	1.446.079,32	354.790,74	Lavori in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 515-96 Es 98 4^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
S.P.I.M. Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
3	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura, n. 2.	B/13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	0,00	Progetto approvato				
COMUNE DI CAVARZERE Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
4	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 81 9/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 228 del 03/12/2004, un'economia di € 17.190,15
COMUNE DI MORGANO Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zerfio, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (TV)	B/14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 1/9/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	Collaudo in corso	14/01/2003	22/07/2003		
COMUNE DI PREGANZIOL Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	B/15.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 46 27/7/2000	774.685,35	774.685,35	697.216,82	Lavori collaudati	19/07/2001	26/10/2002	04/02/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso: in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
COMUNE DI ZERO BRANCO Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
3	Interventi di fognatura e di depurazione nel comune di Zero Branco.	B/18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 64 DEL 1/9/2000	123.949,66	123.949,66	123.949,66	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 123.949,66				
4	Interventi di fognatura e depurazione	B/18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	134.278,79	134.278,79	134.278,79	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 134.278,79				
4A	Interventi di fognatura e depurazione (€ 516.456,90)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 258.228,45) + 3 (€ 123.949,66) + 4 (€ 134.278,79) = € 516.456,90					Collaudo in corso				
MAV Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
3	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	B/21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDS N. 28 11/3/1999	1.549.370,70	1.520.474,93	1.254.439,76	Lavori in corso				
REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
36	Realizzazione Carta Geologica della Laguna	B/22.1 IV fase	DCR N. 23 DEL 1/3/2000	DGR N. 3788 1/12/2000	309.874,14	309.870,17	303.930,59	Lavori ultimati				
37	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	B/22 IV fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		451.899,79	428.730,01	428.129,97	Lavori in corso				
ULSS 17 ESTE MONSELICE												
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1^ fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDA N. 96 30/10/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.016.099,14	Lavori in corso	08/04/2002			
ENTI VARI												
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		5.164.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	Progetto approvato				
TOTALE					61.187.231,14	49.285.685,85	37.385.016,99					
						80,55%						61,10%

Legge 515-96 Magg Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
26	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	B/23	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	36.151,98	36.151,98	6.501,93	Lavori collaudati	03/07/2003	08/08/2003		Registrata con DDDA n. 105 del 08/08/2004, un'economia di € 29.650,05
CONSORZIO DESE SILE												
Legge 515/96 Magg. Mutui IV ^a fase												
TOTALE												
						36.151,98	6.501,93					
						100,00%	17,98%					

Legge 345-97 Es 98 5^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ARPAV												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
10	Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto.	A/6.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 8/10/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	309.874,00	Lavori in corso				
11	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante	B/15.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGR N. 667 14/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	516.456,90	Lavori in corso				
APGA												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
12	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	A/1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 14/12/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori in corso				
AZIENDA SPECIALE VENETO SERVIZI												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
8	Impianto di biotratamento di Conselve (€ 8.779.767,28)	A/6 V fase	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		1.032.913,80							
8A	Adeguamento al D. M. 30 luglio 1999 dell'Impianto di depurazione di Conselve - I stralci	A/5.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 69 26/06/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	1.175.394,52	Lavori in corso				
8B	Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 46.800 A.E. - 1° stralcio	A/5.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 26 26/03/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	94.676,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 3.098.741,39				
8C	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	A/5.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 26 26/03/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	94.676,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 3.098.741,39				
A.S.P. DI CHIOGGIA												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
7	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGCA N. 180 31/05/2004	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Lavori ultimati				Intervento originario di € 19.780.912,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto
COMUNE DI MIRA												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, loc. Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 148 13/12/2002	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge 345-97 Es 98 5^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI VENEZIA Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
76 V.	Bonifica "Corti femminili" - Mestre	B/16 V fase	DGR N. 2962 DEL 14/9/2000		1.518.216,98	1.518.216,98	1.417.549,70	Lavori collaudati				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Registrata, con DDDA n. 152 del 22/11/2001, un'economia di € 100.667,29
77A V.	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiarificazione, filtrazione e disinfezione U. V.	A/2.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 27/5/2002	5.216.214,68	5.216.214,68	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
77B V.	Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione	A/2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.239.498,56	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
78	PROGETTO INTEGRATO RII	B/19 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 4/10/2001	19.625.362,17	19.625.362,17	19.625.362,17	Lavori in corso				

CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE

Legge 345/97 Es. 1998 - V fase

5	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 18 12/3/2003	3.616.198,29	3.616.198,29	149.344,87	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione in corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione.
6	Fitoriduzione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 139/01 DDDA N. 110/02	7.746.853,49	361.519,83	296.639,42	Progetto approvato				

CONSORZIO BASSO PIAVE

Legge 345/97 Es. 1998 - V fase

2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 223 DEL 2004	53.789,57	53.789,57	53.789,57	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 12.911.422,48, di cui € 10.867.632,91 devoluti alla Diocesi Patriarcale di Venezia e € 2.000.000,00 alla Comunità Ebraica di Venezia.
---	---	-------------	--------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------	--	--	--	--

CONSORZIO BACCHIGLIONE BRENTA

Legge 345/97 Es. 1998 - V fase

Legge 345-97 Es 98 5^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4	Ricalibratura e sostegni sui rii di Piove	A/7 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/6/2003	4.131.655,20	206.582,75	206.582,75	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazioni limitati alle sole spese di progettazione
5	Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	A/9 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 14/12/2000	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato				
6	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999					Finanziamento originale di € 2.840.512,95 suddiviso negli interventi 6A (€ 1.549.370,70) e 6B (€ 1.291.142,25)				
6A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacino dei Rii di Piove (€ 1.549.370,70)	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.549.370,70			Progetto definitivo				Con DGR 1550 e 1551 del 26/05/2004 ottenuto giudizio di compatibilità ambientale
6B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Bernio (€ 1.291.142,25)	A/8.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 190 07/10/2004	1.291.142,00	1.291.142,00	142.025,65	Lavori in corso				
CONSORZIO DESE SILE Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
16	Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	A/10.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.291.142,25			Finanziamento suddiviso negli interventi 16A (€ 309.874,14) e 16B (€ 981.268,11)				
16A	Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossatta (€ 309.874,14)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 309.874,14)					Progettazione in corso				Approvazione VIA con DGR N. 1549 DEL 14/06/02
16B	Interventi di riqualificaz. nell'area denominata "Oasi di Noale". 2° Stralcio (€ 981.268,11)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 981.268,11)					Progettazione in corso				
CONSORZIO DESTRA PIAVE Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
1	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque dei sottobac. Vela: riserimento corsi d'acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d'invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monaster, Roncade.	B/14 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 29 27/3/2003	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori in corso	14/05/2003			Con DDDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori
CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
11	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	B/13.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.615.196,29			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 345-97 Es 98 5^A

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11A	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica (L'importo complessivo del progetto è pari a € 8.234.568,99, di cui € 5.164.568,99 costituiscono il primo stralcio)							Progettazione in corso				L'importo di € 5.164.568,99 è costituito da uno stralcio di € 2.469.568,99 affidato al Consorzio e da uno stralcio di € 2.695.000,00 all'A.C.M.
DELTA PO Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
2	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGCA N. 344 10/10/2000	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	Lavori in corso				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque. La quota pari a € 1.900.000,00 assegnati all'ASP di Chioggia (int. 7)
REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
3	Bonifica siti inquinati P.Marghera	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		6.125.345,12							Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003. Il finanziamento complessivo pari a € 7.643.562,11, comprende anche una quota pari a € 1.518.216,88 destinata al Comune di Venezia per la bonifica delle Corti Femminili
4	Indagine epidemiologica Marghera	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		103.291,38			Progettazione in corso				
REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
38	Intervento sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche	B/22 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.197.482,79							Intervento coordinato con il M.A.V. che finanzia una quota pari ad altri € 6.197.483,01
39	Progetto integrato Fusina (refil civili industriali) - P.I.F.	A/3	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		18.075.991,47							
REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 345-97 Es 98 5^a

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8	Incentivi, modifiche culturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole	A/4 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	Vari	10.329.137,98	10.329.137,98	4.020.035,06	Lavori in corso	importo complessivo dei finanziamenti pari a € 10.329.137,98, di cui € 6.818.335,60 destinati ai Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni relative ai consorzi di bonifica è pari a € 3.451.802,81			
VESTA												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
3	Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia)	B/21.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGR N. 3057 DEL 2003	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Progetto approvato				
COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/08/1999		2.000.000,00			Progettazione in corso	Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino"			
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA												
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/08/1999		10.857.632,91			Progettazione in corso	Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod. B/20_V fase.			
TOTALE					142.025.647,01	77.604.790,96	49.812.954,57					
					54,64%		35,07%					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo impiego	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
ARPAV												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
12	Monitoraggio delle acque lagunari e dei corsi d'acqua del bacino scolante	E/91	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		54.370,00			Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
13	Monitoraggio interventi di disinquinamento nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e realizzazioni del Laboratorio per l'analisi delle diossine presso il Dipartimento dell'ARPAV di Venezia - Centro di riferimento del Bacino Scolante.	E/91.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 26/6/2003	1.495.000,00	1.495.000,00	668.500,00	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
14	Piano di monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera e nel bacino scolante nella laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio Industriale e delle emergenze a P.M.	E/92	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4013 31/12/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				Progetto SIMAGE I° LOTTO
ACM												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
73	Interventi di fognatura in comune di S. Maria di Sala	B/49	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 167 7/12/2002	413.165,52	413.165,52	371.849,01	Collaudo in corso	13/02/2003			
74	Interventi di fognatura in comune di Vigonovo	B/52	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 103 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	174.342,68	Lavori in corso	25/10/2002			
75	Interventi di fognatura in comune di Stra	B/51	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 168 7/12/2001	309.874,14	309.874,14	204.792,20	Lavori in corso	05/03/2003			
76	Interventi di fognatura in comune di Spinea	B/50	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 158 30/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,60	Collaudo in corso	03/10/2002			
77	Interventi di fognatura in comune di Scorzè	B/48	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 157 30/11/2001	516.456,90	516.456,90	198.632,08	Lavori in corso	13/02/2003			
78	Interventi di fognatura in comune di Salzano	B/47	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 155 30/11/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,97	Lavori in corso	13/02/2003			
79	Interventi di fognatura in comune di Camponogara	B/37	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 121 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	162.573,99	Lavori in corso	13/02/2003			
80	Interventi di fognatura in comune di Noale	B/45	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 159 30/11/2001	671.393,97	671.393,97	473.476,85	Lavori in corso	18/02/2003			
81	Interventi di fognatura in comune di Martellago	B/42	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 156 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	169.816,44	Lavori in corso	13/02/2003			
82	Interventi di fognatura in comune di Mirano	B/44	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 129 4/10/2001	733.368,80	733.368,80	366.731,64	Lavori in corso	12/02/2003			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
83	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di <u>Diavolera</u>	B/46	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 127 4/10/2001	258.228,45	258.228,45	211.565,43	Lavori in corso	13/02/2003			
84	Interventi di fognatura in comune di <u>Campagna Lupia</u>	B/36	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 142 9/11/2001	258.228,45	258.228,45	107.246,78	Lavori in corso	18/02/2003			
85	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di <u>Mira</u>	B/43	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 128 4/10/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	401.254,91	Lavori in corso	29/01/2003			
86	Interventi di fognatura in comune di <u>Campogogara</u>	B/38	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 104 DEL 7/9/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	810.461,91	Lavori in corso	18/02/2003			
87	Interventi di fognatura in comune di <u>Dolo</u>	B/39	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 160 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	211.414,09	Lavori in corso	12/02/2003			
88	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di <u>Fossoducola</u>	B/40	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 122 3/10/2001	258.228,45	258.228,45	220.688,73	Lavori in corso	13/02/2003			
89	Interventi di fognatura in comune di <u>Fossò</u>	B/41	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 105 DEL 7/9/2001	247.899,31	247.899,31	195.056,95	Lavori in corso	01/10/2002			
APGA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
13	Interventi di fognatura in comune di <u>Azergrande</u>	B/32	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 145 12/12/2002	309.874,14	309.874,14	0,00	Progetto approvato				
14	Interventi di fognatura in comune di <u>Bragline</u>	B/30	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 144 12/12/2002	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori ultimati				
15	Interventi di fognatura in comune di <u>Correzzola</u>	B/29	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 145 12/12/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Progetto approvato				
16	Interventi di fognatura in comune di <u>Legnaro</u>	B/33	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 144 12/12/2002	593.925,43	593.925,43	253.008,16	Lavori in corso				
17	Interventi di fognatura in comune di <u>Piove di Sacco</u>	B/31	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 145 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.003,44	0,00	Progetto approvato				
18	Interventi di fognatura in comune di <u>Pontelongo</u>	B/28	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 145 12/12/2002	671.393,97	671.393,97	566.474,47	Lavori in corso				
19	Interventi di fognatura in comune di <u>S. Angelo di Piove</u>	B/34	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 144 12/12/2002	542.279,74	542.279,74	0,00	Progetto approvato				
20	Interventi di fognatura in comune di <u>Polverara</u>	B/27	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 144 12/12/2002	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori ultimati				
21	Adeguamento impianti di depurazione minori	B/35	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 102 01/06/2004	1.549.370,70	1.549.370,70	103.622,62	Lavori in corso				
AGENZIA SERVIZI URBANI DELLA PROV. DI ANA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Interventi di fognatura nei comuni di <u>Riese Pio X, Loria</u>	B/54	DGR N. 1834 23/6/2000	DDA N. 30 21/3/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	30/10/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 31/08/2004.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
8	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d'Alfino - 3° stralcio	B/22	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2002	1.755.953,46	1.755.953,46	1.213.585,37	Lavori in corso	01/04/2003			
9	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA n. 70 del 13/06/2003	1.136.205,18	1.136.205,18	63.719,58	Progetto approvato				Erogazione limitata alla copertura delle spese di progettazione
10	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 86 12/08/2003	774.685,35	774.685,35	697.216,82	Collaudo in corso	27/01/2003			
11	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Callalta	B/25	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 100 14/10/2002	774.685,35	774.685,35	596.437,63	Lavori in corso	25/02/2003			
AZIENDA CONSORZIO TERGOLA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
46	Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago	B/12	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 105 18/10/2002	309.874,14	309.874,14	235.213,72	Lavori in corso				
47	Interventi di fognatura in comune di Loreggia	B/3.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 88 30/7/2001	358.937,54	358.937,54	172.073,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
47A	Costruzione di un nuovo by-pass della rete fognaria di Loreggia (€ 723.039,65)			Riuniti i fondi dei finanziamenti 42 (€ 139.443,36) + 43 (€ 224.658,75) + 47 (€ 358.937,54) = € 723.039,65				Lavori in corso	15/05/2002			
48	Riqualificazione della rete di fognatura mista del comune di Camposampiero e dell'area denominata "Fornace"	B/7	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 52 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	02/05/2002			
49	Interventi di fognatura in comune di Camposampiero loc. Fiumicello (PD)	B/8	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 14 22/2/2002	1.136.205,18	1.136.205,18	14.211,47	Lavori in corso				
50	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero	B/11	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 116 19/12/2000	413.165,52	413.165,52	297.561,97	Finanziamento convogliato nell'intervento 50A				
50A	Esecuzione della rete di fognatura nera in via Giovanni XXIII e via Cao del Mondo e Puccini a Camposampiero (€ 502.512,56)			Riuniti i finanziamenti 28 (€ 89.347,04) + 50 (€ 413.165,52) = € 502.512,56				Lavori in corso	02/05/2002			
51	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Maicanton e Muson in comune di Pomarico	B/9	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	258.228,45	258.228,45	103.291,38	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
52	Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe	B/10	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 56 27/5/2003	258.228,45	258.228,45	0,00	Progetto approvato				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dolo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collauda	Note
53	Interventi di fognatura in comune di Resana	B/15	DGR N. 1834 23/6/2000		154.337,07			Progettazione in corso				
54	Impianto di depurazione di Camposanpiero	B/20	DGR N. 1834 23/6/2000		516.456,90			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
55	Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Grenzetta e Morosini in comune di Saonara - 2° tronco	B/17	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 149 19/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Lavori in corso	20/02/2002			
56	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	B/13. 1	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 98 30/10/2000	330.532,42	330.532,42	142.542,10	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
56A	Realizzazione rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in Comune di Noventa Padovana (€ 1.879.903,12)		Riuniti i finanziamenti 29 (€ 516.456,90) + 32 (€ 1.032.913,80) + 56 (€ 330.532,42) = € 1.879.903,12					Opera in fase di collaudo	04/08/2000 30/10/2002	19/06/2003		
57	Impianto di depurazione di Cadoneghe	B/21	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 124 4/10/2001	413.165,52	413.165,52	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
58	Interventi di fognatura in comune di Vigonza	B/6	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 72 13/06/2003	144.607,93	144.607,93	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A con DDDA N. 72 del 13/06/2003				
58A	Costruzione di una fognatura lungo via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 335.969,98)		Riuniti i finanziamenti 35E (€ 191.089,05) + 58 (€ 144.607,93) = € 335.969,98									
59	Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, 1° e II° tronco, in comune di Trebaseleghe - 1° stralcio.	B/2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 51 DEL 9/6/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	08/04/2002			
60	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	B/4	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 116 19/12/2000	516.456,90	516.456,90	379.271,71	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				
60A	Estensione della rete fognaria nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in Comune di Santa Giustina in Colle (€ 764.356,21)		Riuniti i finanziamenti 36 (€ 247.899,31) + 60 (€ 516.456,90) = € 764.356,21									
61	Rete fognaria nella Via Palù e sistemazione rete nelle vie Stiffonie villaggio Europa in comune di Piombino Dese.	B/14	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 35 DEL 3/4/2001	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in fase di collaudo	03/04/2002	28/05/2003		
62	Condotto fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana	B/13	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	547.444,31	547.444,31	416.603,21	Lavori in corso	09/01/2003			
63	Condotto di by-pass impianto di depurazione Camposanpiero (vedi Dgr 1834/00) Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone e Misson in comune di Borgoricco	B/19	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
63A	Realizzazione rete di fognatura nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone in Comune di Borgoricco (€ 1.549.370,70)		Riuniti i finanziamenti 30 (€ 774.685,35) + 51 (€ 258.228,45) + 63 (€ 516.456,90) = € 1.549.370,70					Lavori in corso		23/05/2002		

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
64	Completamento del collettore fognario Abbazia Pisani - Villa del Conte e della pista ciclabile lungo le vie Cardinale Priuli, Militare e Rettifineo.	B/5.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 121 29/12/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,45	Lavori in corso	04/12/2001 30/06/2003			
65	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle.	B/15.1 VI*	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 31 21/3/2001	619.748,28	619.748,28	369.157,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				
65A	Collegamento fognario Resana - Torreselle (€ 2.685.575,88)							Opere in fase di collaudo	23/05/2002	20/05/2003		
66	Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Ronchi in comune di L. Anzania (PT).	B/3.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 23 26/2/2001	157.519,35	157.519,35	141.767,42	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				
66A	Realizzazione fognature acque nere e pista ciclabile lungo la SP 71 nel Comune di Loreggia (€ 475.064,35)		Riuniti i finanziamenti 22 (€ 299.545,00) + 66 (€ 157.519,35) = € 475.064,35					Lavori collaudati	13/10/1999	06/04/2002	18/11/2002	L'importo del finanziamento regionale è pari a € 475.064,35. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 846.989,30 resta a carico dell'ente. Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte dell'ente
67	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	B/16	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 97 30/10/2000	464.811,21	464.811,21	464.811,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
67A	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia (appalto A) e completamento degli stessi (appalto B) (€ 630.077,42)		Riuniti i finanziamenti 34 (€ 165.266,21) + 67 (€ 464.811,21) = € 630.077,42					Lavori collaudati	30/07/2001	26/09/2003	02/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
68	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	B/18.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 135 30/10/2001	335.696,98	335.696,98	262.453,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				
68A	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 1 stralcio (€ 392.500,00)		Riuniti i finanziamenti 13 bis (€ 56.810,26) + 68 (€ 335.696,98) = € 392.500,00					Lavori in corso	14/01/2003			
69	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	B/5	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 161 3/12/2001	309.874,14	309.874,14	102.762,65	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				
70	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	B/18.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 84 30/7/2001	77.468,53	77.468,53	49.063,40	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
70A	Ampliamento rete di fognatura nelle vie Stroppari e Piovega nord in Comune di Villanova di Camposampiero (€ 284.051,29)		Riuniti i finanziamenti 40 (€ 206.582,76) + 70 (€ 77.468,53) = € 284.051,29					Opere in fase di collaudo	08/05/2002	20/05/2003		
71	Progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale e fognatura di acque nere di via Prati in comune di Vigonza - 1° stralcio	B/6.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 130 25/11/2002	320.203,28	320.203,28	228.813,08	Lavori in corso				
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - Vi fase												
12	Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera Via, Tombolo, S. Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari	B/26	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 170 12/12/2001	7.746.853,49	7.746.853,49	1.497.366,81	Lavori in corso				
AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - Vi fase												
4	Interventi di fognatura ed adeguamento impianto di depurazione in Comune di Battaglia Terme	B/63	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.342.787,94			Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 529.367,32) e 4B (€ 813.420,62).				
4A	Ampliamento rete fognaria in Comune di Battaglia Terme (€ 529.367,32)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
4B	Ampliamento rete fognaria in Comune di Montegrotto Terme (€ 813.420,62)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
A.S.P. DI CHIOGGIA Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - Vi fase												
23	Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	D/65	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.682.284,50			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante
24	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	B1/55	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 134 29/11/2002	9.812.681,08	9.812.681,08	1.120.711,47	Progetto approvato				
COMUNE DI CAMPOARSEGO Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - Vi fase												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
<p style="text-align: center;">COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Legge 448/98 Es. 1998, 2000, 2001 - VI fase</p>												
2	Interventi di fognatura e depurazione	B1/62	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		258.228,45			Finanziamento convogliato nell'intervento n. 3A.				
<p style="text-align: center;">COMUNE DI CAVALLINO Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase</p>												
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/63	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 38 23/4/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Progetto approvato				
<p style="text-align: center;">COMUNE DI CAVARZERE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase</p>												
5	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	B1/61	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 126 4/10/2001	2.065.827,60	2.065.827,60	1.859.244,84	Lavori ultimati				Date non comunicate dall'ente
<p style="text-align: center;">COMUNE DI ESTE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase</p>												
2	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/64, B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 67 DEL 4/6/2001	516.456,90	516.456,90	51.072,26	Lavori in corso				
3	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/64, A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 53 DEL 9/6/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	294.638,65	Lavori in corso				
<p style="text-align: center;">COMUNE DI FOSSO' Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase</p>												
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fosso (VE)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
<p style="text-align: center;">COMUNE DI MIRA Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase</p>												
2	Parco lagunare di Mira	D/82	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				Intervento congiunto con il Consorzio Sinistra Medio Brenta e la Regione Veneto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Indice o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI MONSELICE												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
3	Impianto di depurazione	B1/65	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 90 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato				
COMUNE DI MORGANO												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B1/66	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 13 22/2/2002	516.456,90	516.456,90	417.034,59	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	516.456,90	516.456,90	56.667,69	Lavori in corso				
COMUNE DI VENEZIA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
79	Interventi di fognatura; accordo di V. programma Malamocco-Alberoni	B1/60	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.681.025,89	0,00	0,00	Progettazione in corso				
80	PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 22 DEL 7/3/2002	24.789.931,16	24.789.931,16	22.195.410,00	Lavori in corso				
81	Interventi di fognatura; accordo di programma S. Erasmo	B1/59	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.807.599,15	0,00	0,00	Progettazione in corso				Intervento affidato al MAV
82	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6 (FUSINA)	B1/56.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 120 29/12/2000	1.068.549,32	1.068.549,32	45.650,86	Lavori in corso	27/03/2003			
83	Interventi di fognatura al Lido di Venezia	B1/58	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		826.331,04	0,00	0,00	Progettazione in corso				
84	Fognature afferenti all'impianto di V. Campalto	B1/57	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.078.919,94	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 6 interventi
85	Fognature afferenti all'impianto di V. Fusina	B1/56	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.265.138,64	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni di interventi precedenti e 2 nuovi interventi)

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
92	Bonifica area "ex - conterie" a Mirano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico-nocivi.	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
93	Interventi di riqualificazione della fognatura di viale Garibaldi e Piazza V. Carnedon.	B1/57.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 106 18/10/2002	1.254.768,03	1.254.768,03	0,00	Progetto approvato				
CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
7	Incremento Invaso e capacità di autodepurazione Valli di Gaizignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	D/79	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
8	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		7.746.853,49			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
7	Ricalibratura, realizzazione aree golenali e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	D/72	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 78 13/6/2003	3.098.741,40	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 7A (€ 2.324.056,05) e 7B (€ 774.685,35)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
7A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacini a sud del Fiumicello (€ 2.324.056,05)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 2.324.056,05)					Progetto preliminare				
7B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Trezze (€ 774.685,35)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 774.685,35)					Progetto preliminare				
8	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Sattima Presa Inferiore (Ricalibratura e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/75	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 63 13/6/2003	2.582.284,50	129.114,23	129.114,23	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 64 13/06/2003	2.324.056,10	116.202,80	116.202,80	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Progetto definitivo per la realizzazione di interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell'Idrovio Padova - Venezia.	D/74	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 128 18/11/2002	774.685,35	774.685,00	0,00	Progetto approvato				
CONSORZIO BRENTELLA DI PEDEROBBA Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
1	Bonifica ex - cava di Riese denominata "Cava Bergamini"	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	823.748,75	823.748,75	0,00	Progetto approvato	15/04/2003			Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
CONSORZIO DESE SILE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
17	Riqualificazione ambientale della fossa Marone	D/78	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				
18	Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del f. Marzenego e interv. sugli affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		7.746.853,49			Finanziamento diviso negli interventi 18A (€ 5.164.568,99) e 18B (€ 2.582.284,50)				
18A	Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 5.164.568,99)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 5.164.568,99)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
18B	Interventi nella zona di valle del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 2.582.284,50)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 2.582.284,50)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
CONSORZIO DESTRA PIAVE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risarcimento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	D/81	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 29 27/03/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	799.117,53	Lavori in corso	14/05/2003			

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
12	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio Brenta	D/76	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		4.131.655,19			Progettazione esecutiva in corso				
DELTA PO												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
3	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Plovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002				Finanziamento originale pari a € 19.108.905,27. Impegnati alla Delta Po € 18.876.499,66 suddivisi, poi, negli Int. 3A (€ 14.018.456,41) e 3B (€ 4.858.043,25). Il residuo, pari a € 232.405,61 impegnato per spese di progettazione				
3A	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Plovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	14.018.456,41	14.018.456,41	5.662.949,90	Lavori in corso				
3B	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotta Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotta Centrale Gazzera-Casello autostradale di Mestre e condotta centrale Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/86.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	4.858.043,25	4.858.043,25	0,00	Progetto approvato				
REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
5	Bonifica dell'area industriale ex Italsintex in comune di Camposampiero (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4136 DEL 22/12/2000	39.291,84	39.291,84	21.749,20	Lavori in corso				Liquidazione sospesa
6	Bonifica dei siti inquinati - Porto Marghera	D/83	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		8.263.310,39							Fondi a disposizione della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
REGIONE ACQUEDOTTI												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
1	Condotta CÀ solaro - Gazzera	D/90	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	4.002.540,97	6.197,48	6.197,48	Progettazione in corso				
2	Condotta CÀ solaro - Cavallino	D/89	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	6.972.169,14	13.427,88	13.427,88	Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
REGIONE DISINQUINAMENTO												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
40	Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	E/94	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.682.284,50							Intervento congiunto Regione Veneto/Comune di Venezia
41	Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e dell'aspetto di sedimenti dalla laguna, informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	E/95	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 43 DEL 2002	1.291.142,25	25.427,88	25.427,88	Progetti in fase di approvazione				
42		E/93	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,90	517.504,60	327.504,60	Lavori in corso				
REGIONE FURESE E AGRICOLTURA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
9	Incentivi alla politiche agricole ecocompatibili, modifiche culturali e piani di spargimento. Gestione pratiche agricole:	C/67	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPASA 156 DEL 23.10.2003	10.329.137,98	10.329.137,98	2.120.387,94	Lavori in corso				
10	Incentivazione all'innovazione ambientale	C/71	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.549.370,70			In istruttoria				
11	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali	C/70	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99	512.995,55	0,00	In istruttoria				
12	Ricostruzione fasce tampone e set-aside	C/68	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	Vari	3.615.198,29	3.614.872,81	848.067,17	Lavori in corso				
13	Gestione pratiche irrigue	C/69	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		10.329.137,98	5.658.031,20		Lavori in corso				
VESTA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
4	Adeguamento impianto di potabilizzazione Ca Solaro	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	3.486.084,07	3.486.084,07	788.104,00	Lavori in corso				
ENTI VARI												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Spese per progettazione inerenti: "Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto".	D/86.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	163.911,23	0,00					
TOTALE					235.504.345,36	137.853.897,22	57.101.001,59					24,25%
						58,54%						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
94A	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nel 17° lotto del comune di Spinea - parte C	1/F/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 46 23/05/2003	429.848,51	79.017,91	0,00	Progetto approvato	16/09/2003			Scheda madre
94B	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Spinea - parte C	1/F/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 47 23/05/2003	493.629,50	493.629,50	136.722,57	Lavori in corso				
94C	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Mirano	1/F/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 48 23/05/2003	305.380,96	305.380,96	0,00	In fase di appalto				
94D	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Salzano	1/F/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 48 23/05/2003	123.639,78	123.639,78	53.563,79	Lavori in corso				
94E	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Campagna Lupata	1/F/5.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 52 26/05/2003	510.827,52	510.827,52	353.166,55	Lavori in corso				
94F	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianina	1/F/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 87 29/07/2003	718.700,00	718.700,00	497.591,81	Lavori in corso	27/09/2003			
94G	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Dolo, Camponogara e Stra	1/F/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 55 27/05/2003	709.301,91	709.301,91	211.529,23	Lavori in corso				
94H	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Scorzè e Martellon	1/F/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 87 29/07/2003	430.879,99	430.879,99	0,00	Progetto approvato				
94I	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Noale	1/F/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 89 29/07/2003	772.051,42	772.051,42	166.811,30	Lavori in corso				
94J	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Mira.	1/F/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 117 20/08/2003	74.834,60	74.834,60	0,00	Progetto approvato				
94M	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Fossò - parte B.	1/F/5.10	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 174 19/11/2003	2.400.000,00	2.400.000,00	142.484,31	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante. Impegno di spesa relativo alle sole spese di progettazione.
95	Messa in sicurezza ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA 114/04				Progetto in corso				Quota di competenza A.C.M. pari a € 2.695.000,00. Presentato alla Regione Veneto in data 06/08/2003 progetto preliminare con S.I.A. Il finanziamento è riportato nell'intervento 11A del consorzio Sinistra Medio Brenta
96	Progetto dimostrativo per l'integrazione di reti di fognatura bianca e reti di bonifica DOLO-MIRA (Finanziamento iniziale € 5.164.568,99 al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta - Int. 11A - e poi diviso per competenze)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002					Progetto in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
22	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotte di Cona e Pontelongo	1/E/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Corezola, Cona, diversione scarico di Pontelongo.	1/E/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		4.648.112,09			Progettazione in corso				
24	Riqualificazione ed implementazione dati della rete fognaria del comprensorio conseriale.	1/E/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90			Progettazione in corso				
25	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45			Progettazione in corso				
26	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45			Progettazione in corso				
27	Interventi di fognatura a Sant' Angelo di Piove.	1/E/6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		413.165,52			Progettazione in corso				
28	Estensione ed adeguamento della rete fognaria nei comuni consorziati	1/E/7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.652.662,08			Progettazione in corso				
AZIENDA SERVIZI IDRICI CASTELLANA												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/M/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 85 12/8/2002	1.748.741,39	1.748.741,39	1.573.867,25	Collaudo in corso	03/03/2003			
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)	1/M/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 12/8/2002	1.350.000,00	1.350.000,00	1.215.000,00	Collaudo in corso	11/02/2003			
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
12	Ampliamento impianti Quarto d'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				
13	Realizzazione condotta da impianto depurazione di Roncade ad impianto di Quarto d'Altino (Costo del progetto € 2.400.000,00)	1/C/2	(ex 794 del 9/4/02) DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 1 DEL 07/01/2004	2.892.158,61	2.400.000,00		Progetto approvato				Il residuo, rispetto al costo del progetto pari a € 492.158,63, è riallocato nell'intervento 16A con DDDA n. 1/2004
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
72	Realizzazione della condotta fognaria di bypass fra S.Giustina in Colle e Cammasantera	1/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
72A	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticciolo Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoriccio e Massanzano - 1° stralcio (€ 826.331,04)		Riuniti i finanziamenti 35C (€ 51.645,69) + 72 (€ 774.685,35) = € 826.331,04					Progettazione in corso				
73	Completamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe	1/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 124 30/10/2002	1.859.244,84	1.859.244,84	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
73A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2° fase (€ 4.389.883,65)		Riuniti i finanziamenti 45 (€ 2.117.473,29) + 57 (€ 413.165,52) + 73 (€ 1.859.244,84) = € 4.389.883,65					Progettazione esecutiva terminata				
74	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Poventa	1/A/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
75	Realizzazione di condotte fognarie a Piombino Dese.	1/A/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		640.913,80			Progettazione in corso	14/01/2003			
76	Interventi di fognatura nei comuni consorziati	1/A/6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		3.629.518,18			Finanziamento diviso negli interventi 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G e 76H				
76A	Rete fognaria nelle vie Ronchi, Obbia Alta e Bassa in Comune di Trebaseleghe (€ 260.000,00)							Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76	-			
76B	Realizzazione reti di fognatura nera nelle vie Isonzo, Treviso, Arrigoni, Capriccio, Caviniello e Garibaldi (€ 600.000,00)							Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76	-			
76C	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle Vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do', Piazza Mercato e Via Cantale in Comune di Villanova di Camposampiero - 2° Stralcio (€ 750.000,00)							Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76	-			
76D	Realizzazione condotte di fognatura nera in Via Frattina, in Via Tiepolo, Via Castellaro e via Desman in Comune di Borgoriccio	1/A/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 64 30/03/2004	460.000,00	460.000,00	0,00	Progetto approvato				
76E	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticciolo Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoriccio e Massanzano - 2° stralcio (€ 800.000,00)	1/A/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 91 06/08/2003	774.885,35	774.885,35	0,00	Progetto approvato				
76F	Rete di fognatura nera in depressione nelle Vie Noventana e laterali a Noventa Padovana - 1° Stralcio (€ 600.000,00)	1/A/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 193 13/10/2004	645.000,00	645.000,00	0,00	Progetto approvato				
76G	Estensione della rete fognaria nelle vie Guizza Alta e Carpane in comune di Lorenzina (PD)	1/A/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 194 13/10/2004	350.000,00	350.000,00	0,00	Progetto approvato				
76H	Interventi nei Comuni ex Consorzio Tergola (€ 2.299.203,53)							Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito all'intervento 35F (€ 331.514,83)				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
76	Ampliamento rete di fognatura nera nel Comune di Villa del Conte e nella frazione di Abbazia Pisani (€ 286.633,57)	1/A/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 05/12/2003	286.633,57	286.633,57	0,00	Progetto approvato				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito agli interventi 16 bis (€ 258.228,45), 25 (€ 258.228,45) e 69 (€ 309.874,14)
77	Progetto definitivo per lavori di rifacimento e separazione condotte fognarie lungo via Manzoni, via Zanella, vicolo Aggio e viale della Vittoria in Comune di Piombino Dese	1/A/4.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 123 30/10/2002	392.000,00	392.000,00	295.525,49	Lavori in corso	14/01/2003			
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
13	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadella con incremento da 60.000 a 75.000 A.F.	1/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.328.137,98			Progettazione in corso				
AZIENDA ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
6	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montebelluna	1/G/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.065.827,60			Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.291.142,25) e 5B (€ 774.685,35).				
5A	Interventi nei Comuni ex Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico (€ 1.291.142,25)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 5					Progettazione in corso				
5B	Completamento della rete fognaria nera e ristrutturazione tratti di condotta in Comune di Galzignano Terme. (€ 774.685,35)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 5					Progettazione in corso				
AZIENDA CENTRO VENETO SERVIZI Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
9	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	1/B/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 25 25/03/2003	516.456,90	516.456,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 516.456,90				
9A	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.635.198,29)		Riuniti i finanziamenti 8C (€ 3.088.741,39) + 9 (€ 516.456,90) = € 3.615.198,29					Progettazione definitiva				
10	Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca.	1/V/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 14 21/02/2003	516.456,90	516.456,90	124.035,56	Lavori in corso	09/05/2003			
A.S.P. DI CHIOGGIA Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
25	Completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 6.197.482,79)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002					Finanziamento suddiviso negli interventi 25A (€ 5.510.163,87) e 25B (€ 687.318,92)				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25A	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87)	1/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.510.163,87			Progettazione in corso				
25B	Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 89 DEL 2004	687.318,92	687.318,92	0,00	Progetto approvato				
26	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 142 DEL 12/12/2002	2.065.827,60	144.607,93	144.607,93	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronta	1/R/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDA N. 267 DEL 28/12/2004	1.187.860,87	1.187.860,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3A	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronta (€ 1.446.079,32)							Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,45) + 3 (€ 1.187.860,87) = € 1.446.079,32				
4	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.376.701,74)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002					Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.358.322,68), 4B (€ 345.985,06) e 4C (€ 671.394,00)				
4A	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località Salvatronta e Borgo Padova (€ 1.358.322,68)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.358.322,68			In fase di progettazione				
4B	Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronta. Filtrazione e disinfezione dello scarico	1/R/2.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDA N. 257 DEL 28/12/2004	345.985,06	345.985,06	0,00	Progetto approvato				
4C	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00)	1/R/2.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDA N. 116 DEL 23/06/2004	671.394,00	671.394,00	34.634,15	Lavori in corso				
5	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDA N. 258 DEL 29/12/2004	1.342.787,94	1.216.657,36	0,00	Progetto approvato				
COMUNE DI CAVALLINO Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE)	1/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 2 DEL 07/01/2004	1.032.913,80	1.032.913,80	80.418,40	Lavori in corso				
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		517.000,00			Progetto in fase di redazione				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
COMUNE DI CAVARZERE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 97 26/05/2004	1.032.913,80	1.032.380,62	102.757,28	Lavori in corso				
COMUNE DI ESTE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Interventi di completamento della rete fognaria del centro storico e della zona Merigliaro. XV stralcio	1/T/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 116 20/09/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori in corso	20/03/2002 07/11/2002			
COMUNE DI FOSSO' Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
2	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favilli	4/A/1.9	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolastico.
COMUNE DI MONSELICE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marandole e di via Mandic.	1/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 26 26/9/2003	284.051,29	284.051,29	0,00	Progetto approvato				
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A/1.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.807.599,00	1.807.599,00		Progettazione in corso				
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A/1.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 10/09/2004	718.367,98	718.367,98	0,00	Progetto approvato				
COMUNE DI MORGANO Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale	1/H/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 53 16/03/2004	826.331,04	826.331,04	149.485,77	Lavori in corso				
COMUNE DI NOALE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolastico. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
COMUNE DI PREGANZIOL Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughina e Boschetta	1/I/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 30 27/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	247.600,00	Lavori in corso				26/11/2003
COMUNE DI SALZANO												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 185 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	31.996,33	Lavori in corso				Vedi scheda riprologativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi Industriali	4/A/1.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 54 26/05/2003	750.000,00	75.000,00	75.000,00	Progetto approvato				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione (importo pari a € 75.000,00). Vedi scheda riprologativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante.
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi Industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2833 10/09/2004	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riprologativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante.
COMUNE DI VENEZIA Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
86 V.	Interventi di fognatura nel territorio comunale (importo complessivo € 17.043.077,67)	1/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		14.796.489,67	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento originale di € 17.043.077,67 suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni e 3 nuovi interventi)
86A V.	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	1/N/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 115 23/06/2004	2.246.588,00	2.246.588,00	0,00	Progetto approvato				
87	PROGETTO INTEGRATO RII	7/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 22 07/03/2002	20.658.275,96	20.658.275,96	0,00	Progetto approvato				
CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
9	Incremento volume Invaso canale dei Cuori e diaframatura argini	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 109 18/10/2002	3.098.741,40	232.405,60	232.405,60	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Opere di diaframatura e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 130 24/09/2003	258.228,45	258.228,45	19.367,13	Progetto definitivo				Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 108/02

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	2/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 111 18/10/2002	1.291.142,25	96.835,67	96.835,67	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
12	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 107 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
CONSORZIO BASSO PIAVE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Completamento intervento per acquedotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	5/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 6.164.686,99 interamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
CONSORZIO BRENDA BACCHIGLIONE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
11	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 66 13/6/2003	1.239.496,60	61.974,83	61.974,83	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
12	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 65 13/6/2003	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia	2/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 67 13/6/2003	3.098.741,50	164.937,07	164.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 13A (€ 1.291.142,25) e 13B (€ 1.807.599,15)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13A	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Bernio (€ 1.291.142,25).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,25)					Progetto preliminare				
13B	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Trezze (€ 1.807.599,15).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,15)					Progetto preliminare				Procedura di screening
14	Ricalibratura e sostegni su corsi d'acqua nell'area della Riviera del Brenta	2/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 68 13/6/2003	2.375.701,80	118.785,09	118.785,09	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
CONSORZIO DESE SILE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
19	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Desè e Zero. II° stralcio - scolo Zermason	2/E/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
20	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Desè e Zero. II° stralcio - scolo Rusteghin	2/F/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione solo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
21	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del "Dese e Zero. 1° stralcio - scolo Zeretto"	2/G/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.032.913,80			Progettazione in corso				
22	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del "Dese e Zero. 1° stralcio - scolo Vernise"	2/H/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scollmatore. 1° stralcio - scolo Draganzolo	2/I/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
24	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scollmatore. 1° stralcio - scolo Dosa e prolungamento	2/L/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
CONSORZIO DESTRA PIAVE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Veia: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione.	2/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				
4	Risanamento dell' alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole	2/V/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 114 18/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
13	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano	2/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	103.291,38	Progettazione in corso				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
14	Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 96 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
15	Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, S. Marco e Vandura)	2/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 104 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
16	Riassetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere	2/T/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 102 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
DELTA PO Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chiappria (L. stralcio)	6/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2387 DEL 9/8/2002	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziarie (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
7	Bonifica dei siti inquinati compresi nel Bacino Scolante	4/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.402.250,26							in attesa di destinazione da parte della Giunta Regionale
8	MASTERPLAN bonifica Porto Marghera	4/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.466,90							In attesa del decreto di impegno
REGIONE DISINQUINAMENTO												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
43	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		15.493.706,97							
REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
14	AGRICOLTURA COMPATIBILE. (Al fine di ridurre gli apporti di fitonutrienti e favorire una più corretta gestione del suolo.)	3/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98	2.818.315,95	781.688,38	Lavori in corso				
15	Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo culturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia	3/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.298.233,20			In istruttoria				
16	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante Laguna di Venezia	3/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.164.568,99			In istruttoria				
ULSS 12 VENEZIA - DISINQUINAMENTO												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
9	Completamento della rete fognaria acque bianche dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella Laguna Nord.	1/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 126 29/06/2004	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto preliminare approvato				
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA												
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR 794 09/04/2002		5.164.568,99			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 5/B/1

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Eregate (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	TOTALE				205.033.389,16	75.813.267,84	13.158.196,65					
						36,98%	6,42%					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
<p style="text-align: center;">ABBZIA SAN GIORGIO MAGGIORE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004 Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Marinive.</p>												
2		B/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
<p style="text-align: center;">ARPAV Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004</p>												
16	Progetto Grandi Rischi Industriali - Verifiche zona Industriale di Porto Marghera	A/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
17	Completamento Progetto SIMAGE - III° LOTTO	A/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso				
18	Realizzazione nuova sede del laboratorio ARPAV di Venezia a supporto dei monitoraggi e dei controlli ambientali nel sistema lagunare	B/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione conclusa				
<p style="text-align: center;">ACM Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004</p>												
99	Intervento in comune di Fossò	E/1.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		384.000,00			Progettazione in corso				
100	Intervento in comune di Campolongo Maggiore	E/1.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
101	Intervento in comune di Pianiga	E/1.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
102	Intervento in comune di Mira	E/1.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.656.000,00			Progettazione in corso				
103	Intervento in comune di Saizano	E/1.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		664.000,00			Progettazione in corso				
104	Intervento in comune di Spinea	E/1.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
105	Intervento in comune di Strà	E/1.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.000,00			Progettazione in corso				
106	Intervento in comune di Vigonovo	E/1.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		408.000,00			Progettazione in corso				
107	Intervento in comune di Dolo	E/1.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
108	Intervento in comune di S. Maria di Sala	E/1.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		664.000,00			Progettazione in corso				
109	Intervento in comune di Camponogara	E/1.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.656.000,00			Progettazione in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione solo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
110	Intervento in comune di Campagna Lupia	E/1.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
111	Intervento in comune di Mirano	E/1.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
112	Intervento in comune di Martellago	E/1.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
113	Interventi nei vari comuni	E/1.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
APGA Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
30	Ampliamento, potenziamento ed affinamento dei processi degli impianti di depurazione di Cona, Codevigo e Pontelongo	E/6	DCR N. 24 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
31	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DCR N. 24 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				
AZIENDA SERVIZI IDRICI CASTELLANA Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
7	Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riase Pio X* (TV): via Monfenera, e Brigata Martiri del Grappa	E/5.2	DCR N. 24 04/05/2004		152.000,00			Progettazione in corso				
8	Costruzione rete di fognatura nera nel collettore Asolo / impianto di depurazione di Maser.	E/5.1	DCR N. 24 04/05/2004		450.000,00			Progettazione in corso				
9	Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godego (TV): via Vegre, via Cacciatore e via Mofte	E/5.3	DCR N. 24 04/05/2004		650.000,00			Progettazione in corso				
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
17	Intervento in Comune di Quarto D'Altino - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e Via IV Novembre	E/16.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		779.520,00			Progetto approvato				
18	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotte fognarie in Via Carboncine e Via D'Arv	E/16.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		666.080,00			Progetto approvato				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
19	Intervento in Comune di Marcon - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Vie zermanese, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Ortolani, Don Bosco e Ancliotto	E/16.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		853.200,00			Progetto approvato				
S.E.T.A.												
7	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004 Impianto di depurazione di Vigonza: completamento ed adeguamento trattamenti terziari	E/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progetto approvato				
8	Impianto di depurazione di Onara: dismissione impianto depurazione di Onara e collegamento all'impianto di depurazione di Cittadella	E/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.000,00			Progetto approvato				
9	Completamento rete fognaria Gaizignano e Battaglia, dismissione impianto di depurazione di Battaglia, collegamento all'impianto di depurazione di Montegrotto e suo potenziamento fino a 30.000 A.E.	E/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progetto approvato				
10	Impianto di depurazione di Camposanpiero: seconda fase digestione anaerobica, completamento compostaggio aerobico, viabilità	E/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto approvato				
11	Impianto di depurazione di Cittadella: opere di completamento (acquedotto duale e trattamento sabbie)	E/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto approvato				
12	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Ronchi, Obbia Alta e Bassa	E/22.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		208.000,00			Progetto approvato				
13	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Villanova	E/22.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00			Progetto approvato				
14	Intervento in Comune di Cittadella - Via delle Sorgenti	E/22.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		42.000,00			Progetto approvato				
15	Intervento in Comune di Villa del Conte - Via degli Alpini, Don Carrara, Marconi, Maso Moro, Terzola	E/22.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		755.600,00			Progetto approvato				
16	Intervento in Comune di Massanzago - Via Roma, Stradona, Padovane, Ca' Zorzi e Rando	E/22.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00			Progetto approvato				
17	Intervento in comune di S. Giorgio delle Pertiche: collegamento imp. Selezione frazione secca, della SS 307 e di via Anconetta, nonché fognatura nera nelle vie Montegrappa e Ceccatello	E/22.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.060.000,00			Progetto approvato				
18	Intervento in Comune di Piombino Dese - Via Plave, Massari, Stiffoni	E/22.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00			Progetto approvato				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione all'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
19	Intervento in Comune di Piombino Dese - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progetto approvato				
20	Intervento in Comune di S. Martino di Lupatari - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00			Progetto approvato				
21	Lupatari/S. Giustina in Colle - collegamento fraz. Campretto - Borghetto - Fratte a S. Giustina in Colle - 2° Stralcio	E/22.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progetto approvato				
22	Intervento in Comune di Campodarsègo - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progetto approvato				
23	Intervento in Comune di Resana - interventi di riqualificazione del sistema fognario	E/22.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.120.000,00			Progetto approvato				
24	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E/22.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progetto approvato				
25	Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marezane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali	E/22.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		450.000,00			Progetto approvato				
AZIENDA CENTRO VENETO SERVIZI Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
16	Lavori di fognatura in via S. Pietro - S.P. 14, pernumia	E/9.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		235.200,00			Progetto preliminare				
17	Lavori di fognatura in via Cà Erizzo, Bovolenta	E/9.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		115.360,00			Progetto preliminare				
18	Lavori di fognatura in via Rovere prolungamento, Angulliera	E/9.17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		67.680,00			Progetto preliminare				
19	Lavori di fognatura in via Bologna, Ponte S. Nicolò	E/9.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				
20	Lavori di fognatura in via Bologna laterale, Ponte S. Nicolò	E/9.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				
21	Sdoppiamento rete, adeguamento rete del centro e del nucleo del centro storico, suddivisione acque nere e bianche, nella zona di Monselice capoluogo	E/9.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.561.626,00			Progetto preliminare				
22	Completamento rete fognatura nella vecchia zona Industriale e via Umbria, Monselice	E/9.31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
23	Lavori di fognatura in via Marconi laterale, Terrassa Padovana	E/9.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		47.680,00			Progetto preliminare				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione s/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
24	Lavori di fognatura in via Corso e Ponte de Riva laterali, Due Carrare	E/9.26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
25	Lavori di fognatura in via Chiaviche, Arquà	E/9.27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
26	Comune di Ponte S. Nicolò. Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino scolante nella Laguna di Venezia	E/9.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		360.000,00			Progetto preliminare				
27	Lavori di fognatura in via Boario Polito, Arquà	E/9.19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		33.840,00			Progetto preliminare				
28	Lavori di fognatura in via Argine, Pozzonovo	E/9.16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.880,00			Progetto preliminare				
29	Lavori di fognatura in via Arre prolungamento, S.P., Conselve	E/9.21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.240,00			Progetto preliminare				
30	Lavori di fognatura in via Cà Borin laterale, Baone	E/9.20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		225.600,00			Progetto preliminare				
31	Lavori di fognatura in via S. Trinità, Pernumia	E/9.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		228.160,00			Progetto preliminare				
32	Lavori di fognatura in via Monte Grappa laterale, Conselve	E/9.18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		112.800,00			Progetto preliminare				
33	Lavori di fognatura in via Stanga prolungamento, Arre	E/9.23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		201.120,00			Progetto preliminare				
34	Lavori di fognatura in via Paraiso, Pozzonovo	E/9.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		60.000,00			Progetto preliminare				
35	Lavori di fognatura in via Roma prolungamento lato destro, Ponte S. Nicolò	E/9.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		144.800,00			Progetto preliminare				
36	Lavori di fognatura in via Maseralino, Cartura	E/9.25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		189.200,00			Progetto preliminare				
37	Ulteriore stralcio funzionale di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Meggiaro	E/9.22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00			Progetto preliminare				
38	Lavori di fognatura nella S.P. 21 prolungamento, Baone	E/9.28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
39	Lavori di fognatura in via Fossalza prolungamento, Conselve	E/9.30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		197.920,00			Progetto preliminare				
40	Lavori di fognatura in via Santo, Anguillara	E/9.24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		223.040,00			Progetto preliminare				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
41	Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Bertica" e di altre 20 utenze civili, Monselice	E/8.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		392.800,00			Progetto preliminare				
42	Lavori di fognatura in via Ponte de Riva S.P., Cartura	E/8.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		310.400,00			Progetto preliminare				
43	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/8.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		105.600,00			Progetto preliminare				
44	Lavori di fognatura in via Rezzole laterale, Pozzonovo	E/9.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		92.160,00			Progetto preliminare				
45	Lavori di fognatura in via Rialto laterale, Candiana	E/9.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				
46	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		464.800,00			Progetto preliminare				
A.S.P. DI CHIOGGIA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
27	Interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e modulazione "Niccolò De Conti"	E/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
28	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - 1 ^a fase	E/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
29	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque alte	E/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
AZIENDA BRENTA SERVIZI												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Comune di Rossano: fognatura in zone laterali Via Salute e Via 11 Febbraio	E/8.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.087.320,00							
2	Comune di Rosà: fognature in laterali Via Granella, zona S. Pietro e Cusinati	E/8.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.598.400,00							
AZIENDA SPIM												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
4	Adeguamento del depuratore di Preganzioli: potenziamento dei sistemi di decantazione, clorazione e filtrazione finale	E/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		560.000,00			Progettazione in corso				
AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO												

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Veduggio, Attivole, - 1° Lotto	E/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.360.000,00			Progettazione esecutiva				
COMUNE DI CAVALLINO												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
5	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà Valle	E/10.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.440.000,00			Progettazione in corso				
6	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
7	Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura	E/10.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
COMUNE DI CODEVIGO												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
2	Interventi di ripristino dei caratteri lagunari in alcune aree della gronda attraverso rinaturalizzazione di aree prossime alla contenzione lagunare, finalizzate al ripristino delle funzioni ecologiche proprie della zona umida.	E/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				Stipulato un accordo di programma tra il comune di Codevigo e il MAV per la realizzazione dell'intervento
COMUNE DI CORNUA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Adeguamento ai limiti di legge del depuratore comunale di Cornuda, località La Valle	E/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		943.675,00			Progettazione in corso				
COMUNE DI MORGANO												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
6	Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zerolo, Via Levada, Via Marcello, Via Molin Cappello Nord	E/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		260.800,00			Progettazione in corso				
COMUNE DI VENEZIA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
89	Opere di disinquinamento ambito Campalto: diminuzione acque parassite	E/14.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.040.000,00			Progettazione in corso				
90	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite	E/14.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
91	Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite	E/14.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
92	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognatura nera e riqualificazione fognatura bianca	E/14.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.320.000,00			Progettazione in corso				
93	Osservatorio naturalistico della Laguna	B/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		400.000,00			Progetto preliminare				
94	Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia.	B/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		600.000,00			Studio preliminare				
95	PROGETTO INTEGRATO RI	A/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		28.000.000,00			Progettazione in corso				
CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
13	Fitoripulazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione nei bacini centrali - (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		183.819,20			Progetto approvato				
14	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		139.229,00			Progetto approvato				
15	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica. Incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		481.339,20			Progettazione in corso				
16	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.211.142,20			Progettazione in corso				
17	Ricalibratura canale San Giacomo - Monsesana (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		176.097,20			Progettazione in corso				
18	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.373,20			Progettazione in corso				
19	Interventi in rete minore di bonifica. Aumento tempi di corvazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale.	D1/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore e Rebosola, stralcio.	D1/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
21	Impinguamento canali Beoli - Rebosola	D2/42	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.150.000,00			Progettazione in corso				
CONSORZIO BASSO PIAVE												
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
4	Progetto di opere aziendali e comuni a più fondi nel settore dell'irrigazione - Distribuzione di acqua alle aziende delle unità irrigue elementari.	D2/44	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.978.171,00			Progetto preliminare				
CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE												
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
15	Interventi strutturali in rete di bonifica: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora di Cambroso) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 3)	D1/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		180.000,00			Lavori in corso				
16	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui RI di Piove (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 4)	D1/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
17	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Bernio (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
18	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area di "Brondolo" in comune di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progetto esecutivo				
19	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Bacino Trezze (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00			Progettazione in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nel bacino "Noventana" (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 9)	D1/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
21	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (I stralcio) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		350.000,00			Progettazione in corso				
22	Completamento, ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progetto preliminare				
23	Adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		570.000,00			Progetto preliminare				
24	Completamento ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano	D1/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
25	Interventi di trasformazione irrigua del Bacino Bernio in sx del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codévigo	D2/43	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.963.000,00			Progettazione in corso				
CONSORZIO BRENTELLA DI PEDEROBBA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
3	Sistemazione dello scarico di Salvatonda a monte della confluenza nello Zero in Comune di Castelfranco	D1/33	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.400.000,00			Progettazione in corso				
4	Riconversione del sistema irriguo in Comune di Veduggio, zona di Fanzolo e Barcon - Riconversione da scorrimento ad aspersione (pluvirrigazione) su un'area di 1.200 Ha	D2/45	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.840.000,00			Progettazione in corso				
CONSORZIO DESE SILE												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
27	Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego - Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna - integrazione tra la rete principale di bonifica ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche	B/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.000.000,00			Progetto approvato				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
28	Estensione, completamento e gestione della Zona Tampona arborea realizzata presso l'Azienda Diana di Veneto Agricoltura, con raccolta ed elaborazione di dati per il monitoraggio dell'efficacia delle fasce tampone arboree nel controllo dell'inquinamento.	D1/29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto approvato				
29	Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Marzenego - 2° Stralicio, Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerno.	D1/30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto approvato				
30	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchessa e Tarò in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12B).	D1/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.950.000,00			Progetto approvato				
31	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di S., Desolino, Rio S. Martino, Piovega di S., Rio S. Amrogio, Piovega di L. Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12A)	D1/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progetto approvato				
32	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Marzenego. (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
33	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 18)	D1/22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
34	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralicio - scolo Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 19)	D1/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
35	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralicio - scolo Kusteghin (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 20)	D1/24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
36	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Zeretto (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 21)	D1/25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00			Progettazione in corso				
37	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Vernise (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 22)	D1/26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		850.000,00			Progettazione in corso				
38	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Draganzolo (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 23)	D1/27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progettazione in corso				
39	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Dosa e prolungamento (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 24)	D1/28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		120.000,00			Progettazione in corso				
CONSORZIO DESTRA PIAVE												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
5	Risanamento dell'alto corso del fiume Mesolo in area di alta densità di allevamenti ittici e colture agricole	D1/31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione preliminare				
6	Diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione	D1/32	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione preliminare				
CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
17	Ammodernamento e potenziamento impianto idrovoro di Dogaietto a Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/34	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDA N. 215 17/11/2004	310.000,00	310.000,00	0,00	Lavori in corso				
18	Ricalibratura scoli Fondi a Est e Fondi a Sud a Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 4)	D1/35	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		206.582,00			Lavori in corso				
19	Sistemazione idraulica e ricalibratura rete di bonifica bacino Chirignago Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/36	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		774.684,00			Progettazione in corso				
20	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete idraulica del bacino Gamberare - Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/37	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		852.152,00			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
21	Progetto dimostrativo per integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11A) Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12) Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell'asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Milano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/38 D1/39	DCR N. 24 DEL 04/05/2004 DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.478,42 300.000,00			Progettazione in corso Progettazione in corso				
23	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell'asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Milano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/40	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.032.913,88			Progettazione in corso				
24	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riassetto della rete scolante del sottobacino Rio dell'Arzere (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 16)	D1/41	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.549.370,70			Progettazione in corso				
25	Riconversione irrigua di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, S. Martino di Lupatari e Castelfranco	D2/46	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		174.240,00			Progetto approvato				
DELTA PO Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
6	Modello strutturate degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Linea-Padova-Plove di Sacco-Cavazzere	B/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		20.000.000,00			Progetto definitivo				
MAV Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
6	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	A/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDSPC 287 16/09/2004	3.400.000,00	3.400.000,00	795.580,56	Lavori in corso				
7	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Botte di CONCHE	A/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.242.000,00			Progetto preliminare				
REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
44	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.100.743,00			Progetti in fase di redazione				
45	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		9.919.447,15							

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
46	Accordo di programma relativo a progetti di ricerca, sperimentazione e utilizzo dell'idrogeno tra Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente	B/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.000.000,00			Progetto preliminare				
47	Attività di studi, ricerche, indagini e divulgazione, concernenti il Piano Direttore 2000	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		700.000,00							
REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
17	Agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3a)	C/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.611.724,00			In corso di realizzazione				
18	Gestione dei rifiuti zootecnici ed interventi strutturali in zootecnia (C5.1.4)	C/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		22.264.354,00			In corso di realizzazione				
19	Realizzazione fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3b)	C/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.046.290,00			In corso di realizzazione				
20	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C5.1.3c)	C/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		10.406.396,00			In corso di realizzazione				
21	Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale e compatibilità in agricoltura nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C5.1.5)	C/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.500.000,00			In corso di realizzazione				
VENETO AGRICOLTURA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia. Utilizzo dei composti di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		900.000,00			Progettazione in corso				
2		B/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso				
ULSS 12 VENEZIA - OSPEDALI												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												
5	Urgenti lavori di messa a norma di alcuni padiglioni dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia	B/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progetto preliminare				
ASL 15 ALTA PADOVANA												
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004												

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolante nel bacino della Laguna di Venezia.	B/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.039.000,00			Studio di fattibilità				
S.A.V.E.												
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 1° stralcio	B/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.090.000,00			Progetto preliminare				
2	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 2° stralcio	B/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.520.000,00			Progetto preliminare				
PROVINCIA DI VENEZIA												
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Realizzazione di una rete ecologica in Provincia di Venezia mediante individuazione di aree ad esempio meccanismi di fitodepurazione, sostenendo i principi di un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale.	B/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				
ASSOCIAZIONE TEATRO GOLDONI												
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00			Progetto preliminare				
ENTI VARI												
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
3	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.000.000,00			Progettazione in corso				
TOTALE					286.824.446,15	3.710.000,00	796.680,66					1,29% 0,28%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTI DEI FINANZIAMENTI ATTRIBUITI AI SOGGETTI ATTUATORI, ORDINATI PER LEGGI DI FINANZIAMENTO

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note	
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08	
	Comune di Chioggia	3.925.072,43	3.925.072,43	3.925.072,43	3.775.126,03	
	Comune di Chioggia / A.S.P.	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	779.092,95	
	Comune di Jesolo	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	
	Comune di Marcon	309.874,14	309.874,14	309.874,14	283.166,21	
	Comune di Mogliano Veneto	671.393,97	671.393,97	671.393,97	610.414,64	
	Comune di Venezia	16.495.088,56	11.673.132,16	10.938.702,76	10.938.702,76	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	444.697,73	0,00	0,00	0,00	
	S.P.I.M.	516.456,90	516.456,90	516.456,90	54.110,77	
	VE.S.T.A.	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	2.427.347,43	2.427.347,43	2.427.347,43	2.427.347,43	
	U.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	
	TOTALE	41.316.551,93	36.049.897,79	30.913.038,96		
	Legge 910/86 Es. 1987-1988	Comune di Chioggia / A.S.P.	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66
Comune di Jesolo		444.283,96	444.283,96	444.283,96	395.909,14	
Comune di Jesolo / A.S.I.		118.948,40	118.948,40	111.270,71	111.270,71	
Comune di Musile di Piave		543.245,49	543.245,49	516.456,90	516.456,90	
Comune di Quarto d'Altino		774.685,35	774.685,35	774.685,35	774.685,35	
Comune di Venezia		10.307.802,54	7.725.518,05	6.765.326,50	6.765.326,50	
Regione - Disinquinamento		33.259.241,38	31.641.869,46	31.486.029,79	31.486.029,79	
U.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali		5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	
TOTALE		51.645.689,92	47.446.033,50	45.518.828,03		
Legge 910/86 Es. 1989		Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	9.296.224,18	9.296.224,18	8.461.192,47	8.461.192,47
		S.P.I.M.	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	0,00
		Comune di Chioggia	5.164.568,99	5.164.568,99	4.359.929,32	4.359.929,32
		Comune di Venezia	10.122.555,22	9.805.967,14	6.226.292,51	6.226.292,51
		Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	206.582,76	206.582,76	206.582,76	206.582,76
		Magistrato alle Acque di Venezia	2.582.284,50	1.922.252,58	0,00	0,00
	Regione - Disinquinamento	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.584,63	3.003.584,63	
	U.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	
	VE.S.T.A.	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	0,00	
	TOTALE	38.734.267,43	37.757.647,44	24.839.866,19		
	Legge 67/88 Es. 1988	Comune di Chioggia / A.S.P.	1.394.433,63	1.394.433,63	640.537,73	640.537,73

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note	
Legge 67/88 Es. 1990	Comune di Venezia	8.005.081,94	1.522.852,43	1.388.275,63		
	Delta Po S.p.A.	8.934.704,35	8.934.704,35	2.680.411,31		
	TOTALE	18.334.219,92	11.851.990,41	4.709.224,67		
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	516.456,90	516.456,90	446.735,22		
Legge 67/88 Es. 1991	Comune di Chioggia	7.493.789,61	7.493.789,61	7.247.877,57		
	Comune di Codevigo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70		
	Comune di Jesolo	3.898.809,13	3.898.226,13	3.816.191,96		
	Comune di Jesolo / A.S.I.	232.846,06	232.846,06	198.281,86		
	Comune di Musile di Piave	2.065.827,60	2.065.827,60	2.046.715,66		
	Comune di Quarto d'Altino	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30		
	Comune di Venezia	22.885.825,46	21.336.454,77	12.063.187,10		
	Consorzio di bonifica Dese Sile	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49		
	Diocesi Patriarcale di Venezia	511.292,33	0,00	0,00		
	Regione - Disinquinamento	4.744.618,64	4.590.084,07	3.131.339,29		
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Disinquinamento	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80		
	TOTALE	53.989.745,96	51.751.965,37	34.068.380,95		
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^a tranche	A.R.P.A.V.	258.228,50	258.228,45	274.484,19	
		Azienda Consorzio del Tergola	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29	
Comune di Chioggia		516.456,90	516.456,90	514.127,07		
Comune di Meolo		516.456,90	516.456,90	464.811,21		
Comune di Venezia		4.183.300,88	4.183.300,88	3.790.801,90		
Ente di bacino R.S.U. VE 2		6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69		
TOTALE		15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35		
Legge 67/88 Es. 1992 - II^a tranche		Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	4.131.655,19	1.422.499,00	58.468,17	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08		
	Comune di Cavazere	1.291.142,25	1.291.142,25	1.289.946,52		
	Comune di Venezia	5.164.568,99	2.840.512,95	2.666.908,82		
	Consorzio di bonifica Dese Sile	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39		
	TOTALE	15.338.769,90	10.305.557,67	8.766.726,98		
Legge 67/88 Es. 1992 - III^a tranche	Azienda Consorzio Alta Servizi	3.873.426,74	3.873.426,74	3.873.404,07		
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	5.164.568,99	5.164.568,99	1.107.295,38		
	Consorzio di bonifica Dese Sile	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25		
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	2.065.827,60	1.291.142,25	1.145.525,32		
	Delta Po S.p.A.	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00		
	Regione - Disinquinamento	15.492.448,37	62.400,00	0,00		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
TOTALE		30.987.413,94	14.782.680,23	8.347.367,02	
Legge 360/91					
	Comune di Venezia	2.065.827,60	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	1.291.142,25	0,00	0,00	
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	1.549.370,70	682.465,17	446.340,07	
TOTALE		8.263.310,39	4.039.435,01	3.803.309,92	
Legge 139/92 Es. 1993					
	A.R.P.A.V.	1.549.370,70	1.549.370,70	1.548.164,22	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	30.987.413,95	30.987.413,95	30.615.601,62	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	3.098.741,40	3.098.741,40	3.064.204,68	
	Azienda Consorzio del Tergola	29.438.043,25	29.438.043,25	29.437.215,74	
	Comune di Arquà Petrarca	516.456,90	516.456,90	513.763,48	
	Comune di Chioggia	5.164.568,99	5.164.568,99	1.660.341,62	
	Comune di Mogliano Veneto	3.098.741,39	3.098.741,39	2.755.972,37	
	Comune di Monselice	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	
	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29	
	Comune di Quarto d'Altino	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
	Comune di Venezia	73.130.296,91	72.609.708,36	48.350.622,30	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	12.911.422,47	12.911.422,47	12.911.422,47	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	1.755.953,46	0,00	0,00	
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18	
TOTALE		180.759.914,68	178.483.372,67	149.966.213,75	
Legge 139/92 II fase					
	A.R.P.A.V.	11.529.900,95	11.402.802,03	9.752.059,37	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	2.582.284,44	2.582.284,44	2.578.137,82	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	4.286.592,26	4.286.592,26	4.067.098,09	
	Comune di Noale	774.685,35	774.685,35	774.685,35	
	Comune di Venezia	41.161.614,86	19.470.425,10	16.608.802,49	
	Comune di Zero Branco	258.228,45	258.228,45	206.582,76	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	8.366.601,77	8.366.601,77	8.240.312,74	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	2.169.119,00	2.169.118,98	1.686.246,94	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	33.866.661,15	17.133.457,62	12.151.578,30	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	12.240.028,51	10.690.657,81	2.865.904,09	
	Regione - Disinquinamento	12.181.000,00	0,00	0,00	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	35.849.491,61	33.340.721,42	21.187.349,99	
TOTALE		165.266.208,33	110.475.575,22	80.118.757,93	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note	
Legge 139/92 Magg. Mutui II^a fase	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.540.000,00	0,00	0,00		
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	3.500.000,00	3.500.000,00	175.230,60		
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	2.800.000,00	1.300.000,00	64.630,00		
	Azienda Servizi Territoriali Ambientali (S.E.T.A.)	8.840.000,00	0,00	0,00		
	Azienda speciale consorziate Veneto Servizi	2.457.086,20	640.000,00	0,00		
	Porto di Chioggia	2.500.000,00	0,00	0,00		
	Comune di Monselice	5.400.000,00	0,00	0,00		
	Comune di Morgano	400.000,00	400.000,00	0,00		
	Comune di Venezia	4.038.597,75	0,00	0,00		
	Comune di Zero Branco	210.000,00	210.000,00	0,00		
	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	780.000,00	0,00	0,00		
	Consorzio di bonifica Dese Sile	403.848,02	403.848,02	403.848,02		
	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	0,00	0,00		
	Diocesi Patriarcale di Venezia	464.400,00	464.400,00	46.440,00		
	Magistrato alle Acque di Venezia	3.767.443,55	1.000.000,00	1.000.000,00		
	U.S.L. n. 17 - Este-Monselice	232.000,00	0,00	0,00		
	TOTALE		40.349.825,52	10.418.248,02	1.690.148,62	
	Legge 539/95 Es. 1996	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,80	
		Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	4.441.529,33	4.441.529,33	4.111.928,40	
Azienda Consorzio del Tergola		2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,59		
Comune di Chioggia		4.906.340,54	4.906.340,54	4.318.989,01		
Comune di Venezia		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70		
TOTALE		15.493.706,97	15.493.706,97	14.576.754,50		
Legge 539/95 Es. 1997		Azienda Consorzio del Tergola	17.714.471,64	17.714.471,64	15.773.626,63	
		Azienda Consorzio Alta Servizi	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	
		Azienda Consorzio Acquedotto Eiganeco Berico	428.659,23	428.659,23	428.659,23	
		Comune di Chioggia	1.446.079,32	1.446.079,32	1.294.668,53	
	Comune di Gaizignano	346.026,12	346.026,12	274.003,05		
	Comune di Marcon	1.549.370,70	1.549.370,70	1.206.494,01		
	Comune di Venezia	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70		
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32		
	U.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04		
	TOTALE	30.987.413,95	30.987.413,95	28.440.688,59		
Legge 539/95 Magg. Mutui III^a fase	Regione - Disinquinamento	21.342.612,00	0,00	0,00		
	TOTALE	21.342.612,00	0,00	0,00		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
Legge 515/96 Es. 1997 - III fase	A.R.P.A.V.	1.032.913,80	1.032.913,80	946.275,27	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	10.329.137,98	10.329.137,98	9.971.880,68	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	7.746.853,49	7.746.853,49	6.961.859,24	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	1.549.370,70	1.549.370,70	115.508,77	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	2.840.512,95	2.840.512,95	2.801.668,82	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	568.102,59	568.102,59	468.442,37	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	
	Comune di Arquà Petrarca	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	
	Comune di Castelfranco Veneto	1.446.079,32	1.446.079,32	1.260.029,51	
	Comune di Cavallino	4.648.112,09	4.648.112,09	2.488.097,95	
	Comune di Cavarzere	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	
	Comune di Chioggia	10.329.137,98	8.776.910,16	5.508.926,64	
	Comune di Este	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	
	Comune di Gaizignano	619.748,28	619.748,28	619.711,96	
	Comune di Meolo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	
	Comune di Mogliano Veneto	2.582.284,50	2.582.284,50	2.324.056,05	
	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79	
	Comune di Monselice	2.582.284,50	2.582.284,50	2.324.056,07	
	Comune di Musile di Piave	206.582,76	206.582,76	206.582,76	
	Comune di Noale	1.291.142,25	1.291.142,25	192.701,15	
	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
	Comune di Venezia	29.336.757,66	19.749.311,82	11.878.508,68	
	Comune di Zero Branco	1.549.370,70	1.549.370,70	1.070.893,88	
	Consorzio di bonifica Basso Piave	1.291.142,25	1.291.142,25	892.427,07	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	5.265.854,58	0,00	0,00	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	2.582.284,50	850.521,66	664.768,68	
	U.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Disinquinamento	1.032.913,80	1.032.913,80	991.140,36	
TOTALE	103.291.379,83	85.154.088,74	65.561.612,82		
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	5.939.254,34	5.939.254,34	5.071.187,66	
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	7.488.625,05	7.488.625,07	4.910.003,06	
	Azienda Consorzio del Tergola	20.098.527,69	11.598.700,34	8.218.124,88	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	5.835.962,96	5.835.962,96	4.789.014,18	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	6.662.294,00	6.662.294,00	4.093.282,93	
	Comune di Cavarzere	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	
	Comune di Morgano	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note	
	Comune di Preganziol	774.685,35	774.685,35	697.216,82		
	Comune di Zero Branco	258.228,45	258.228,45	258.228,45		
	S.P.I.M.	516.456,90	516.456,90	0,00		
	Magistrato alle Acque di Venezia	1.549.370,70	1.520.474,93	1.254.439,76		
	Regione - Disinquinamento	761.773,93	738.600,18	732.060,56		
	U.S.L. n. 17 - Este-Monselice	1.291.142,25	1.291.142,25	1.016.099,14		
	Enti vari	5.164.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54		
	TOTALE	61.187.231,14	49.285.685,85	37.385.016,99		
	Legge 515/96 Magg. Mutui - IV fase	Consorzio di bonifica Dese Sile	36.151,98	36.151,98	6.501,93	
		TOTALE	36.151,98	36.151,98	6.501,93	
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	A.R.P.A.V.	2.065.827,60	2.065.827,60	826.330,90		
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63		
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	8.779.767,28	7.746.863,48	1.269.971,27		
	A.S.P. di Chioggia	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
	Comune di Mira	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50		
	Comune di Venezia	27.359.290,39	26.359.793,83	21.042.911,87		
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	11.362.051,78	3.976.718,12	445.984,29		
	Consorzio di bonifica Basso Piave	53.789,57	53.789,57	53.789,57		
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	7.746.853,25	2.272.410,10	348.608,40		
	Consorzio di bonifica Dese Sile	1.291.142,25	0,00	0,00		
	Consorzio di bonifica Destra Piave	516.456,90	516.456,90	516.456,90		
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	3.615.198,29	0,00	0,00		
	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00		
	Diocesi Patriarcale di Venezia	10.857.632,91	0,00	0,00		
	Veneto Acque S.p.A.	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18		
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	6.228.636,50	0,00	0,00		
	Regione - Disinquinamento	24.273.474,26	0,00	0,00		
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	10.329.137,98	10.329.137,98	4.020.035,06		
	VE.S.T.A.	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00		
	TOTALE	142.025.647,01	77.604.790,96	49.812.954,57		
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 VI fase	A.R.P.A.V.	3.098.740,70	3.044.370,70	1.443.185,35		
	Azienda Consorzio dei Mirese (A.C.M.)	7.746.853,49	7.746.853,49	4.883.078,26		
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	6.610.648,31	6.610.281,05	2.059.310,43		
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70		
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	4.441.529,34	4.441.529,34	2.570.959,40		
Azienda Consorzio del Tergola	10.380.783,66	9.709.389,70	5.884.742,15			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Azienda Consorzio Alta Servizi	7.746.853,49	7.746.853,49	1.497.366,81	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	1.342.787,94	0,00	0,00	
	Comune di Campodarsego	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	
	Comune di Castelfranco Veneto	258.228,45	0,00	0,00	
	Comune di Cavallino	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	
	Comune di Cavarzere	2.065.827,60	2.065.827,60	1.859.244,84	
	Comune di Chioggia	12.394.965,58	9.812.681,08	1.120.711,47	
	Comune di Este	2.065.827,60	2.065.827,60	345.710,91	
	Comune di Fossò	634.684,42	634.684,42	0,00	
	Comune di Mira	2.582.284,50	0,00	0,00	
	Comune di Monselice	774.685,35	774.685,35		
	Comune di Morgano	1.032.913,80	1.032.913,80	473.692,28	
	Comune di Venezia	50.871.004,56	30.211.989,91	22.241.060,86	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	12.911.422,48	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	8.779.767,34	1.174.939,10	400.254,10	
	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	823.748,75	823.748,75	0,00	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	10.329.137,99	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Destra Piave	1.549.370,70	1.549.370,70	799.117,53	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	4.131.655,19	0,00	0,00	
	Delta Po S.p.A.	18.876.499,66	18.876.499,66	5.662.949,90	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	8.302.602,22	39.291,84	21.749,20	
	Regione - Acquedotti	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36	
	Regione - Disinquinamento	4.906.340,54	542.932,48	352.932,48	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	30.987.413,95	20.115.037,54	2.968.455,11	
	VE S.T.A.	3.486.084,07	3.486.084,07	788.104,00	
	Enti vari	232.405,61	163.911,23	0,00	
	TOTALE	235.504.345,36	137.853.897,22	57.101.001,59	
Legge 488/98 Es. 2002, 2003 - VII fase	Abbazia di S. Giorgio Maggiore	206.582,76	206.582,76	139.873,79	
	A.R.P.A.V.	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	11.179.767,30	8.435.333,19	3.094.015,88	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	10.329.137,98	0,00	0,00	
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	3.098.741,39	3.098.741,39	2.788.867,25	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	4.441.529,31	2.400.000,00	0,00	
	Azienda Consorzio del Tergola	11.362.051,78	4.767.563,76	295.525,49	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	10.329.137,98	0,00	0,00	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	2.065.827,60	0,00	0,00	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	1.032.913,80	1.032.913,80	124.039,56	
	Comune di Castelfranco Veneto	4.906.340,55	3.421.887,29	34.634,15	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Comune di Cavallino	1.549.913,80	1.032.913,80	80.418,40	
	Comune di Cavarzere	1.032.913,80	1.032.380,62	102.757,28	
	Comune di Chioggia	8.283.310,39	831.926,85	144.607,93	
	Comune di Este	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	
	Comune di Fossò	280.000,00	280.000,00	0,00	
	Comune di Monselice	2.810.018,27	2.810.018,27	0,00	
	Comune di Morgano	826.331,04	826.331,04	149.485,77	
	Comune di Noale	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	
	Comune di Preganziol	1.032.913,80	1.032.913,80	247.600,00	
	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	31.996,33	
	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00	
	Comune di Venezia	37.701.353,63	22.904.863,96	0,00	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	7.746.853,49	819.875,32	581.014,00	
	Consorzio di bonifica Basso Piave	0,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	7.746.853,70	387.342,68	387.342,68	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	7.746.853,49	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Destra Piave	2.582.284,50	51.645,69	51.645,69	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	6.197.482,79	309.874,14	103.291,38	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	5.164.568,99	0,00	0,00	
	Veneto Acque S.p.A.	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	2.918.707,16	0,00	0,00	
	Regione - Disinquinamento	15.493.706,97	0,00	0,00	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	17.791.940,17	2.818.315,95	781.688,38	
	U.S.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Disinquinamento	774.685,35	774.685,35	0,00	
	TOTALE	205.033.389,16	75.813.267,84	13.158.196,55	
Legge 388/00 e 488/01	Abbazia di S. Giorgio Maggiore	80.000,00	0,00	0,00	
Es. 2002, 2003, 2004	A.R.P.A.V.	4.500.000,00	0,00	0,00	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	10.596.000,00	0,00	0,00	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	5.600.000,00	0,00	0,00	
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.252.000,00	0,00	0,00	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	2.298.800,00	0,00	0,00	
	Azienda Servizi Territoriali Ambientali (S.E.T.A.)	19.283.600,00	0,00	0,00	
	Azienda speciale Centro Veneto Servizi	10.689.306,00	0,00	0,00	
	Azienda Brenta Servizi	2.685.720,00	0,00	0,00	
	Azienda SPIM	560.000,00	0,00	0,00	
	Azienda Schievenin Alto Trevigiano	7.360.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Cavallino	4.240.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Chioggia	6.000.000,00	0,00	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Comune di Codevigo	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Cornuda	943.675,00	0,00	0,00	
	Comune di Morgano	260.800,00	0,00	0,00	
	Comune di Venezia	37.160.000,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	7.649.999,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Basso Piave	2.978.171,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	11.463.000,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	8.240.000,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Dese Site	13.600.000,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Destra Piave	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	5.688.421,00	310.000,00	0,00	
	Veneto acque S.p.A.	20.000.000,00	0,00	0,00	
	Magistrato alle Acque di Venezia	4.642.000,00	3.400.000,00	795.580,56	
	Regione - Disinquinamento	17.720.190,15	0,00	0,00	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	51.828.764,00	0,00	0,00	
	Veneto Agricoltura	1.900.000,00	0,00	0,00	
	U.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Ospedali	3.000.000,00	0,00	0,00	
	A.S.L. n. 15 - Alta Padovana	1.039.000,00	0,00	0,00	
	S.A.VE. Servizi Aeroportuali Venezia	6.610.000,00	0,00	0,00	
	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Associazione Teatro Stabile Veneto Goldoni	455.000,00	0,00	0,00	
	Enti vari	11.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE	286.824.446,15	3.710.000,00	795.580,56	
	TOTALE	1.762.495.822,61	1.005.104.987,93	674.953.543,48	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Ambiente
Servizio Legge Speciale per Venezia



RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO
ATTRAVERSO IL SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
(aggiornamento al 31 dicembre 2004)

INDICE

INDICE

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

SEZIONE I: COMUNI

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA
COMUNE DI CAMPODARSEGO
COMUNE DI CASTELFRANCO
COMUNE DI CAVALLINO
COMUNE DI CAVARZERE
COMUNE DI CODEVIGO
COMUNE DI CORNUDA
COMUNE DI ESTE
COMUNE DI FOSSO'
COMUNE DI GALZIGNANO TERME
COMUNE DI JESOLO / A.S.I
COMUNE DI MARCON
COMUNE DI MEOLO
COMUNE DI MIRA
COMUNE DI MOGLIANO VENETO
COMUNE DI MONASTIER
COMUNE DI MONSELICE
COMUNE DI MORGANO
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
COMUNE DI NOALE
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
COMUNE DI PREGANZIOL
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
COMUNE DI SALZANO
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
COMUNE DI VENEZIA / VE.S.T.A
COMUNE DI ZERO BRANCO

SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI

AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE (A.C.M.)
AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE (A.P.G.A.)
AZIENDA BRENTA SERVIZI
AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI (SE.T.A.)
AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA
AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.P.A. (SPIM S.P.A.)
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI
VE.S.T.A.

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA
CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE
CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE
CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE
CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA
CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA

SEZIONE IV: REGIONE VENETO

REGIONE: ACQUEDOTTI
REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI
REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)
REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA

SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE

ARPAV
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA
ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

S.A. VE. - SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA

U.L.S.S. N° 12 - VENEZIA

A.S.L. N° 15 - ALTA PADOVANA

U.L.S.S. N° 17 - ESTE - MONSELICE

VENETO ACQUE S.P.A. (EX DELTA PO)

VENETO AGRICOLTURA

SEZIONE VI: ENTI VARI

ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (VENEZIA)

COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA

DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"

ENTI VARI

SCHEDE RIEPILOGATIVE

BONIFICA SITI INQUINATI: SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI PER ENTE ATTUATORE

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 DICEMBRE 2004

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Gli schemi che sono riportati nel proseguo di questo report rappresentano la successione ordinata. Ente per Ente, di tutti i finanziamenti erogati dal Servizio Legge Speciale nella sua storia. Lo scopo di questo lavoro è, oltre che quello di quantificare i singoli finanziamenti, di ripiegare lo stato dei lavori andando ad individuare le principali fasi di esecuzione:

- data di approvazione del finanziamento
- data di approvazione del progetto
- data di inizio lavori
- data di fine lavori
- data di collaudo

In molti casi un singolo finanziamento può essere stato diviso dall'Ente e dar vita a più progetti. In questo caso una singola riga di finanziamento si interrompe e si sviluppa in un numero di righe pari al numero di progetti sviluppati. Come si vede nell'esempio la riga madre (n. 12) mantiene i riferimenti dell'approvazione del finanziamento ma rimanda alle righe successive le informazioni inerenti i tempi di esecuzione del progetto e degli impegni ove siano separati.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Interventi strutturali: ricablizzazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: € 2.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		6.263.310,39			Finanziamento suddiviso negli interventi 12A, (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C. Desolato, Rio S. Martino, Piovega di S. Rito S. Amrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione definitiva in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Daviatore Piovega di Peseglie, Bacino Pisani, Pesegliana, Marconessa e Tarcu in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorzè (€ 4.131.655,19)		Realizzato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.

Ci sono anche casi in cui due o più finanziamenti danno vita ad un unico progetto. In questo caso le righe degli interventi originari (che sono stati evidenziati in grigio) contengono le informazioni sul finanziamento, mentre le notizie inerenti all'impegno e allo stato dei lavori sono riportate nella riga relativa all'intervento unificato.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 DEL 21/11/1993	DPGR N. 2267 DEL 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A2	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DPGR N. 2287 DEL 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1995	07/07/1995 28/07/1995	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73

Inoltre, le note nelle tabelle guidano il lettore nella consultazione dei progetti realizzati con i fondi della Legge Speciale.

SEZIONE I: COMUNI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati
i finanziamenti attribuiti direttamente ai Comuni

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Es. 1993												
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DPGR N. 6 DEL 3/1/1995	516.456,90	516.456,90	513.763,48	Lavori collaudati	05/02/1999 01/06/1999	29/07/2002	08/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
Legge 516/96 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 9/12/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati	16/06/1998 03/12/1998	25/01/2001	29/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
					TOTALI							
					2.065.827,60	2.065.827,60	1.908.197,11					

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 -VI fase												
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante
					TOTALI							
					2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI CASTELFRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1997												
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1998	DDDA N. 25 19/03/1999	1.446.079,32	1.446.079,32	1.260.029,51	Lavori conclusi. Collaudo in corso	23/05/2000	29/11/2001		
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Interventi di fognatura e depurazione	B/1/62	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		258.228,45			Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda	1/R/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3A	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda (€ 1.446.079,32)			Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,45) + 3 (€ 1.187.850,87) = € 1.446.079,32				In fase di progettazione				
4	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.375.701,74)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002					Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.358.322,68), 4B (€ 345.985,06) e 4C (€ 671.394,00)				
4A	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località Salvatronda e BorgoPadova (€ 1.358.322,68)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.358.322,68			In fase di progettazione				
4B	Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico.	1/R/2.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	345.985,06	345.985,06	0,00	Progetto approvato				
4C	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00)	1/R/2.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 23/06/2004	671.394,00	671.394,00	34.634,15	Lavori in corso				
5	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 258 29/12/2004	1.342.787,94	1.216.657,36	0,00	Progetto approvato				
					6.610.648,31	4.867.966,61	1.294.663,66	TOTALI				

COMUNE DI CAVALLINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1997												
1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 38 23/4/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	2.486.097,95	Lavori in corso				
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B/1/63	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 38 23/4/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treportì (VE)	1/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 2 07/01/2004	1.032.913,80	1.032.913,80	80.418,40	Lavori in corso				
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		517.000,00			Progetto in fase di redazione				Vedi scheda riiepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
5	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà Valle	E/10.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.440.000,00			Progettazione in corso				
6	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
7	Individualizzazione e riduzione di acque parassite nella fognatura	E/10.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
					TOTALI	11.470.939,69	6.713.939,69	2.568.516,35				
COMUNE DI CAVAZZERE												
Legge 67/88 Es. 1992 - I^a tranche												
1	Fognatura comunale di Cavazzere	1/4.5	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 62 DEL 8/9/1995	568.102,59	568.102,59	566.906,86	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 19 del 26/02/2001, un'economia di € 1.195,73 reiscritta sui fondi impegnati con DGR n. 186/CR/1993
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto e Zona Industriale	1/4.5bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DPGR 2293 9/11/1995	723.039,66	723.039,66	723.039,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 93 del 23/09/2002
Legge 515/96 Es. 1997												
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavazzere	B/15/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 64 12/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 204 del 22/10/2004, un'economia di € 4.303,48. Richiesta la restituzione alla R.V. di € 12.354,14
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
4	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 81 9/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 228 del 17/10/04
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
5	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	B/16 I	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 126 4/10/2001	2.065.827,60	2.065.827,60	1.859.244,84	Lavori ultimati				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 489/99 Es. 2002, 2003											
6	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 97 26/05/2004	1.032.913,80	1.032.380,62	102.757,28	Lavori in corso				
TOTALI					7.488.625,04	7.488.091,86	6.178.562,82					

COMUNE DI CODEVIGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2261 29/10/1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 381 del 02/10/1997
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
2	Interventi di ripristino dei caratteri lagunari in alcune aree della gronda attraverso rinaturalizzazione di aree prossime alla contenzione lagunare, finalizzate al ripristino delle funzioni ecologiche proprie delle zone umide	B/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				Stipulato un accordo di programma tra il comune di Codevigo e il MAV per la realizzazione dell'intervento
TOTALI					3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70					

COMUNE DI CORNUDA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Adeguamento ai limiti di legge del depuratore comunale di Cornuda, località La Valle	E/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		943.675,00			Progettazione in corso				
TOTALI					943.675,00	0,00	0,00					

COMUNE DI ESTE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 615/96 Es. 1997											
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Megliario"	A/6/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 30 DEL 5/8/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	Collaudo in corso Lavori in corso	02/02/2000 09/06/2003			
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B/1/64.B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 67 DEL 4/6/2001	516.456,90	516.456,90	51.072,26	Lavori in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio Legge 488/99 Es. 2002, 2003	B1/64.A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 DEL 9/5/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	294.638,65	Lavori in corso				
4	Interventi di completamento della rete fognaria del centro storico e della zona Megliaro. XV stralcio Legge 488/99 Es. 2002, 2003	1/7/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 116 DEL 20/8/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori in corso	20/03/2002	07/11/2002		
TOTALI					4.906.340,54	4.906.340,54	1.507.739,93					

COMUNE DI FOSSO'

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE) Legge 488/99 Es. 2002, 2003	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
2	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favalli Legge 488/99 Es. 2002, 2003	4/A/1.9	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DGR 2833 DEL 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
TOTALI					914.684,42	914.684,42	0,00					

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme Legge 539/95 Es. 1997	C/30/1	DGR N. 553 DEL 25/02/1997	DDDA N. 62 DEL 11/06/1997	346.026,12	346.026,12	274.003,05	Lavori collaudati	14/05/1998	29/06/2002	19/09/2003	Registrata, con DDDA n. 119 del 23/06/2004, un'economia di € 72.023,06
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano Legge 515/96 Es. 1997	A/7/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 185 DEL 24/4/1998	619.748,28	619.748,28	619.711,96	Lavori collaudati	11/01/1999	09/03/2001	13/10/2002	Registrata, con DDDA n. 61 del 31/05/2002, un'economia pari a € 36,32
TOTALI					965.774,40	965.774,40	893.715,01					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

**COMUNE DI JESOLO / A.S.I.
FINANZIAMENTI DIRETTI AL COMUNE**

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note		
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986														
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34 da rescrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986		
Legge 910/86 Es. 1987-1988														
2	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	1/1.4.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DGR N. 158 27/9/1986	46.551,70	46.551,70	46.551,70	Lavori collaudati	03/07/1996	03/11/1996	29/01/1997	Registrata, con DDDA n. 29 del 15/05/2000, un'economia di € 54.485,00 reimpiiegata nell'intervento 12		
3	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 162 2/10/1986	95.639,10	95.639,10	95.639,10	Lavori collaudati	07/01/1997	16/04/1997	24/07/1997	Registrata, con DDDAn. 98 del 21/10/1999, un'economia di € 64.462,54 reimpiiegata nell'intervento 11		
4	Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	1/1.4.3a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 71 23/6/1997	242.406,28	242.406,28	242.406,28	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 28/10/1999		
5	Opere di completamento fognario	1/1.22		DFGR 2853 31/12/1990	59.686,88	59.686,88	11.312,06	Lavori in corso				Dati non forniti dall'ente		
Legge 67/88 Es. 1990														
6	Ampliamento della rete fognaria di via Baffile in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 14 16/4/1993	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	Lavori collaudati	04/09/1995	01/05/1997	24/06/1998	L'erogazione comprende l'importo di € 226.367,16 (economia) reimpiiegata nell'intervento 14, con DDDA n. 34 del 21/06/2000		
7	Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	1/1.4.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 71 23/6/1997	126.343,95	126.343,95	126.343,95	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 28/10/1999		
8	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione comunale.	1/2.10b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 13 12/5/1997	1.142.673,28	1.142.673,28	1.062.639,11	Lavori collaudati	17/09/1997	13/11/1999	07/03/2002	Registrata, con DDDA n. 6 del 09/02/2003, un'economia di € 80.034,17		
9	Somme per ulteriori interventi per copertura supero di spesa progetto "ampliamento rete fognaria Via Baffile" (1/2.10a)		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02					Dati non forniti dall'ente		
10	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 35 DEL 5/6/1999	6.527,10	6.527,10	6.527,10	Finanziamento riallocato nell'intervento 13A						
											TOTALI	5.634.235,34	5.631.652,35	5.494.250,01

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

FINANZIAMENTI DIRETTI ALL'A.S.I.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
11	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo (€ 64.462,00)	1/1.4.4a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 27 12/3/2001	64.462,54	64.462,54	56.784,85	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				Finanziamento costituito dall'economia di € 64.462,54 dell'intervento 3 del comune di Jesolo
12	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 54.485,00)	1/1.4.1 bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	54.485,86	54.485,86	54.485,86	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				Finanziamento costituito dall'economia di € 54.485,86 dell'intervento 2 del comune di Jesolo
Legge 67/88 Es. 1990												
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo	1/1.4.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 12/3/2001	6.478,90	6.478,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				
13A	Trattamento dei percolati da discarica (€ 77.468,53)		Riuniti i finanziamenti 10 (€ 6.527,10) + 13 (€ 6.478,90) + 11 (€ 64.462,54) = € 77.468,53					Lavori ultimati. Collaudo in corso	03/09/2001	30/04/2002		
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	226.367,16	226.367,16	198.281,86	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				
14A	Costruzione della rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 280.853,02)		Riuniti i finanziamenti 12 (€ 54.485,86) + 14 (€ 226.367,16) = € 280.853,02					Lavori ultimati. Collaudo in corso	22/04/2002	08/10/2003		
TOTALI					351.794,46	351.794,46	309.552,57					
Totale Comune di Jesolo/A.S.I.					5.986.029,80	5.983.446,81	5.803.802,58					

COMUNE DI MARCON

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 799/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDL N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto del LL.PP n. 7 del 28/03/2000
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/A.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	267.079,24	267.079,24	240.371,31	Lavori collaudati	25/06/2001	17/06/2002	14/01/2003	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo da parte del Comune di Marcon. Ente esecutore dei lavori. Consorzio Sile Piave
Legge 539/95 Es. 1997												
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/291	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 186 24/4/1998	1.548.370,70	1.548.370,70	1.206.494,01	Lavori in corso	25/06/2001			
TOTALI					1.859.244,84	1.859.244,84	1.489.560,22					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI MEOLO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
Legge 67/88 Es. 1991													
1	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR N. 4975 DEL 2/1/1993	DDDA N. 7 20/1/1995	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Finanziamento diviso negli interventi 1A, 1B e 1C					
1A	Adeguamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura di via Cà Tron, via Verdi e via Toscanini (progetto complessivo € 428.963,36)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1										
1B	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.913,48)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1										
1C	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.584,87)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1										
Legge 515/96 Es. 1997													
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo (progetto complessivo € 538.335,67)	B/19/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 11 DEL 5/5/1998	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente	
TOTALI													
					1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11						Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 13/11/2003

COMUNE DI MIRA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase													
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 148 13/12/2002	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione	
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase													
2	Parco lagunare di Mira	D/62	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				Intervento congiunto con il Consorzio Sinistra Medio Brenta e la Regione Veneto	
					3.718.489,67	113.620,50	113.620,50						TOTALI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 793/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)		DGR 994 DEL 09/10/1986		413.165,52	413.165,52	378.748,50	Lavori collaudati			14/1/1996	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/1/1995, un'economia pari a € 34.417,02 impegnata sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
2	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)		DGR 875 DEL 12/09/1986		258.228,45	258.228,45	231.666,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/03/1988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
Legge 139/92 Es. 1993												
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/tele rilevamento impianti di sollevamento	5/G/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 68 24/11/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.755.972,37	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
Legge 515/96 Es. 1997												
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 84 09/12/1998	2.582.284,50	2.582.284,50	2.324.056,05	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
					TOTALI	6.352.419,86	6.352.419,86	5.690.443,05				

COMUNE DI MONASTIER

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1997												
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 29 DEL 5/8/1998	1.401.642,79	1.401.642,79	1.401.642,79	Lavori collaudati	01/07/1999	26/10/2001	22/07/2002	Importo originale del progetto pari a € 1.549.370,70. Registrata, con DDA n. 36 del 14/04/2003, un'economia di € 147.727,91, reinvestita per finanziare l'int. 2
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento	B/1/2/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 182 05/10/2004	147.727,91	147.727,91	0,00	Progetto approvato				Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003
					TOTALI	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79				

COMUNE DI MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Es. 1993												
1	Fognatura di Monselice	6/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 103 24/11/1995	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori collaudati	20/11/1995	03/12/1998	31/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDA n. 41 del 28/04/2002

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	A/8/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 116 13/12/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.324.056,07	Lavori ultimati	18/01/2000	26/09/2002		Perizia suppletiva di variante approvata con DDDA 22/2001. Finanziamento invariato
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
3	Impianto di depurazione	B/1/65	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 90 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato				
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic.	1/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 26 26/3/2003	284.051,29	284.051,29	0,00	Progetto approvato				
5	Bonifica area ex Inceneritore	4/A/1.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.807.599,00	1.807.599,00		Progettazione in corso				
6	Bonifica area ex Inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A/1.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 10/09/2004	718.367,98	718.367,98	0,00	Progetto approvato				
Legge 139/92 Magg. Mutui II^a fase												
7	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Via del Borgo	6/H/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		5.400.000,00			Progettazione in corso				
					TOTALI	14.149.272,61	8.749.272,61	4.906.340,57				
COMUNE DI MORGANO												
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zerolo, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (TV)	B/14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 1/9/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	Collaudo in corso	14/01/2003	22/07/2003		
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B/1/66	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 13 22/2/2002	516.456,90	516.456,90	417.034,59	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	516.456,90	516.456,90	56.657,69	Lavori in corso				
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale	1/H/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 53 16/03/2004	826.331,04	826.331,04	149.485,77	Lavori in corso				
Legge 139/92 Magg. Mutui II^a fase												
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	6/G/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 222 22/11/2004	400.000,00	400.000,00	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
6	Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zerolo, Via Levada, Via Marcella, Via Molin, Cappello Nord	E/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		260.800,00			Progettazione in corso				
					3.811.187,08	3.550.387,09	1.785.206,07					
TOTALI												
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE												
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
1	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DPGR N. 2817 DEL 28/12/1990	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
2	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/3.1bis ECO	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA 214 DEL 17/11/2004	26.786,59	26.786,59	0,00	Progetto approvato				
Legge 67/88 Es. 1990												
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR N. 4589 DEL 5/8/1991	DDDA N. 111 DEL 15/10/1992	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	Lavori collaudati	11/02/1999	20/06/2002	18/11/2002	importo originale del finanziamento € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 22 del 26/03/2003, un'economia di € 19.111,94 (reinvestita nell'int. 4)
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR N. 4589 DEL 5/8/1991	DDDA 214 DEL 17/11/2004	19.111,94	19.111,94	0,00	Progetto approvato				
5	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR N. 4589 DEL 5/8/1991	DDDA N. 32 DEL 26/3/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
Legge 515/86 Es. 1997												
6	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 93 DEL 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
6A	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) (€ 1.239.496,56)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 516.456,90) + 3 (€ 516.456,90) + 4 (€ 206.582,76) = € 1.239.496,56					Lavori collaudati	18/02/2000	20/06/2001	28/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
					2.815.655,85	2.815.655,85	2.769.755,32					
TOTALI												

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI NOALE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 518/96 Es. 1997												
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/2/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 18 26/2/2001	1.291.142,25	1.291.142,25	192.701,15	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 1.291.142,25				
Legge 139/92 Il fase												
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Finanziato inizialmente al Consorzio DESE-SILE)	5/B/3.3	DGR N. 6400 12/12/1995	DDDA N. 18 26/2/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 774.685,35				
2B	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (€ 2.065.827,60)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.291.142,25) + 2 (€ 774.685,35) = € 2.065.827,60					Lavori in corso	01/07/2002 03/09/2003			Lavori in corso mediante due appalti
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolastico. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
TOTALI					3.408.615,60	2.200.106,40	1.038.352,34					

COMUNE DI PADOVA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 518/96 Es. 1997												
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio In Comune di Padova	A/9/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DGCA N. 213 03/05/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori ultimati	20/05/2002			Importo complessivo dell'opera € 6.971.742,72 finanziato parzialmente con fondi della Legge Speciale per Venezia per € 2.065.827,60
TOTALI					2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Es. 1993												
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 80 24/11/1995	1.609.967,86	1.609.967,86	1.609.967,86	Lavori collaudati	14/04/1997	05/11/1998	06/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 19 del 26/3/2003
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 23 03/04/1995	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	Lavori collaudati	06/09/1995	28/08/1998	07/04/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 20 del 26/3/2003
TOTALI					3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29					

COMUNE DI PREGANZIOL

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	B/45.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/6/1999	DDDA N. 46 27/7/2000	774.685,35	774.685,35	697.216,82	Lavori collaudati	19/07/2001	26/10/2002	04/02/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso: in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/I/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 30 27/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	247.600,00	Lavori in corso	26/11/2003			
TOTALI					1.807.599,15	1.807.599,15	944.816,82					

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	DGR N. 259 DEL 25/1/1994	DDDA N. 26 11/4/1991	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/04/1995	20/01/1997	20/11/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 102 del 20/11/2000
Legge 67/88 Es. 1990												
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1047 28/4/1993	2.562.284,50	2.562.284,50	2.259.776,30	Lavori collaudati	25/10/1996	20/07/1998	20/09/1998	Registrata, con DDDA n. 93 del 19/05/2004, un'economia di € 322.508,20
Legge 139/92 Es. 1993												
3	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (Il stralcio)	5/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDETA N. 6 20/1/1995	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	18/12/1996	05/08/1995	21/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 103 del 20/11/2000
TOTALI					5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI SAIZANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 185 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	31.996,33	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
TOTALI					2.400.000,00	2.400.000,00	31.996,33					

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 54 26/05/2003	750.000,00	75.000,00	75.000,00	Progetto approvato				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione (importo pari a € 75.000,00). Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2833 10/09/2004	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
TOTALI					1.250.000,00	575.000,00	75.000,00					

COMUNE DI VENEZIA / V.E.S.T.A.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 798/04 Es. 1984-1985-1986												
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6		DDEA N. 54 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05					L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo							Fondi riallocati nell'int. 2A				
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 516.456,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcale di Venezia

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Costruzione della fognatura di TREPORI		DGR N. 1175 DEL 26/03/1985	DDL N. 1190 DEL 23/12/1987	1.394.433,63	1.394.433,63	1.379.989,31	Lavori collaudati	14/11/1988	26/02/1991	16/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 55 del 09/02/1996, per € 1.379.989,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.357,55
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDL N. 1006 DEL 26/10/1987	1.595.851,82	1.595.851,82	1.587.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	06/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.861,61.
5	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)			DDL N. 1003 DEL 26/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	16/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 23/08/1994, un'economia pari a € 3.785,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)			DGR N. 2992 DEL 26/05/1987	619.748,28	619.748,28	605.927,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/09/1988	26/01/1996	Registrata, con DDLP n. 285 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53
7	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto			DGR N. 5591 DEL 29/09/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	1.491.506,77	Lavori collaudati	18/01/1988	31/05/1989	08/04/1991	Registrata, con DDLP n. 118 del 11/05/1994, un'economia pari a € 625.966,51, destinata in parte all'intervento 22A
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto			DGR N. 5590 DEL 29/09/1987	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori collaudati	13/01/1988	06/01/1989	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 32 del 23/02/1999. Con DDLP n. 75 del 31/03/1999 si concede un ulteriore finanziamento per € 6.201,73
9	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto			DGR N. 999 DEL 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	2.077.719,51	Lavori collaudati	12/01/1988	25/05/1989	16/03/1992	Registrata, con DDLP n. 322 del 10/11/1994, un'economia pari a € 39.753,78
10	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE			DGR N. 2994 DEL 26/05/1987	852.153,88	852.153,88	823.357,07	Lavori collaudati	11/01/1988	15/12/1988	08/05/1997	Registrata, con DDLP n. 301 del 06/08/1997, un'economia pari a € 28.796,81
11	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 DEL 19/3/1999	676.558,54	675.525,62	675.525,62	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
12	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera (vasca di arrivo del collettore)			DDL N. 949 DEL 21/10/1987	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/10/1987	08/04/1988	22/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 95 del 11/05/1998. Con DDLP n. 255 del 15/10/1998 finanziato aumento revisione prezzi per € 10.940,58
13	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta Legge 910/86 Es. 1987-1988	1/3.6.A		DDEA N. 54 DEL 17/10/1991	4.820.923,49	0,00	0,00	Progetto in fase di redazione				Interventi gestiti dalla società INSULA
14	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	1/1.5		DDDA N. 9 DEL 12/9/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	919.192,17	Lavori collaudati	20/10/1987	22/06/1989	12/04/2000	La Regione ha utilizzato parte del finanziamento per € 15.493,70, destinando il rimanente pari a € 1.017.420,09 al Comune di Venezia. In attesa di ricevere la richiesta di saldo da parte del Comune di Venezia

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 14 11/10/1990	133.601,63	133.601,63	133.601,63	Progetto approvato				Modifica del progetto approvato utilizzando il finanziamento regionale oltre a fondi propri del Comune: in attesa della documentazione da parte del Comune
16	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993		2.582.284,50			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.582.284,50 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
17	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	1/3.7	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 23/2/1993	2.065.827,60	2.065.827,60	1.859.244,84	Lavori collaudati	29/09/1997	09/03/2001	22/02/2002	Dati attesi da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale
18	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)				3.615.198,29	3.615.198,29	2.975.311,14	Lavori ultimati				Dati attesi da parte del Comune di Venezia
19	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mil Legge 910/86 Es. 1989	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	877.976,73	877.976,73	877.976,73	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
20	Costruzione vasca di modulazione di Favaro V. Veneto (VE)	1/3.8	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 37 26/5/1994	1.807.599,15	1.807.599,15	1.597.613,90	Collaudo in corso	02/12/2002			Inizio dei lavori ritardato dal fallimento dell'impresa. Le opere sono finanziate, oltre che dal presente finanziamento, anche da € 568.102,59 (int. 84) e da € 413.165,52 (int. 64)
21	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	DGR N. 745 DEL 17/1/1988	DDEA N. 59 11/12/1991	3.795.958,21	3.795.958,21	586.178,58	Lavori da appaltare				L'appalto sarà unificato all'int. n. 38. Dell'importo finanziato, una quota parte pari a € 205.582,76 è destinata al Consorzio Sinistra Medio Brenta.
22	Costruzione fognatura di Via San Donà a V. Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 55 12/10/1994	1.936.713,37	1.936.713,37	2.202.677,43	Finanziamento convogliato nell'intervento 22A				Le erogazioni si riferiscono al finanziamento complessivo dell'int. 22A
22A	Costruzione fognatura di Via San Donà a V. Carpenedo - Mestre (VE)			Riuniti i finanziamenti 7 (€ 593.925,43) + 22 (€ 1.936.713,37) = € 2.530.638,80				Lavori collaudati	06/05/1997	08/07/1999	26/11/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
23	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E		DDEA N. 63 11/6/1997	619.748,28	619.748,28	557.506,82	Lavori collaudati	14/07/1997	22/10/1997	04/05/1998	Registrata con DDDA n. 17 del 02/03/1999, un'economia di € 62.241,46 destinata all'int. 24
24	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 32 26/4/1999	1.962.636,22	1.645.948,14	1.282.315,78	Lavori ultimati	01/05/2000			Quota parte del finanziamento pari a € 378.046,45, convogliati nell'int. 28. Utilizzate le economie dell'int. 23 pari a € 62.241,46

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Fognatura S.Erasmo							Fondi riallocati				Intervento affidato al MAV
Legge 67/88 Es. 1988												
26	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.											
26A	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		6.482.229,51	0,00	0,00	Fondi riallocati				In attesa di chiarimenti sulla destinazione dei fondi da parte del Comune di Venezia.
26B	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea - Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		231.710,18	231.710,18	231.710,18	Progettazione conclusa				Finanziamento limitato alle sole spese di progettazione
27	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalzo - Opere accessorie	1/2.2	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DPGR N. 207 26/1/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.156.565,45	Lavori collaudati	14/01/1997	20/06/2000	03/09/2003	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
Legge 67/88 Es. 1990												
28	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	1/2.7	DGR N. 259 DEL 25/1/1994		3.098.741,39	3.098.741,39	2.881.295,30	Lavori collaudati	23/05/1996	10/04/1998	28/01/2002	L'importo dei lavori sale con perizia suppletiva di € 542.279,74, finanziato con parte dell'int. 24, pari a € 378.046,45 e con parte dell'int. 68 pari a € 163.727,74. In attesa di ricevere la richiesta di saldo
29	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.549.370,70			Progettazione in corso				Impegno pari a € 1.549.370,70 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
30	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto.	1/2.6	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	N. 23 DEL 15/4/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	1.573.090,41	Lavori collaudati	11/11/1996	26/05/1999	31/03/2003	In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale (importo € 2.863.521,17)
31	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2436 3/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	722.403,66	Lavori in corso				L'erogazione è comprensiva delle spese di progettazione e dell'anticipo del 10%
32	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 24 DEL 7/4/1995	4.131.655,19	4.131.655,19	3.718.489,67	Collaudo in corso				Collaudate le opere civili. In appalto le opere elettromeccaniche
33	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1182 9/6/1994	3.615.198,29	3.615.198,29	3.167.908,06	Lavori collaudati	24/02/1997	14/12/1998	18/10/1999	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
34	Ampliamento IV linea depuratore Fusina.							Fondi riallocati				
34B	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	1/2.5.B	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	Progetto approvato				Finanziamento proveniente da fondi riallocati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1991											
35	Estensione della rete fognaria di tipo separato V. nella zona di Trivignano - Zelarino - Il lotto	1b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 12 12/2/1996	3.925.072,43	3.925.072,43	3.532.573,45	Lavori in via di ultimazione	12/12/1997			Mancano lavori di completamento. Integrazione di € 516.456,89 proveniente dall'int. 85. Ritardi dovuti al fallimento dell'impresa
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
36A	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	Riuniti i finanziamenti 11(€ 676.558,54) + 19 (€ 877.976,73) + 36 (€ 258.228,45) + 58 (€ 1.545.233,04) = € 3.358.002,76					Lavori ultimati				
	Legge 67/88 Es. 1992 - 1° tranché											
37	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione V. della Rana	1/4.2	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	N. 157 DEL 16/9/1996	2.840.512,95	2.840.512,95	2.666.908,82	Lavori collaudati	27/05/1997	08/05/1999	14/10/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
38	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		2.324.056,05			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.324.056,05 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
	Legge 360/91											
39	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993					Fondi riallocati nell'intervento 39A				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolastico.
39A	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.032.913,80	0,00	0,00	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolastico. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
40	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - lotto "B1"	1/2.5	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991		1.032.913,80			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolastico. Impegno pari a € 1.032.913,80 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
	Legge 139/92 Es. 1993											
41	Fognature di Pellestrina (VE)	5/B/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		520.588,55	0,00	0,00	Progettazione in corso				Interventi gestiti dalla società INSULA
42	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di Via Torino a Mestre	1/C/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 12/2/1996	4.751.403,47	4.751.403,47	4.283.343,57	Lavori collaudati	14/01/1997	06/08/1999	22/01/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
43	Impianto di modulazione delle acque di pioggia della zona di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 20 12/2/1996	2.995.450,01	2.995.450,01	1.333.826,50	Lavori in corso	31/01/1997			Sospensione lavori per mancata tenuta dei diaframmi. Impresa fallita. Nuovo progetto che comporta un incremento di spesa di € 1.549.371,00 finanziato con parte dei fondi dell'Int. 84.
44	Completamento della rete di fognatura separata nella zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	1/C/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 12/2/1996	2.943.804,32	2.943.804,32	2.649.423,89	Lavori collaudati	15/05/1997	03/11/1999	07/01/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
45	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 13 12/2/1996	1.859.244,84	1.859.244,84	1.660.333,60	Lavori collaudati	10/03/1997	14/09/1999	04/11/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
46	Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	1/C/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 14 12/2/1996	2.014.181,91	2.014.181,91	1.730.927,27	Lavori collaudati	07/01/1998	19/11/1999	05/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
47	Ristrutturazione della fognatura nella zona di V. Cipressina - Zelarino	1/C/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 22 12/2/1996	2.737.221,57	2.737.221,57	2.463.499,41	Lavori collaudati	23/03/1998	24/03/2000	09/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
48	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 19 12/2/1996	3.718.489,67	3.718.489,67	3.263.130,89	Lavori collaudati	16/11/1998	29/09/1999	18/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
49	Ricostruzione della fognatura della zona di via V. Silvio Trentin - Mestre	1/C/8	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 12/2/1996	3.356.969,84	3.356.969,84	1.526.061,65	Lavori in corso	10/07/1997			Risolto il contratto in danno all'impresa con lavori al 45%. Completamento appaltato ad altra ditta in data 05/05/2003
50	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/9	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 15 12/2/1996	2.169.118,98	2.169.118,98	1.914.484,44	Lavori collaudati	05/05/1997	23/10/1998	06/12/1999	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
51	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	1/C/10	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 168 10/4/1998	1.755.953,46	1.755.953,46	13.578,74	Lavori in corso				In attesa dell'approvazione della variante urbanistica
52	Completamento dell'impianto di depurazione di V. Campalto	1/C/11	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 528 1/12/1997	7.230.396,59	7.230.396,59	349.459,20	Lavori in corso	16/01/2001			
53	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo V. (Via Tevere)	1/C/12	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 11 12/2/1996	4.957.986,23	4.957.986,23	2.912.123,56	Lavori in corso	06/04/1998			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta
54	Completamento della rete di fognatura di tipo V. separato di Malcontenta	1/C/13	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 133 DEL 8/8/1996	1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,26	Lavori in corso				Consegna sospesa in attesa di risoluzione espropri
55	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale V. Osellino	1/C/14	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 21 12/2/1996	1.910.890,53	1.910.890,53	1.446.753,40	Lavori in corso	26/06/1997			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta il 12/12/2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impagno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
56 V.	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46 completamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
57	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		18.075.991,47	18.075.991,47	18.075.991,47	Lavori in corso				
58	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pelicciolina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld.	5/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	1.545.239,04	1.545.239,04	1.209.542,06	Finanziamento interamente convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
59 V.	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto.	5/B/2		DDDA N. 115 23/06/2004	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 6.894.700,00. Finanziato con parte dei fondi (€ 2.246.587,51) dell'int. 86
60 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	5/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 23 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	1.538.841,76	Lavori collaudati	15/01/1997	30/07/1999	04/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
61 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savo	5/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 24 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	1.846.270,63	Lavori collaudati	09/09/1999		06/06/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
62 V.	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Maliccontenta	1/B/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progettazione in corso				Intervento facente parte del Progetto integrato
63 V.	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progetto definitivo				Integrazione del finanziamento, per € 1.549.370,69, con parte dei fondi dell'int.86
64 V.	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 110 14/12/2000	3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,72	Lavori in corso	16/01/2002			La differenza tra importo finanziato ed impegnato, pari a € 413.165,51, convogliato nell'int. 20
65	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	1/C/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.582.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto integrato Campalto
66	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	1/C/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		3.098.741,39	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto integrato Campalto
67	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	1/C/5	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		4.131.655,19	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto integrato Campalto
68 V.	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	1/E/1	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996		3.460.261,22	0,00	0,00	Progettazione in corso				Integra per € 115.686,34 l'int. 51, per € 163.716,84 l'int. 28 e per € 2.633.930,18 due interventi dell'appalto integrato.
69	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,77	Lavori in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
70	Progetto Campalto - affinamento con V. fitodepurazione	5/B/6	DCR N. 45 DEL 15/7/1999		3.873.426,74	0,00	0,00	Progettazione in corso	16/01/2002			Finanziamento proveniente da fondi riallocati
71	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di V. chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V. Legge 539/95 Es. 1996	1/C/7	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 57 27/5/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori in corso	16/01/2002			Finanziamento complessivo pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B. Impegno inerente alle spese di progettazione
72	PROGETTO INTEGRATO RII Legge 539/95 Es. 1997	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
73	PROGETTO INTEGRATO RII Legge 515/96 Es. 1997	C/26/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
74	Ampliamento e ristrutturazione della rete V. fognaria in Comune di Venezia	C/23/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		7.521.618,25	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento € 27.372.215,65 suddiviso negli interventi 74A (€ 428.659,23), 74B (4.343.402,52), 74C (€ 2.065.827,60) e uno di competenza del Comune del Cavallino (€ 4.648.112,09). Parte del finanziamento revocato, pari a € 5.265.854,58 e devoluto alla Diocesi Patriarcale di Venezia (int. C/23/1.9).
74A	Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico.	C/23/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 179 24/12/2001	428.659,23	428.659,23	0,00	Progetto approvato				
74B	Ristrutturazione della rete fognaria della zona V. del centro di Marghera (VE)	C/23/1.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 27/6/2002	4.343.402,52	4.343.402,52	0,00	Progetto approvato				
75	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		11.878.508,66	11.878.508,66	11.878.508,66	Lavori in corso				
74C	Ristrutturazione della rete fognaria secondaria V. della zona Nord e Centro di Marghera (VE)	C/23/1.4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999		2.065.827,60							Il DDDA n. 90 del 12/08/2002 che impegnava € 2.065.827,60 è annullato con il DDDA 77/03 in quanto l'intervento deve essere finanziato con i fondi CIPE
74D	Completamento della rete di fognatura di tipo V. misto del Bacino della Gazzera. Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	C/23/1.5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 114 20/08/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				
76	Bonifica "Corti femminili" - Mestre	B/16 V fase	DGR N. 2962 DEL 14/9/2000		1.518.216,98	1.518.216,98	1.417.549,70	Lavori collaudati				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolare. Registrata, con DDDA n. 152 del 22/11/2001, un'economia di € 100.667,29

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
77A V.	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U. V.	A/2.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 DEL 27/5/2002	5.216.214,68	5.216.214,68	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
77B V.	Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione	A/2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.239.496,56	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
78	PROGETTO INTEGRATO RII	B/19 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 DEL 4/10/2001	19.625.362,17	19.625.362,17	19.625.362,17	Lavori in corso				
79 V.	Interventi di fognatura; accordo di programma V. Malamocco-Alberoni	B/160	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.681.025,89	0,00	0,00	Progettazione in corso				
80	PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 22 DEL 7/3/2002	24.789.931,16	24.789.931,16	22.195.410,00	Lavori in corso				
81 V.	Interventi di fognatura; accordo di programma S. Erasmo	B/159	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.807.599,15	0,00	0,00	Progettazione in corso				Intervento affidato al MAV
82 V.	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6 (FUSINA)	B/156.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 120 DEL 29/12/2000	1.068.549,32	1.068.549,32	45.650,86	Lavori in corso	27/03/2003			
83 V.	Interventi di fognatura al Lido di Venezia	B/158	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		826.331,04	0,00	0,00	Progettazione in corso				
84 V.	Fognature afferenti all'impianto di Campalto	B/157	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.078.919,94	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 6 interventi
85 V.	Fognature afferenti all'impianto di Fusina	B/156	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.265.138,64	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni di interventi precedenti e 2 nuovi interventi)
92	Bonifica area "ex - conterie" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi.	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
93 V.	Interventi di riqualificazione della fognatura di V. viale Garibaldi e Piazza Carpanedo.	B/157.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 106 DEL 18/10/2002	1.254.768,03	1.254.768,03	0,00	Progetto approvato				
86 V.	Interventi di fognatura nel territorio comunale (importo complessivo € 17.043.077,67)	I/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		14.796.489,67	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento originale di € 17.043.077,67 suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni e 3 nuovi interventi)

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
86A	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX lotto.	1/N/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 115 DEL 23/06/2004	2.246.588,00	2.246.588,00	0,00	Progetto approvato					
87	PROGETTO INTEGRATO RII	7/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 22 DEL 07/03/2002	20.658.275,96	20.658.275,96	0,00	Progetto approvato					
Legge 139/92 - Magg. Mutui II FASE													
88	PROGETTO INTEGRATO RII		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		4.038.597,75	0,00		Progettazione in corso					
Legge 388/00 e 449/01 Es. 2002, 2003, 2004													
89	Opere di disinquinamento ambito Campalto: diminuzione acque parassite	E/14.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.040.000,00			Progettazione in corso					
90	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite	E/14.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso					
91	Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite	E/14.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso					
92	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognatura nera e riqualificazione fognatura bianca	E/14.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.320.000,00			Progettazione in corso					
93	Osservatorio naturalistico della Laguna	B/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		400.000,00			Progetto preliminare					
94	Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia	B/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		600.000,00			Studio preliminare					
95	PROGETTO INTEGRATO RII	A/5	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		28.000.000,00			Progettazione in corso					
					383.327.708,36 253.492.572,73 167.060.142,81			TOTALI					

COMUNE DI ZERO BRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	2/A/1	DGR 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	258.228,45	258.228,45	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 258.228,45				
Legge 139/92 Il fase												
2	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	B/14/1	DGR N. 2513 DEL 22/7/1997	DDDA N. 67 DEL 13/1/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.070.693,88	Lavori in corso	25/10/2000			Con DDDA n. 52/2004 stabilito integrazione finanziamento di € 210.000,00. Con DGR 1234/04 stabilito nuovo termine fine e lavori: 31/12/2005

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase		DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		DDDA N. 64 DEL 1/9/2000		123.949,66		123.949,66		Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 123.949,66	
3	Interventi di fognatura e di depurazione nel comune di Zero Branco.	B/18 IV fase									
4	Interventi di fognatura e depurazione	B/18 IV fase									
4A	Interventi di fognatura e depurazione (€ 516.456,90)										
		Legge 139/82 Magg. Murtul II fase		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		DDDA N. 52 16/03/2004		210.000,00		210.000,00	
5	Adeguamento al D. M. 30 luglio 1999 ed ampliamento dell'impianto di depurazione comunale	6/1/1									
TOTALI										2.275.827,60 2.275.827,60 1.535.705,09	

SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente alle Aziende Speciali Consortili.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE (A.C.M.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)			DPR N. 1523 16/12/1986	206.582,76	206.582,76	184.286,86	Lavori collaudati	23/03/1987	21/04/1987	16/01/1989	Registrata, con DDLP n. 422 del 11/12/2003, un'economia pari a € 20.183,39
2	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese		DPR N. 621 DEL 20/07/1987	DR N. 1004 DEL 26/10/1987	2.375.701,74	2.375.701,74	2.375.701,74	Lavori collaudati	14/09/1987	16/07/1989	15/06/1989	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 424 del 11/12/2003
Legge 910/88 Es. 1988												
3	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	1/3.1bis	DGR N. 4976 DEL 21/11/1993	N. 1249 DEL 4/6/1993	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Decreto di contabilità finale n. 92/2004, per € 1.394.433,63. Disimpegnati, con DGR 25/17/2002 € 154.937,07.
4	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	1/3.1A	DGR N. 4976 DEL 21/11/1993	DPR N. 1365 25/6/1993	7.488.625,04	7.488.625,04	6.808.530,40	Primo appalto collaudato. Secondo appalto in attesa di collaudo	14/12/1994	27/10/2000	22/07/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso: manca relazione acclarante
5	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettivi fognari	1/3.1	DGR N. 4976 DEL 21/11/1993	N. 41 DEL 8/11/1993	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	02/01/1995	20/06/1997	25/03/1998	Decreto di contabilità finale sospeso in attesa dell'integrazione della documentazione
Legge 87/88 Es. 1990												
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	1/2.15	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPR N. 1249 4/6/1993	516.456,90	516.456,90	446.735,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
6A	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE) (€ 2.065.827,60)		Finanziato con i fondi del finanziamento 3 (€ 1.549.370,70) + 6 (€ 516.456,90) = € 2.065.827,60					Lavori collaudati	28/12/1994	16/03/1998	29/09/2003	Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
Legge 67/88 Es. 1982 - 1° tranche												
7	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature (€ 4.131.655,19)	1/4.3	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		2.709.156,19		0,00	Finanziamento suddiviso in 7A (€ 462.554,00), 7B (€ 499.945,00) e 7C (460.000,00)				Finanziamento originale pari a € 4.131.655,19
7A	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Stra	1/4.3c	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 144 23/07/2004	462.554,00		19.975,58	Lavori in corso				
7B	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Campagna Lupia	1/4.3a	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 142 23/07/2004	499.945,00		19.635,77	Lavori in corso				
7C	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Fiesso d'Artico	1/4.3b	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 143 23/07/2004	460.000,00		18.856,82	Lavori in corso				
Legge 138/82 Es. 1983												
8	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	1/B/1	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 36 25/5/1995	929.622,42	929.622,42	929.622,42	Lavori collaudati	28/06/1996	24/09/1998	01/08/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 119 del 25/10/2002

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	1/B/2	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	06/11/1995	17/04/1997	18/10/1997	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 99 del 02/03/1998
10	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	1/B/3	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 67 16/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	11/04/1996	26/02/1999	21/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 8 del 15/02/2002
11	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	1/B/4	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 69 19/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	11/04/1996	26/11/1998	26/03/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 79 del 15/07/2002
12	Vasca di pioggia di Noale	1/B/5	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 170 29/10/1996	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	01/09/1998	25/03/1999	21/02/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 15/02/2002
13	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese (€ 1.229.167,42)	2/A/1	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993		Intervento suddiviso negli interventi 31 (€ 242.734,74), 32 (€ 142.025,65) e 33 (€ 844.407,03)							
14	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	2/A/7	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 7 27/1/1997	320.203,28	320.203,28	320.203,28	Lavori collaudati	27/01/1998	26/07/1999	29/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 07/01/2004
15	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Milano	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	Lavori collaudati	11/04/1996	22/12/2000	24/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 151 del 30/10/2003
16	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	29/03/1996	31/07/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 07/07/2000
17	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	18/09/1996	01/08/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 14/02/2001
18	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	16/07/1997	19/11/1998	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 87 del 30/10/2000
19	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	27/11/1995	31/12/1997	07/10/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 88 del 30/10/2000
20	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 18 3/3/1995	2.324.056,05	2.324.056,05	2.314.921,22	Lavori collaudati	27/11/1995	06/02/2003	15/09/2003	Registrata con DDDA n. 10 del 07/01/2004, un'economia pari a € 9.134,83
21	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DGCA N. 18 DEL 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	25/11/1995	27/09/1997	25/11/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 07/07/2000
22	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campiungo Maggiore	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	27/11/1995	09/07/1997	08/08/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 43 del 07/07/2000
23	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - Il traicco	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 4 19/1/1995	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	Lavori collaudati	25/09/1996	25/09/1999	25/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 80 del 15/07/2002
24	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - Il traicco	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 5 19/1/1995	3.382.792,69	3.382.792,69	3.382.792,69	Lavori collaudati	31/05/1995	09/01/1999	07/05/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 07/01/2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	2/A/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 56 DEL 24/10/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	25/02/1995	16/10/1995	02/03/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 18 del 27/05/1998
26	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	2/A/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 DEL 7/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	23/02/1995	07/05/1997	04/05/1998	
27	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	2/A/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 146 DEL 31/12/1999	854.736,17	854.736,17	769.262,55	Collaudo in corso	20/12/2000			
28	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	2/A/1.2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 147 DEL 31/12/1999	671.393,97	671.393,97	604.254,57	Collaudo in corso	20/12/2000	10/11/2001		
29	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	2/A/1.3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 148 DEL 31/12/1999	539.697,46	539.697,46	539.697,46	Lavori collaudati	20/12/2000	31/07/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 138 del 16/07/2004
30	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	2/A/1.4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 149 DEL 31/12/1999	774.685,35	774.685,35	774.295,86	Lavori collaudati	20/12/2000	29/10/2002		Registrata, con DDDA n. 46 del 3/3/2004, un'economia pari a € 389,49
31	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquisite. 27° Lotto fognature.	2/A/1.5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 DEL 28/2/2002	242.734,74	242.734,74	242.734,74	Lavori collaudati	12/07/2002	10/02/2003	22/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 02/03/2004
32	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquisite. 27° lotto fognature.	2/A/1.6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 DEL 28/2/2002	142.025,65	142.025,65	127.823,08	Collaudo in corso	25/11/2002	09/04/2003		
33	Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	2/A/1.7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 DEL 28/2/2002	844.407,03	844.407,03	648.931,60	Lavori in corso	03/07/2002			
34	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	1/E/3	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 44 DEL 1/6/1999	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,80	Lavori collaudati	05/09/2000	07/04/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 162 del 31/08/2004.
35	Opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Flesso D'Artico	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 DEL 13/9/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	13/03/2001	21/03/2002	25/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 98 del 18/08/2003
36	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Saizano	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 109 DEL 14/12/2000	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	15/10/2001	30/05/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 239 del 20/12/2004
37	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 107 DEL 14/12/2000	284.051,29	284.051,29	255.646,17	Lavori in corso	16/07/2002			Con DDDA n. 195 del 13/10/2004 stabilito nuovo termine fine lavori: 14/11/2005
38	Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 28 DEL 21/3/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,96	Collaudo in corso	16/05/2002			
39	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 DEL 13/9/2000	568.102,59	568.102,59	465.400,54	Lavori in corso	13/04/2001			
40	Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Saizano settore "B". Progettazione esecutiva del 28° lotto.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 117 DEL 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	557.773,45	Lavori in corso	05/03/2002			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
41	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Fossò	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 22/9/1999	413.165,52	413.165,52	393.860,72	Lavori collaudati	04/02/2000	04/04/2001		Registrata, con DDDA n. 113 del 16/06/2004, un'economia pari a € 19.304,81
42	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 22/9/1999	464.811,21	464.811,21	464.892,98	Lavori collaudati	13/03/2000	27/04/2001	10/05/2002	Registrata, con DDDA n. 141 del 12/12/2002, un'economia di € 118,23
43	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto - in comune di Noale (Ve)	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 75 22/9/1999	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Lavori collaudati	14/03/2000	22/03/2002	02/12/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57 del 27/05/2003
44	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 144 31/12/1999	534.209,07	534.209,07	534.209,06	Lavori collaudati	22/05/2000	30/10/2002	12/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 07/01/2004
45	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 145 31/12/1999	395.413,35	395.413,35	395.413,35	Lavori collaudati	11/02/2000	03/05/2001	22/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 58 del 27/05/2003
46	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Pianiga	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 22/9/1999	516.456,90	516.456,90	497.090,05	Lavori collaudati	14/09/2000	21/05/2002	11/12/2003	Registrata, con DDDA n. 100 del 01/06/2004, un'economia di € 19.366,85
47	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 79 22/9/1999	524.616,92	524.616,92	519.457,90	Lavori collaudati	07/03/2000	30/07/2001	10/09/2002	Registrata, con DDDA n. 7 del 7/02/2003, un'economia di € 5.159,02
48	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 80 22/9/1999	508.296,88	508.296,88	481.632,89	Lavori collaudati	22/05/2000	04/07/2001	04/11/2003	Registrata, con DDDA n. 94 del 19/05/2004, un'economia di € 26.663,99
49	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 81 22/9/1999	671.393,97	671.393,97	669.023,23	Lavori collaudati	05/09/2000	07/10/2002	01/09/2003	Registrata, con DDDA n. 8 del 07/01/2004, un'economia di € 2.370,74
50	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 82 22/9/1999	284.051,29	284.051,29	274.136,39	Lavori collaudati	05/09/2000	23/11/2001		Registrata, con DDDA n. 161 del 31/08/2004, un'economia di € 9.914,90
51	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 83 22/9/1999	748.862,50	748.862,50	748.862,49	Lavori collaudati	22/05/2000	22/02/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 231 del 06/12/2004
52	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di S. Maria di Sala	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 131 23/12/1999	774.685,35	774.685,35	750.560,99	Lavori collaudati	20/10/2000	27/05/2002	20/10/2003	Registrata, con DDDA n. 91 del 19/05/2004, un'economia di € 24.124,37
53	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Strà	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 132 23/12/1999	413.165,52	413.165,52	404.960,93	Lavori collaudati	14/09/2000	06/06/2002		Registrata, con DDDA n. 139 del 16/07/2004, un'economia di € 8.204,60
54	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Vigonovo	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 133 23/12/1999	490.634,05	490.634,05	490.634,05	Lavori collaudati	20/12/2000	16/12/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 241 del 20/12/2004
55	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Campolongo Maggiore	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 135 23/12/1999	516.456,90	516.456,90	508.625,66	Lavori collaudati	22/01/2001	20/06/2002		Registrata, con DDDA n. 112 del 16/06/2004, un'economia di € 7.831,24
56	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Strà	A/11.2 IV fase	DGR N. 2624 DEL 3/8/1999	DDDA N. 33 DEL 2/4/2001	206.582,76	206.582,76	149.704,00	Collaudo in corso	06/03/2002	28/05/2003		Legge 51586 Es. 1988 - IV fase

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
57	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Santa Maria di Sala.	A/11.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 44 23/4/2001	413.165,52	413.165,52	322.965,79	Lavori in corso	04/03/2002			
58	Lavori per la costruzione del 29° lotto di fognature. Intervento nel comune di Fossò	A/11.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 45 23/4/2001	103.291,38	103.291,38	87.780,79	Collaudo in corso	15/10/2001	13/12/2002		
59	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Noale.	A/11.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 58 14/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,23	Lavori in corso	18/02/2003			
60	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Scorzé	A/11.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 41 23/5/2001	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Lavori collaudati	13/02/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 03/12/2004
61	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campolongo Maggiore.	A/11.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 120 3/10/2001	309.874,14	309.874,14	222.937,40	Lavori in corso	07/10/2003			
62	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Vigonovo	A/11.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 32 DEL 2/4/2001	258.228,45	258.228,45	228.679,46	Collaudo in corso	06/03/2002	26/06/2003		
63	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Dolo.	A/11.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	196.534,26	Lavori in corso	03/07/2002			
64	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Fiesso d' Artico.	A/11.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 14/5/2001	154.937,07	154.937,07	139.443,36	Lavori in corso	10/09/2002			
65	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Martellego	A/11.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 30/7/2001	361.519,83	361.519,83	275.917,82	Lavori in corso	09/10/2002			
66	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mira.	A/11.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 107 DEL 7/9/2001	723.039,66	723.039,66	650.735,69	Lavori in corso	28/08/2002			
67	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mirano.	A/11.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 119 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	557.773,46	Lavori in corso	28/10/2002			
68	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Salzano.	A/11.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 3/10/2001	413.165,52	413.165,52	328.098,44	Collaudo in corso	05/09/2002			
69	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Spinea.	A/11.14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 DEL 7/9/2001	154.937,07	154.937,07	154.937,07	Lavori collaudati	11/07/2002	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 240 del 20/12/2004
70	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campagna Lupia	A/11.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 89 30/7/2001	154.937,07	154.937,07	95.462,11	Lavori in corso	11/09/2002			
71	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Pianiga.	A/11.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 14/5/2001	258.228,45	258.228,45	208.974,10	Collaudo in corso	10/09/2002	26/07/2003		
72	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Camponogara	A/11.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 90 30/7/2001	464.811,21	464.811,21	418.330,09	Collaudo in corso	12/07/2002			
73	Interventi di fognatura in comune di S.Maria di Sala	B/49	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 167 7/12/2002	413.165,52	413.165,52	371.849,01	Collaudo in corso	13/02/2003			
74	Interventi di fognatura in comune di Vigonovo	B/52	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 103 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	174.342,68	Lavori in corso	25/10/2002			
75	Interventi di fognatura in comune di Stra	B/51	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 168 7/12/2001	309.874,14	309.874,14	204.792,20	Lavori in corso	05/03/2003			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
76	Interventi di fognatura in comune di Spinea	B/60	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 158 30/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,60	Collaudo in corso	03/10/2002			
77	Interventi di fognatura in comune di Scorzè	B/48	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 157 30/11/2001	516.456,90	516.456,90	198.632,08	Lavori in corso	13/02/2003			
78	Interventi di fognatura in comune di Salzano	B/47	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 155 30/11/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,97	Lavori in corso	13/02/2003			
79	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Campolongo Maggiore	B/37	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 121 31/02/2001	361.519,83	361.519,83	162.573,99	Lavori in corso	13/02/2003			
80	Interventi di fognatura in comune di Noale	B/45	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 159 30/11/2001	671.393,97	671.393,97	473.476,85	Lavori in corso	18/02/2003			
81	Interventi di fognatura in comune di Martellago	B/42	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 156 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	169.816,44	Lavori in corso	13/02/2003			
82	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mirano.	B/44	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 129 4/10/2001	733.368,80	733.368,80	365.751,64	Lavori in corso	12/02/2003			
83	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Pianiga	B/46	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 127 4/10/2001	258.228,45	258.228,45	211.565,43	Lavori in corso	13/02/2003			
84	Interventi di fognatura in comune di Campagna Lupia.	B/36	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 142 9/11/2001	258.228,45	258.228,45	107.246,78	Lavori in corso	18/02/2003			
85	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mira	B/43	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 4/10/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	401.254,91	Lavori in corso	29/01/2003			
86	Interventi di fognatura in comune di Camponogara	B/38	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 104 DEL 7/9/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	810.461,91	Lavori in corso	18/02/2003			
87	Interventi di fognatura in comune di Dolo	B/39	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 160 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	211.414,09	Lavori in corso	12/02/2003			
88	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Fiesso D'Artico	B/40	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 122 3/10/2001	258.228,45	258.228,45	220.608,73	Lavori in corso	13/02/2003			
89	Interventi di fognatura in comune di Fossò	B/41	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 105 DEL 7/9/2001	247.899,31	247.899,31	195.056,95	Lavori in corso	01/10/2002			
Legge 48869 Es. 2002, 2003												
90	Interventi di fognatura nel comune di Spinea (€ 1.549.370,70)	1/F/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 46/03, 49/03 e 50/03	1.549.370,70			Finanziamento suddiviso in 90A (€ 162.000,00), 90B (€ 830.000,00) e 90C (€ 517.370,70)				Importo complessivo dell'intervento € 1.549.370,70
90A	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte A (€ 162.000,00)	1/F/1.2		Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90		162.000,00	62.850,28	Lavori in corso				
90B	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte B (€ 830.000,00)	1/F/1.3		Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90		830.000,00	500.741,90	Lavori in corso	07/10/2003			
90C	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte C (€ 557.370,70)	1/F/1.1		Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90		557.370,70	316.456,04	Lavori in corso	16/09/2003			L'importo complessivo del progetto è pari a € 636.387,00; il comune copre la quota di € 79.017,00
91	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara		DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 115/03	1.032.913,80			Finanziamento suddiviso in 91A (€ 878.328,20), 91B (€ 154.585,00)				Importo complessivo dell'intervento € 1.359.387,00. Il Comune copre la quota residua di 326.762,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
91A	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte A (€ 878.328,20)	1/F/2.1	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 91		878.328,20	54.029,53	Progetto approvato					
91B	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte B (€ 154.565,00)	1/F/2	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 91				Progettazione in corso					
92	Interventi di fognatura nel comune di Fossò	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 88/03	1.032.913,80	Finanziamento suddiviso in 92A (€ 640.000,00) e 92B (€ 392.913,00)							
92A	Interventi di fognatura nel comune di Fossò - parte A (€ 640.000,00)	1/F/3.1	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 92		640.000,00	193.202,97	Lavori in corso					
92B	Interventi di fognatura nel comune di Fossò - parte B (€ 392.913,00)	1/F/3	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 92		392.913,80	1.087,55	Lavori in corso					
93	Interventi di fognatura nel comune di Noale	1/F/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90	403.778,05	Lavori in corso					
94	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei 17 comuni consorziati (€ 4.548.112,10)	1/F/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002									
94A	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei 17 comuni consorziati	1/F/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		429.848,51							Scheda madre
94B	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Spinea - parte C.	1/F/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 46 23/05/2003	79.017,91	0,00	Progetto approvato		16/09/2003			
94C	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Mirano	1/F/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 47 23/05/2003	493.629,50	136.722,57	Lavori in corso					
94D	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Salzano	1/F/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 48 23/05/2003	305.380,96	0,00	In fase di appalto					
94E	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Campagna Lupia	1/F/5.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 52 26/05/2003	123.639,78	53.563,79	Lavori in corso					
94F	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianiga	1/F/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 29/07/2003	510.827,52	353.166,55	Lavori in corso					
94G	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Dolo, Camponogara e Strà.	1/F/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 55 27/05/2003	718.700,00	497.591,81	Lavori in corso		27/09/2003			
94H	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Scorzè e Martellago.	1/F/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 29/07/2003	709.301,91	211.529,23	Lavori in corso					
94I	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Noale	1/F/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 29/07/2003	430.879,99	0,00	Progetto approvato					
94L	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Mira.	1/F/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 117 20/08/2003	772.051,42	166.811,30	Lavori in corso					
94M	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Fossò - parte B.	1/F/5.10	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 174 19/11/2003	74.834,60	0,00	Progetto approvato					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
95	Messa in sicurezza ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 114/04	2.400.000,00	240.000,00	142.484,31	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolare. Impegno di spesa relativo alle sole spese di progettazione
96	Progetto dimostrativo per l'integrazione di reti di fognatura bianca e reti di bonifica DOLO-MIRA (Finanziamento iniziale € 5.164.568,99 al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta - Int. 11A - e poi diviso per competenze)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002					Progetto in corso				Quota di competenza A.C.M. pari a € 2.695.000,00. Presentato alla Regione Veneto in data 08/08/2003 progetto preliminare con S.I.A. Il finanziamento è riportato nell'intervento 11A del consorzio Sinistra Medio Brenta
Legge 139/92 Magg. Mutui II° fase												
97	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Camponogara - 31° lotto bis	6/E/1.A	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 183 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Progetto approvato				
98	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Spinea - 31° lotto bis	6/E/1.B	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 184 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Progetto approvato				
Legge 389/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
99	Intervento in comune di Fossò	E/1.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		384.000,00			Progettazione in corso				
100	Intervento in comune di Campolongo Maggiore	E/1.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
101	Intervento in comune di Planiga	E/1.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
102	Intervento in comune di Mira	E/1.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.656.000,00			Progettazione in corso				
103	Intervento in comune di Saizano	E/1.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		664.000,00			Progettazione in corso				
104	Intervento in comune di Spinea	E/1.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
105	Intervento in comune di Strà	E/1.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.000,00			Progettazione in corso				
106	Intervento in comune di Vigonovo	E/1.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		408.000,00			Progettazione in corso				
107	Intervento in comune di Dolo	E/1.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
108	Intervento in comune di S. Maria di Sala	E/1.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		664.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
109	Intervento in comune di Camponogara	E/1.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.656.000,00			Progettazione in corso				
110	Intervento in comune di Campagna Lupia	E/1.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
111	Intervento in comune di Mirano	E/1.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
112	Intervento in comune di Martellago	E/1.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
113	Interventi nei vari comuni	E/1.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					98.335.686,62	82.286.095,33	67.692.787,37					

AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE (A.P.G.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo			DDL N. 471 26/07/1988	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08	Lavori collaudati	28/03/1989	24/05/1991	26/09/1996	Registrata, con DDLP n. 491 del 27/1/1996, un'economia di € 5.804,16
Legge 799/84 Es. 1984-1985-1986												
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	1/4.4	DGR N. 2773 21/6/1994	DFGR N. 1293 8/6/1995	1.652.662,08	1.652.662,08	1.549.568,48	Lavori collaudati	10/07/1996	10/10/1999	09/04/2004	Registrata un'economia di € 103.093,6 destinata, con DDDA n. 26 del 25/03/2002, all'intervento 2 bis
2bis	Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - impianti (€ 103.093,60)	1/4.4bis	DGR N. 2773 21/6/1994	DDDA N. 126 6/11/2002			103.093,60	Lavori ultimati	10/07/1996	10/10/1999	-	Utilizzata l'economia di € 103.093,6 dell'intervento 2
Legge 139/82 Es. 1993												
3	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DFGR N. 2955 28/11/1994	3.064.204,68	3.064.204,68	3.064.204,68	Lavori collaudati	10/09/1996	16/12/1998	26/11/2001	Finanziamento originale pari a € 3.098.741,39. Registrata, con DDDA n. 39 del 23/04/2002, un'economia di € 34.536,72 destinata all'intervento 3 bis
3bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1 ECO	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 169 13/09/2004	34.536,72	34.536,72	0,00	Progetto approvato				
Legge 139/82 II fase												
4	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	1/D/4	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 111 12/2/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	04/09/1997	09/10/1998	09/07/2004	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 5 del 07/01/2004

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	1/D/5	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	987.807,50	987.807,50	987.807,50	Lavori collaudati	16/09/1997	07/02/2000	25/01/2002	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. Registrata, con DDDA n. 38 del 14/04/2003, un'economia di € 45.106,24 destinata all'intervento 4 bis
5bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona	1/D/5.1	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 136 14/07/2004	45.106,24	45.106,24	40.959,62	Collaudo in corso				
6	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	1/D/3	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	23/09/1998	05/11/1999	26/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 74 del 02/07/2001
Legge 539/95 Es. 1986												
7	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 84 DEL 16/2/1998	1.265.319,40	1.265.319,40	1.248.823,93	Lavori collaudati	31/05/1998	28/04/2000	15/05/2002	Registrata, con DDDA n. 226 del 03/12/2004, un'economia di € 16.495,49
8	Progetto 2° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 85 DEL 16/2/1998	1.420.256,47	1.420.256,47	1.276.477,19	Lavori collaudati	18/08/1998	25/08/2000	28/11/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte dell'ente
9	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 24 DEL 22/6/1998	1.586.627,28	1.586.627,28	1.586.627,28	Lavori collaudati	31/05/1999	13/10/2000	16/02/2002	Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46. Registrata, con DDDA n. 37 del 14/04/2003, un'economia di € 169.326,17 destinata all'intervento 9 bis
9bis	Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco	1/E/5.3 ECO	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 168 13/09/2004	169.326,17	169.326,17	0,00	Progetto approvato				
Legge 515/96 Es. 1987												
10	Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 4° stralcio impianti	A/4/1.1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 39 DEL 10/4/2001	2.788.867,26	2.788.867,26	2.499.671,64	Lavori in corso	18/04/2001			
11	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	A/4/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 68 DEL 7/9/2000	4.957.986,23	4.957.986,23	4.462.187,60	Collaudo in corso	03/09/2001			
Legge 345/97 Es. 1989 - V fase												
12	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di Sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	A/1 V fase	DGR N. 2824 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 14/12/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori in corso				
Legge 448/98 Es. 1989, 2000, 2001 - VI fase												
13	Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	B/32	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	309.874,14	309.874,14	0,00	Progetto approvato				
14	Interventi di fognatura in comune di Brugine	B/30	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori ultimati				
15	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	B/29	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Progetto approvato				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
16	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	B/33	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	593.925,43	593.925,43	253.008,16	Lavori in corso					
17	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	B/31	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.003,44	0,00	Progetto approvato					
18	Interventi di fognatura in comune di Portofoglio	B/28	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	671.393,97	671.393,97	566.474,47	Lavori in corso					
19	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	B/34	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	542.279,74	542.279,74	0,00	Progetto approvato					
20	Interventi di fognatura in comune di Polverara	B/27	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori ultimati					
21	Adeguamento impianti di depurazione minori	B/35	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 102 01/06/2004	1.549.370,70	1.549.370,70	103.622,62	Lavori in corso					
Legge 488/99 Es. 2002, 2003													
22	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotte di Cona e Portofoglio	1/E/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso					
23	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Corezzola, Cona, diversione scarico di Portofoglio.	1/E/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		4.648.112,09			Progettazione in corso					
24	Riqualificazione ed implementazione dati della rete fognaria del comprensorio consortile	1/E/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90			Progettazione in corso					
25	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45			Progettazione in corso					
26	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45			Progettazione in corso					
27	Interventi di fognatura a Sant' Angelo di Piove.	1/E/6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		413.165,52			Progettazione in corso					
28	Estensione ed adeguamento della rete fognaria nei comuni consorziati	1/E/7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.652.662,08			Progettazione in corso					
Legge 138/92 Magg. Mutui II ^a fase													
29	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Portofoglio e Pegolotte	6/D/1	DGR N. 1140 18/4/2003		1.540.000,00			Progettazione in corso					
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004													
30	Ampliamento, potenziamento ed affinamento dei processi degli impianti di depurazione di Cona, Codevigo e Portofoglio	E/6	DGR N. 24 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso					
31	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DGR N. 24 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso					
TOTALI											46.442.369,96	28.972.864,72	23.107.874,35

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENEZO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

AZIENDA BRENTA SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Comune di Rossano: fognatura in zone laterali Via Salute e Via 11 Febbraio	E/8.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.087.320,00							
2	Comune di Rosà: fognature in laterali via Granellia, zona S. Pietro e Cusinati	E/8.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.598.400,00							
TOTALI					2.685.720,00	0,00	0,00					

AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV). I° stralcio	BI/7.1	DGR N. 2924 DEL 23/6/2000	DDDA N. 48 DEL 3/8/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	Lavori collaudati	22/02/2001	14/11/2002	24/04/2003	Registrata, con DDDA n. 148 del 20/10/2003, un'economia di € 66.305,78 da reinscrivere nel bilancio regionale 2003
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	BI/54	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 30 DEL 21/3/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	30/10/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 31/08/2004
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/IM/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 85 DEL 12/8/2002	1.748.741,39	1.748.741,39	1.573.867,25	Collaudo in corso	03/03/2003			
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° lotto)	1/IM/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 DEL 12/8/2002	1.350.000,00	1.350.000,00	1.215.000,00	Collaudo in corso	11/02/2003			
Legge 138/92 Magg. Mutui II° fase												
5	Costruzione dei collettori di fognatura nera (Riese Pio X - Castello di Godego - Altivole - Maser - Asolo) per un importo di € 2.500.000		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		Interventi unificati per l'importo totale di € 3.500.000 e poi suddivisi nei tre interventi 6A, 6B e 6C							
6	Costruzione dei collettori di fognatura nera in comune di Castello di Godego per un importo di € 1.000.000		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003									
6A	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/2 e 6/F/1.1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 65 DEL 30/03/2004	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	Progetto approvato				
6B	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel Comune di Riese Pio X e Altivole - 4° stralcio (2° lotto)	6/F/1.2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 69 DEL 13/04/2004	1.367.000,00	1.367.000,00	90.350,60	Lavori in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note		
6C	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel comune di Altivole, Asolo e Maser - 4° stralcio (3° lotto)	6I/F1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 84 DEL 11/05/2004	1.100.000,00	1.100.000,00	84.880,00	Lavori in corso						
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004														
7	Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riese Pio X (TV); via Montenera, e Brigata Martiri del Grappa	E/5.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		152.000,00			Progettazione in corso						
8	Costruzione rete di fognatura nera nei comuni di Asolo e Maser; completamento collettore Asolo / Impianto di depurazione di Maser.	E/5.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		450.000,00			Progettazione in corso						
9	Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godego (TV); via Vegre, via Cacciatore e via Motte	E/5.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		650.000,00			Progettazione in corso						
TOTALI											10.433.025,89	9.181.025,89	5.480.076,57	

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 DEL 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.085,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 DEL 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5541 DEL 10/11/1996	DDDA N.120 DEL 6/9/1990	1.885.067,68	1.885.067,68	1.838.810,70	Lavori collaudati			26/10/2000	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/2/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1986	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1986	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati			02/10/1986	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
Legge 910/86 Es. 1989												
5	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.20	DCR N. 745 DEL 1/7/1988	DDDA N. 120 DEL 6/9/1990	5.164.568,99	5.164.568,99	4.359.929,32	Lavori collaudati			26/11/1996	Intervento suddiviso in opere elettromeccaniche (€ 2.840.512,94) e opere civili (€ 2.324.056,05). Esiste solo la relazione acclarante del collaudatore amministrativo. Manca il collaudo tecnico.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENEETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 67/88 Es. 1990												
6	Collegamento a impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 109 20/6/1996	56.810,26	56.810,26	56.810,26	Lavori ultimati				Finanziamento originario pari a € 568.102,59, di cui € 511.292,33 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
7	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR N. 4699 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 20/7/1993	7.436.979,35	7.436.979,35	7.191.067,31	Lavori collaudati	21/05/1997	15/06/2000	14/10/2002	Registrata, con DDDA n. 2 del 13/01/2003, un'economia di € 254.911,79 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
Legge 67/88 Es. 1991												
8	Fognatura di Chioggia (VE)	3c	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 115 28/6/1996	516.456,90	516.456,90	514.127,07	Lavori collaudati	16/10/1996	29/04/1997	03/03/1998	Registrata, con DDDA n. 35 del 21/06/2000, un'economia di € 2.329,83 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
Legge 139/92 Es. 1993												
9	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 2/10/1995	4.622.289,25	4.622.289,25	1.154.906,22	Parte dei lavori collaudati	29/04/1996	16/04/1999	03/10/2000	Rescisso il contratto con la ditta appaltatrice
10	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	5/F2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 45 13/6/1995	542.279,74	542.279,74	505.435,40	Lavori collaudati	06/05/1996	06/12/1997	15/05/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
Legge 539/95 Es. 1996												
11	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	1/E2	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 517 18/11/1997	4.906.340,54	4.906.340,54	4.318.989,01	Lavori collaudati	30/04/1998	10/11/2000	12/10/2002	Registrata, con DDDA n. 225 del 03/12/2004, un'economia di € 587.351,53
Legge 539/95 Es. 1997												
12	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	C/33/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 526 1/12/1997	320.203,28	320.203,28	270.796,95	Lavori collaudati	16/02/1998	27/04/1999	21/01/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
13	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	C/33/3	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 546 16/12/1997	118.785,09	118.785,09	111.541,41	Lavori collaudati	18/03/1998	24/07/1998	29/03/1999	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
14	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	C/33/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 366 24/5/1997	1.007.090,95	1.007.090,95	912.330,18	Lavori collaudati	13/11/1997	05/02/1999	28/03/2002	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
Legge 515/96 Es. 1997												
15	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/7	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 55 29/6/1999	250.998,05	250.998,05	0,00	Lavori in corso	10/09/1999			
16	Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nelle calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter	B/16/4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 95 30/10/2000	4.991.555,93	4.991.555,93	2.682.307,55	Lavori in corso	04/10/2002			Progetto riadottato
17	Finanziamento dei primi due lotti dell'opera Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia	B/16/8	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 135 29/11/2002	1.669.062,18	1.669.062,18	116.834,35	Progettazione in corso				Decreto di impegno ed erogazioni limitati alle sole spese di progettazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "piccoli" del depuratore di Val da Rio	B/16/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 545 16/12/1997	209.705,25	209.705,25	189.927,74	Lavori collaudati	09/03/1998 07/05/1998	08/07/1998	Registrata, con DDDA n. 39 del 14/04/2003, un'economia di € 19.777,51 da reinscrivere nel bilancio regionale 2003	
19	Progetto esecutivo per un sistema di disidratazione dei fanghi depuratore Val da Rio - 2° lotto	B/16/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 146 24/3/1998	194.381,98	194.381,98	194.381,98	Lavori collaudati	03/03/1999 10/08/1999	15/09/1999	Registrata, con DDDA n. 54 del 25/06/1999, un'economia di € 12.200 convogliata nel finanziamento 16	
20	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 430 22/10/1997	147.098,80	147.098,80	140.752,63	Lavori collaudati	29/11/1997 12/05/1998	19/12/1998	Documentazione relativa al collaudo dell'opera non ancora inviata da parte dell'ente.	
21	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	B/16/5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 12 DEL 2/3/1999	2.040.004,75	2.040.004,75	1.614.034,30	Collaudo in corso	19/07/1999	31/10/2000	L'importo complessivo dell'opera è pari a 3,1 MLD di lire, finanziato per 1,5 mlrd dal CIPE e per 1,6 MLD dalla Legge Spec. Ve	
22	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	B/16/6	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 22 15/3/1999	826.331,04	826.331,04	510.688,08	Lavori in corso	15/07/1999		Vedi scheda riiepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante	
23	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	D/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				
24	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	B/1/55	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 134 29/11/2002	9.812.681,08	9.812.681,08	1.120.711,47	Progetto approvato				
25	Legge 488/99 Es. 2002, 2003							Finanziamento suddiviso negli interventi 25A (€ 5.510.163,87) e 25B (€ 687.318,92)				
25A	Completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 6.197.482,79)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002									
25B	Completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87)	1/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.510.163,87			Progettazione in corso				
26	Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 DEL 2004	687.318,92	687.318,92	0,00	Progetto approvato				
26	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 142 12/12/2002	2.065.827,60	144.607,93	144.607,93	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
27	Legge 368/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004 interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e inondazione "Niccolò De Conti"	E/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
28	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - 1° fase	E/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
29	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque alte	E/4	DCR N. 24 DEL 04/09/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI												
COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		DGR N. 3002 DEL 26/05/1987		149.772,50	149.772,50	149.772,50	Lavori collaudati			05/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 164.640,48. Supero di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		883.141,30	883.141,30	629.320,45	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione aclarante
3	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione aclarante
Legge 67/88 Es. 1988												
4	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige		DGR N. 4171 DEL 24/9/1996	DDDA N. 577 DEL 24/12/1997	774.685,35	774.685,35	387.342,67	Lavori collaudati	23/01/1997	18/05/2001	20/12/2002	Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione aclarante
5	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)		DGR N. 2357 DEL 04/08/1996	DDDA N. 576 DEL 24/12/1997	413.165,52	413.165,52	206.582,76	Lavori collaudati	02/11/1995	06/07/1999		Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione aclarante
6	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia		DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DDDA N. 61 DEL 12/3/1997	206.582,76	206.582,76	46.612,30	Lavori collaudati	05/03/1996	24/02/2000	03/02/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione. La Regione è in attesa dell'integrazione della documentazione relativa al collaudo.
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
7	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21.2 Vfase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGCA N. 180 DEL 31/05/2004	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Lavori ultimati				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque (int. 2)
TOTALI												
Totale A.S.P. di Chioggia												
70.964.551,95 53.398.656,09 33.569.516,53												

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione I stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 43 DEL 01/06/1999	1.549.370,70	1.549.370,70	115.508,77	Intervento sospeso e fondi dirottati per € 1.549.370,70 all'intervento 7A.				Intervento revocato con DDDA n. 71 del 11/06/2001

Legge 515/96 Es. 1997

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 51586 Es. 1998 - IV fase												
2	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 63 01/09/2000	2.065.827,60	2.065.827,60	2.052.399,45	Lavori collaudati	09/10/2001	30/06/2003		Registrata, con DDDA n. 229 del 03/12/2004, un'economia di € 13.428,15
3	Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Calliata, Roncade per l'importo totale di € 5.422.797,44	A/8 IV fase	Finanziamento suddiviso negli interventi 4 (DDDA n. 78/2000), 5 (DDDA n. 94/2000), 6 (DDDA n. 61/2000) e 7 (DDDA n. 51/2000)									
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 78 15/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,65	Collaudo in corso	18/10/2001	25/01/2003		
5	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Calliata - Ampliamento della rete - Il stralcio	A/8.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 94 30/10/2000	1.446.079,30	1.446.079,32	68.736,33	Fondi dirottati all'intervento 7A per l'importo di € 1.446.079,32.				
6	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	A/8.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 61 01/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori in corso	26/10/2001			
7	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Calliata. Impianto di depurazione della Frazione Olmi - 2° stralcio	A/8.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 51 04/08/2000	877.976,75	877.976,75	0,00	Fondi dirottati nell'intervento 7A per l'importo di € 877.976,73.				
7A	Realizzazione di rete fognaria e relativi allacciamenti in conformità al nuovo Progetto Generale Definitivo (€ 3.873.426,75)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.549.370,70) + 5 (€ 1.446.079,32) + 7 (€ 877.976,73) = € 3.873.426,75					Redatto il progetto definitivo				
Legge 44898 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
8	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d'Altino - 3° stralcio	B/22	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2002	1.755.953,46	1.755.953,46	1.213.585,37	Lavori in corso	01/04/2003			
9	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA n. 70 del 13/06/2003	1.136.205,18	1.136.205,18	63.719,58	Progetto approvato				Erogazione limitata alla copertura delle spese di progettazione
10	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 86 12/08/2003	774.685,35	774.685,35	697.216,82	Collaudo in corso	27/01/2003			
11	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Calliata	B/25	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 100 14/10/2002	774.685,35	774.685,35	596.437,63	Lavori in corso	25/02/2003			
Legge 48889 Es. 2002, 2003												
12	Ampliamento impianti Quarto d'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				
13	Realizzazione condotta da impianto depurazione di Roncade ad impianto di Quarto d'Altino (Costo del progetto € 2.400.000,00)	1/C/2	(ex 794 del 9/4/02) DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 1 DEL 07/01/2004	2.892.158,61	2.400.000,00		Progetto approvato				Il residuo, rispetto al costo del progetto pari a € 492.158,61, è riallocato nell'intervento 15A con DDDA n. 1/2004
Legge 13982 Magg. Mutui II° fase												
14	Realizzazione condotta di collegamento dall'impianto di depurazione di Roncade all'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	6/C/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		200.000,00			Intervento sospeso e fondi dirottati all'interventi 15A				
15	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Monastier di Treviso	6/C/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		1.300.000,00			Intervento sospeso e fondi dirottati all'interventi 15A				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impiego	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15A	Collegamento fognario tra Monastier di Treviso e Roncade (€ 1.992.158,63)							Progettazione definitiva in corso				
16	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Meolo capoluogo Legge 388/00 e 449/01 Es. 2002, 2003, 2004	6/C/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 178 24/05/2004	1.300.000,00	1.300.000,00	64.630,00	Lavori in corso				
17	Intervento in Comune di Quarto D'Altino - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e Via IV Novembre	E/16.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		779.520,00			Progetto approvato				
18	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotte fognarie in Via Carboncine e Via Dary	E/16.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		666.080,00			Progetto approvato				
19	Intervento in Comune di Marcon - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Vie zermanesa, Monte Felino, Tofane, Cristallo, Ortolan, Don Bosco e Ancilotto	E/16.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		853.200,00			Progetto approvato				
TOTALI												
23.019.854,40 17.179.525,11 7.661.101,23												

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI (S.E.T.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impiego	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Magg. Mutui II° fase												
1	Completamento dell' impianto di depurazione di Camposampiero		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.000.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A				
1A	Realizzazione del centro di biotratamenti di Camposampiero (importo progetto del 1998 pari a € 22.790.470,34, aggiornato al settembre 2003 in € 26.724.765,46)							Lavori in corso	14/01/2003			La differenza tra l'importo di progetto e l'importo finanziato è a carico dell'ente
2	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		515.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 2A				
2A	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza e diversione scarico in fiume Brenta (€ 2.890.701,74)							Progettazione in corso				
3	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento dell' impianto di depurazione minore di via Fabris di Camposampiero con l' impianto principale.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		460.000,00			Progettazione in corso				
4	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Onara di Tombolo.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.115.000,00			Progettazione in corso				
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento (con dismissione) dell' impianto di depurazione di Battaglia Terme con l' impianto di depurazione di Montegrotto T. con relative opere di adeguamento dimensionale di quest' ultimo.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.750.000,00			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
6	Interventi di fognatura nei comuni di S. Martino di Lupatari frazioni Caprette e Borghetti, Villa del Conte e S. Giustina in Colle fraz. Fratte Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004		DCR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.000.000,00			Progettazione in corso				
7	Impianto di depurazione di Vigonza: completamento ed adeguamento trattamenti terziari	E/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progetto approvato				
8	Impianto di depurazione di Onara: dismissione impianto depurazione di Onara e collegamento all'impianto di depurazione di Cittadella	E/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.000,00			Progetto approvato				
9	Completamento rete fognaria Galzignano e Battaglia, dismissione impianto di depurazione di Battaglia, collegamento all'impianto di depurazione di Montebelluna e suo potenziamento fino a 30.000 A.E.	E/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progetto approvato				
10	Impianto di depurazione di Camposampiero: seconda fase digestione anaerobica, completamento compostaggio aerobico, viabilità	E/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto approvato				
11	Impianto di depurazione di Cittadella: opere di completamento (acquedotto duale e trattamento sabbie)	E/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto approvato				
12	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Ronchi, Obbia Alta e Bassa	E/22.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		208.000,00			Progetto approvato				
13	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Villanova	E/22.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00			Progetto approvato				
14	Intervento in Comune di Cittadella - Via delle Sorgenti	E/22.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		42.000,00			Progetto approvato				
15	Intervento in Comune di Villa del Conte - Via degli Alpini, Don Carrara, Marconi, Maso Moro, Tergola	E/22.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		755.600,00			Progetto approvato				
16	Intervento in Comune di Massanzago - Via Roma, Stradana, Padovane, Cà Zorzi e Bigolo	E/22.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00			Progetto approvato				
17	Intervento in comune di S. Giorgio delle Pertiche: collegamento imp. Selezione frazione secca, della SS 307 e di via Anconetta, nonché fognatura nera nelle vie Montegrappa e Ceccarello	E/22.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.060.000,00			Progetto approvato				
18	Intervento in Comune di Piombino Dese - Via Piave, Massari, Stiffoni	E/22.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00			Progetto approvato				
19	Intervento in Comune di Piombino Dese - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progetto approvato				
20	Intervento in Comune di S. Martino di Lupatari - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00			Progetto approvato				
21	Intervento in Comune di S. Martino di Lupatari/S. Giustina in Colle - collegamento fraz. Campretto - Borghetto - Fratte a S. Giustina in Colle - 2° Stralcio	E/22.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
22	Intervento in Comune di Campodarsego - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progetto approvato				
23	Intervento in Comune di Resana - Interventi di riqualificazione del sistema fognario	E/22.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.120.000,00			Progetto approvato				
24	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E/22.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progetto approvato				
25	Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marezzane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali	E/22.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		450.000,00			Progetto approvato				
TOTALI					28.123.600,00	0,00	0,00					

AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 539/95 Es. 1997												
1	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	C/30/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 126 13/3/1998	428.659,23	428.659,23	428.659,23	Per questo progetto sono stati utilizzati anche fondi CIPE (n. 7/4/97) per un importo totale di € 1.032.913,80. Lavori collaudati	01/02/1999	08/02/2001	20/05/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 32 del 2/4/2003
Legge 515/98 Es. 1997												
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	A/7/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 58 22/8/2000	568.102,59	568.102,59	468.442,37	Lavori in corso			31/07/2002	
Legge 515/98 Es. 1998 - IV fase												
3	Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Galzignano T.	B/12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/6/1999	DDDA N. 62 DEL 4/6/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso			18/07/2002	
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
4	Interventi di fognatura ed adeguamento impianto di depurazione in Comune di Battaglia Terme	B/5/3	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.342.787,94			Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 529.367,32) e 4B (€ 813.420,62)				
4A	Ampliamento rete fognaria in Comune di Battaglia Terme (€ 529.367,32)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
4B	Ampliamento rete fognaria in Comune di Montegrotto Terme (€ 813.420,62)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
5	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.	1/G/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.065.827,60			Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.291.142,25) e 5B (€ 774.685,35).				
5A	Interventi nei Comuni ex Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico (€ 1.291.142,25)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 5					Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5B	Completamento della rete fognaria nera e ristrutturazione tratti di condotta in Comune di Galzignano Terme. (€ 774.685,35)							Progettazione in corso				
Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 5												
5.438.291,15 2.029.675,61 1.826.724,02.												
TOTALI												
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI												
Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a tranche												
1	Ampliamento Impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DPGR 2207 31/10/1995	1.239.496,56	1.239.496,56	1.239.496,56	Lavori collaudati	04/12/1996	16/10/2001	12/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 155 del 30/10/2003
2	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DDDA N. 70 18/10/1995	2.633.930,19	2.633.930,19	2.633.907,51	Lavori collaudati	02/09/1999	23/07/1999	15/10/2001	Registrata, con DDDA n. 47 del 9/05/2002, una economia di € 22,68
Legge 139/92 II fase												
3	Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	1/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DGCA N. 380 2/10/1997	2.091.650,44	2.091.650,44	2.091.650,44	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	30/03/1998	17/07/2002	09/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 63 del 30/03/2004
4	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	1/D/2	DGR N. 4987 DEL 3/10/1997	DGCA N. 387 2/10/1997	2.194.941,82	2.194.941,82	1.975.447,65	Collaudo in corso (eseguiti con 2 appalti)	08/07/1998	04/08/2000	27/05/2002	
Legge 539/95 Es. 1997												
5	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	C/3/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 527 1/12/1997	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	26/08/1998	21/01/2003	26/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 62 del 30/03/2004
Legge 515/98 Es. 1997												
6	Progetto n. 7. Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella.	A/3/1.a	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	408.000,95	408.000,95	369.156,83	Lavori collaudati	11/02/2003	07/10/2003	28/10/2003	Registrata, con DDDA n. 164 del 31/08/2004, un'economia di € 36.844,13
7	Progetto n. 8. Ottimizzazione Impianto consorziale di Cittadella	A/3/1.b	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	1.996.105,92	1.996.105,92	1.996.105,92	Lavori collaudati	03/05/2000	01/12/2001	25/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
8	Progetto n. 6. Scolmatore roggia Munara	A/3/1.c	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	436.406,08	436.406,08	436.406,08	Lavori collaudati	30/11/2000	30/11/2001	20/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
Legge 515/98 Es. 1998 - IV fase												
9	Progetto "Laguna 9" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella e Fontaniva	A/10.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 70 13/9/2000	2.014.181,91	2.014.181,91	1.680.099,77	Lavori in corso	29/01/2001			
10	Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	A/10.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.529.125,57	Lavori in corso	27/03/2001			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupatari. Legge 448/88 Es. 1989, 2000, 2001 - VI fase	A/10.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.579.788,84	Lavori in corso	27/03/2001			
12	Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera Via, Tombolo, S. Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupatari. Legge 488/88 Es. 2002, 2003	B/26	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 170 12/12/2001	7.746.853,49	7.746.853,49	1.497.366,81	Lavori in corso				
13	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadella con incremento da 60.000 a 75.000 A.E.	1/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98			Progettazione in corso				
TOTALI					36.565.148,46	26.236.010,47	18.681.214,06					

AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 67/88 Es. 1981												
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
2	Interventi nel settore della zootecnica dell'alta padovana		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 561 DEL 2/3/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori in corso	01/03/2000			Le opere eseguite vanno a far parte dell'intervento 1A S.E.T.A. "Centro di biotratamento di Camposampiero", il cui nuovo termine dei lavori è stabilito al 19/11/2008 con DDDA n. 173/2003.
Legge 139/82 Es. 1993												
3	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	1/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 51 2/15/1995	16.165.100,94	16.165.100,94	16.165.100,94	Lavori collaudati	29/01/1996 16/01/1996 23/05/1997	29/07/1999 28/12/1998 04/08/2000	15/10/2000 07/07/2001 28/12/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 95 del 23/09/2002
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1996	07/07/1999 28/07/1999	15/10/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73
5	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	1/A/3	DGR 4977 2/11/1993	DPGR 2391 24/11/1995	4.338.237,95	4.338.237,95	4.338.237,95	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante S.E.T.A.				
6	Progetto del collettore di collegamento della rete di fognatura al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 54 12/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/11/1995	30/11/1996	09/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 45 del 09/05/2002
7	Collettore di collegamento della rete di fognatura alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	1/A/5	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 53 12/10/1994	1.652.662,08	1.652.662,08	1.651.834,57	Lavori collaudati	02/09/1996 01/06/2000	26/07/1999 27/06/2001	30/10/2001 06/12/2001	Registrata con DDDA n. 14 del 15/01/2004, un'economia di € 827,51

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 538/85 Es. 1998											
8	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 82 9/12/1998	110.005,32	110.005,32	110.005,32	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
9	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1996	DGCA N. 17 12/1/1998	129.114,22	129.114,22	129.114,22	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	18/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 13 del 21/02/2001
10	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1996	DGCA N. 16 12/1/1998	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	27/11/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 69 del 08/06/2001
11	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 54 DEL 2/2/1998	356.355,26	356.355,26	356.355,26	Lavori collaudati	27/07/1998	05/07/1999	05/05/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 5 del 15/01/2001
12	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 53 DEL 2/2/1998	380.628,73	380.628,73	380.628,73	Lavori collaudati	12/10/1998	04/10/2000	21/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/05/2002
13	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 124 13/3/1998	201.418,19	201.418,19	201.418,19	Lavori collaudati	06/07/1998	10/05/1999	15/09/2000	Registrata una economia di € 56.810,26, reimpegnata nell'intervento 13 bis come da DDDA N. 113 del 18/10/2002
13 bis	Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	1/E/4.1	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 28 28/3/2003	56.810,26	56.810,26	56.810,26	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				Utilizzata l'economia di € 56.810,26 del finanziamento 13
14	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1^ in comune di Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 160 DEL 1/4/1998	335.696,98	335.696,98	335.696,98	Lavori collaudati	05/03/1999	27/07/2000	08/03/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 153 del 30/10/2003
15	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 17 27/5/1998	289.215,86	289.215,86	289.215,86	Lavori collaudati	03/02/1999	20/09/2000	19/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 70 del 08/06/2001
	Legge 538/85 Es. 1997											
16	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	C/32/1	DGR N. 553 25/2/1997	DGCA N. 28 19/1/1998	1.962.536,22	1.962.536,22	1.962.536,22	Lavori collaudati	15/12/1998	28/02/2001	28/01/2002	Registrata una economia di € 258.228,45, reimpegnata nell'intervento 16 bis come da DDDA N. 112 del 18/10/2002
16 bis	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani. (€ 258.228,45)	C/32/1.1	DGR N. 553 25/2/1997	DDDA N. 27 26/3/2003	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				Utilizzata con DDDA n. 27 del 26/03/2003, l'economia di € 258.228,45 dell'intervento 16
17	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	A/5.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 33 DEL 5/5/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
18	Impianto di biotratamento di Camposampiero	A/5/1	DGR N. 561 DEL 2/3/1999		11.878.508,68	11.878.508,68	9.998.605,59	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
19	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 1 DEL 3/2/1999	281.469,01	281.469,01	281.469,01	Lavori collaudati	22/04/1999	02/10/2000	08/01/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 143 del 12/11/2001
20	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 16 DEL 2/3/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	22/06/1999	21/12/2000	30/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 94 del 23/09/2002

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
21	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margherita e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 82 9/12/1998	122.400,29	122.400,29	122.400,28	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
21A	Realizzazione fognatura nera lungo le vie Roma e Margherita e pista ciclabile lungo via Roma in Comune di S. Giorgio delle Pertiche (€ 232.405,60)							Lavori in fase di collaudo	18/11/1999	17/10/2002		L'importo del finanziamento regionale è pari a € 232.405,60. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 521.621,47 resta a carico dell'ente. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57/2004
22	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 83 9/12/1998	299.545,00	299.545,00	269.590,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 66°				
23	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebasiegn e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 50 25/6/1999	1.259.121,92	1.259.121,92	1.259.121,92	Lavori collaudati	06/03/2000	19/10/2001	30/04/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 154 del 30/10/2003
24	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 52 25/6/1999	309.874,14	309.874,14	278.866,72	Collaudo in corso	07/06/2000			
25	Legge 515/86 Es. 1988 - IV fase Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	A/1.14 - IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 161 3/12/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				
26	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 92 30/10/2000	516.456,90	516.456,90	426.560,11	Lavori in corso	30/07/2001			Nuovo termine lavori al 30/10/2005 con DDDA n. 133 del 25/09/2003
27	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	A/2.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 77 15/9/2000	387.342,67	387.342,67	387.342,67	Lavori collaudati	04/07/2001	27/06/2002	18/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 170 del 17/11/2003
28	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero	A/1.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 116 19/12/2000	89.347,04	89.347,04	89.347,04	Finanziamento convogliato nell'intervento 50°				
29	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana.	A/1.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 56°				
30	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	A/1.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 85 30/7/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 63°				
31	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Campodarzago alla rete consortile principale	A/1.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 76 15/9/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,46	Appalto A lavori in collaudati Appalto B lavori in corso	30/07/2001	27/09/2002	26/02/2003	
32	Rete fognaria nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/2.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 56°				
33	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 93 30/10/2000	144.607,93	144.607,93	130.147,14	Lavori in corso	03/04/2002			
34	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio della Perlicha nelle vie Fornace e Russia	A/1.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 30/10/2000	165.266,21	165.266,21	165.266,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67°				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione d/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
35	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	A/1.14 fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		2.190.698,87			Finanziamento suddiviso dall'ente in 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F e 35G				
35A	Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentini con Via Straelle San Pietro in Comune di Camposampiero (€ 88.364,63)	A/1.18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 35 04/02/2004	88.425,43	88.425,43	0,00	Progetto approvato				
35B	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: prolungamento e lottizzazione Fratina e Bassa 1ª in comune Id Campodarsago - Rostiroia in comune di Camposampiero (€ 516.456,90)	A/1.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 10/09/2003	516.456,90	516.456,90	0,00	Progetto approvato				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35C	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustaga e del Graticciato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 1° stralcio (€ 51.645,69)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 06/08/2003	51.645,69	51.645,69	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 72°				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35D	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: Rigotti e Matteotti in comune di Cadoneghe - S. Francesco, Goldoni e S. Chiara in Comune di Vigonza - Don Orione in Comune di Trebaseleghe (€ 1.032.913,80)							In fase di progettazione				
35E	Costruzione di una fognatura nera lungo Via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 191.089,05)	A/1.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/06/2003	191.089,05	191.089,05	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 58°				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35F	Interventi nei Comuni ex Tergola (€ 331.514,83)							Finanziamento convogliato nell'intervento 76G				
35G	Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta (€ 926.331,04)							Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
36	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	A/2.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 115 19/12/2000	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Finanziamento convogliato nell'intervento 60°				
37	Progetto esecutivo per il collegamento della zona industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzago.	A/1.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 22/8/2000	404.385,75	404.385,75	404.385,75	Lavori collaudati	02/07/2001	05/09/2002		Determinazione del DDDA N. 96 del 18/08/2003
38	Completamento centro di biotattamento di Camposampiero	B/20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		6.249.128,48			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
39	Collettore di collegamento fognario Resana - Torresselle	A/2.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 31 21/3/2001	2.065.827,60	2.065.827,60	1.363.120,36	Finanziamento convogliato nell'intervento 65°				
40	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Plovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	A/1.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 84 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 70°				
41	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	A/1.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 22/8/2000	65.073,57	65.073,57	65.073,57	Lavori collaudati	04/12/2001	01/07/2002		Determinazione del DDDA N. 97 del 18/08/2003
42	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia	A/2.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	139.443,36	139.443,36	139.443,36	Finanziamento convogliato nell'intervento 47°				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
43	Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia	A/1.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	224.658,75	224.658,75	224.658,75	Finanziamento convogliato nell'intervento 47°				
44	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	A/1.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 54 DEL 4/8/2000	774.685,35	774.685,35	489.212,60	Finanziamento convogliato nell'intervento 44°				
44A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe (€1.807.599,15)			Riuniti i finanziamenti 17 (€ 1.032.913,80) + 44 (€ 774.685,35) = € 1.807.599,15				Opere in fase di collaudo 03/07/2000 24/04/2003				
45	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2° fase	A/1.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 124 4/10/2001	2.117.473,29	2.117.473,29	249.027,29	Finanziamento convogliato nell'intervento 73°				
46	Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago	B/12	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 105 18/10/2002	309.874,14	309.874,14	235.213,72	Lavori in corso				
47	Interventi di fognatura in comune di Loreggia	B/3.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 88 30/7/2001	358.937,54	358.937,54	172.073,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 47°				
47A	Costruzione di un nuovo by-pass della rete fognaria di Loreggia (€ 723.039,65)			Riuniti i fondi dei finanziamenti 42 (€ 139.443,36) + 43 (€ 224.658,75) + 47 (€ 358.937,54) = € 723.039,65				Lavori in corso	15/05/2002			
48	Riqualificazione della rete di fognatura mista del comune di Campodarsego e dell'area denominata "Fornace"	B/7	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 52 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	02/05/2002			
49	Interventi di fognatura in comune di Campodarsego loc. Fiumicello (PD)	B/8	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 14 22/2/2002	1.136.205,18	1.136.205,18	14.211,47	Lavori in corso				
50	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie di Camposanpiero	B/11	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 116 19/1/2000	413.165,52	413.165,52	297.561,97	Finanziamento convogliato nell'intervento 50°				
50A	Esecuzione della rete di fognatura nera in via Giovanni XXIII e via Cao del Mondo e Puccini a Camposanpiero (€ 502.512,56)			Riuniti i finanziamenti 28 (€ 89.347,04) + 50 (€ 413.165,52) = € 502.512,56				Lavori in corso	02/05/2002			
51	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone e Muson in comune di Borgoricco	B/9	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	258.228,45	258.228,45	103.291,38	Finanziamento convogliato nell'intervento 63°				
52	Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe	B/10	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 56 27/5/2003	258.228,45	258.228,45	0,00	Progetto approvato				
53	Interventi di fognatura in comune di Resana	B/15	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		154.937,07			Progettazione in corso				
54	Impianto di depurazione di Camposanpiero	B/20	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		516.456,90			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
55	Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Granzetta e Morosini in comune di Saonara - 2° tronco	B/17	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 19/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Lavori in corso	20/02/2002			
56	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	B/13.1	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 98 30/10/2000	330.532,42	330.532,42	142.542,10	Finanziamento convogliato nell'intervento 56°				
56A	Realizzazione rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in Comune di Noventa Padovana (€ 1.879.903,12)			Riuniti i finanziamenti 29 (€ 516.456,90) + 32 (€ 1.032.913,80) + 56 (€ 330.532,42) = € 1.879.903,12				Opere in fase di collaudo	04/08/2000 30/10/2002			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
57	Impianto di depurazione di Cadoneghe	B/21	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 124 4/10/2001	413.165,52	413.165,52	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73°				
58	Interventi di fognatura in comune di Vigonza	B/6	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 72 13/06/2003	144.607,93	144.607,93	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A con DDDA N. 72 del 13/06/2003				
58A	Costruzione di una fognatura lungo via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 335.969,98)		Riuniti i finanziamenti 335.969,98	35E (€ 191.089,05) + 58 (€ 144.607,93) = €								
59	Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, n° e l° tronco, in comune di Trebaseleghe - 1° stralcio.	B/2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 51 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	08/04/2002			
60	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	B/4	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 115 19/12/2000	516.456,90	516.456,90	379.271,71	Finanziamento convogliato nell'intervento 60°				
60A	Estensione della rete fognaria nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in Comune di Santa Giustina in Colle (€ 764.356,21)		Riuniti i finanziamenti 764.356,21	36 (€ 247.899,31) + 60 (€ 516.456,90) = €								
61	Rete fognaria nella via Patù e sistemazione rete nelle vie Stiffonie villaggio Europa in comune di Piombino Dese.	B/14	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 35 DEL 3/4/2001	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in fase di collaudo	03/04/2002	28/05/2003		
62	Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana	B/13	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	547.444,31	547.444,31	416.603,21	Lavori in corso	09/01/2003			
63	Condotta di by-pass impianto di depurazione Camposanpiero (vedi Dgr 1834/00) Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone e Miuson in comune di Borgoricco	B/19	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 63°				
63A	Realizzazione rete di fognatura nelle vie di Sabbadina, Lovara, Malcantone in Comune di Borgoricco (€ 1.549.370,70)		Riuniti i finanziamenti 516.456,90 = € 1.549.370,70	30 (€ 774.685,35) + 51 (€ 258.228,45) + 63 (€ 516.456,90) = €				Lavori in corso	23/05/2002			
64	Completamento del collettore fognario Abbazia via Cardinali Prituli, Militare e Rettillineo.	B/5.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 121 29/12/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,45	Lavori in corso	04/12/2001	30/06/2003		
65	Collettore di collegamento fognario Resana - Torresselle.	B/15.1 VI° fase	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 31 21/3/2001	619.748,28	619.748,28	359.157,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 65°				
65A	Collagamento fognario Resana - Torresselle (€ 2.685.575,88)		Riuniti i finanziamenti 2.685.575,88	39 (€ 2.065.827,60) + 65 (€ 619.748,28) = €				Opere in fase di collaudo	23/05/2002	20/05/2003		
66	Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Ronchi in comune di Loreggia (PD)	B/3.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 23 26/2/2001	157.519,35	157.519,35	141.767,42	Finanziamento convogliato nell'intervento 66°				
66A	Realizzazione fognature acque nere e pista ciclabile lungo la SP 71 nel Comune di Loreggia (€ 475.064,35)		Riuniti i finanziamenti 475.064,35	22 (€ 299.545,00) + 66 (€ 157.519,35) = €				Lavori collaudati	13/10/1999	06/04/2002	18/11/2002	L'importo del finanziamento regionale è pari a € 475.064,35. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 846.989,30 resta a carico dell'ente. Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte dell'ente

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
67	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia (appalto B)	B/16	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 97 30/10/2000	464.811,21	464.811,21	464.811,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67°				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
67A	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia (appalto A) e completamento degli stessi (appalto B) (€ 630.077,42)		Riuniti i finanziamenti 630.077,42		€ 165.266,21 + 67 (€ 464.811,21) = €			Lavori collaudati	30/07/2001 21/01/2003	26/09/2003 02/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
68	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	B/18.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 135 30/10/2001	335.696,98	335.696,98	262.453,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				
68A	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 1° stralcio (€ 392.500,00)		Riuniti i finanziamenti 392.500,00		€ 56.810,26 + 68 (€ 335.696,98) = €			Lavori in corso	14/01/2003			
69	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	B/5	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 161 3/12/2001	309.874,14	309.874,14	102.762,65	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				
70	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	B/18.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 84 30/7/2001	77.468,53	77.468,53	49.063,40	Finanziamento convogliato nell'intervento 70°				
70A	Ampliamento rete di fognatura nelle vie Stroppari e Piovega nord in Comune di Villanova di Camposampiero (€ 284.051,29)		Riuniti i finanziamenti 284.051,29		€ 206.582,76 + 70 (€ 77.468,53) = €			Opere in fase di collaudo	08/05/2002	20/05/2003		
71	Progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale e fognatura di acque nere di via Prati in comune di Vigonza - 1° stralcio	B/6.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 130 25/11/2002	320.203,28	320.203,28	228.813,08	Lavori in corso				
72	Realizzazione della condotta fognaria di by-pass fra S. Giustina In Colle e Camposampiero	1/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				
72A	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticciolo Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 1° stralcio (€ 826.331,04)		Riuniti i finanziamenti 826.331,04		€ 51.645,69 + 72 (€ 774.685,35) = €			Progettazione in corso				
73	Completamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe	1/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 124 30/10/2002	1.859.244,84	1.859.244,84	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
73A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2° fase (€ 4.389.883,65)		Riuniti i finanziamenti (€ 1.859.244,84) = € 4.389.883,65		€ 2.117.473,29 + 57 (€ 413.165,52) + 73			Progettazione esecutiva terminata				
74	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	1/A/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
75	Realizzazione di condotte fognarie a Piombino Dese.	1/A/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		640.913,80			Progettazione in corso	14/01/2003			
76	Interventi di fognatura nei comuni consorziati	1/A/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		3.629.518,18			Finanziamento diviso negli interventi 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G e 76H				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
76A	Rete fognaria nelle vie Ronchi, Obbia Alta e Bassa in Comune di Trebaseleghe (€ 260.000,00)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76					In fase di progettazione	-			
76B	Realizzazione reti di fognatura nera nelle vie Isonzo, Treviso, Arrigioni, Capriccio, Cavinello e Garibaldi (€ 600.000,00)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76					In fase di progettazione	-			
76C	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle Vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do', Piazza Mercato e Via Cantele in Comune di Villanova di Camposampiero - 2° Stralcio (€ 750.000,00)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76					In fase di progettazione	-			
76D	Realizzazione condotte di fognatura nera in Via Frattina, in Via Tiepolo, Via Castellaro e via Desman in Comune di Borgoricco	1/A/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 64 30/03/2004	460.000,00	460.000,00	0,00	Progetto approvato	-			
76E	realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 2° stralcio (€ 800.000,00)	1/A/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 91 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato	-			
76F	Rete di fognatura nera in depressione nelle Vie Noventana e laterali a Noventa Padovana - 1° Stralcio (€ 600.000,00)	1/A/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 193 13/10/2004	645.000,00	645.000,00	0,00	Progetto approvato	-			
76G	Estensione della rete fognaria nelle vie Gulzza Alta e Carpane in comune di Loreggia (PD)	1/A/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 194 13/10/2004	350.000,00	350.000,00	0,00	Progetto approvato	-			
76H	Interventi nei Comuni ex Consorzio Tergola (€ 2.299.203,53)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito all'intervento 55F (€ 331.514,83)					In fase di progettazione				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito agli interventi 16 bis (€ 258.228,45), 25 (€ 258.228,45) e 69 (€ 309.874,14)
76I	Ampliamento rete di fognatura nera nel Comune di Villa del Conte e nella frazione di Abbazia Pisani (€ 286.633,57)	1/A/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 05/12/2003	286.633,57	286.633,57	0,00	Progetto approvato	-			
77	Progetto definitivo per lavori di rifacimento e separazione condotte fognarie lungo via Manzoni, via Zanella, vicolo Aggio e viale della Vittoria in Comune di Piombino Dese	1/A/4.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 129 30/10/2002	392.000,00	392.000,00	295.525,49	Lavori in corso	14/01/2003			
TOTALI					94.614.903,91	78.909.194,57	65.290.260,78					

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Veduggio, Altivole, - 1° Lotto	E/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.360.000,00			Progettazione esecutiva				
TOTALI					7.360.000,00	0,00	0,00					

AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO

Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.p.A. (SPIM S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.B	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	54.110,77	Lavori in corso				
Legge 910/86 Es. 1989												
2	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.D	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Progetto approvato				
Legge 515/86 Es. 1998 - IV fase												
3	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	B/13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	0,00	Progetto approvato				
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
4	Adeguamento del depuratore di Preganziol: potenziamento dei sistemi di decantazione, clorazione e filtrazione finale	E/23	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		560.000,00			Progettazione in corso				
					3.142.284,50	2.582.284,50	54.110,77					
					TOTALI							

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 67/88 Es. 1992 - Il tranche												
1	Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	1/5.2	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 146 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.370,70	343.685,16	Lavori in corso				
2	Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	4d	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 101 18/10/2002	3.615.198,29	3.615.198,29	763.610,22	Lavori in corso				
Legge 515/96 Es. 1997												
3	Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano.	A/2/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DPGR N. 63 12/11/1998	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	Lavori collaudati	19/04/1998	7/11/2001	07/12/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDA n. 30 del 05/04/2002
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
4	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	A/4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 171 12/12/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	26.261,49	Lavori in corso				
5	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	A/6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2000	DDDA N. 114 19/12/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	12/07/2001	19/09/2002	14/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDA n. 147 del 20/10/2003
Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P., Tribano.												
6	Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P., Tribano.	A/3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2001	DDDA N. 87 30/07/2001	3.821.781,05	3.821.781,05	3.350.710,87	Lavori in corso	02/07/2002	02/07/2002	15/05/2002	02/07/2002

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7	Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognatura in comune di Este	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2002	DDDA N. 136 30/10/2001	1.446.079,32	1.446.079,32	354.790,74	Lavori in corso				
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
8	Impianto di biotratamento di Conselve (€ 8.779.767,28)		Intervento sospeso e fondi riallocati con D.G.R. 794/2002 agli interventi 8A (€ 1.032.913,80), 8B (€ 4.648.112,09) e 8C (€ 3.098.741,39)									
8A	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - Il stralcio	A/5 V fase	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		1.032.913,80			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 1.032.913,80				
8B	Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 46.880 A.E. - 1° stralcio	A/5.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 69 26/06/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	1.175.394,52	Lavori in corso				
8C	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	A/5.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 25 26/03/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	94.576,75	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A per l'importo di € 3.098.741,39				
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
9	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	1/B/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 25 26/03/2003	516.456,90	516.456,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A per l'importo di € 516.456,90				
9A	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.615.198,29)		Riuniti i finanziamenti 8C (€ 3.098.741,39) + 9 (€ 516.456,90) = € 3.615.198,29									
10	Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca.	1/V/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 14 21/02/2003	516.456,90	516.456,90	124.039,56	Lavori in corso	09/06/2003			
Legge 139/92 Magg. Mutui II° fase												
11	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - Il stralcio	6/B/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		667.086,20			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 667.086,20				
11A	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - Il stralcio (€ 1.700.000,00)		Riuniti i finanziamenti 8A (€ 1.032.913,80) + 11 (€ 667.086,20) = € 1.700.000,00									
12	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone	6/B/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		450.000,00			In fase di progettazione				
13	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l' impianto di depurazione di Conselve	6/B/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		400.000,00			In fase di progettazione				
14	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna	6/B/4	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		300.000,00			In fase di progettazione				
15	Interventi di fognatura in comune di Cartura	6/B/5	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 250 23/12/2004	640.000,00	640.000,00	0,00	Progetto approvato				
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
16	Lavori di fognatura in via S. Pietro - S.P. 14, Pernumia	E/9.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		235.200,00			Progetto preliminare				
17	Lavori di fognatura in via Cà Erizzo, Bovolenta	E/9.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		115.360,00			Progetto preliminare				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18	Lavori di fognatura in via Rovere prolungamento, Angulliarà	E/9.17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		67.680,00			Progetto preliminare				
19	Lavori di fognatura in via Bologna, Ponte S. Nicolò	E/9.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				
20	Lavori di fognatura in via Bologna laterale, Ponte S. Nicolò	E/9.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				
21	Sdoppiamento rete, adeguamento rete del centro e del nucleo del centro storico, suddivisione acque nere e bianche, nella zona di Monselice capoluogo	E/9.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.561.626,00			Progetto preliminare				
22	Completamento rete fognatura nella vecchia zona Industriale e via Umbria, Monselice	E/9.31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
23	Lavori di fognatura in via Marconi laterale, Terrassa Padovana	E/9.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		47.680,00			Progetto preliminare				
24	Lavori di fognatura in via Corso e Ponte de Riva laterali, Due Carrare	E/9.26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
25	Lavori di fognatura in via Chiaviche, Arquà	E/9.27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
26	Comune di Ponte S. Nicolò. Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino sciolante nella Laguna di Venezia	E/9.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		360.000,00			Progetto preliminare				
27	Lavori di fognatura in via Boario Polito, Arquà	E/9.19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		33.840,00			Progetto preliminare				
28	Lavori di fognatura in via Argine, Pozzonovo	E/9.16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.880,00			Progetto preliminare				
29	Lavori di fognatura in via Arre prolungamento, S.P., Conselve	E/9.21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.240,00			Progetto preliminare				
30	Lavori di fognatura in via Cà Borin laterale, Baone	E/9.20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		225.600,00			Progetto preliminare				
31	Lavori di fognatura in via S. Trinità, Pernumia	E/9.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		228.160,00			Progetto preliminare				
32	Lavori di fognatura in via Monte Grappa laterale, Conselve	E/9.18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		112.800,00			Progetto preliminare				
33	Lavori di fognatura in via Stanga prolungamento, Arre	E/9.23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		201.120,00			Progetto preliminare				
34	Lavori di fognatura in via Paraiso, Pozzonovo	E/9.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		60.000,00			Progetto preliminare				
35	Lavori di fognatura in via Roma prolungamento lato destro, Ponte S. Nicolò	E/9.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		144.800,00			Progetto preliminare				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
36	Lavori di fognatura in via Maseralino, Cartura	E/9.25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		189.200,00			Progetto preliminare					
37	Ulteriore stralcio funzionale di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Meggliaro	E/9.22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00			Progetto preliminare					
38	Lavori di fognatura nella S.P. 21 prolungamento, Baone	E/9.28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare					
39	Lavori di fognatura in via Fossalta prolungamento, Conselve	E/9.30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		197.920,00			Progetto preliminare					
40	Lavori di fognatura in via Santo, Angullara	E/9.24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		223.040,00			Progetto preliminare					
41	Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Berica" e di altre 20 utenze civili, Monselice	E/9.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		392.800,00			Progetto preliminare					
42	Lavori di fognatura in via Ponte de Riva S.P., Cartura	E/9.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		310.400,00			Progetto preliminare					
43	Lavori di fognatura in via Rana Camorì laterale, Este	E/9.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		105.600,00			Progetto preliminare					
44	Lavori di fognatura in via Rezzole laterale, Pozzonovo	E/9.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		92.160,00			Progetto preliminare					
45	Lavori di fognatura in via Riatto laterale, Candiana	E/9.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare					
46	Lavori di fognatura in via Rana Camorì laterale, Este	E/9.29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		464.800,00			Progetto preliminare					
							40.725.190,61	27.185.884,61	12.533.843,48				
TOTALI													
VE.S.T.A.													
Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
1	(Acquedotto di Venezia ORIGINALMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.9		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	Progetto approvato					
2	(Acquedotto di Venezia ORIGINALMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.10		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Progetto approvato					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
3	Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia)	B/21.1	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGR N. 3057 DEL 2003	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Progetto approvato				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
4	Adeguamento impianto di potabilizzazione Cà Solaro	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 DEL 19/4/2001	3.486.084,07	3.486.084,07	788.104,00	Lavori in corso				
	TOTALI											14.589.394,45 14.589.394,46 1.508.223,80

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati
i finanziamenti attribuiti direttamente ai Consorzi di
Bonifica

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Es. 1993												
1	Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 21/11/1993	DDDA N. 130 DEL 8/8/1996	12.844.589,35	12.844.589,35	12.844.589,35	Lavori collaudati	22/09/1997	20/03/2001	04/08/2001	Registrata, con DDDA n. 112 del 14/9/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis
1	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12)	6/B/2		DDDA N. 35 DEL 19/4/2002	66.833,12	66.833,12	66.833,12	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				DDDA n. 35 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1. Decreto di contabilità finale DDDA n. 6 del 07/01/2004
Legge 139/92 Il fase												
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 21 DEL 26/2/2001	619.748,28	619.748,28	483.469,25	Lavori collaudati	26/02/2002			Registrata, con DDDA n. 163 del 31/08/2004, un'economia di € 126.289,03
3	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui ril Barpegara, Rebosola e S. Silvestro	5/B/4	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	DDDA N. 22 DEL 22/6/1996	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Lavori collaudati	21/06/2000	21/06/2003	03/11/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 205 del 22/10/2004
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	5/C/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 61 DEL 4/8/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50				
4A	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 2.649.117,67)			Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62				Lavori collaudati	04/08/2000	04/08/2003	04/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6 del 07/01/2004
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
5	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 18 DEL 12/3/2003	3.615.198,29	3.615.198,29	149.344,87	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione
6	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 138/01 DDDA N. 110/02	7.746.853,49	361.519,83	296.639,42	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
7	Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	D/79	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
8	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		7.746.853,49			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
9	Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatatura argini	2/M/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 109 DEL 18/10/2002	3.098.741,40	232.405,60	232.405,60	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Opere di diaframmatatura e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 130 DEL 24/09/2003	258.228,45	258.228,45	19.367,13	Progetto definitivo				Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 108/02

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	2/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 111 18/10/2002	1.291.142,25	96.835,67	96.835,67	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
12	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 107 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
13	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione nei bacini centrali - (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		183.819,20			Progetto approvato				
14	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		139.228,00			Progetto approvato				
15	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica. Incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		481.339,20			Progettazione in corso				
16	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.211.142,20			Progettazione in corso				
17	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		176.097,20			Progettazione in corso				
18	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.373,20			Progettazione in corso				
19	Interventi in rete minore di bonifica. Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale	D1/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
20	Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione. Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Giovannielli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore e Rebosola: stralcio	D1/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
21	Impinguamento canali Baoli - Rebosola	D2/42	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.150.000,00			Progettazione in corso				
					60.948.350,99	26.074.617,68	22.178.733,50	TOTALI				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA

Int.	LEGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Es. 1993												
1	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DDDA N. 71 27/10/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	22/07/1996	29/11/1997	20/03/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 12/7/2001
Legge 139/92 II fase												
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 73 DEL 27/2001	619.748,30	619.748,28	413.760,65	Lavori in corso	03/09/2001			La somma impegnata è stata ridotta rispetto a quella finanziata in base alla riduzione dell'importo del progetto iniziale (da € 619.748,28 a € 516.456,90)
3	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (Idrovora Cambroso)	5/B/7	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGCA N. 72 DEL 2/2/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.272.486,29	Lavori in corso	12/10/1998	29/11/1997		Approvata perizia di variante
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
4	Ricalibratura e sostegni sui ril di Piove	A/7 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/6/2003	4.131.655,20	206.582,75	206.582,75	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazioni limitati alle sole spese di progettazione
5	Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	A/9 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 14/12/2000	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato				
6	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999					Finanziamento originale di € 2.840.512,95 suddiviso negli interventi 6A (€ 1.549.370,70) e 6B (€ 1.291.141,25)				
6A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacino dei Ril di Piove (€ 1.549.370,70)	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.549.370,70			Progetto definitivo				Con DGR 1550 e 1551 del 26/05/2004 ottenuto giudizio di compatibilità ambientale
6B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Bernio (€ 1.291.141,25)	A/8.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 190 07/10/2004	1.291.142,00	1.291.142,00	142.025,65	Lavori in corso				
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
7	Ricalibratura, realizzazione aree golenali e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	D/72	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 78 13/6/2003	3.098.741,40	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 7A (€ 2.324.056,05) e 7B (€ 774.685,35)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
7A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacini a sud del Fiumicello (€ 2.324.056,05)							Progetto preliminare				
7B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Trezze (€ 774.685,35)							Progetto preliminare				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Pressa in Sinistra Brenta e Settima Pressa inferiore (Ricalibratura e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/75	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 63 13/6/2003	2.582.284,50	129.114,23	129.114,23	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
9	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventana" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 64 13/6/2003	2.324.056,10	116.202,80	116.202,80	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Progetto definitivo per la realizzazione di interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell' idrovio Padova - Venezia.	D/74	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 18/11/2002	774.685,35	774.685,00	0,00	Progetto approvato				
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
11	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell' area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 66 13/6/2003	1.239.496,60	61.974,83	61.974,83	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
12	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 65 13/6/2003	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia	2/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 67 13/6/2003	3.096.741,50	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 13A (€ 1.291.142,25) e 13B (€ 1.807.599,15)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13A	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Bernio (€ 1.291.142,25).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,25)					Progetto preliminare				
13B	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Trezze (€ 1.807.599,15).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,15)					Progetto preliminare				Procedura di screening
14	Ricalibratura e sostegni sui corsi d' acqua nell' area della Riviera del Brenta	2/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 68 13/6/2003	2.375.701,80	118.785,09	118.785,09	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
15	Interventi strutturali in rete di bonifica: diversione delle acque di piena del Fiumicello (Idrovora di Cambroso) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 3)	D/1/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		180.000,00			Lavori in corso				
16	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Plove di Sacco e Codevigo - Bacino Sesta Pressa e ESPROPRI dell'int. 4)	D/1/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
17	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Plove di Sacco e Codevigo - Bacino Sesta Pressa e ESPROPRI dell'int. 6)	D/1/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area di "Brondolo" in comune di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progetto esecutivo				
19	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (I stralcio) - Bacino Sesta Presa e Bacino Trezze (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00			Progettazione in corso				
20	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nel bacino "Noventana" (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 9)	D1/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
21	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa inferiore (I stralcio) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		350.000,00			Progettazione in corso				
22	Completamento, ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progetto preliminare				
23	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		570.000,00			Progetto preliminare				
24	Completamento ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano	D1/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
25	Interventi di trasformazione irrigua del Bacino Bernio in sx del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo	D2/43	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.963.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					39.454.963,99	7.553.181,55	4.371.822,81					

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulico delle isole Trepontine	B/17/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 52 DEL 4/6/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	892.427,07	Lavori in corso	24/04/2002			

Legge 515/96 Es. 1997

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDA N. 223 DEL 2004	53.789,57	53.789,57	53.789,57	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 12.911.422,48, di cui € 10.857.632,91 devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia e € 2.000.000,00 alla Comunità Ebraica di Venezia.
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Completamento intervento per acquedotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	5/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 5.164.586,99 interamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
4	Progetto di opere aziendali e comuni a più fondi nel settore dell'irrigazione - Distribuzione di acqua alle aziende delle unità irrigue elementari	D2/44	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.978.171,00			Progetto preliminare				
					TOTALI		4.323.102,82 1.344.931,82 946.216,64					

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1151 DEL 19/1/1986	DDL N. 909 DEL 10/2/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	1990	08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
2	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		DGR N. 1151 DEL 19/1/1986	DR N. 762 DEL 08/08/1990	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	1989	30/11/1990	15/10/1992	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
Legge 67/89 Es. 1990												
3	Risanamento e rinaturalizzazione del tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR N. 3324 DEL 29/07/1996	DPGR 2436 DEL 03/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49	Lavori in corso				
Legge 67/88 Es. 1992 - I^a tranche												
4	Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - Il stralcio	1/4.1	DGR N. 2773 DEL 21/06/1994	DDA N. 72 DEL 02/1/1995	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati	23/11/1996	30/05/1997	06/12/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDA n. 27 del 31/03/1999

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 57/88 Es. 1992 - II^a tranche												
5	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherle		DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DGCA N. 367 24/09/1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
6	Ricalibratura e sostegno nel sottobacini del Marzenego		DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		1.291.142,25			Finanziamento convogliato nell'intervento 16 per € 1.291.142,25				
7	Riquilibratura ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (il finanziamento di € 774.685,35 - DGR N. 6400 DEL 12/12/1995 - è stato assegnato al Comune di Noale)	5/B/3.3						Con D.D.A. n° 18 del 26/02/01 e successivo D.D.A. n°38 del 09/04/01 il finanziamento è stato trasferito al comune di Noale				
8	Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	1/C/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.005.081,94			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
9	Progetto Campalto: riserzionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	1/C/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.582.284,50			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
10	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica sovrante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante/impianto per n. 24 stazioni.	5/B/5	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 59 15/05/2001	813.419,62	813.419,62	536.177,29	Lavori in corso	14/05/2002			
11	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	5/B/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 33 19/09/1998	7.230.396,59	7.230.396,59	7.230.396,59	Lavori collaudati	18/11/1999	08/08/2003		Importo originale € 7.670.396,59. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004. L'economia registrata convogliata negli int. 25 e 26
12	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995					Finanziamento di € 8.263.310,39 suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S. Martino, Piovega di S., Rio S. Amrogio, Piovega di L. e Piovega del Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)	5/B/2.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 83 11/05/2004	4.131.655,19	4.131.655,19	337.101,31	Progetto approvato				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria del collettore Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze (€ 4.131.655,19)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		4.131.655,19			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	5/B/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.014.181,91			Progettazione in corso				
14	Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre. 1° e 2° perizia supplementare e di variante.	5/B/3.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 40 30/06/2000	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
15	Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	5/B/3.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 53 04/08/2000	4.648.112,09	4.648.112,09	3.738.028,97	Lavori in corso	02/01/2002			
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
16	Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	A/10.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.291.142,25			Finanziamento suddiviso negli interventi 16A (€ 309.874,14) e 16B (€ 981.268,11)				
16A	Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Marcelligo, Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione RIO La Fossetta (€ 309.874,14)							Progettazione in corso				Approvazione VIA con DGR N. 1548 DEL 14/06/02
16B	Interventi di riqualificaz. nell'area denominata "Oasi di Noale". 2° Stralcio (€ 981.268,11)							Progettazione in corso				
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
17	Riqualificazione ambientale della fossa Storta e interventi presso cave Praello a Marcon	D/78	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				
18	Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del F. Marzenego e interv. sugli affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		7.746.853,49			Finanziamento diviso negli interventi 18A (€ 5.164.568,99) e 18B (€ 2.582.284,50)				
18A	Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del F. Marzenego e suoi affluenti (€ 5.164.568,99)							Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
18B	Interventi nella zona di valle del bacino del canale Scolmatore del F. Marzenego e suoi affluenti (€ 2.582.284,50)							Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
19	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. 1° stralcio - scolo Zermason	2/E/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
20	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. 1° stralcio - scolo Rusteghin	2/F/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
21	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. 1° stralcio - scolo Zeretto	2/G/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.032.913,80			Progettazione in corso				
22	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. 1° stralcio - scolo Vernise	2/H/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. 1° stralcio - scolo Draganzolo	2/I/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
24	Ricalibratura e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. 1° stralcio - scolo Dosa e prolungamento	2/L/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Magg. Mutui IV fase												
25	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	5/B/1.2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	403.848,02	403.848,02	403.848,02	Lavori collaudati	03/07/2003	08/08/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004
Legge 515/96 Magg. Mutui IV fase												
26	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	B/23	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	36.151,98	36.151,98	6.501,93	Lavori collaudati	03/07/2003	08/08/2003		Registrata, con DDDA n. 105 del 08/06/2004, un'economia di € 29.650,05
Legge 368/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
27	Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego - Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna - integrazione tra la rete principale di bonifica ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche	B/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.000.000,00			Progetto approvato				
28	Estensione, completamento e gestione della Zona Tampono arborea realizzata presso l'Azienda Diana di Veneto Agricoltura, con raccolta ed elaborazione di dati per il monitoraggio dell'efficacia delle fasce tampone arboree nel controllo dell'inquinamento	D1/29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto approvato				
29	Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Marzenego - 2° Stralcio, Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne	D1/30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto approvato				
30	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Pesevaglia, Bacino Pisani, Pesevigliana, Marrocchessa e Tarsi in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12B)	D1/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.950.000,00			Progetto approvato				
31	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consorziali: Piovega di C., Desolino, Rio S. Martino, Piovega di S., Rio S. Annrogljo, Piovega di L. e Piovega del Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12A)	D1/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progetto approvato				
32	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Marzenego. (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
33	Riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 18)	D1/22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
34	Interventi strutturali in rete minore di bonifica Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 19)	D1/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note		
35	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Rusteghin (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 20)	D1/24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progettazione in corso						
36	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Zeretto (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 21)	D1/25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00			Progettazione in corso						
37	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Vernise (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 22)	D1/26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		850.000,00			Progettazione in corso						
38	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Draganzolo (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 23)	D1/27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progettazione in corso						
39	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Dosa e prolungamento (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 24)	D1/28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		120.000,00			Progettazione in corso						
TOTALI											81.837.879,43	30.846.399,93	19.655.150,81	

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
1	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d'acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d'invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	B/14 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/6/1999	DDDA N. 29 27/3/2003	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori in corso	14/05/2003			Con DDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d'acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d'invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	D/81	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 29 27/3/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	799.117,53	Lavori in corso	14/05/2003			
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
3	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Vela: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione.	Z/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4	Risanamento dell' alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole Legge 388/00 e 449/01 Es. 2002, 2003, 2004	2/V/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 114 DEL 18/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
5	Risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area di alta densità di allevamenti ittici e colture agricole	D1/31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione preliminare				
6	Diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione	D1/32	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione preliminare				
TOTALI												
					6.148.112,09	2.117.473,29	1.367.220,12					

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
1	Bonifica ex - cava di Riese denominata "Cava Bergamin"	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	823.748,75	823.748,75	0,00	Progetto approvato	15/04/2003			Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
2	Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero Legge 388/00 e 449/01 Es. 2002, 2003, 2004		DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		780.000,00			Progettazione in corso				
3	Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in Comune di Castelfranco	D1/33	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.400.000,00			Progettazione in corso				
4	Riconversione del sistema irriguo in Comune di Veduggio, zona di Fanzolo e Barcon - Riconversione da scorrimento ad aspersione (piuvirrigazione) su un'area di 1.200 Ha	D2/45	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.840.000,00			Progettazione in corso				
					9.843.748,75	823.748,75	0,00					
TOTALI												

CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 910/86 Es. 1989												
1	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	DGR N. 2549 DEL 30/4/1992	DDEA N. 59 DEL 11/12/1991	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori ultimati.				Intervento inizialmente affidato al CVD poi revocato (DDEA N. 2549 del 30/04/1992) e affidato a questo consorzio. Le date non sono reperibili.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a tranche												
2	Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	4b	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDA N. 39 19/5/1999	774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				Impegno pari a € 774.685,35 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio n. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
3	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,5 MLD)	4c	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDA N. 39 19/5/1999	1.291.142,25	1.291.142,25	1.145.525,32	Collaudo in corso	12/06/2000	03/06/2002		
Legge 139/82 II fase												
4	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio)	1/A/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDA N. 40 19/5/1999	1.652.662,08	1.652.662,08	127.166,53	Lavori in corso				
5	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2.2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDA N. 100 22/10/1999	2.608.107,34	2.608.107,34	282.787,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6	PARCO LAGUNARE DI MIRA - EX Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2.3	DGR N. 33 DEL 12/1/1999	DDA N. 100 22/10/1999	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6A	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara, Giare) (€ 3.795.958,22)			Riuniti i finanziamenti 5 (€ 2.608.107,34) + 6 (€ 1.187.850,87) = € 3.795.958,22				Progettazione in corso				
7	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Potenziamento impianto idrovoro di Dogailetto in comune di Mira)	1/A/2.1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDA N. 38 19/5/1999	2.556.461,65	2.556.461,65	2.260.796,61	Lavori in corso	12/06/2000	29/06/2002		
8	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all'impianto idrovoro di Malcontenta	1/B/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDA N. 101 22/10/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	195.153,33	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				
8A	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all'impianto idrovoro di Malcontenta (€ 2.840.512,95)			Riuniti i finanziamenti 2 (€ 774.685,35) + 8 (€ 2.065.827,60) = € 2.840.512,95				Progettazione in corso				
9	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovoro di Malcontenta)	1/B/3	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				Fondi riallocati con DGR N. 5087/99
10	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 2/7/1999		619.748,28		0,00	Progetto approvato				In attesa di coordinamento con l'intervento di ARPAV codice 5/A/1
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
11	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	B/13.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.615.198,29			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				
11A	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica (L'importo complessivo del progetto è pari a € 8.234.568,99, di cui € 5.164.568,99 costituiscono il primo stralcio)			Riuniti i finanziamenti 9 (€ 1.549.370,70) + 11 (€ 3.615.198,29) = € 5.164.568,99				Progettazione in corso				L'importo di € 5.164.568,99 è costituito da uno stralcio di € 2.469.568,99 affidato al Consorzio e da uno stralcio di € 2.695.000,00 all' A.C.M.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
12	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio Brenta	D/76	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		4.131.655,19			Progettazione esecutiva in corso				
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
13	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano	2/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	103.291,38	Progettazione in corso				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
14	Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 96 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
15	Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, S. Marco e Vandura)	2/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 104 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
16	Riassetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere	2/T/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 102 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
17	Ammodernamento e potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto a Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/34	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 215 17/11/2004	310.000,00	310.000,00	0,00	Lavori in corso				
18	Ricalibratura scoli Fondi a Est e Fondi a Sud a PER ESPROPRI dell'int. 4)	D1/35	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		206.582,00			Lavori in corso				
19	Sistemazione idraulica e ricalibratura rete di bonifica bacino Chirignago Malcontenta ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/36	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		774.684,00			Progettazione in corso				
20	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete idraulica del bacino Gamarare - Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/37	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		852.152,00			Progettazione in corso				
21	Progetto dimostrativo per integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11A)	D1/38	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.478,42			Progettazione in corso				
22	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/39	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00			Progettazione in corso				
23	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/40	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.032.913,88			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o chiusura lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
24	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riassetto della rete scolante del sottobacino Rio dell'Arzere (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 16)	D1/41	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.549.370,70			Progettazione in corso				
25	Riconversione irrigua di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, S. Martino di Lupari e Castelfranco	D2/46	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		174.240,00			Progetto approvato				
TOTALI					34.145.196,14	12.808.256,96	4.321.303,55					

SEZIONE IV: REGIONE VENETO**Nota:**

REGIONE VENETO – BONIFICA SITI INQUINATI: i fondi vengono ripartiti con Deliberazione della Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (vedi anche scheda riepilogativa pag. 115)
REGIONE VENETO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO: gli interventi con i numeri evidenziati in grigio sono stati realizzati direttamente dalla Regione Veneto, tramite il C.V.D.)
REGIONE VENETO – FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA: i fondi vengono ripartiti con Deliberazione di Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (Consorzi di Bonifica ed aziende Agricole)

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

REGIONE: ACQUEDOTTI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
1	Condotta Cà solaro - Gazzera	D/90	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	4.002.540,97	6.197,48	6.197,48	Progettazione in corso				
2	Condotta Cà solaro - Cavallino	D/89	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	6.972.168,14	13.427,88	13.427,88	Progettazione in corso				
TOTALI					10.974.709,11	19.625,36	19.625,36					

REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/86 Es. 1997												
1	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	C/24/1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 95/03 DGR 2382/03 DGR 1948/03	2.030.708,53	288.945,69	113.192,71	Lavori in corso				Fondi a disposizione della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
2	Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera - MASTER PLAN (Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Z. I. di Porto Marghera)	C/24/1.1	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 37 23/4/2002	561.575,97	551.575,97	551.575,97	Lavori ultimati	Date diverse			Esecuzione dei lavori affidata a 5 soggetti attuatori.
Legge 345/87 Es. 1998 - V fase												
3	Bonifica siti inquinati P. Marghera	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		6.125.345,12							Fondi a disposizione della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003. Il finanziamento complessivo pari a € 7.643.562,11, quota pari a € 1.518.216,98 destinata al Comune di Venezia per la bonifica delle Corti Femminili
4	Indagine epidemiologica Marghera	B/18.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		103.291,38			Progettazione in corso				
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
5	Bonifica dell'area industriale ex Italsintex in comune di Camposampiero (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4136 22/12/2000	39.291,84	39.291,84	21.749,20	Lavori in corso				Liquidazione sospesa

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Bonifica dei siti inquinati - Porto Marghera	D/83	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		8.263.310,39							Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
7	Bonifica dei siti inquinati compresi nel Bacino Scolante	4/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.402.250,26							In attesa di destinazione da parte della Giunta Regionale
8	MASTERPLAN bonifica Porto Marghera	4/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90							In attesa del decreto di impegno
TOTALI					20.032.230,38	889.813,49	686.517,88					

REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
1	Somme in amministrazione per spese tecniche e notari	1/1.22		DGR 2853 31/12/1990	424.340,91	424.340,91	424.340,91					
2	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	1/1.3		DDDA N. 7 12/9/1990	1.549.370,70	1.549.370,70	1.632.913,17	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 81/96. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 59/2001
3	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	1/1.2		DDDA N. 6 12/9/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.885.581,27	Lavori collaudati			31/07/1997 30/03/1998	Variazione finanziamento con DDDA n. 76/96. D.C.F. 23 del 22/06/1998
4	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	1/1.11		DDDA N. 19 12/11/1990	1.931.597,89	1.931.597,89	1.931.597,89	Lavori collaudati			22/07/1995	Finanziamento originale pari a € 2.065.827,60. DCF 147 del DDDA n. 82 del 16/02/1998 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 15/1999
5	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	1/1.8	N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 12 12/9/1990	4.699.757,78	4.699.757,78	4.358.752,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 16/02/1998 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 15/1999
6	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Marfiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	1/1.14		DDDA N. 28 18/12/1990	1.344.229,74	1.344.229,74	1.344.229,74	Lavori collaudati			07/07/1994	Finanziamento originale pari a € 1.446.079,32. DCF 101.849,58, convogliata nell'int. 24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENEZO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	1/1.15		DDDA N. 29 18/12/1990	3.042.086,08	3.042.086,08	3.042.086,07	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 3.047.095,70. DCF 96 del 06/08/2001. Economia, pari a € 5.009,62, convogliata nell'int. 24
8	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	1/1.23	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 13 15/2/1991	995.302,79	995.302,79	995.302,79	Lavori collaudati			13/03/1997	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DGCA 161/1998. Economia, pari a € 37.611,00, convogliata nell'int. 24
9	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.13	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 12/12/1990	980.577,05	980.577,05	980.577,05	Lavori collaudati			22/10/1998	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DDDA 106 del 26/10/1999. Economia, pari a € 52.336,76, convogliata nell'int. 24
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	1/1.17		DDDA N. 31 18/12/1990	770.689,83	770.689,83	770.689,83	Lavori collaudati			14/08/1995	Finanziamento originale pari a € 774.685,35. DCF DDDA n. 106 del 14/05/1996. Economia pari a € 3.995,52 convogliata nell'int. 24
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	1/1.1	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 5 12/9/1990	835.121,92	835.121,92	835.121,92	Lavori collaudati			07/07/1995	Finanziamento originale pari a € 877.976,73. DCF DDDA 42/1996. Economia, pari a € 42.854,81, convogliata nell'int. 24
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupatá (VE)	1/1.16		DDDA N. 30 18/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.052.547,83	Lavori collaudati			31/05/1997	Variazione finanziamento con DDDA n. 554 del 18/12/1997. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 16/02/1998
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	1/1.10		DDDA N. 15 11/10/1990	1.298.757,42	1.298.757,42	1.298.757,42	Lavori collaudati			21/06/1994	Finanziamento originale pari a € 1.497.725,01. DCF 48 del 20/03/1996. Economia, pari a € 198.967,59, convogliata nell'int. 24
14	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	1/1.12		DDDA N. 20 12/1/1990	972.642,76	972.642,76	972.642,76	Lavori collaudati			08/11/1994	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF 106 del 19/05/1996. Economia, pari a € 60.271,04, convogliata nell'int. 24
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - Vi lotto	1/1.7		DDDA N. 11 12/9/1990	1.136.205,18	1.136.205,18	1.068.506,88	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 53 del 20/05/2002
16	Fognatura bacino San Giuliano	1/1.6		DDDA N. 10 12/9/1990	433.816,22	433.816,22	433.816,22	Lavori collaudati			16/05/1994	Finanziamento originale pari a € 464.811,21. DCF 18 del 03/03/1997. Economia, pari a € 30.994,99, convogliata nell'int. 24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
17	Redazione del Piano Direttore				516.456,90	516.456,90	516.456,90	Intervento concluso				
18	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	1/1.4	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDETA N. 8 12/9/1990	2.698.487,30	2.698.487,30	2.652.463,24	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 15/1/1998
19	Lavori di estensione della rete interna ed II collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	1/1.19	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 34 19/12/1990	3.352.130,39	3.279.236,61	3.279.236,61	Lavori collaudati			30/05/1996	Finanziamento originale pari a € 3.356.989,84, DCF n. 76/1997, Economia pari a € 77.733,23 convogliata nell'int. 24
20	Lavori di telesegregazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	627.508,56	627.508,56	624.095,07	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n.84 del 12/08/2002
21	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	446.078,81	446.078,81	446.078,81	Lavori collaudati			28/06/1996	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
22	Ispezioni televisive	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Lavori collaudati			22/03/1995	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
23	Piano pilota W.I.R.C.	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	327.330,38	327.330,38	327.330,38	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
24	RIUTILIZZO ECONOMIE L. 910/86 Es. 1987/88	1/1. ECO	DGR 2517 DEL 13/09/2002		2.085.508,84	541.030,70	507.236,30	Lavori in corso				
25	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo. RIUTILIZZO ECONOMIA Legge 910/86 Es. 1989	1/1.23 ECO		DGR 1356 21/04/1998	28.077,39	28.077,39	28.077,39	Lavori ultimati				
26	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte Legge 67/88 Es. 1990	1/1.18		DDDA N. 32 18/12/1990	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.584,63	Lavori collaudati			12/07/1996	Registrata, con DDDA n. 73 del 30/06/1997, un'economia di € 95.156,76
27	Aggiornamento Piano Direttore II° fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	1/2.16 Penna	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.614.488,62	1.529.665,48	1.444.069,51	Lavori in corso				
28	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/2.5.A	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		2.065.827,60	1.994.040,61	631.110,85	Lavori in corso				
29	Aggiornamento del Piano Direttore	1/2.16	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		967.795,88	968.871,43	959.662,38	Lavori ultimati				
30	Impianto Integrato di Fusina - P.I.F. (linea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - I° stralcio) Legge 67/88 Es. 1992 - II° tranches	1/2.5	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		96.506,54	96.506,54	96.506,54	Intervento concluso				Quota spesa per la sola progettazione
31	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR N. 2121 DEL 2004	7.229.137,98	62.400,00						Impegno di spesa a favore dello IUAV
32	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)		DGR N. 45 DEL 15/07/1999		8.263.310,39							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione euro impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
33	Quota regionale agenzia per Venezia Legge 139/92 - II fase											Finanziamento di € 5.164.568,99 revocato con DDDA n. 108 del 28/10/1999
34	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004 (PCR 1115/95 di assegnazione dei fondi)		12.181.000,00							Finanziamento proveniente da fondi riallocati di cui alla legge 139/92 II fase (schede 4/A/1 e 4/A/2 destinati alla Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura)
35	Progetto integrato Fusina (P.I.F.) Legge 539/95 Magg. Mutui III* fase		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		21.342.612,00							
36	Realizzazione Carta Geologica della Laguna Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	B/22.1 IV fase	DCR N. 23 DEL 1/3/2000	DGR N. 3788 1/7/2000	309.874,14	309.870,17	303.930,59	Lavori ultimati				
37	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	B/22 IV fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		451.899,79	428.730,01	428.129,97	Lavori in corso				
38	Intervento sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche	B/22 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.197.482,79							Intervento coordinato con il M.A.V. che finanzia una quota pari ad altri € 6.197.483,01
39	Progetto integrato Fusina (reflui civili industriali) - P.I.F. Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	A/3	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		18.075.991,47							
40	Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	E/94	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50							Intervento congiunto Regione Veneto/Comune di Venezia
41	Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e dell'asporto di sedimenti dalla laguna	E/95	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDA N. 43 DEL 2002	1.291.142,25	25.427,88	25.427,88	Progetti in fase di approvazione				
42	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna Legge 488/99 Es. 2002, 2003	E/93	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80	517.504,60	327.504,60	Lavori in corso				
43	Progetto integrato Fusina (P.I.F.) Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	1/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		15.493.706,97							
44	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.100.743,00			Progetti in fase di redazione				
45	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	B/22 V fase	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		9.919.447,15							

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
46	Accordo di programma relativo a progetti di ricerca, sperimentazione e utilizzo dell'idrogeno tra Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente	B/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.000.000,00			Progetto preliminare				
47	Attività di studi, ricerche, indagini e divulgazione, concernenti il Piano Direttore 2000	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		700.000,00							
TOTALI					153.274.147,63	40.674.627,59	38.705.946,75					

REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 360/91												
1	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio	1/3.4	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDEA N. 33 DEL 28/9/1993	452.932,70	452.932,70	216.807,60	Lavori ultimati				Progetto affidato al Centro Veneto Disinquinamento (CVD) e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
2	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - Il stralcio	1/4.8	DGR N. 5211 DEL 18/11/1993	DGCA N. 542 DEL 10/12/1997	409.756,90	229.532,47	229.532,47	Lavori in corso				Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
3	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993		686.681,09							Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
Legge 139/92 Il fase												
4	Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a) (€ 15.493.706,97)	2/D/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	DDRPAS 63 DEL 21.12.2000; DDRPAS 69 DEL 28.12.2000; DDRPAS 71 DEL 28.12.2000	15.493.706,97	15.493.706,97	10.391.443,53					Importo complessivo del finanziamento pari a € 15.493.706,97, di cui € 13.014.701,34 destinati al Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni destinate ai consorzi di bonifica è pari a € 7.787.425,94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Protezione zootecnica: gestione reflui zootecnici(3.3a)	4/A/1	DDRPASM N. 77 DEL 14/6/1999; DSRSP 128 DEL 27.10.1999; DSRSP 102 DEL 23.08.2000; DSRSP 103 DEL 23.08.2000; DSRSP 69 DEL 28.12.2000; DSRSP 71 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	4.203.126,32	2.424.788,70	1.671.034,65	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 6.713.939,69, di cui € 2.510.813,37 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento Int. 44)
6	Protezione zootecnica: interventi strutturali in zootecnica(3.3b).	4/A/2	DDRPASM N. 77 DEL 14.06.1999; DSRSP 128 DEL 27.10.1999; DSRSP 102 DEL 23.08.2000; DSRSP 103 DEL 23.08.2000; DDRPAS 71 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	10.988.089,33	10.988.089,33	7.891.211,73	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 20.658.275,96, di cui € 9.670.186,63 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento Int. 44)
7	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnica	4/A/3	DDRPAS 1 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DGR 4093 DEL 30.12.2002; DDRPAS 32 DEL 22.03.2003; DDRPAS 26 DEL 21.02.2003; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	5.164.568,99	4.434.136,42	1.233.660,08	Lavori in corso				
8	Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superficiali agricole	A/4 V fase	DDRPAS 72 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 37 DEL 28.3.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	10.329.137,98	10.329.137,98	4.020.035,06	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 10.329.137,98, di cui € 6.818.335,60 destinati ai Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni relative ai consorzi di bonifica è pari a € 3.451.802,81
9	Incentivi alla politiche agricole ecocompatibili, modifiche colturali e piani di spargimento	C/67	DDRPASA 156 DEL 23.10.2003	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	10.329.137,98	10.329.137,98	2.120.387,94	Lavori in corso				
10	Gestione pratiche agricole: Incentivazione all'innovazione ambientale	C/71		DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	1.549.370,70			In istruttoria				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali	C/70	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99	512.995,55	0,00	In istruttoria				
12	Ricostruzione fasce tampone e set-aside	C/68	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPAS 72 DEL 13.05.2003; DDRPASA 29 DEL 18.06.2003; DDRPASA 34 DEL 25.06.2003	3.615.198,29	3.614.872,81	848.067,17	Lavori in corso				
13	Gestione pratiche irrigue	C/69	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		10.329.137,98	5.658.031,20		Lavori in corso				
14	AGRICOLTURA COMPATIBILE. (Al fine di ridurre gli apporti di fitonutrienti e favorire una più corretta gestione del suolo.)	3/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98	2.818.315,95	781.688,38	Lavori in corso				
15	Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia	3/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.298.233,20			In istruttoria				
16	Gestione delle pratiche irrigue; razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante Laguna di Venezia	3/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.164.568,99			In istruttoria				
17	Legge 389/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004 Agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3a)	C/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.611.724,00			In corso di realizzazione				
18	Gestione dei reflui zootecnici ed interventi strutturali in zootecnia (C5.1.4)	C/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		22.264.354,00			In corso di realizzazione				
19	Realizzazione fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3b)	C/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.046.290,00			In corso di realizzazione				
20	Gestione delle pratiche irrigue; razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C5.1.3c)	C/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		10.406.396,00			In corso di realizzazione				
21	Gestione delle pratiche agricole; incentivazione all'innovazione ambientale ecompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C5.1.5)	C/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.500.000,00			In corso di realizzazione				
TOTALI												
											148.336.118,41	
											67.285.678,06	
											29.403.868,62	

SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

ARPAV

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
Legge 67/88 Es. 1991												
1	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	4a	DGR N. 4975 DEL 21/11/1993	DGR N. 2558 27/07/1999	258.228,50	258.228,45	274.484,19	Lavori in corso				Fondi derivanti da un finanziamento iniziale di € 7.950.853,96 suddiviso negli interventi 1 (€ 258.228,45), 2 (€ 1.032.913,80), 7A (€ 4.787.555,45), 8 (€ 839.242,46) e 11 (€ 1.032.913,80)
Legge 139/92 Es. 1993												
2	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	4/B/1	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori in corso				
3	Estensione rete agrometeorologica	6/C/1	DGR N. 4977 DEL 22/07/1993	DGR N. 156 27/11/1995	516.456,90	516.456,90	515.250,42	Lavori ultimati			15/05/1998	
Legge 139/92 II fase												
4	Interventi strutturali in rete di bonifica.		DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		103.291,60							Intervento soppresso per errore di attribuzione di ente
5	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	2/B/1	DGR N. 2238 DEL 21/5/1996	DGR 2584/96 DGR 2698/97	1.807.599,15	1.783.792,29	1.769.184,73	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso in 2 interventi: servizio agrometeo (€ 774.685,34) e radar meteo progetto 2RADMETEO (€ 1.032.913,80)
6	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrometeorologico della Regione Veneto	2/C/1 penna	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	2.582.284,50	2.582.284,50	1.647.866,29	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso: parte attività agro-zootecnica (€ 1.807.599,15) lavori ultimati e parte ampliamento sede (€ 774.685,35)
7A	Progetto quadro di monitoraggio (€ 4.785.555,45)											Finanziamento convogliato nell'intervento 7
7B	S.I.R.A.V. (Sistema Informativo Regione Ambiente Veneto) (€ 1.409.927,33)											Finanziamento convogliato nell'intervento 7
7	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna (€ 6.197.482,79)	5/A/1	DGR 2516/98 DGR 2558/99	DGR 2516/98 DGR 2558/99	6.197.482,90	6.197.482,79	6.187.559,90	Lavori in corso				
8	Interventi strutturali in rete di bonifica.	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	839.242,80	839.242,46	147.448,45	Lavori in corso				
Legge 515/86 Es. 1997												
9	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica	C/25/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGR 2696 29/07/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	946.275,27	Lavori in corso				L'importo finanzia parte del progetto 2RADMETEO
Legge 345/87 Es. 1998 - V fase												
10	Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto.	A/6.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 8/10/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	309.874,00	Lavori in corso				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
11	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	B/15.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGR N. 667 DEL 14/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	516.456,90	Lavori in corso					
12	Monitoraggio delle acque lagunari e dei corsi d'acqua del bacino scolante	E/91	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		54.370,00			Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13	
13	Monitoraggio interventi di disinquinamento nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e realizzazione del Laboratorio per l'analisi delle diossine presso il Dipartimento dell'ARPAV di Venezia - Centro di riferimento del Bacino Scolante	E/91.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 DEL 26/5/2003	1.495.000,00	1.495.000,00	668.500,00	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13	
14	Piano di monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera e nel bacino scolante nella laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio Industriale e delle emergenze a P.I.M. Legge 488/99 Es. 2002, 2003	E/92	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4013 DEL 31/12/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				Progetto SIMAGE I° LOTTO	
15	Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio Industriale e delle emergenze per l'area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	6/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 186 DEL 17/12/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso					
16	Progetto Grandi Rischi Industriali - Verifiche zona Industriale di Porto Marghera	A/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso					
17	Completamento Progetto SIMAGE - III° LOTTO	A/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso					
18	Realizzazione nuova sede del laboratorio ARPAV di Venezia a supporto dei monitoraggi e dei controlli ambientali nel sistema lagunare	B/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione conclusa					
							25.584.352,93	20.902.883,97	15.565.184,65	TOTALI			

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
1	Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia Legge 139/92 Magg. Mutui II° Fase		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		516.450,00			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante	
							516.450,00	0,00	0,00	TOTALI			

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Magg. Mutui II ^a fase												
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminali di Val da Rio in comune di Chioggia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003			2.500.000,00			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
TOTALI						2.500.000,00	0,00	0,00					

ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 67/88 Es. 1991													
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	4a	DGR N. 4975 DEL 27/1/1993	DGR N. 863 09/03/1993		6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69					I finanziamenti sono stati riuniti in un unico progetto il cui importo finale è stato determinato con DDDA n. 118 del 18/11/1999 in €
Legge 360/91													
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DPRG N. 911 06/05/1992		3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	Lavori collaudati	18/10/1988	09/12/1998	07/06/1999	Oltre ai finanziamenti della Legge Speciale per Venezia, l'intervento ha beneficiato dei fondi F.I.C. e della legge regionale 48/1994
Legge 139/92 Es. 1993													
3	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	4/A/1	DGR N. 4977 DEL 27/1/1993	DGR N. 4977 02/11/1993		9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18					
Legge 539/95 Es. 1997													
4	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	C/28/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGR N. 553 25/02/1997		2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32					
TOTALI						22.310.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04					

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento	Approvazione del finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 910/86 Es. 1989													
1	Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	1/3.6.C1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 99 30/10/2000		1.922.252,58	1.922.252,58	0,00	Progetto approvato				Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi ex "Fognature Giudecca" pari a € 2.582.284,49 riallocati con DCR 32/97, al finanziamento 1 (€ 1.922.252,58) e al finanziamento 2 (€ 660.031,92)
2	Fognatura S. Erasmo	1/3.6.C	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		660.031,92				Fondi disimpegnati sul capitolo 50511 con DGR 2517 DEL 13/09/2002				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
3	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	B/21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDS N. 28 11/3/1999	1.549.370,70	1.520.474,93	1.254.439,76	Lavori in corso				
Legge 139/92 Magg. Mutui II* fase												
4	Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	5/D/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDSPC 431 09/10/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Lavori in corso				Accordo di Programma tra Regione Veneto, MAV, comuni di Chioggia e Rosolina
5	Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco	5/D/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.767.443,55							
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
6	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	A/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDSPC 287 16/09/2004	3.400.000,00	3.400.000,00	795.580,56	Lavori in corso				
7	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Botte di CONCHE	A/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.242.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					12.541.098,74	7.842.727,51	3.050.020,32					

PROVINCIA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Realizzazione di una rete ecologica in Provincia di Venezia mediante individuazione di aree ad esempio i meccanismi di fitodepurazione, sostenendo i principi di un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale	B/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					2.000.000,00	0,00	0,00					

S.A.V.E. - SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 1° stralcio	B/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.090.000,00			Progetto preliminare				
2	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 2° stralcio	B/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.520.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					6.610.000,00	0,00	0,00					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

U.I.S.S. n° 12 - VENEZIA

SETTORE "OSPEDALI"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
Legge 910/86 Es. 1987-1988												
2	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
Legge 910/86 Es. 1989												
3	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
Legge 539/95 Es. 1987												
4	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	C/271	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DDLLPP 157 137/1998	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
4A	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		Riuniti i finanziamenti 1, 2, 3 e 4					Lavori collaudati			30/09/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
5	Urgenti lavori di messa a norma di alcuni padiglioni dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia	B/2	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					20.301.306,12 17.301.306,12 17.261.746,32							
SETTORE "DISINQUINAMENTO"												
Legge 67/88 Es. 1990												
6	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Primo stralcio funzionale	1/2.9	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 68 16/10/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	04/12/1995	30/06/1998	25/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 21 del 26/03/2003
Legge 515/96 Es. 1997												
7	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Secondo stralcio funzionale	B/2/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 152 27/3/1998	929.622,42	929.622,42	915.230,09	Lavori collaudati	25/10/1999	15/11/2000	30/04/2003	Registrata, con DDDA n. 153 del 30/10/2003, un'economia di € 14.392,33 reiscritta nel bilancio regionale
8	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile e G.B. Giustinian in Comune di Venezia	B/2/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 425 27/10/1997	103.291,38	103.291,38	75.910,27	Lavori collaudati	13/06/1995	30/10/1998	27/03/2003	In attesa del decreto di contabilità finale di competenza dei lavori pubblici
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
9	Completamento della rete fognaria acque bianche dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella laguna Nord.	1/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 126 29/06/2004	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto preliminare approvato				
TOTALI					2.840.512,94 2.840.512,95 2.024.054,16							

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

A.S.L. n° 15 - ALTA PADOVANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolante nel bacino della Laguna di Venezia	B/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.039.000,00			Studio di fattibilità				
					TOTALI	1.039.000,00	0,00	0,00				

U.I.S.S. n° 17 - ESTE - MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1ª fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 96 DEL 30/10/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.016.095,14	Lavori in corso	08/04/2002			
Legge 139/92 Magg. Mutui IIª fase												
2	Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell'area ospedaliera di Monselice		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		232.000,00			Progettazione esecutiva in corso				
					TOTALI	1.523.142,25	1.291.142,25	1.016.095,14				

DELTA PO S.p.A. (ora VENETO ACQUE S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 67/88 Es. 1988												
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Realizzazione della condotta Cavarzere - Chioggia	1/4.10	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	8.934.704,35	8.934.704,35	2.680.411,31	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
2	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGCA N. 344 DEL 10/10/2000	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	Lavori in corso				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque. La quota pari a € 1.900.000,00 assegnati all'ASP di Chioggia (int. 7)
Legge 448/99 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
3	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione della condotta Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002				Finanziamento originale pari a € 19.108.905,27. Impegnati alla Delta Po € 18.876.499,66 suddivisi, poi, negli int. 3A (€ 14.018.456,41) e 3B (€ 4.858.043,25). Il residuo, pari a € 232.405,61 impegnato per ptese di progettazione				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3A	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	14.018.456,41	14.018.456,41	5.662.949,90	Lavori in corso				
3B	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotta Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotta Centrale Gazzera-Casello autostradale di Mestre e condotta centrale Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/86.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	4.858.043,25	4.858.043,25	0,00	Progetto approvato				
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (1° stralcio)	5/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
Legge 67/88 Es. 1992 Il trancie												
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/6.1.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR 3905 DEL 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	Lavori in corso				
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
6	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Linea-Padova-Piove di Sacco-Cavarzere	B/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		20.000.000,00			Progetto definitivo				
					79.121.154,18	59.121.154,18	30.252.914,79					
					TOTALI							

VENETO AGRICOLTURA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Messa a punto di modelli produttivi innovativi: nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino sciolante in Laguna di Venezia	B/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		900.000,00			Progettazione in corso				
2	Utilizzo dei composti di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso				
					1.900.000,00	0,00	0,00					
					TOTALI							

SEZIONE VI: ENTI VARI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

ABBZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (Venezia)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 146 15/10/2003	206.582,76	206.582,76	139.873,79	Lavori in corso				
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
TOTALI					286.582,76	206.582,76	139.873,79					

COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/08/1999		2.000.000,00			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
TOTALI					2.000.000,00	0,00	0,00					

DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 798/94 Es. 1984-1985-1986												
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	DGR 4976 02/11/1993		444.697,73			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/5.1
Legge 67/88 Es. 1990												
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR 4599 05/08/1991		511.282,33			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Chioggia/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Es. 1993												
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15.1	DGR 4977 DEL 02/11/1993		1.755.953,46			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vesca di prima pioggia e larmazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/C/15
Legge 515/96 Es. 1997												
4	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 80 20/02/2004	464.400,00	464.400,00	46.440,00	Progettazione conclusa				
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR 2613 22/07/1997		5.265.854,58			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/09/1999		10.857.632,91			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR 794 09/04/2002		5.164.568,99			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 5/B/1
TOTALI					24.464.400,00	464.400,00	46.440,00					

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"

Int.	LEGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					455.000,00	0,00	0,00					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

ENTI VARI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		5.164.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	Progetto approvato				
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Spese per progettazione inerenti "Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto". Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	D/86.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	163.911,23	0,00					
3	Interventi nel Bacino Scolante In Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.000.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					16.396.974,60	1.918.831,77	1.754.920,54					

SCHEDA RIEPILOGATIVE

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

BONIFICA SITI INQUINATI: SCHEDE RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI PER ENTE ATTUATORE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Ente attuttore AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA											
	Legge 139/82 Magg. Mutui II ^a fase											
1	Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		516.450,00			Progettazione in corso				
	Ente attuttore AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE											
	Legge 488/95 Es. 2002, 2003											
1	Messa in sicurezza ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 114/04	2.400.000,00	240.000,00	142.484,31	Progettazione in corso				
	Ente attuttore AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA											
	Legge 139/82 Magg. Mutui II ^a fase											
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminali di Val da Rio in comune di Chioggia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.500.000,00			Progettazione in corso				
	Ente attuttore COMUNE DI CAMPODARSEGO											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR 2621 10/10/2001	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	Lavori in corso				
	Ente attuttore COMUNE DI CAVALLINO											
	Legge 488/95 Es. 2002, 2003											
1	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		517.000,00							
	Ente attuttore COMUNE DI CHIOGGIA / A.S.P.											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Messa in sicurezza della discarica "Ca' Rossa" in Comune di Chioggia	D/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50			Progettazione esecutiva in corso				
	Ente attuttore COMUNE DI FOSSO'											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR 2621 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	0,00	Progetto approvato				
	Legge 488/95 Es. 2002, 2003											
1	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favalli	4/A/1.9	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Ente attuatore COMUNE DI MIRA Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, loc. Orno di Borbiago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDA N.148 13/12/2002	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
Ente attuatore COMUNE DI MONSELICE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica area ex Inceneritore	4/A/1.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.807.599,00	1.807.599,00	0,00	Progettazione in corso				
2	Bonifica area ex Inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A/1.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 10/09/2004	718.367,98	718.367,98	0,00	Progetto approvato				
Ente attuatore COMUNE DI MORGANO Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
1	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	516.456,90	516.456,90	56.657,69	Lavori in corso				
Ente attuatore COMUNE DI NOALE Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	Lavori in corso				
Ente attuatore COMUNE DI SALZANO Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 185 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	31.996,33	Lavori in corso				
Ente attuatore COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDA N. 54 26/05/2003	750.000,00	75.000,00	75.000,00	Progetto approvato				
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2833 10/09/2004	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				
Ente attuatore COMUNE DI VENEZIA Legge 360/91												
1	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993					Fondi riallocati nell'intervento 1A				
1A	Bonifica in Viale S. Marco in comune di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.032.913,80	0,00	0,00					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	1/2.5	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDDA N. 14 21/5/1998	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori ultimati				L'intervento rientra nella realizzazione del Parco di San Giuliano
3	Bonifica "Corti femminili" - Mestre	B/16 V fase	DGR N. 2962 DEL 14/9/2000		1.518.216,98	1.518.216,98	1.417.439,63	Lavori collaudati				Registrata con DDDA n. 152 del 22/11/2001, un'economia di € 100.667,29
4	Bonifica area "ex - conterie" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi.	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				
Ente attuatore CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA												
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
1	Bonifica ex - cava di Riese denominata "Cava Bergamin"	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	823.748,75	823.748,75	0,00	Lavori in corso	15/04/2003			
TOTALI					28.690.655,20	16.475.913,02	3.100.558,55					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 Dicembre 2004

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	A.S.P. di Chioggia	70.964.551,95	53.398.656,09	33.569.516,53
2	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	98.335.686,62	82.286.096,33	67.692.787,37
3	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	46.442.369,96	28.972.864,72	23.107.874,35
4	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.433.025,89	9.181.025,89	5.480.076,57
5	Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a	23.019.854,40	17.179.525,11	7.661.101,23
6	Azienda Servizi Territoriali Ambientali (S.E.T.A.)	28.123.600,00	0,00	0,00
6a	Azienda Consorzio del Tergola	94.614.903,91	78.909.194,57	65.290.260,78
6b	Azienda Consorzio Alla Servizi	36.565.148,46	26.236.010,47	18.681.214,06
6c	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	5.438.291,15	2.029.675,61	1.826.724,02
7	Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi	40.725.190,61	27.185.884,61	12.533.843,48
8	Azienda S.P.I.M.	3.142.284,50	2.582.284,50	54.110,77
9	Brenta Servizi	2.685.720,00	0,00	0,00
10	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano	7.360.000,00	0,00	0,00
11	Comune di Arquà Petrarca	2.065.827,60	2.065.827,60	1.908.197,11
12	Comune di Campdarsego	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45
13	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.648,31	4.867.966,61	1.294.663,66
14	Comune di Cavallino	11.470.939,69	6.713.939,69	2.568.516,35
15	Comune di Cavarzere	7.488.625,04	7.488.091,86	6.178.562,82
16	Comune di Codevigo	3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
17	Comune di Cornuda	943.675,00	0,00	0,00
18	Comune di Este	4.906.340,54	4.906.340,54	1.507.738,93
19	Comune di Fossò	914.684,42	914.684,42	0,00
20	Comune di Gaizignano	965.774,40	965.774,40	893.715,01
21	Comune di Jesolo / A.S.I.	5.986.029,60	5.983.446,81	5.903.802,56
22	Comune di Marcon	1.859.244,84	1.859.244,84	1.489.660,22
23	Comune di Melegnano	1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11
24	Comune di Mira	3.718.489,67	113.620,50	113.620,50
25	Comune di Mogliano Veneto	6.352.419,86	6.352.419,86	5.690.443,05
26	Comune di Montebelluna	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79
27	Comune di Monselice	14.149.272,61	8.749.272,61	4.906.340,57
28	Comune di Morgano	3.811.187,08	3.550.387,08	1.785.206,07
29	Comune di Mutila di Piave	2.815.655,85	2.815.655,85	2.769.755,32
30	Comune di Noale	3.408.615,60	2.200.106,40	1.038.352,34
31	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
32	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29
33	Comune di Preganziol	1.807.599,15	1.807.599,15	944.816,82
34	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25
35	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	31.996,33
36	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00
37	Comune di Venezia M.E.S.T.A.	383.327.708,96	253.492.572,73	167.060.142,81
38	Comune di Zero Branco	2.275.827,60	2.275.827,60	1.535.705,09

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA


nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
39	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	60.948.350,99	26.074.617,88	22.178.733,50
40	Consorzio di bonifica Basso Piave	4.323.102,82	1.344.931,82	946.216,64
41	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	39.454.963,99	7.553.181,55	4.371.822,81
42	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	9.843.748,75	823.748,75	0,00
43	Consorzio di bonifica Dese - Sile	81.837.879,43	30.846.399,93	19.655.150,81
44	Consorzio di bonifica Destra Piave	6.148.112,09	2.117.473,29	1.367.220,12
45	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	34.145.195,14	12.808.256,96	4.321.303,55
46	ARPAV	25.584.352,93	20.902.883,97	15.565.184,65
47	Magistrato alle Acque di Venezia	12.541.098,74	7.842.727,51	3.050.020,32
48	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
49	Regione - Bonifiche siti inquinati	20.032.230,38	889.813,49	686.517,88
50	Regione - Acquedotti / Delta Po	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36
51	Regione - Disinquinamento / C.V.D.	153.274.147,63	40.674.627,59	38.705.946,75
52	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	148.336.113,41	67.285.678,06	29.403.868,62
53	Veneto Acque S.p.A.	79.121.154,18	59.121.154,18	30.252.914,79
54	Veneto Agricoltura	1.900.000,00	0,00	0,00
55	U.S.L. n. 12 - Venezia/Disinquinamento	2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.054,16
55a	U.S.L. n. 12 - Venezia/Ospedali	20.301.306,12	17.301.306,12	17.261.746,32
56	U.S.L. n. 17 - Este-Monselice	1.523.142,25	1.291.142,25	1.016.099,14
57	A.S.L. n. 15 Alta Padovana	1.039.000,00	0,00	0,00
58	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	0,00	0,00
59	Azienda Speciale Porto di Chioggia	2.500.000,00	0,00	0,00
60	S.A.V.E. - Servizi Aeroportuali di Venezia	6.610.000,00	0,00	0,00
61	VESTA - Venezia Servizi Territoriali Ambientali	14.589.394,45	14.589.394,46	1.508.223,60
62	Abbazia di San Giorgio Maggiore	286.582,76	206.582,76	139.873,79
63	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
64	Diocesi Patriarcato di Venezia	24.464.400,00	464.400,00	46.440,00
65	Ente di bacino R. S. U. VE 2	22.310.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04
66	Associazione Teatro Stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	0,00	0,00
67	Enti Vari (Fondo relazione progetti)	16.396.974,60	1.918.631,77	1.754.920,54
TOTALI		1.762.495.822,61	1.005.104.987,93	674.953.543,48

Documento D Comune di Venezia


Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di
legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre
2004



Vice Sindaco
on. Michele Vianello



Venezia, 24 giugno 2005
P.g. 251096



Al Presidente del Magistrato alle Acque

Segretario del Comitato di Indirizzo

Coordinamento e Controllo

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva, S. Polo 19

30125 - VENEZIA

Oggetto: Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia

Con riferimento alla nota del 24 maggio 2005, prot. 349/GAB, si trasmette in allegato lo stato di avanzamento degli interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna aggiornato al 31 dicembre 2004.

Si precisa che nel corso del 2004, con l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale che ha approvato il programma degli investimenti di legge speciale, sono state reintrodotte nel piano programma le risorse rinvenienti dalle economie degli interventi finanziati con i mutui di cui ai limiti di impegno delle legge 5 febbraio 1992, n. 139, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, e della legge 4 ottobre 1996, n. 515. Sono state, altresì, programmate le risorse provenienti dalla ricognizione del debito globale riferito ai mutui con decorrenza 1999 contratti in base alle leggi 2 ottobre 1997, n. 345, 2 ottobre 1998, n. 295 e 28 dicembre 1998, n. 448.

Con queste azioni si è inciso in maniera dinamica sulla programmazione degli investimenti in un momento di stasi dei finanziamenti statali: ciò è evidente raffrontando il dato parziale di ogni singolo mutuo (suddivisione per lettera) dello stato di avanzamento degli ultimi anni.

E' opportuno, infine, sottolineare come lo speso complessivo sia passato al 66% rispetto al 58% del 31 dicembre 2003.

Distintamente.

On. Michele Vianello

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**COMUNE DI VENEZIA
PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE**

LEGGI DI FINANZIAMENTO	MUTUO A DECORRERE DALL'ANNO	LIMITI DI IMPEGNO QUINDICENNALI A CARICO DELLO STATO	DATA STIPULA MUTUO	AMMONTARE DISPONIBILE ALLA STIPULA DEL MUTUO	DICHI ACCANTONAMENTO COME RISERVA (*)
	1993	17.043	22.12.1992	151.340	---
LEGGI 5 FEBBRAIO 1992 N. 139	1994	7.081	21.07.1994	69.150	---
	1995	4.948	09.06.1995	45.135	---
	1996	4.498	22.12.1995	42.378	---
LEGGI 20 DICEMBRE 1995 N. 539	1996	3.160	24.07.1996	32.702	---
	1997	5.969	24.07.1996	64.619	---
LEGGI 4 OTTOBRE 1996 N. 515	1997	18.514	30.08.1996	204.290	---
	1998	9.428	30.07.1997	101.328	---
LEGGI 2 OTTOBRE 1997 N. 345	1998	9.640	23.12.1997	114.610	---
	1999	6.585	12.11.1998	81.384	---
LEGGI 3 AGOSTO 1998 N. 295	1999	658	02.11.1999	8.254	---
	2000	439	02.11.1999	5.371	826
LEGGI 28 DICEMBRE 1998 N. 448	1999	10.639	25.10.1999	143.540	---
	2000	2.995	20.12.1999	39.250	5.681
	2001	3.873	07.07.2000	46.481	5.165
LEGGI 23 DICEMBRE 1999 N. 488	2001	6.352	11.10.2000	68.689	6.197
	2002	6.972	08.05.2001	79.017	8.263
LEGGI 23 DICEMBRE 2000 N. 388	2002	3.925	23.04.2002	43.920	4.880
	2003	6.972	17.06.2002	90.000	10.000
LEGGI 28 DICEMBRE 2001 N. 448	2002	2.505	17.07.2002	27.372	2.628
	2003	4.170	17.07.2002	45.448	4.552
	2004	8.780	17.07.2003	94.824	10.536
DELIBERA C.I.P.E. PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 20, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 292/84)	2004	4.566	29.12.2003	50.400	5.600

(*) In riserva è una somma predefinita che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione. Per la sua indifferenza e la sua non immediatezza disponibilità, non è stata conteggiata nel programma degli interventi.

(**) limite di impegno per Comune di Venezia € 3.632* per il Comune di Cavallino - Treporti € 228* per il Comune di Chioggia € 681*

(***) Comune di Venezia € 10.152*, Commissario delegato al traffico scoppo € 10.168*, Comune Cavallino - Treporti e Comune di Chioggia € 10.080*

I DATI SONO ESPOSTI IN MILIONI DI EURO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31/12/2004	Legge 5 febbraio 1992 n. 129												TOTALE LEGGE									
	1993 MI				1994 MI				1995 MI				1996 MI				98%	99%	98%	99%	98%	99%
	prezzo	capita	tra	tra	prezzo	capita	tra	tra	prezzo	capita	tra	tra	prezzo	capita	tra	tra						
	Limite d'impegno o decoreo del 1993 - Milia fino a Euro 131.329.863/1																					
	Limite d'impegno o decoreo del 1994 - Milia fino a Euro 67.180.141,2																					
	Limite d'impegno o decoreo del 1995 - Milia fino a Euro 45.138.055,29																					
	Limite d'impegno o decoreo del 1996 - Milia fino a Euro 42.373.382																					
Lettera a) - art. 6 Legge 29/84	79.312	76.970	76.970	76.762	27.138	26.850	26.850	26.540	30.501	30.283	30.283	29.849	28.003	28.003	28.003	26.781	164.954	162.106	162.106	199.932		
Lettera b) - art. 6 Legge 29/84	10.175	9.704	9.704	8.768	601	601	601	595	5.788	5.527	5.527	5.353	8.896	8.896	8.896	7.459	25.478	24.728	24.728	22.175		
Lettera c) - art. 6 Legge 29/84	15.035	14.564	14.564	13.378	14.358	14.437	14.437	8.694	785	785	785	785	32	215	215	-	30.393	30.001	30.001	22.104		
Lettera d) - art. 6 Legge 29/84	16.215	15.743	15.743	15.741	3.267	3.011	3.011	2.909	3.012	7.650	7.650	5.965	5.246	5.246	5.246	3.085	32.740	31.650	31.650	27.700		
ivi - art. 5 Legge 139/92	30.602	30.602	30.602	30.327	23.786	23.786	23.786	22.799	49	49	49	49	-	-	-	-	54.437	54.437	54.437	53.126		
TOTALE	151.339	147.583	147.583	144.576	69.150	68.685	68.685	61.537	45.135	44.294	44.294	41.199	42.378	42.360	42.360	37.325	308.002	302.922	302.922	285.037		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indirizzo	Legge 20 dicembre 1995 n. 559										TOTALE LEGGE			
	18% CERIBOP					11% CERIBOP					preparato	impegno	totale	totale
	preparato	impegno	totale	totale	totale	preparato	impegno	totale	totale	totale				
31/12/2004	Limite d'impegno a decorrere dal 1996: 3.100 mil. € - Multisino fino a Euro 32.701.921,04										Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 3.569 mil. € - Multisino fino a Euro 64.619.045,09			
Lettera a) - art. 6 Legge 792/84	24.325	19.548	19.548	18.072	38.999	38.408	38.408	37.577	63.324	57.956	57.956	55.649		
Lettera b) - art. 6 Legge 792/84	3.415	3.099	3.099	2.619	9.100	7.419	7.419	5.986	12.515	10.518	10.518	8.605		
Lettera c) - art. 6 Legge 792/84	3.615	3.615	3.615	2.113	9.957	9.957	9.957	9.957	13.572	13.572	13.572	12.070		
Lettera d) - art. 6 Legge 792/84	1.347	1.033	1.033	1.033	6.477	5.826	5.826	2.582	7.824	6.859	6.859	3.615		
tit. - art. 5 Legge 139/92	-	-	-	-	86	86	86	86	86	86	86	86		
TOTALE	32.702	27.295	27.295	23.837	64.619	61.696	61.696	56.188	97.321	88.991	88.991	80.025		
		83%	83%	75%		95%	95%	87%		91%	91%	82%		

Interventi	Legge 4 ottobre 1996, n. 515										TOTALE LEGGE			
	1997 CIEBOP					1998 Banco Napoli					impegno		spese	
	impegno	colpo	dis	pagamenti	risorse	colpo	dis	pagamenti	risorse	colpo	dis	pagamenti	colpo	spese
Lettera a) - art. 6 Legge 29/84	122.576	120.418	111.691	71.810	65.166	65.166	71.810	65.166	65.166	65.166	45.512	194.386	185.584	157.203
Lettera b) - art. 6 Legge 29/84	34.181	33.853	31.548	7.108	6.028	6.028	7.108	6.028	6.028	6.028	4.495	41.289	39.881	36.043
Lettera c) - art. 6 Legge 29/84	30.808	30.796	18.083	11.866	11.710	11.710	11.866	11.710	11.710	11.710	6.381	42.674	42.506	24.464
Lettera d) - art. 6 Legge 29/84	14.161	14.094	4.972	5.846	5.696	5.696	5.846	5.696	5.696	5.696	4.943	20.007	19.790	9.915
ri - art. 5 Legge 139/92	2.564	2.564	2.406	14.697	14.697	14.697	14.697	14.697	14.697	14.697	13.201	17.261	17.261	15.607
TOTALE	204.290	201.725	168.700	111.327	103.297	103.297	111.327	103.297	103.297	103.297	74.532	315.617	305.022	246.232
		88%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	67%	97%	97%	77%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30/12/2004	Legge 2 ottobre 1998 n. 295										TOTALE LEGGE					
	1991 Cassa di Risparmio Venezia					2000 Cassa di Risparmio di Venezia					pagamenti	debito	spese	95%	98%	94%
	Limite d'impegno e decore del 1999: 0,152 mil. € - Multa fino a Euro 8.254.543,38					Limite d'impegno e decore del 2000: 0,639 mil. € - Multa fino a Euro 5.371 + riserva euro 826										
interventi	pagamenti	impegni	debiti	spese	pagamenti	impegni	debiti	spese	pagamenti	debiti	spese	95%	98%	100%	87%	81%
Lettera a) - art. 6 Legge 139/92	8.255	8.142	8.139	8.050	5.371	5.371	5.165	4.697	13.626	13.513	13.304	13.626	13.513	13.304	13.626	12.747
Lettera b) - art. 6 Legge 139/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lettera c) - art. 6 Legge 139/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lettera d) - art. 6 Legge 139/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 5 Legge 139/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.255	8.142	8.139	8.050	5.371	5.371	5.165	4.697	13.626	13.513	13.304	13.626	13.513	13.304	13.626	12.747

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Interventi	Legge 28 dicembre 1998 n. 448												TOTALE LEGGE					
	1997 Quadriplo + IdI						2000 Quadriplo + Monte Paschi Banca						2001 Monte Paschi Banca					
	preparato	esposto	discusso	votato	approvato	esec.	preparato	esposto	discusso	votato	approvato	esec.	preparato	esposto	discusso	votato	approvato	esec.
30/12/2004	Limite d'impegno e decorso dal 1997: 10.837 mil. €. - Multa fino a Euro 3.507.243,93 (M. 084.155.54 + Sovv. 5.144.548,99) + riserva Euro 5.681.025,89 (4.448.112,09 + Sovv. 1.022.913,80) Limite d'impegno a decorrere dal 2000: 2.995 mil. €. - Multa fino a Euro 2.507.243,93 (M. 084.155.54 + Sovv. 5.144.548,99) + riserva Euro 4.811.720,93 (comprensivo Sovv. Euro 5.144.548,99) + riserva Euro 5.144.548,99																	
Interventi																		
Lettera a) - art. 6 Legge 730/04	79.616	79.616	79.616	59.345	3.914	3.700	3.700	3.109	7.061	7.061	7.061	6.091	90.591	90.377	90.377	68.545	90.591	90.377
Lettera b) - art. 6 Legge 730/04	27.636	27.176	27.176	17.141	5.373	5.373	5.373	4.221	11.097	11.097	11.097	11.097	44.106	43.646	43.646	32.459	44.106	43.646
Lettera c) - art. 6 Legge 730/04	19.520	19.520	19.520	11.425	2.532	2.532	2.532	426					22.052	22.052	22.052	11.851	22.052	22.052
Lettera d) - art. 6 Legge 730/04	13.824	12.522	12.522	3.961	6.773	6.773	6.773		5.083	5.083	5.083		25.680	24.378	17.605	3.961	25.680	17.605
Art. 5 Legge 139/92	2.945	2.945	2.945	2.432	20.658	20.658	20.658	17.612	23.241	23.241	23.241	17.898	46.844	46.844	46.844	37.942	46.844	46.844
TOTALE	143.541	141.779	141.779	94.304	39.250	39.036	39.036	25.368	46.482	46.482	46.482	35.086	229.273	227.297	220.524	154.758	229.273	220.524

30/12/2004	Legge 23 DICEMBRE 1999 N. 482												TOTALE LEGGE			
	2001 CHI						2002 Banca di Napoli OPI									
	Limite d'impegno e di spesa dal 2001: 3.372 mil. € - Nuovo fino a Euro 48.688.737,58 (compreso Svo Euro 5.481.023,58) - idem Euro 6.197.482,71)		Limite d'impegno e di spesa dal 2002: 4.972 mil. € - Nuovo fino a Euro 79.917.965,57 - idem Euro 8.779.762,28													
previdenza	sanità	sviluppo	scuola	trasporti	energia	agricoltura	ambiente	regioni	infrastr. e trasporti	università	università	università	università	università	università	
Iniziativa	48.164	41.861	41.861	19.048	28.882	23.772	23.772	11.185	77.046	65.633	65.633	30.233				
Lettera a) - art. 6 Legge 798/84	5.237	3.934	3.934	2.034	11.041	11.006	11.006	3.681	16.278	14.940	14.940	5.715				
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84	7.747	7.623	7.623	6.878	14.654	14.654	14.654	5.752	22.401	22.277	22.277	12.630				
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84	7.541	6.883	6.883	1.420	1.561	1.559	1.559	1.453	9.102	8.442	8.442	2.873				
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84	-	-	-	-	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879	22.879				
Art. - art. 5 Legge 599/92	68.689	60.301	60.301	29.380	79.017	73.870	73.870	44.950	147.706	134.171	134.171	74.330				
TOTALE	68.689	60.301	60.301	29.380	79.017	73.870	73.870	44.950	147.706	134.171	134.171	74.330				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Interventi	Legge 23 dicembre 2000 n. 338										TOTAL E LEGGE					
	2002 OH					2003 Diritto Credito					preparati	esposti	adotti	voti		
	preparati	esposti	adotti	voti	preparati	esposti	adotti	voti	preparati	esposti					adotti	voti
	Limite d'impegno o decore del 2002 3.925 mil. € - Alitalia fino a Euro 4.320.000,00 - riserva Euro 4.680.000,00										Limite d'impegno o decore del 2002 6.972 mil. € - Alitalia fino a Euro 9.000.000,00 - riserva Euro 10.000.000					
Lettera a) - art. 6 Legge 298/04	12.919	12.919	12.919	10.263	61.265	43.946	43.946	25.602					74.184	56.865	56.865	35.865
Lettera b) - art. 6 Legge 298/04	3.836	2.879	2.879	2.369	14.101	7.867	7.867	6.139					17.937	10.746	10.746	8.508
Lettera c) - art. 6 Legge 298/04	4.648	4.648	4.648	3.050	-	-	-	-					4.648	4.648	4.648	3.050
Lettera d) - art. 6 Legge 298/04	1.342	787	787	701	9.469	9.373	9.373	3.899					10.811	10.160	10.160	4.600
Art. 5 Legge 298/04	21.175	21.175	21.175	14.672	5.165	5.165	5.165	214					26.340	26.340	26.340	14.886
TOTALE	43.920	42.408	42.408	31.055	90.000	66.351	66.351	35.554					133.920	108.759	108.759	66.909
		97%	97%	71%	74%	74%	74%	40%					81%	81%	81%	50%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30/12/2004	Legge 28 dicembre 2002 n. 448												TOTALE LEGGE				
	2002 OPI				2003 OPI				2004 Banco OPI				75%	78%	21%		
	impegno	impegno	spesa	totale	impegno	impegno	spesa	totale	impegno	impegno	spesa	totale					
	Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 2.565 mil € - Maxio fino a Euro 27.372.000,00 + riserva Euro 2.658.000,00 Limite d'impegno a decorrere dal 2003: 4.170 mil € - Maxio fino a Euro 45.448.000,00 + riserva Euro 4.552.000,00 Limite d'impegno a decorrere dal 2004: 8.780 mil € - Maxio fino a Euro 94.874.000,00 + riserva Euro 10.336.000,00																
Intervalli																	
Lettera a) - art. 6 Legge 798/04	12.813	7.362	7.362	4.800	5.535	5.535	5.535	2.330	2.330	26.218	22.689	22.689	7.722	44.566	35.586	35.586	14.882
Lettera b) - art. 6 Legge 798/04	12.554	4.682	4.682	2.990	8.810	7.822	7.822	5.763	5.763	28.128	15.169	15.169	3.583	49.492	27.673	27.673	12.336
Lettera c) - art. 6 Legge 798/04	-	-	-	-	20.659	20.659	20.659	6.862	6.862	2.740	2.740	2.740	-	23.399	20.659	20.659	6.862
Lettera d) - art. 6 Legge 798/04	1.102	390	390	328	3.615	516	516	124	124	436	436	436	150	5.153	1.342	1.342	602
rti - art. 5 Legge 139/02	903	903	903	63	6.829	6.829	6.829	-	-	37.302	37.302	37.302	-	45.034	45.034	45.034	63
TOTALE	27.372	13.337	13.337	8.181	45.448	41.361	41.361	15.079	15.079	94.824	78.336	78.336	11.455	167.644	133.034	133.034	34.715
	48%	46%	46%	30%	91%	91%	91%	33%	33%	83%	83%	83%	12%	75%	75%	75%	21%

		Patiliera C.I.P. E. 29 settembre 2002 2004 - DEXIA - CREDIOP - OPI - DEFFA BANK T.L.C. Limite d'impegno a decorrere dal 2004; 4,560 mili. € - Nuovo fino a Euro 30.152.000,00 + riserva Euro 5.600.000,00			
		preparata	impegno	estipito	residuo
30/12/2004					
Interventi					
Lettera e) - art. 6 Legge 798/84		13.851	10.527	10.527	1.773
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84		4.923	3.655	3.655	1.351
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84		4.324	4.324	4.324	261
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84		7.054	6.687	6.687	129
rii - art. 5 Legge 159/92					
TOTALE		30.152	25.193	25.193	3.514
			84%	84%	12%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO

30/12/2004	TOTALE LEGGE					TOTALE LEGGE					TOTALE LEGGE					TOTALE LEGGE					TOTALE LEGGE					
	Legge	Art.	Com.	Art.	Com.	Legge	Art.	Com.	Art.	Com.	Legge	Art.	Com.	Art.	Com.	Legge	Art.	Com.	Art.	Com.	Legge	Art.	Com.	Art.	Com.	
Lettera a) - art. 6 Legge 295/04	164.954			162.106	159.922	63.324	57.956	57.956	55.649	185.584	185.584	157.203	88.546	87.342	87.342	71.067	13.626	13.626	13.304	12.747						
Lettera b) - art. 6 Legge 295/04	25.678			24.728	22.175	12.515	10.318	10.318	8.605	39.881	39.881	36.043	24.682	21.513	21.513	17.607										
Lettera c) - art. 6 Legge 295/04	30.393			30.001	22.104	13.572	13.572	12.070		42.506	42.506	24.464	36.759	36.759	36.759	12.148										
Lettera d) - art. 6 Legge 295/04	32.740			31.650	27.700	7.824	6.859	6.859	3.615	19.790	19.790	9.915	17.037	16.711	16.711	7.410										
Art. - art. 5 Legge 295/04	54.437			54.437	53.126	86	86	86	86	17.261	17.261	15.607	26.947	26.947	26.947	13.489										
TOTALE	308.002			302.922	285.037	97.321	88.991	88.991	80.025	305.022	305.022	243.222	195.993	189.272	189.272	121.721	13.626	13.626	13.304	12.747						

LEGGENDA:
 Programmato: intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare
 Impegnato: importi definiti con deliberazione degli organi competenti, Giunta e Consiglio Comunale, l'impegnato può essere assunto solo dopo la stipula del mutuo concernente sulla base del limite di impegno della annualità relativa.
 Obbligato: Contratti di appalto, di compravendita, approvazione graduatorie definitive dei bandi, convenzioni con terzi
 Spese: importi erogati, incasso di cassa

la somma degli interventi finanziati in progetto integrato di non competenza è la quota regionale contribuita al 100% dalle competenze regionali e assegnata al Comune di Venezia ai sensi del 3° comma art. 2 legge 5 febbraio 1992, n. 139

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO

30/12/2004	TOTALE LEGGE			TOTALE LEGGE			TOTALE LEGGE			TOTALE LEGGE			TOTALE LEGGE			TOTALE LEGGE				
	28 dicembre 1998 n. 448	23 dicembre 1999 n. 458	28 dicembre 2000 n. 388	28 dicembre 2001 n. 448	Delibera C.I.P.E. 29 settembre 2002	TOTALE	28 dicembre 2000 n. 388	28 dicembre 2001 n. 448	Delibera C.I.P.E. 29 settembre 2002	TOTALE	28 dicembre 2000 n. 388	28 dicembre 2001 n. 448	Delibera C.I.P.E. 29 settembre 2002	TOTALE	28 dicembre 2000 n. 388	28 dicembre 2001 n. 448	Delibera C.I.P.E. 29 settembre 2002	TOTALE		
Interventi:																				
Lettera a) - art. 6 Legge 298/98	90.591	90.377	88.545	77.046	65.633	30.233	74.184	56.865	35.865	44.566	35.586	35.586	14.832	13.851	10.527	10.527	1.773	825.094	745.280	607.846
Lettera b) - art. 6 Legge 298/98	44.106	43.646	43.646	32.459	16.278	14.940	16.278	10.746	8.508	49.492	27.673	27.673	12.338	4.923	3.655	3.655	1.351	238.700	197.300	144.799
Lettera c) - art. 6 Legge 298/98	22.052	22.052	22.052	11.851	22.401	22.277	12.630	4.448	3.050	23.599	23.399	20.659	6.862	4.324	4.324	4.324	261	200.222	199.538	106.440
Lettera d) - art. 6 Legge 298/98	25.680	24.378	17.605	3.961	9.102	8.442	2.873	10.811	10.160	5.153	1.342	1.342	602	7.054	6.687	6.687	129	158.408	128.619	40.805
rt. - art. 5 Legge 430/92	46.844	46.844	46.844	37.942	22.879	22.879	26.340	26.340	14.886	45.034	45.034	45.034	43	-	-	-	-	239.828	239.828	158.078
TOTALE	229.223	227.297	220.594	154.758	147.706	134.171	74.330	133.920	108.759	167.644	133.034	##	34.715	30.152	25.193	25.193	3.514	1.439.254	1.528.174	1.074.989
	55%	56%	58%	61%	61%	56%	50%	61%	61%	50%	79%	78%	21%	84%	84%	84%	12%	83%	83%	65%

LEGENDA
 Programma: Intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare
 Impegno: impegni definiti con deliberazione degli organi competenti, Giunta o Consiglio Comunale. L'impegno può essere esaurito solo dopo la stipula del nuovo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relativa.
 Obbligate: Contratti di appalto, di compravendita, apprensione graduatoria definitiva dei lavori, convenzioni con terzi.
 Spese: Impiegati erogati, stesche di cassa.

La somma degli interventi indicati al prospetto integrato di non comprende la quota regionale corrispondente al 10% delle competenze regionali e assegnata al Comune di Venezia ai sensi del 2° comma art. 2 legge 8 febbraio 1992 n. 139

Documento E ***Comune di Chioggia***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
— Aggiornamento al 31 dicembre 2004

CITTÀ DI CHIOGGIA

PROVINCIA DI VENEZIA
Cassa del Popolo n. 1193 - 30015 CHIOGGIA

SEGRETERIA COMITATO


SETTORE PROGETTAZIONE E QUALITÀ dell'AMBIENTE

Calle Nordio Marangoni - Chioggia

Tel 041/5534021 - Fax 041/403459

Responsabile del procedimento: Ing. Lucio Napetti


Istruttore del procedimento:



Chioggia, 21.06.2005.

Prot. n. 39612/21.06.2005.

OGGETTO: Legge 798/84 art. 4 comma 4. **Trasmissione dei dati** per la predisposizione annuale della "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia" attuati dal Comune di Chioggia.

ANTICIPATA VIA FAX041 794384

Al

**Magistrato alle Acque di Venezia
Comitato di Indirizzo Coordinamento
e Controllo**

Palazzo X Savi, Rialto

30125 VENEZIA

Si fa seguito alla vostra in data 24 Maggio 2005 Vs. Prot. n. 349/gab avente per oggetto "Richiesta dati" in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della Legge 798/84 per la predisposizione della annuale Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la Salvaguardia di Venezia, trasmettendo in allegato alla presente dettagliati quadri economici aggiornati, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la Legge Speciale per Venezia.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, distintamente.

**Il Dirigente
Ing. Lucio Napetti**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lucio Napetti', written over the typed name.

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NARETTI

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)		CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
COMUNE DI CHILOGGIA - Es. 1992 - ELENCO OPERE PUBBLICHE									
LETTERA "A" ART. 6 LEX 788/84									
1	ACQUISTO PALAZZO GRASSI	1	CS. 1479/6-6-1992	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	100,00%
2	ACQUISTO RESIDENZE ALGA	2	CS. 1480/5-6-1992	626.591,33	626.591,33	626.591,33	626.591,33	626.591,33	100,00%
3	ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI	3	GM. 60/904-36	60.904,36	60.904,36	60.904,36	60.904,36	60.904,36	100,00%
4	MANUTENZIONE INTERNA MUNICIPIO	4	GM. 86/117-5-1995	825.419,23	825.419,23	825.419,23	825.419,23	825.419,23	100,00%
5	RESTAURO PALAZZO GRASSI	5	GM. 89/2-2-1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	100,00%
6	RESTAURO PALAZZO MORARI	6	GM. 91/20-1-1989	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	100,00%
7	RESTAURO EX GRANAO	7	DT. 81/124-05-2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	EX GRANAO - ALLACCIAMENTO ENEL	8	GM. 94/515-10-1997	29.077,60	29.077,60	29.077,60	29.077,60	29.077,60	100,00%
9	EX GRANAO - 1° STRALCIO	9	GM. 94/515-10-1997	737.109,92	737.109,92	737.109,92	737.109,92	737.109,92	100,00%
10	EX GRANAO - 2° STRALCIO (prospettazione)	10	GM. 93/927-05-1999	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84	100,00%
11	RESTAURO EX PALAZZO GRANAO (2° STRALCIO)	11	GM. 41/13-10-2004	344.194,82	344.194,82	344.194,82	344.194,82	344.194,82	100,00%
12	SCUOLA MATERNA PADOAN	12	GM. 86/20-3-1995	114.498,49	114.498,49	114.498,49	114.498,49	114.498,49	100,00%
13	RESTAURO ISTITUTO MAGISTRALE GOLDONI	13	CS. 7/594-12-1993	461.712,47	461.712,47	461.712,47	461.712,47	461.712,47	100,00%
14	RESTAURO SCUOLA ELEMENTARE MARCHETTI	14	CS. 7/594-12-1993	467.909,95	467.909,95	467.909,95	467.909,95	467.909,95	100,00%
15	RESTAURO SCUOLA MEDIA PASCOLI	15	GM. 51/122-3-1995	604.750,37	604.750,37	604.750,37	604.750,37	604.750,37	100,00%
16	RESTAURO SCUOLA ELEMENTARE B. GO S. GIOVANNI	16	GM. 104/74-2-1995	350.312,71	350.312,71	350.312,71	350.312,71	350.312,71	100,00%
17	SCUOLA PASCOLI VARIE ... (Economie Pascoli-Goldoni)	17	VARIE	53.183,56	53.183,56	53.183,56	53.183,56	53.183,56	100,00%
LETTERA "C" ART. 2 LEX 380/81									
18	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	18	GM. 153/45-10-1994	650.735,69	650.735,69	650.735,69	650.735,69	650.735,69	100,00%
19	AMPLIAMENTO MERCATO ITTICO	19	GM. 120/26-7-1995	643.566,23	643.566,23	643.566,23	643.566,23	643.566,23	100,00%
20	SISTEMAZIONE VIA C. COLOMBO	20	GM. 55/71-4-1995	2.571.955,36	2.571.955,36	2.571.955,36	2.571.955,36	2.571.955,36	100,00%
21	RIQUALIFICAZ. VIA MEDEA (Economia Via Colombo)	21	DT. 1350/2-9-2002	193.048,46	193.048,46	193.048,46	193.048,46	193.048,46	100,00%
22	COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI	22	GM. 178/794-1/97/96	533.644,65	533.644,65	533.644,65	533.644,65	533.644,65	100,00%
LETTERA "B" ART. 6 LEX 788/84									
23	URBANIZZAZIONE ZONA TOMBOLA	23	DT. 1436/14-9-1993	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100,00%
24	RIQUALIFICAZIONE VIA MADONNA MARINA	24	GM. 94/7-2-1995	590.402,09	590.402,09	590.402,09	590.402,09	590.402,09	100,00%
25	OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIE	25	GM. 94/7-2-1995	947.669,77	947.669,77	947.669,77	947.669,77	947.669,77	100,00%
26	COMPLETAM. VIA PIGAFETTA	26	CS. 286/14-9-1993	166.177,27	166.177,27	166.177,27	166.177,27	166.177,27	100,00%
27	MURETTO LUNGOMARE COMPLETAMENTO	27	GM. 1189/13-7-1994	46.634,94	46.634,94	46.634,94	46.634,94	46.634,94	100,00%
28	MURETTO LUNGOMARE	28	GM. 290/34-9-93	109.828,59	109.828,59	109.828,59	109.828,59	109.828,59	100,00%
29	PAVIMENTAZIONE CALLI	29	GM. 92/12-2-1997	114.890,55	114.890,55	114.890,55	114.890,55	114.890,55	100,00%
30	GIARDINO CIMITERO SOTTOMARINA	30	GM. 1099/14-9-1995	398.873,17	398.873,17	398.873,17	398.873,17	398.873,17	100,00%
31	PARCHIEGGIO C/O SCUOLA CACCIN	31	GM. 41/12-9-1999	6.373,30	6.373,30	6.373,30	6.373,30	6.373,30	100,00%
32	URBANIZZAZIONE SALONI	32	DT. 1436-15/7/00	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69	100,00%
33	RIPIRISTINO ARGINI STRADA CA' BIANCA	33	DT. 1839/27-1-2000	6.010,67	6.010,67	6.010,67	6.010,67	6.010,67	100,00%
34	FINANZIAM. 3° PERIZIA R.S.A. X ANZIANI	34	GM. 31/8/27-2-2001	25.716,04	25.716,04	25.716,04	25.716,04	25.716,04	100,00%
35	ELIMINAZ. BARR. ARCH. LATO EST. MARCIAPIEDI LUNGO	35	DT. 50/17/18-3-2003	19.766,21	19.766,21	19.766,21	19.766,21	19.766,21	100,00%
36	ACQUISIZ. AREE ANTISTANTI CIMITERO SOTTOMARINA	36	DT. 35/17/19-2-2004	1.763,34	1.763,34	1.763,34	1.763,34	1.763,34	100,00%
LETTERA "C" ART. 6 LEX 788/84									
37	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RESTAURO ABITAZIONI	37	CS. 1481/6-6-1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	100,00%
R I E P I L O G O T O T A L I				16.783.760,68	16.783.760,68	4.888.177,82	16.783.760,67	16.013.976,62	94,03%

IL DIRIGENTE
 Ing. Lucio NARBETTI

COMUNE DI CHILOGGIA - Legge 05-07-1992, N. 139 (2) - Es. 1993 - BIENCO OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDE (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDE)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
LETTERA "A" - ART. 6 LEX 78884									
ACQUISTO COMPENDIO C.R.I.	1	CC.48/11-4-1984	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25		
CONTRIBUTO ASP. PER UFFICI	2	GM.139/06-9-1984	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80		
COMPLETAM. RESTAURO PALAZZO GRASSI	3	GM.47/07-10-1989	413.185,52	0,00		289.558,43	289.558,43		
1° PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	3	GM.48/007-11-00		118.785,09		118.785,09	118.785,12		99,80%
2° PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	3	GM.17/24-4-200		4.822,00		4.822,00	4.822,00		
3° PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	3	GM.11/92/16-10-1986		256.828,71		256.828,71	256.828,71		
RESTAURO PALAZZO RAVAGNAN	4		309.874,14	0,00		166.787,88	166.787,88		
EDIFICI SCOLASTICI	5		61.900,80	61.900,80	61.900,80	61.900,80	61.900,80		
1° SCUOLA MATERNA PADOAN	5	GM.48/020-3-1986		74.557,11		166.787,88	166.787,88		
2° SCUOLA MATERNA MERLIN	5	GM.108/13-1-1986		61.900,80		61.900,80	61.900,80		
3° AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	5	GM.52/74-12-1986		59.251,84		59.251,84	59.251,84		
4° SCUOLA ELEMENTARE MARCHETTI	5	GM.58/22-12-1989		21.953,62		21.953,62	21.953,62		
LETTERA "B" - LEX 78884 - "C" - LEX 38091									
RIQUALIFICAZ. VIA ROMA-P.ZZA BALLARIN	6	GM.85/37-8-1985	894.616,00	871.718,93	460.860,77	871.718,93	871.718,93		
RIQUALIFICAZ. VIA MADONNA MARINA	7	GM.84/7-2-1986	1.217.197,05	1.217.197,05	241.488,51	1.217.197,05	1.217.197,05		
VARIE (ECONOMIA SU VIA ROMA-P.ZZA BALLARIN)	9			22.897,07		22.897,07			0,00%
LETTERA "C" - ART. 6 LEX 78884									
CONTRIBUTI A PRIVATI 4° BANDO - RESTAURO	8	GM.101-10/2/1986	1.120.711,47	1.120.711,47	1.120.711,47	1.120.711,47	1.094.278,55		97,64%
R I E P I L O G O T O T A L I									
			6.536.448,94	6.536.448,94	4.221.683,91	6.536.448,94	6.486.876,98		

IL DIRIGENTE
 Ing. Lucio NAPETTI

COMUNE DI CHILOGGIA - Legge 05-02-1992 n. 139 (31) - Es. 1995 - ELENCO OPERE PUBBLICHE									
LETTERA "A" ART. 8 LEX 788/84	NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
	ACQUISTO IMMOBILE X STRUTTURE COMUNALI			871.393,97	0,00				
	* ACQUISTO AREE EX POLIGONO DI TIRO (M.DIFESA)	1	GM 420/00-08-2002	871.393,97	871.393,97		871.393,97	669.328,14	99,69%
	RESTAURO PALAZZO GRASSI	2	GM 892/2-1986	1.394.433,63	1.394.433,63		1.394.433,63	1.394.433,63	100,00%
	RISTRUTTURAZ. COMPENDIO C.R.I.	3	GM 9282/7-1986	1.187.850,87	0,00				
	* FABBRICATO OVEST EX C.R.I. - 1	3	GM 9282/7-1986		247.103,11	223.109,38	247.103,11	247.103,11	100,00%
	* FABBRICATO OVEST EX C.R.I. - 2	3	DT 726/13-05-2002		940.747,76		940.747,76	940.747,76	100,00%
	LETTERA "B" - LEX 788/84 - "C" - LEX 360/91								
	COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO ANZIANI	4	CC 1889/4-GM 1057/86	1.521.285,71	1.521.285,71	272.100,88	1.521.285,71	1.521.285,71	100,00%
	LETTERA "C" - ART. 8 LEX 788/84								
	CONTRIBUTI A PRIVATI - 4° BANDO RESTAURO	5	GM 1011-10/2/1986	1.394.433,63	1.394.433,63	1.394.433,63	1.394.433,63	1.310.134,05	93,95%
	RIEPILOGO TOTALI			6.169.397,81	6.169.397,81	1.889.643,99	6.169.397,81	6.083.032,40	

IL DIRIGENTE
Ing. LUIGO NAPETTI

COMUNE DI SCHIOGGIA (L. 988/05-02-1992/N. 39/40) ES. 1996 - P. ELENCO OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
LETTERA "A" ART. 8 LEX 78884									
RESTAURO EDIFICI SCOLASTICI	1		413.165,52	7.039,07		7.039,07		0,00%	
• MATERNA - EX COLONIA PADOAN	1	GM.113325-9-1988		344.151,62	313.186,17	344.151,62	344.151,62	100,00%	
• ADEGUAM. CENTRO COTTURA MATERNAPADOAN	1	GM.39012-8-1989		42.865,92		42.865,92	42.865,92	100,00%	
• SCUOLA ELEMENTARE MARCHETTI	1	GM.58272-12-1989		19.108,91		19.108,91	19.108,91	100,00%	
RESTAURO PALAZZO RAVAGNAN	2		361.519,83	125.008,15		125.008,15		0,00%	
• PERIZIA RAVAGNAN	2	GM.52989-02/700		197.690,17		197.690,17	197.690,17	54,71%	
• PROGETTAZ.COMPLET. REST. PALAZZO RAVAGNAN	2	GM.31988-7-1989		48.861,51		48.861,51	48.833,07	99,94%	
RESTAURO BIBLIOTECA (C.A. DI DIO)	3		400.770,55	0,00					#DIV/0!
• RESTAURO BIBLIOTECA (C.A. DI DIO)	3	GM.67823-4-1988		398.431,06	395.540,59	398.431,06	398.431,06	100,00%	
• PREVENZ.INCENDI BIBLIOTECA (CA' DI DIO)	3	DT.198225-12-2004		2.339,49		2.339,49			
RESTAURO EX MACELLO A CITTA DELLA GIUSTIZIA	4 (317740)	GM.11473-4-1988	1.575.193,54	1.575.193,54	1.317.702,88	1.575.193,54	1.575.193,54	100,00%	
ADEGUAMENTO IMPIANTI ABITAZIONI	5	GM.643268-12-1989	348.091,95	348.091,95		348.091,95	348.091,95	100,00%	
LETTERA "B" LEX 78884 - C' LEX 30091									
SISTEMAZIONE VIA MADONNA MARINA	6	GM.547-2-1989	516.456,90	464.811,21		516.456,90	288.665,98	57,80%	
REALIZZAZ. STRUTTURE POLIFUNZIONALI - FITNESS	7	GM.5084-11-1988	596.611,01	596.611,01	134.162,78	596.611,01	596.611,01	100,00%	
URBANIZZ.V. VENETO-P. TODARO, C. STORICO SOTTOM.	8	GM.9124-2-2000	642.865,55	642.865,55		642.865,55	642.865,55	100,00%	
LETTERA "D" LEX 30091									
CONTRIB. A PRIVATI ACQUISTO 1° CASA - 2° BANDO	9	GM.3124-2-1996	774.665,35	774.665,35	774.665,35	774.665,35	774.665,35	100,00%	
LETTERA "C" LEX 78884									
CONTRIBUTI A PRIVATI - X RESTAURO - 4° BANDO	10	GM.1011-10/12/1996	568.102,99	568.102,99	568.102,99	568.102,99	465.126,12	81,87%	
RIEPILOGO TOTALI			6.187.482,78	6.145.837,10	2.317.379,56	6.187.482,78	5.768.659,92		

IL DIRIGENTE
 Ing. Lucio NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 20-12-1995 N. 539 (L. 1) - Es. 1996 - EL ENCO OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
LETTERA "A" ART. 8 LEX 788/84									
ACQUISTO RESTAURO IMMOBILE CAMPO ROMA	1	GM. 8/1720-5-1986	516.456,90	0,00		343.443,84	343.443,84	66,52%	0,00%
• ACQUISTO IMMOBILE CAMPO ROMA PROVINCIA PD	1	GM. 8/1720-5-1986		343.443,84	343.443,84	343.443,84	343.443,84	66,52%	0,00%
• RISTRUTT. IMMOBILE DUOMO 38 - AUTORIMESSA PALAZZO GRASSI	2	DT. 1/4217-9-2002	774.895,35	173.013,06		173.013,06	168.368,65	97,32%	0,00%
• RESTAURO PALAZZO GRASSI	2	GM. 8/8998 - GM. 17/401		774.895,35	201.297,91	774.895,35	774.895,35	100,00%	0,00%
• RESTAURO EDIFICI SCOLASTICI	3	DT. 4/6205-03-2002	671.393,97	0,00		93.086,43	71.502,99	76,83%	0,00%
• SCUOLE ELEMENTARI - 2° SINGOLO	3	DT. 4/6205-03-2002		93.086,43		93.086,43	71.502,99	76,83%	0,00%
• SCUOLE ELEMENTARI - 4° SINGOLO	3	DT. 1/1921-11-2002		578.327,54		578.327,54	504.542,10	87,24%	0,00%
• RESTAURO EDIFICI COMUNALI	4	DT. 1/1921-11-2002	297.992,55	0,49		0,49	0,49	0,00%	0,00%
• FINANZIAM. PARTE 3° PERIZIA PALAZZO GRASSI	4	GM. 17/424-4-2001		51.645,69		51.645,69	51.645,69	100,00%	0,00%
• RESTAURO PALAZZO MORARI - PAVIMENTAZIONE	4	DT. 1/8776-12-2001		19.939,92		19.939,92	19.939,92	100,00%	0,00%
• RESTAURO PALAZZO MORARI - FINANZ. NUOVO O.E.	4	DT. 7/3714-05-2002		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00%
• FINANZIAM. 2° PERIZIA RESTAURO EX MACELLO	4	GM. 5/9520-12-2001		77.468,53		77.468,53	77.468,53	100,00%	0,00%
• COMPLETAM. RECINZIONE E SOLAIO EX MACELLO	4	DT. 1/3805-02-2002		25.669,61		25.669,61	25.669,61	100,00%	0,00%
• INVESTIM. AULA - UDENZE PENALI EX MACELLO	4	DT. 6/9317-4-2002		5.008,85		5.008,85	5.008,85	100,00%	0,00%
• STANZA SERVER CITTADELLA EX MACELLO	4	DT. 1/21001-06-2002		35.200,00		35.200,00	35.200,00	100,00%	0,00%
• ARREDO BAGNI - CITTADELLA GIUSTIZIA EX MACELLO	4	DT. 2/13317-12-2002		4.565,97		4.565,97	4.565,97	100,00%	0,00%
• RISTRUTT. EX CHIESA S. M. LOURDES - SCAMI E RIMOZ.	4	DT. 1/4205-02-2002		5.112,92		5.112,92	5.112,92	100,00%	0,00%
• RIPASSO TETTO ALLOGGIO COO CIMITERO CHIOGGIA	4	DT. 3/2605-03-2002		17.766,77		17.766,77	17.766,77	100,00%	0,00%
• ULTERIORI LAVORI URGENTI SCALA NORD MUNICIPIO	4	DT. 8/1802-DT. 1/15002		12.413,58		13.413,58	11.995,12	89,43%	68,23%
• IMPIANTO ALLONTANAM. PIZIONI MUNICIPIO	4	DT. 6/95-134/103		4.680,23		4.680,23	4.680,23	100,00%	0,00%
• TARGA COMMEMORATIVA PRESSO MUNICIPIO	4	DT. 1/00024-05-2005		17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,00%	0,00%
MANUTENZIONE MUNICIPIO	5		238.228,45	0,00					
• BARRIERE ARCHIT. E ASCENSORE MUNICIPIO	5	GM. 3/006-7-1999		154.937,07	128.499,23	154.937,07	129.176,47	83,37%	63,37%
• UFFICI TRIBUTI-ECONOMATO COO MUNICIPIO	5	GM. 1/099-3-2000		54.566,67		54.566,67	54.386,98	99,68%	99,63%
• IMPIANTI ELETTRICI UFF. TRIBUTI-ECONOMATO	5	DT. 1/388/19-10-2000		5.091,90		5.091,90	5.091,90	100,00%	0,00%
• UFF. URBANISTICA-TRIBUTO-ECONOMATO	5	DT. 1/90728-12-2000		6.086,59		6.086,59	6.086,59	100,00%	0,00%
• LAVORI URGENTI SCALA NORD PALAZZO MUNICIPALE	5	DT. 3/5207-03-2002		2.672,35		2.672,35	2.672,35	100,00%	0,00%
• SCALA NORD PALAZZO MUNICIPALE	5	DT. 8/1802-11/5002		34.853,88		34.853,88	34.853,88	100,00%	0,00%
• RESTAURO EX CHIESA S. MARIA DI L. LOURDES	6	GM. 5/842-12-1989	384.102,11	384.102,11		384.102,11	359.630,23	93,63%	98,77%
• URBANIZZAZ. VIA VENETO-P.ZZA TODARO, C. STORICO	7	GM. 9/124-2-2000	516.456,90	516.456,90		516.456,90	516.456,90	100,00%	100,00%
LETTERA "C" ART. 8 LEX 788/84									
CONTRIB. A PRIVATI 4° BANDO RESTAURO ABITAZIONI	8	GM. 1/011-10/12/1996	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	326.737,05	63,27%	63,27%
LETTERA "D" ART. 2 LEX 360/97									
CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO 1° CASA	9	GM. 3/124-02-1988	1.549.370,70	0,00		1.367.940,39	1.123.284,29	85,72%	82,72%
CONTRIB. PRIVATI ACQUISTO 1° CASA - 2° BANDO	9	CC. 8/609-10-2001		181.430,32	181.430,32	181.430,32	149.497,83	82,40%	82,40%
CONTRIB. PRIVATI ACQUISTO 1° CASA - 3° BANDO	9								
R I E P I L O G O T O T A L I			5.465.143,83	5.465.143,83	2.739.088,58	5.465.143,83	4.849.467,07		

ing. Lucio NARETTI
IL DIRIGENTE

• CENTRALINO TELEFONICO COMANDO VIGILI URBANI	7 (1371)	DT 2222/17-12-2003	8.838,00	8.838,00	100,00%
• RESTAURO / ADEGUAM. UFFICI - Servizio ELIA Alenteo	7 (1371)	DT 1302/29-7-2003	23.523,98	23.523,98	100,00%
• DIPINTURA EX UFF. TRIBUNALE CO MUNICIPIO	7 (1371)	DT 1321/14-09-2003	13.362,54	13.362,54	100,00%
• PAVIMENTAZ. UFFICI SETTORE LL.PP.	7 (1371)	Del. 1180/22-06-2004	2.732,40	2.732,40	100,00%
• ADEGUAM. SICUREZZA E MATERIA MAGMASUTTI	7 (1371)	DT 1200/24-09-2004	7.856,40	7.856,40	100,00%
• RISTRUTTURAZ. EDIFICIO EX ARCI SOTTOMARINA	7 (1372)	GM 6804-01-2002/04	250.000,00	250.000,00	100,00%
• EX ARCI SOTTOMARINA - SERVICE PROGETTO	7 (1371)	DT 1390/18-8-2003	9.815,29	9.815,29	100,00%
• ASP / REFRIGERATORI CED E UFFICI VARI	7 (1371)	DT 1824/22-10-2004	42.480,00	42.480,00	100,00%
• TELECOM / ADEGUAM. IMPIANTI TELEFONICI VARI	7 (1371)	pp. 81/250/12005	63.120,00	63.120,00	100,00%
LETTERA "B" - LEX 788/84 - ART. 6					
LUSENZO INTERNO - ACCORDO MAG. ACQUE VE	8 (70-1400)	GM 5280/11-11-1989	5.164.568,99	5.164.568,99	45,19%
PROLUNGAMENTO LUNGOMARE	9 (71-1420)	CC 5622-7-1989	2.052.916,17	2.052.916,17	100,00%
STRUTTURE POLIFUNZIONALI - FITNESS (ESPROPRI)	10 (74-1460)	GM 5084-11-1988	1.032.913,80	1.032.913,80	31,89%
CANALE DELLA CAVA - ACCORDO MAG. ACQUE VE	11 (80-1200)	GM 5271/11-11-1989	426.076,84	426.076,84	100,00%
URBANIZZAZ. VIA VENEZIA/PIZZA TODARO C. STORICO	12 (75)		0,00	0,00	
• RIFINANZIAM. APPALTO 10 MLD	12 (1500)	GM 9100-07-85301	1.074.230,35	1.074.230,35	100,00%
ACQUISIZIONE AREA ENI A CA' LINO	18 (76-1820)	GM 439/13-10-2000	526.786,04	526.786,04	100,00%
OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA SALONI	19 (72-1440)	DT 1436-1577/00	206.582,76	206.582,76	100,00%
URBANIZZAZIONE - ACQUEDOTTO	13 (77)		0,00	0,00	
• FINANZIAM. ASP - CONDOTTE RETE ACQUEDOTTO	13 (1542)	GM 1447/29-3-2000	397.071,81	397.071,81	100,00%
• RETE IDRICA CANAL DI VALLE	13 (1541)	GM 337-2-2001	166.289,12	166.289,12	100,00%
• POTABILIZZAZIONE CAVANELLA	13 (1540)	GM 77/6-3-2001	338.228,64	338.228,64	100,00%
RIQUALIFICAZ. VIE BOSCHETTO - TIRRENO	14 (78)		774.895,35	774.895,35	99,45%
• FORNITURA E POSA TERRENO GIO FITNESS	14 (1560)	GM 85/6-3-2001	73.853,34	73.853,34	55,02%
CHIMTERO DI SOTTOMARINA	15 (73-1460)		13.000,00	13.000,00	100,00%
LETTERA "C" - LEX 788/84 - ART. 8					
CONTRIBUTI A PRIVATI 4° BANDO RESTAURO ABITAZ.	16 (61/1220)	GM 37/28-1-1987	2.169.118,98	2.169.118,98	100,00%
TOTALI			28.769.271,71	7.943.995,25	28.954.500,16
RIEPILOGO			28.769.271,71	7.943.995,25	17.369.549,62

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 04-10-1996 N. 515 (2*) - Es. 1998 - ELENCO OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	P. PROGRAMMA	IMPORTO	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" - LEX 789/84 - ART. 6									
ACQUISTO RESTAURO COMPENDIO SAN FELICE	13 (82)	GM 187/05-DT. 198/04	3.615.198,29	1.441.719,29	1.441.719,29	0,00	1.441.719,29	45.834,65	0,00%
CONSERV. E RESTAURO COMPENDIO S. FELICE	13 (82/1640)	DT. 428/4-3/2004	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	24.480,00	10,19%
OASI SAN FELICE - Consulenza dal Gesso Gianni	13	GM 225/02-05-2004	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00	24.480,00	37.430,79	153,76%
INFRASTRUTTURE OASI DI SAN FELICE	13 (82/1641)	GM 225/02-05-2004	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00%
PISTA CICLABILE LUSENZO LONGOMARE - 1° Str. (parte)	13 (1642)	GM 257/18-08-2004	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
INTERV. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (M.Indice)	1 (84)	DT. 198/18-12-2001	1.162.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADEGUAMENTO MERCATO ITTICO - Progettazione	1	GM 549/17-12-2002	48.701,89	48.701,89	48.701,89	0,00	48.701,89	18.511,60	38,21%
ACQUISTO BOX CO ISOLA UNIONE	1	GM 549/17-12-2002	18.700,80	18.700,80	18.700,80	0,00	18.700,80	14.000,00	74,87%
LAVORI COMPLETAM. BOX MITICO	1	DT. 153/16-10-2002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	43.670,03	312,00%
ADEGUAM. IGIENICO-SANITARIO MITTICO	1 (84/1683)	GM 289/03-Del.17/08/04	1.080.625,33	1.080.625,33	1.080.625,33	0,00	1.080.625,33	0,00	0,00%
ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI	14	CC. 35/10-04-2002	258.228,44	185.928,44	185.928,44	0,00	185.928,44	0,00	0,00%
IMMOBILE DI CALLE VIANELLI 1011	14	DT. 11/03/00-6-2003	72.300,00	72.300,00	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00%
REALIZZAZ. DI STRUTTURE PER CITTADINI DISABILI	15 (85/1700)	DT. 11/03/00-6-2003	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	85.189,59	1.291.142,25	941.142,07	72,89%
REST. CONSERV. TORRE GARIBOLDI-PORTA S.MARIA	2	DT. 78/02-05-2001	413.185,52	222.076,47	222.076,47	120.771,48	181.089,05	184.200,27	85,93%
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (1-2)	3 (81)	DT. 14/11-2-2001	1.746.228,53	2.495,74	2.495,74	0,00	2.495,74	0,00	0,00%
SCUOLA ELEMENTARE DI S. ANNA	3 (1620)	GM 27/04-DT. 486/04	565.606,33	565.606,33	565.606,33	519.072,22	565.606,33	563.689,29	99,64%
MANUTENZ. STRAORD. ELEMENTARE DON MILANI	3	DT. 19/06/02-7/20/03	515.276,79	515.276,79	515.276,79	0,00	515.276,79	415.596,11	80,65%
COMPLETAM. RECINZ. LATO SUD ELEM. DON MILANI	3	DT. 4/02-05-2002	371,20	371,20	371,20	0,00	371,20	0,00	0,00%
SCUOLE ELEMENTARI - 2° Sirobio	3	DT. 4/02-05-2002	73.590,92	73.590,92	73.590,92	0,00	73.590,92	0,00	0,00%
MANUTENZ. EDIFICI SCOLASTICI - MEDIE - 3° Sirobio	3	DT. 7/7/20-05-2002	313.360,81	313.360,81	313.360,81	0,00	313.360,81	259.142,02	82,70%
MANUTENZ. EDIFICI SCOLASTICI - ELEM. MEDIE-4° Sirobio	3	DT. 19/2/11-11-2002	149.536,74	149.536,74	149.536,74	0,00	149.536,74	0,00	0,00%
TINTEGGIATURA/SERRAMENTI ELEM. MARCHETTI	3 (1627)	DT. 11/2/04-07-2003	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	107.741,32	84,17%
LETTERA "B" - LEX 789/84 - ART. 6									
AREA 2/C1-3A/C1 COSTRUZ. SC. MATERNA	4 (807/600)	GM 387/28-7-1998	1.136.205,16	1.136.205,16	1.136.205,16	3.269,17	1.136.205,16	955.616,08	84,12%
SISTEMAZ. CAMPO MARCONI - SACCA S. FRANCESCO	6 (89)	GM 419/05-DT. 10/10/4	774.695,35	774.695,35	774.695,35	0,00	774.695,35	534.840,81	69,01%
ARREDO URBANO RIVA LUSENZO E CAMPIELLI	6 (89)	DT. 13/1/98-27/9/98-14/7/00	0,00	604.416,07	604.416,07	560.798,13	604.416,07	563.324,65	93,20%
SISTEMAZIONE RIVA LUSENZO DIFESA ACQUE ALTE	6 (89)	DT. 8/9/07-6-2002	480.143,42	480.143,42	480.143,42	39.695,65	480.143,42	480.143,42	100,00%
ARREDO URBANO RIVA LUSENZO E CAMPIELLI	6 (89/1781)	DT. 457/20-3-2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	414.021,36	516.456,90	515.196,69	99,75%
SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO DI VALLI	16	DT. 72/04/04-04-2002	258.228,45	258.228,45	258.228,45	34.072,51	258.228,45	258.325,69	99,28%
ADEGUAMENTO CIMITERI DI S. ANNA E CAVANELLA	17	DT. 18/5/20-12-2000	103.291,38	10.883,38	10.883,38	3.088,74	103.291,38	10.883,38	10,54%
ADEGUAMENTO DI VIA MARCO POLO	7	DT. 15/4/97-07-01	154.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESTAURO PORTICI	19	DT. 12/43/17-5-2001	146.435,73	146.435,73	146.435,73	88.945,34	146.435,73	146.435,74	100,00%
1° LOTTO-1° STRALCIO RESTAURO PORTICI-CHIOGGIA	19	Del. 44/20/03-03-2004	8.501,34	8.501,34	8.501,34	0,00	8.501,34	240,00	2,82%
2° LOTTO-2° STRALCIO RESTAURO PORTICI-CHIOGGIA	18	DT. 14/3/02-10-2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	458.072,12	516.456,90	516.456,90	100,00%
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "SALONI"	8	DT. 11/02-17/2/02	258.228,45	258.228,45	258.228,45	32.498,36	258.228,45	258.228,45	100,00%
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "CANTIERI"	9 (81/1620)	DT. 18/5/20-12-2000	258.228,45	258.228,45	258.228,45	198.337,45	258.228,45	258.228,45	100,00%
OPERE URBANIZZ. PRIMARIA BORGO SAN GIOVANNI	19	DT. 18/5/20-12-2000	1.136.205,18	1.136.205,18	1.136.205,18	0,00	1.136.205,18	0,00	0,00%
RILOCALIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LETTERA "D" - LEX 360/87 - ART. 2									
CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO 1° CASA	12	GM 31/24-2-1989	2.065.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FINANZIAM. 2° BANDO ACQUISTO 1° CASA	12	CC. 96/08-10-2001	353.256,52	353.256,52	353.256,52	0,00	353.256,52	353.256,52	100,00%
FINANZIAM. 3° BANDO ACQUISTO 1° CASA	12	CC. 96/08-10-2001	1.712.571,08	1.712.571,08	1.712.571,08	0,00	1.712.571,08	1.415.498,09	82,65%
TOTALI									
RIEPILOGO TOTALI			16.751.301,45	15.522.683,27	15.522.683,27	4.613.578,72	16.751.301,45	9.123.504,08	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAFEM

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 02-10-1997, N. 345 (1*) - Es. 1998 - ELENCO OPERE PUBBLICHE

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" - LEX 789/04 - ART.6								
IMMOBILI X ESIGENZE SOCIO-CULTURALI ABITATIVE	1 (98)		1.119.653,78	6.519,41		6.519,41		0,00%
* MANUTENZ.ADEGUAM. EDIFICI USO ABITATIVO	1	GM/643208-12-1989	659.534,28	497.125,37	497.125,37	659.534,28	659.534,27	100,00%
* LAVORI SOMMA URGENZA VIA BARBARIGO 101	1	GM.14729-3-2000	145.211,89	145.842,06	145.211,89	145.842,06	145.842,06	100,00%
* LAVORI URG. LATO NORD FABBR. BARBARIGO 101	1	GM.19320-04-2000	128.984,90	128.984,90	128.984,97	128.984,90	128.984,91	100,00%
* IMPIANTISTICA/OPERE EDILI FABBR. BARBARIGO 101	1 (1)	GM.16918-4-2003	68.886,89	68.886,89	68.886,89	68.886,89	68.886,89	100,00%
* FORNITURA / POSA BOX 60 CONDOMINIO S. MONICA	1	DT.1331/08-08-2003	14.795,00	14.795,00	14.795,00	14.795,00	14.795,00	100,00%
* CONDOM.S. MONICA 101 / TRASFERIM. INQUILINI	1	DT.178403-09-19/04	43.222,24	43.222,24	43.222,24	43.222,24	43.222,24	100,00%
* MANUTENZ.EDIFICIO CHIOGGIACA ROSSA CIV. 180	15 (09)	DT.2202/15-12-2003	53.899,00	53.899,00	638.340,73	53.899,00	53.899,00	100,00%
* ACQUISIZ. E RESTAURO COMPLESSO CORTE SALASCO	2 (109)	GM.4401/13-10-2000	630.340,73	630.340,73	638.340,73	638.340,73	638.340,73	100,00%
* ACQUISIZ.RESTAURO ORATORIO NOSTRA SIGNORA	2		1.032.913,80	537.115,18	537.115,18			0,00%
* COMPLETAMENTO REASTAURO PALAZZO GRANAIO	3 (109)	GM/31723-7-1999	1.549.370,70	495.798,62	495.798,62	495.798,62	495.798,62	100,00%
* MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4 (97)		516.456,90	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70		0,00%
* SCUOLE ELEMENTARI - 1° Stralcio	4	DT.41/01/03-30/02	400.118,93	400.118,93	297.283,58	400.118,93	394.826,50	98,68%
* SCUOLE ELEMENTARI - 2° Stralcio	4	DT.4623-03-2002	116.337,97	116.337,97	99.632,87	116.337,97	116.337,97	100,00%
* RESTAURO ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO CHIOGGIA	5 (107)	GM/10895-3-2000	154.937,07	154.937,07	153.864,21	154.937,07	154.937,07	100,00%
LETTERA "B" - LEX 789/04 - ART.6								
RESTAURO STADIO "BALLARIN"	6 (108)		184.405,35	0,00		0,00		0,00%
* RECINZIONE E TRIBUNA LATO EST STADIO BALLARIN	6	GM/597/5-8-1989	46.072,65	46.072,65	46.501,78	46.072,65	45.536,03	98,84%
* TRIBUNA EST-RECINZIONE NORD STADIO BALLARIN	6	GM/3612-2-1989	31.292,15	31.292,15	31.553,82	31.292,15	31.162,22	99,58%
* COMPL. RECINZ. E VARIE STADIO BALLARIN	6	VARIE	87.040,55	87.040,55	78.317,90	87.040,55	78.317,90	89,98%
* COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE	7 (109)		184.776,80	0,00		0,00		0,00%
* RECINZIONE PISCINA COMUNALE	7	GM/1687/5-1989	175.595,35	175.595,35	174.295,20	175.595,35	174.295,20	98,28%
* PAVIMENTAZ. ESTERNA PISCINA	7	DT.119/11/19-8-2000	9.181,45	9.181,45	9.181,45	9.181,45	9.181,45	100,00%
INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	16 (284)		332.211,82	147.211,82	147.211,82	148.787,55	148.787,55	100,00%
* MANUTENZ. CAMPI TENNIS RIDOTTO MADONNA	13 (110)	GM.3990/04-DT.1859/04	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
* AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	14 (111)	DT.143/12-2001	516.456,90	516.456,90	361.519,83	516.456,90	511.006,50	98,94%
* ADEGUAMENTO CIMITERI S. ANNA E CAVANELLA	8 (109)	DT.7241/05-2002	361.519,83	361.519,83	3514,61	361.519,83	348.707,22	98,46%
* OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONI	8	VARIE	27.406,17	27.406,17	27.406,17	27.406,17	1.963,82	71,66%
* ILLUMINAZIONE VIA PRIULA	8	GM/459/00-9-1989	83.046,27	83.046,27	63.187,11	83.046,27	63.520,71	76,62%
* ILLUMINAZIONE CANAL DI VALLE	8	GM/502/26-10-1989	168.717,99	168.717,99	167.817,29	168.717,99	168.717,99	100,00%
* PROGETTAZIONI VARIE	8	VARIE	191.089,05	191.089,05	171.084,72	191.089,05	191.071,19	99,99%
* OPERE URBANIZZ. PRIMARIA FRAZIONE S. ANNA	8	DT.1227/14-8-2001	277.698,87	277.698,87	277.698,87	277.698,87	277.698,87	100,00%
* REALIZZAZIONE 2° AREA VERDE A VALLI (pietre)	8	DT.1043/07-06-04	26.727,00	26.727,00	26.727,00	26.727,00	26.727,00	100,00%
* OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "CANTIERI"	9 (101/2020)	DT.1102-17/2-002	258.228,45	258.228,45	258.228,45	258.228,45	258.228,45	100,00%
* OPERE URBANIZZ. PRIMARIA "B.G. SAN GIOVANNI"	10 (102)		1.097,17	1.097,17	1.097,17	1.097,17	1.097,17	100,00%
* SISTEMAZ. VIABILITA' B.S.G. - CAVALCAVIA	10	DT.1935/20-12-2000	169.333,61	169.333,61	169.333,61	169.333,61	169.333,61	100,00%
* SERVICE TECNICO ADEGUAM. VIA TURATI B.S.G.	10	DT.1934/23-8-2000	2.835,35	2.835,35	2.835,35	2.835,35	2.835,35	100,00%
* ALLARGAM. SISTEMAZ. VIA TURATI B.S.GIOVANNI	10	DT.1343/13-9-2001	81.359,10	81.359,10	81.359,10	81.359,10	81.359,10	100,00%
* SERVICE TECNICO - OPERE VARIE B.S.GIOVANNI	10	DT.1232/14-9-2001	3.603,22	3.603,22	3.603,22	3.603,22	3.603,22	100,00%
* OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "SALONI"	11 (109)		508.842,45	103.842,17	103.842,17	103.842,17	103.842,17	100,00%
* OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "SALONI"	11 (100/2000)	DT.1436-15/7-00	258.914,76	258.914,76	258.914,76	258.914,76	258.914,76	100,00%
* SERVICE BENINI M. - PONTE CIN LOMBARDO	11 (100/2001)	DT.98/04-06-2003	10.893,60	10.893,60	10.893,60	10.893,60	10.893,60	100,00%
* MESSA A NORMA ALLACCIAM.FOGNARI SALONI	11 (100/2002)	DT.1337/06-08-2003	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	131.702,81	99,77%
* VARIE SALONI / Enti erogatori	11 (100/2003)	VARIE	2.577,92	2.577,92	2.577,92	2.577,92	2.577,92	100,00%
LETTERA "C" - LEX 789/04 - ART.6								
RFINANZIAMENTO 3° BANDO - 1° CASA PRIVATI	12 (104)	CC.98/09-10-2001	1.807.599,14	1.807.599,14	1.807.599,14	1.807.599,14	1.439.206,10	79,62%
R I E P I L O G O T O T A L I			10.168.013,52	8.618.642,82	5.269.682,83	10.168.013,52	7.334.810,66	

ing. Lucio NAPETTI
DIREGENTE

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 02-10-1997 N. 345 (C.A. Es. 1999) - ELENGO OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI PALAZZO CALLE LUCCARINI (EX CASERMA CC)	1		516.456,90	0,00		516.456,90	560.355,74	72,98%	
ACQUISTO EX CASERMA CARABINIERI	2	GM 95/18-2-1999	1.892.538,22	560.355,74	990.355,74	500.355,74	1.011.583,63	72,98%	
RISTRUTTURAZ. EX CASERMA CARABINIERI	2 (1192321)	DT 84/320-06-2001		1.386.033,98	104.319,11	1.386.033,98	16.146,50	95,69%	
VARIE - EX CASERMA CARABINIERI	2 (1192322)	DT 43/501-0F-15/3801		16.146,50	16.146,50	16.146,50	1.581.420,58	95,69%	
COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO RAVAGNAN	3 (1172340)	DT 2.18/99-2-2001	1.652.662,08	1.652.662,08	17.134,39	1.652.662,08	1.833,22	34,71%	
ACQUISIZIONE RESTAURO IMMOBILE EDILIZIA ABITATIVA	4 (119)	DT 2.892/158-83	2.892.158,83	5.281,96	1.833,22	5.281,96	118.530,70	100,00%	
MANUT. ADEGUAM. IMMOBILE CLE FURLANETTO 760	4	DT 366/08-03-2002		118.530,70	1.248,21	118.530,70	26.867,68	55,39%	
MANUTENZ. ADEGUAM. IMMOBILE CLE GRASSI 1069	4	DT 459/11-3-2003		26.867,68		26.867,68	118.311,90	100,00%	
INDAGINE STATICA IMMOBILI SU COMUNALI	4	DT 330/28-2-2001		118.311,90	69.797,63	118.311,90	73.960,76	100,00%	
LAVORI SOMMA URGENZA IMMOBILE R. DUOMO 39	4	DT 323/28-2-2001		73.960,76	40.962,88	73.960,76	215.372,03	100,00%	
IMPIANTISTICA OPERE EDILI FABBR. BARBARICO 101	4	DT 1022/10-7-2001		215.372,03	214.399,51	215.372,03	276.953,31	100,00%	
RISTRUTTURAZ. EDIFICIO IN CA. BIANCA, CIV. 34	4 (1192286)	GM 17/003-DT-11/04/03		270.318,85		270.318,85	438.988,36	98,74%	
ACQUISTO IMMOBILE DI CALLE GRADARA 309	4	CC 90/25-01-2001		438.988,36		438.988,36	8.912,74	100,00%	
SISTEMAZ. COPERTURA IMMOBILE CLE GRADARA 309	4	DT 239/28-02-2003		8.912,74		8.912,74	202.192,86	100,00%	
ACQUISTO IMMOBILE SOTTOMARINA 110 (Scegnè)	4	GM 3/02-CC-1/21-12-02		202.192,86		202.192,86	13.424,22	98,74%	
PROGETTAZ. RISANAM. IMMOBILI X RESIDENZA	4	DT 737/13-05-2002		13.424,22		13.424,22	173.563,47	100,00%	
RESTAURO EDIFICIO IN LOCALITA' PUNTA POLI 60	4	DT 184/9/18-11-2002		174.010,26	12.595,83	174.010,26	323.031,35	100,00%	
RISTRUTTURAZ. EDIFICIO IN LOCALITA' S. ANNA	4	DT 167/03-02-2003		323.031,35	3.116,17	323.031,35	20.558,92	0,00%	
OPERE MURARIE ALLOGGIO CAVANELLA DADIGE 9	4	DT 659/14-4-2003		20.558,92		20.558,92	551.000,00	0,00%	
ACQUISTO RESTAURO. IMMOB. CLE PONTE SCARPA	4	CC 11/95-12-2002		551.000,00		551.000,00	21.120,00	100,00%	
IMPIANTI ELETTRICO-RISCALDAM. VIA FOSSETTA 43	4	DT 241/06-2-2004		21.120,00		21.120,00	28.094,88	5.627,93	
IMMOBILE PUNTA POLI 60 - TRASFERIM. INQUILINI	4	DT 1330-DT-14/99/03		28.094,88		28.094,88	717.823,12		
VARIE - FABBRICATI RESIDENZIALI	4	Del 42/02-03-05		5.627,93		5.627,93			
RESTAURO DEL PALAZZO GRANAIO	12 (277/5540)	GM 41/31-10-2004	717.823,12			717.823,12			
LETTERA 'A' - LEX 78864 - ART. 6									
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONI	5		2.065.827,59	107.998,49		107.998,49	458.721,43	84,19%	
RIQUALIFICAZ. C. STORICO "CIVANELLA"	5	DT 190/28-12-2000		544.862,03	449.969,66	544.862,03	805.217,92	95,07%	
RISANAM. AMB. SCLOLO FOSSON A "S. ANNA"	5	GM 64/189-DT-27/2/03		846.986,31	333.805,66	846.986,31	236.987,02	100,00%	
IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA FRAZIONI	5	DT 185/28-12-2000		236.987,02	233.292,08	236.987,02	282.807,38	94,34%	
OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA S. ANNA	5	DT 1227/14-9-2001		310.374,07	143.046,20	310.374,07	2.082,35	87,81%	
URBANIZZAZ. FRAZIONI - INTERVENTI VARI	5	VARIE		18.616,67	2.082,35	18.616,67	51.845,69	36,17%	
RIQUALIF. URBANA-AMBIENTALE DI ISOLA VERDE	5	DT 1457/10-9-2002		671.393,97	38.976,10	671.393,97	30.053,00	90,51%	
STUDI SUL TERRITORIO (Nuovo Cimiero)	5	GM 45/28-10-2000		51.845,69	51.845,69	51.845,69	219.817,32	91,79%	
OPERE URBANIZZ. PRIMARIA B.G. SAN GIOVANNI	5	DT 1343/13-9-2001		78.742,53	28.897,14	78.742,53	41.823,68	97,50%	
SISTEMAZIONE DI VIA TURATI - B.S. GIOVANNI	5	GM 10/10-DT-132/5/02		242.863,86	2.212,50	242.863,86	10.982,40	76,37%	
CAMP. CALCIO A.S. - SISTEMAZ. AREA A VERDE	7 (114/2281)	DT 60/23-01-2002		11.264,00	41.359,44	11.264,00	67.852,42	77,31%	
LAVORI DI ILLUMINAZ. STRADA DEL PORTO	8 (114/2282)	DT 37/11-03-2002		51.135,95		51.135,95	15.800,92	94,77%	
SEGATO G. - MARCIAPIEDI QUARTIERE PRIMAVERA	8 (114/2283)	DT 37/11-03-2002		11.264,00		11.264,00	1.118.369,86	90,69%	
SISTEMAZ. ARREDO URB. QUARTIERE PRIMAVERA	8 (114/2283)	DT 17/104-DT-18/10/05		390.679,01		390.679,01	204.564,79	90,69%	
SPORTAMENTO CAMPO SPORTIVO ISOLA-UNIONE	9 (120)	VARIE	516.456,90	88.695,16		516.456,90	80.164,05	28.430,55	
ACCORDI PROGRAMMA MAGISTRA TO ACQUEVE	9 (120)	GM 2/03-06-04-2002	2.502.284,50	1.057.083,83		1.057.083,83	65.719,02	90,69%	
OPERAZIONE DIFESA SOTTOMARINA Prolungamento	9 (1202/400)	DT 192/18-11-2003		1.057.083,83		1.057.083,83	28.430,55	94,77%	
DIFESA ABITATO CHIOGGIA 1 STR. - F. S. DOMENICO	9	DT 150/26-8-2001		19.831,94	15.800,92	19.831,94	1.118.369,86	94,77%	
MARGINALI. ISOLE UNIONE/BUON CASTELLO	9 (1202/403)	GM 20/03-06-04-2002		1.118.369,86	761.542,63	1.118.369,86	204.564,79	90,69%	
INTERVENTI FOCI FIUMI BRENTA-ADIGE 2003-2004	10	DG 41/326-9-2003		216.000,00		216.000,00	65.719,02	90,69%	
STUDI E RICERCHE (2%)	10	GM 106/25-03-1999		-0,01		-0,01	80.164,05	28.430,55	
FONDO PROGETTAZ. URBANISTICA (LEX 10994 - 1%)	10	GM 65/2/98-DT-1/18/99		92.862,24		92.862,24	6.749,58	90,69%	
PROGETTO S.U. "CHIOGGIA A CHIOGGIA"	10	GM 45/2/98-DT-1/18/99		92.862,24		92.862,24	6.749,58	90,69%	
CONSULENZA L.S.V.E. ARCH. RAVAGNAN P.L.	10	GM 93/90/19-08-1999		28.430,55		28.430,55	6.749,58	90,69%	
V. CENSIMENTO AGRICOLTURA	10	GM 41/278-9-2000		6.749,58		6.749,58	6.749,58	100,00%	

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NABETTI

* SERVICE TECNICO P.P. CENTRI STORICI	10	DT.11/13/24-7-2001	57.782,12	57.782,12	57.782,12	57.782,12
RIEPILOGO TOTALI			13.000.274,64	3.412.674,00	14.662.159,40	10.751.985,07

IL DIRIGENTE
Ing. LUCHI NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 03-08-1998, N. 285 (1*) - Es. 1999 - ELENCO OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
ACQUISIZ. E RESTAURO IMMOBILI X AA. PRODUTTIVE	1		1.291.142,25	1.291.392,86	1.517,14	1.291.392,86	1.517,14	0,00%	
- INCARICO FRAZIONAM. AREE BRONDOLO		DT. 162323-11-2000		1.549,37		1.549,37		97,92%	
- INCARICO RILEVAZIONE AREE BRONDOLO	1	DT. 90573-5-2003		7.200,00		7.200,00	7.200,00	100,00%	
RESTAURO DEL PALAZZO GRANAIO	2	GM. 4/19/13-10-2004	185.128,96			185.128,96			
RIEPILOGO TOTALI			1.291.142,25	1.291.392,86	1.517,14	1.476.271,21	1.476.271,21		8.717,14

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 03-08-1998 N. 295 (2) - Es. 2000 - FINANCO. OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
LETTERA "A" - LEX 780/84 ART. 6.8									
COLLEGAMENTO CHIOGGIA - SOTTOMARINA	1 (24)		820.822,42	344.038,06		344.038,06		0,00%	
• FORNITURA COLONNINE SOS	1 (2480)	DT. 5/16/02-GM.524/02		190.598,81	190.598,81	190.598,81	150.598,81	0,00%	
• RIPRISTINO DANNI VIABILITA' SOTTOMARINA	1 (2481)	DT. 10/3/10-07-2002		51.500,00	51.499,03	51.500,00	51.499,03	0,00%	
• ACQUISTO TERRENO B.G.O.S. GIOVANNI (Area Caprenigoli)	1 (2482)	CC. 4/7-4-2003		27.888,67		27.888,67		0,00%	
• SEGNALETICA CAVALCAVA B.S.C.	1	Del. 1/20/02-09-04/04		3.635,50		3.635,50	3.635,50	0,00%	
• MANUTENZ. PONTE GIREVOLE CNL S. DOMENICO	1	Del. 2/10/11-11-2004		54.000,00		54.000,00	54.000,00	60,00%	
• LAVORI URGENTI PONTE GIREVOLE CNL S. DOMENICO	1	Del. 2/3/09-09-20/05		54.000,00		54.000,00	41.112,60	76,13%	
• SISTEMAZ. CARMARCONI / SACCA S. FRANCESCO - 2° LOTTO	1 (2483)	GM. 26/07-5-20/05		237.961,38		237.961,38			
LETTERA "A" - LEX 780/84 ART. 6									
REALIZZ. IMPIANTO NATATORIO COPERTO AREA FITNESS	2	GM. 25/07-05-20/05	100.559,28	100.559,28		100.559,28			RIVALORE!
RIEPILOGO TOTALI			1.030.181,70	1.030.181,70	202.097,84	1.030.181,70	282.845,94		

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

STIPES	13	206.582,76	0,01	47.410,74	47.410,74	0,00%
STIPES	13	206.582,76	0,01	47.410,74	47.410,74	0,00%
• SERVICE PIANO GIU' LE BARRICATE	13			47.410,74	47.410,74	
• SERVICE PIANO SICUREZZA STRADALE	13			36.151,98	36.151,98	
• SERVICE TECNICO P.P. CENTRI STORICI	13			123.020,03	123.020,03	
RIEPILOGO TOTALI		21.141.567,21		7.343.840,93	22.591.292,22	10.935.222,98

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio MAZZETTI

COMUNE DI CHIOGGIA (Legge 23-12-1998, N. 448 (2A) - Es. 2000 - ELENCO OPERE PUBBLICHE)									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHiesti	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
COLLEGA. CHIOGGA - SOTTOMARINA E PARCHEGGI	1 (144)		795.343,61	0,01		0,01		0,00%	
* ACCANTIERAM. CAMPO MARCONI / SACCA S. F. 1° Str.	1	DT. 1156/19-05-2004	50.000,00	50.000,00		50.000,00	49.087,50		
* SISTEMAZ. C. MARCONI / SACCA S. FRANCESCO - 2° Lido	1	GM. 267/27-5-2005	582.038,62	582.038,62		582.038,62	182.881,08		
* RAMP. ACCESSO TERMINAL	1 (142/880)	Del. 175/22-05-2004	183.305,00	183.305,00		183.305,00	636.461,04	82,16%	
RIQUALIFICAZ. VIA VENTURINI E FRAZIONE BRONDOLO	5 (150/000)	DT. 722/13-05-2002	774.685,35	774.685,35	50.990,71	774.685,35	636.461,04	0,00%	
STUDI SUL TERRITORIO	6 (148)		263.393,02	10.306,05		10.306,05		0,00%	
* REDAZIONE P.P. CENTRI STORICI	6	GM. 22/25-1-2001	182.208,16	182.208,16	21.208,34	182.208,16	78.133,94	48,14%	
* SERVICE GRAFICO STUDI FATTIBILITA' VARI	6	DT. 322/28-1-2001	516,46	516,46	516,46	516,46	519,46	100,00%	
* SERVICE TECNICO P.P. CENTRI STORICI	6	DT. 111/24-7-2001	47.410,74	47.410,74	47.410,74	47.410,74	47.410,74	100,00%	
* SERVICE COMPENDIO SAN FELICE	6	DT. 51/26-4-2002	17.860,61	17.860,61	17.860,61	17.860,61	17.860,61	100,00%	
* STUDIO X. COSTITUZ. SOC. TRASFORMAZ. URBANA	6	DT. 172/102-10-2003	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.016,00	100,00%	
OPERE DI URBANIZZAZIONE A.S.P. AI SALONI	7 (151)	GM. 34/7-2-2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	258.228,45	258.228,45	100,00%	
PROLUNGAMENTO V.LE TRENTO E PARCHEGGI	8 (152)	DT. 148/104-10-2001	568.102,59	568.102,59	20.235,33	568.102,59	564.281,68	99,33%	
RIQUALIFICAZ. DI RIDOTTO MADONNA (TERMINAL)	9 (153)	GM. 44/005-DT. 10/003	206.582,76	206.582,76	206.582,76	206.582,76	189.400,32	92,04%	
RIQUALIFICAZ. VIABILITA' INCROCIO OSPEDALE	10 (154)	GM. 41/213-10-2004	1.032.913,80	1.032.913,80	13.065,29	1.032.913,80	86.834,95	8,41%	
LETTERA "B" - LEX 79884 - "C" - LEX 36091									
URBANIZZAZIONE - INFRASTRUTT. - FRAZIONI	2 (145)		1.032.913,80	18.795,93		18.795,93		0,00%	
* URBANIZZAZ. FRAZ. DI CA' LINO	2 (145/280)	DT. 144/61-10-2001	341.548,47	341.548,47		341.548,47	271.232,16	79,41%	
* ESTENSIONE RETE ITALGAS FRAZ. BRONDOLO	2	DT. 457/23-03-2002	671.395,97	671.395,97	30.738,70	671.395,97	665.377,93	99,10%	
URBANIZZAZIONE - INFRASTRUTT. SOTTOMARINA	3 (146)	DT. 758/16-05-2002	1.174,43	1.174,43	1.174,43	1.174,43	1.174,43	100,00%	
* SISTEMAZ. V.LE TRIESTE 1/2 LOTTO (MIG. G.E.)	3	Del. 182/122-10-2004	516.456,90	373.977,98		373.977,98		0,00%	
OPERE URB. COLLEGATE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	4 (149)		1.032.913,80	142.478,92		142.478,92		#DIV/0!	
* SPAZIO URBANO ATTREZZATO - PARCHEGGIO	4 (149/2881)	GM. 24/28-01-2005	952.676,75	952.676,75		952.676,75	78.207,21	8,26%	
* DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN SOTTOMARINA	4 (149/2880)	GM. 800/03-DT. 2027/04	80.237,05	80.237,05		80.237,05			
AMPLIAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	11 (147)	DT. 143/1-2-2001	774.685,35	774.685,35		774.685,35	574.480,52	74,16%	
REALIZZAZ. BRETELLA V.M. MARINA E COMPARTO B/C)	12 (155)	DT. 68/29-5-2001	113.620,52	113.620,52		113.620,52	113.620,52	100,00%	
CAVALCATA DI B GO SAN GIOVANNI	13 (156)	DT. 683/5/0-12-2000	87.797,67	87.797,67		87.797,67	87.797,67	100,00%	
REALIZZ. IMPIANTO NATATORIO COPERTO AREA FITNESS	14	GM. 250/27-05-2005	784.732,71	784.732,71		784.732,71			
Riepilogo Totale			8.242.370,33	7.457.657,62	147.009,26	8.242.370,33	3.894.613,21		

IL DIRIGENTE
Ing. Ludio MARETTI

COMUNE DI CHIOGGIA (Legge 23/12/1998 N. 448 (3)) Es. 2001 - BILANCIO OPERE PUBBLICHE									
LETTERA "A" - ART. 6 - "C" - ART. 8 - LEX 788/84	NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
									#VALORE #DIVIDUI
1	IMMOBILI X ANZIANI - RISTRUTT. ALA OVEST EX C.R.I. RESTAURO CORTE SALASCO (ATTIVITA' SOCIOCULT.)	(34)	DT. 7/26/13-05-2002	351.190,89	350.394,48			350.394,48	100,00%
2	POLO AGRONOMICARE COMPLETAM. CORTE SALASCO - LOTTO 2.	(29)	GM. 2/29/29-12-2004	1.291.142,25	1.291.142,25	21.170,14	21.170,14	183.818,92	83,01%
3	COMPLETAM. CORTE SALASCO - LOTTO 2.	(10)	VARI	2.374.056,00	197.635,19				
3	CORTE SALASCO - DAL GESSO G.	(10)	Del. 4/28/04	774.685,35	0,00			13.484,00	100,00%
3	CENTRO CULTURALE/RESERVI. CORTE SALASCO	(10)	P. GM. 6/04	781.221,35	781.221,35			2.808,00	100,00%
3	COMPLETAMENTO CITTADELLA GIUSTIZIA	(192)	GM. 3/5/20-12-2001	256.225,45	256.228,45	222.395,85	222.395,85	252.622,99	97,83%
4	INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI STORICI	(4)		77.488,53					
LETTERA "B" - LEX 788/84 - "C" - LEX 300/91									
5	STRADA ARGINALE SINISTRA ADIGE	(3220)	DT. 15/7/93-10-2001	774.685,35	774.685,35	664.752,52	664.752,52	667.549,47	86,17%
5	RIDULIF. URB. QUARTIERI EST ROMA S. ANNA 1° LOTTO	(20)	GM. 3/6/8-09-2004	826.331,04	65.426,83			11.615,64	
5	REALIZZAZ. COLLEGAM. FOGNARIO VALLICA BIANCA	(22)		754.027,07					
6	INTERVENTI STRAORDINARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	(17)	DT. 4/3/28-9-2001	1.136.205,18	1.134.656,66	322.496,55	322.496,55	666.106,67	59,71%
7	COMPLETAMENTO PALESTRA VALLI	(25)	DT. 11/03-07-2003	619.748,28	619.748,28			238.788,15	38,53%
8	SOTTOMARINA (Viabilità-Parcoaggi-Venog)	(1)	DT. 7/2/3-1-04	299.215,66	0,00			38.266,71	
8	V.I.A.B. SOTTOMARINA-1° Str. Rotaloria V. Medivul Lungom.	(164/288)		73.793,22	215.422,64			63.129,94	29,31%
8	OPERE DI VIABILITA' A SOTTOMARINA	(164/3821)	Del. 10/29/26-5-2005						
9	STRADA DEL PORTO	(2)	DT. 1/4/84-10-2001	387.342,67	387.342,67	317.971,66	317.971,66	319.347,21	82,45%
10	INTERVENTI URGENTI art. 148 - 147 DPR 554/89	(10)		208.592,76	0,01				
10	IMMOBILE LOCALITA' FOSSETTA CIV. 44-45	(22)	DT. 11/7/92-8-2001	136.344,62	136.344,62	136.344,63	136.344,63	138.344,63	100,00%
10	OPERE URBANIZZAZ. SALONI - RIMOZ. TUBAZIONI	(10)	DT. 1/85/11-02-2002	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	100,00%
10	SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA	(10)	DT. 4/62/11-3-2003	2.600,00	2.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00%
10	CONSOLIDAM. PIAZZA E SCARICHI FOGN. S. ANNA	(10)	DT. 20/02/27-11-2003	6.488,13	6.488,13			6.488,13	100,00%
RIEPILOGO TOTALI				10.070.900,53	6.340.744,14	1.748.881,55	1.748.881,55	3.014.514,95	

IL DIRIGENTE
 Ing. Lucio NARETTI

COMUNE DI CHILOGGIA - Legge 23-12-1999 N. 488 (1*) - Es. 200 - ELENCO OPERE PUBBLICHE									
LETTERA "A" ART. 6 - "C" ART. 8 LEX 78684	NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
	REFIN. COLLEG. CHIOGGIA-SOTTOMARINA E AUTOSILOI	1 (18)	DT 692/17-04-03	2.892.284,50	1.213.673,71			1.159.560,95	95,54%
	REFINANZIAM. RISTRUTTURAZ. PONTE LONGO	2 (19)	GM 550/03-DT. 17/2003	1.213.673,71	774.655,63				#VALOREI
	COMPLETAM. RISTRUTTURAZ. EX COLONIA TURATI	3 (19)		774.655,63					
	RISTRUTTURAZ. ALLOGGIO CUSTODE MARCHETTI	3 (22)		109.291,38					0,00%
	MANUTENZ. STRAORD. MATERNA DI VALLI	3 (8)		77.468,63					99,96%
	* LAVORI STRAORD. MANUTENZ. MATERNA VALLI	3	GM 117/28-3-2001	56.162,22	56.095,47		55.069,00	96.192,91	#VALOREI
	COMPLETAM. RESTAURO CORTE SALASCO LOTTO 3	3	GM 52/28-12-2004	242.734,74	242.734,74				
	LETTERA "B" LEX 78684 - "C" LEX 36091								
	AMPLIAMENTO SCUOLA DI VALLI	4 (24)	GM 8/01-DT. 107/001	160.759,92	160.759,91	160.535,40	14.526,69	160.155,41	99,67%
	RIQUALIF. QUARTIER EST ROMEA-S ANNA 2°-3° LOIO	4 (29)		852.153,89					#DW/01
	OPERE DI VIABILITA' A SOTTOMARINA	5 (171)		970.938,97	0,00			69.946,20	
	* OPERE DI VIABILITA' A SOTTOMARINA	5 (171/3421)	DT 102/26-05-2005		804.552,33				
	PELIZZA ANTONIO - Service Ambientale-Opere a Verde	5 (171/3420)	DT 226/05-02-2004	1.799,28	1.799,28				
	* VIAB. SOTTOMARINA-1° Str. Rotatoria V. Medilungom.	5 (171/3420)	DT 7/23-1-2004	1.799,28	1.799,28				
	NUOVA R.S.A.	6 (38)		2.220.764,87	0,00			1.799,28	#DW/01
	* RISTRUTTURAZ. ALA OVEST EX C.R.I. (NARANTE)	6	DT 130/03-1-2003		208.857,75			202.231,43	96,83%
	* COSTRUZ. NUOVA R.S.A. VIA DEL BOSCHETTO	6	GM 4/04/05-12-2004		1.985.905,90	7.436,98	7.436,98	73.311,74	3,69%
	* RIFINANZIAM. SPESE TECNICHE (25%) TOMAZ	6	DT 18/02/27-11-2003		26.001,02			26.001,02	100,00%
	LETTERA "C" ART. 8 LEX 78684								
	CONTRIB. PRIVAT. L. RIFINANZIAM. 3° BANDO - 1° CASA	7	CC 11/28-01-2003	619.748,28	619.748,28				0,00%
	STUDI SUL TERRITORIO	8		129.114,22	0,00				#VALOREI
	* REDAZIONE PIANO DEL VERDE	8 (3480)	VARIE		117.553,03	114.566,52	72.261,68	114.566,52	97,46%
	* STUDI RISCHIO IDRAULICO	8	GM 4/04/05-10-2001		9.482,15	9.482,14		9.482,15	100,00%
	* PORTE SUMMANE E AREA IDROVONA CA. BIANCA	8	DT 18/32/06-19-2004		2.075,04			2.075,04	100,00%
	RIEPILOGO TOTALI			9.867.618,15	6.429.858,86	356.926,51	149.293,35	1.695.286,65	

ing. Lucio MARETTI
IL DIRIGENTE

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge n. 23-12-1999 N. 488 (2A) - Es. 2002 - ELENCO OPERE PUBBLICHE

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)		CODICE (SCHEMA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A"									
COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICI									
1 (175)	2. LOTTO - STRALCIO RESTAURO PORTICI-CHIOGGIA	1 (175/3500)	DT 148/19-09-2002	516.456,90	0,00	342.740,27	342.740,27	342.740,27	74,03%
1	2. LOTTO - STRALCIO RESTAURO PORTICI-CHIOGGIA	1 (175/3500)	DT 44/95-3-2004		173.716,63	22.315,94	22.315,94	128.807,40	74,03%
COMPLETAMENTO PALAZZO GRASSI - FINANZ. O. E. DEFINITIVO									
2 (176/3520)	RESTAUR. PALAZZO GRASSI - FINANZ. O. E. DEFINITIVO	2 (176/3520)	DT 131/21-08-2003	154.937,07	42.537,40	95.381,91	95.381,91	95.381,91	97,07%
2	VARIE - CORPI ILLUMINANTI PALAZZO GRASSI	2 (176/3520)	DT 197/627-10-2004	14.136,00	14.136,00			14.136,00	100,00%
ACQUIST. IMMOB. X UFFICI O AA. SOCIALI O CULTURALI									
3 (177)	RISTRUTTURAZ. ALA OVEST EX C.R.I. / SOPRALEV. AZ.	3 (177/3540)	GM 27/128-5-2003	2.117.473,29	8.297,56	206.939,69	266.939,69	386.774,00	97,54%
3 (177/3541)	QUOTA PARTE IMMOBILE ATER EX CASA PESCATORE	3 (177/3541)	CC 9/02 - Del. 19/85/04		306.439,51	6.109,20	6.109,20	6.109,20	100,00%
3 (177/3542)	RISTRUTTURAZIONE UFFICI PRESSO LA SEDE ILL. PP.	3 (177/3542)	DT 65/144-2003		6.109,20	118.085,45	118.085,45	120.051,97	98,04%
3 (177/3543)	AMPLIAM. SUO EDIFICIO V. SCHIAVO GIÀ BIBLIOTECA	3 (177/3543)	GM 33/278-6-2003		125.000,00			196.120,19	152,09%
3 (177/3544)	PALESTRA SCUOLA MEDIA VALLI	3 (177/3544)	DT 114/03-07-2003		324.413,14			20.809,00	6,41%
OPERE VARIE - Consulenza DAL GESSO Gianni									
3 (177)	CORTILE EX LAZZARETTO / SERVICE	3 (177)	Del. 13/97/15-07-04		6.315,60			3.045,60	48,22%
NUOVA R.S.A. DI VIA DEL BOSCHETTO SOTTOMARINA									
3	DISTRETTO SPAZIO URB. ATTREZZ. - PARCHEGGIO	3	GM 24/28-01-2005		265.043,47				
3	STRUTTURE PER CITTADINI DISABILI / PERIZIA	3	DT 1/02/26/05		24.830,40				
3 (177/3548)	IMP. IRRIGAZIONE / SISTEMAZ. AREA VERDE EX CRI	3 (177/3548)	DG 287/05-06-11/11/05		139.800,00				
RESTAURO RISTRUTT. IMMOBILI X ESIGENZE ABITATIVE									
4 (178/3560)	INTERV. URGENTI IMMOBILI DI VIA FOSSETTA	4 (178/3560)	VARIE	1.032.813,80	1.755,29	204.768,25	204.768,25	204.768,25	100,00%
4 (178/3560)	INTERV. URGENTE APPARTAM. CALE COMELLI 1050	4 (178/3560)	DT 148/2-2-2003		34.247,46	34.247,46	34.247,46	34.247,46	100,00%
4 (178/3560)	INDAGINI GEOGNOSTICHE - DITTA S.P.G.	4 (178/3560)	DT 7/20/28-04-2003		1.557,60	1.557,60	1.557,60	1.557,60	100,00%
4 (178/3560)	FABBRICATI CA' BIANCA E CANAL DI VALLE	4 (178/3560)	DT 14/30-2-2003		16.156,80	16.156,80	16.156,80	16.156,80	100,00%
4 (178/3560)	INTERV. URGENTE EDIFICIO SACCA S. FRANCESCO 17	4 (178/3560)	DT 25/11/13-02-2003		54.032,56	54.032,56	54.032,56	54.032,56	100,00%
4 (178/3560)	INTERV. URGENTI APPARTAM. CALLE GRADARA 309-2P	4 (178/3560)	DT 5/2/10-3-2003		53.489,51	53.489,51	53.489,51	53.489,51	100,00%
4 (178/3560)	SISTEMA COPERTURA IMMOBILE CLE GRADARA 309	4 (178/3560)	DT 22/08/20-12-2003		11.814,22	11.814,22	11.814,22	11.814,22	100,00%
4 (178/3567)	RISTRUTT. FABBRICATO EX SC. ELEM. CANAL DI VALLE	4 (178/3567)	GM 2/80/03-DT 13/11/03		650.000,00	17.363,77	17.363,77	422.237,93	64,86%
4 (178/3560)	INTERVENTI SU FABBRICATI VARI - Lux 108/94	4 (178/3560)	DT 13/53/08-8-2003		5.115,09	5.115,09	5.115,09	5.115,09	100,00%
5 (179/3560)	RESTAURO CINEMA ASTRA	5 (179/3560)	GM 51/90/02-DT 20/16/04	1.549.370,70	1.549.370,70				
COMPLETAMENTO CAMPIELLI LUSENTO									
6 (180/3600)	ARREDO URBANO RIVA LUSENTO CAMPIELLI	6 (180/3600)	DT 6/94/7-6-2002	413.165,52	3.308,94	352.539,85	352.539,85	361.175,95	98,89%
6	BASSORILIEVO PROF. F. CASSON - 2° Strada	6	DT 15/80/1-01-2005		44.593,94			43.261,91	96,98%
7 (181)	INTEGRAZ. RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA TURATI	7 (181)	GM 5/50/03-DT 17/23/03	774.885,35	774.885,35				
8 (182/3640)	BANCHIAM. CNL LOMBARDO ZONA PONTE SALONI	8 (182/3640)	GM 2/56/24-5-2002	154.937,07	154.937,07	75.599,87	75.599,87	154.937,06	100,00%
LETTERA "B"									
RISTRUTTURAZIONE PONTE DELLA PIOPPA									
9 (183-3660)	OPERE DI URBANIZZAZIONE A.S.P.	9 (183-3660)	VARIE	288.228,44	100.935,41	15.546,28	15.546,28	72.228,70	71,58%
10 (184/3680)	MANUT. SPOGLIATOIO E IMP. SPORTIVO DI CA' BIANCA	10 (184/3680)	DT 5/15/03-6/3/04	1.084.559,48	1.084.559,48	1.084.559,48	1.084.559,48	1.084.559,48	100,00%
11 (800/185)	ACQUISTO AREE CAMPO CALCIO - CA' BIANCA	11 (800/185)	CC 11/003-DT 15/24/03	154.937,07	91.183,49	63.753,58	63.753,58	63.753,58	100,00%
12 (185)	ACCORDO DI PROGRAMMA PER CA' BIANCA	12 (185)	GM 33/720-8-2004	1.291.142,25	900.000,00			30.500,00	3,39%
12 (186/3720)	PISTA CICLABILE CNL. MORTO / PASSERELLA CNL. CLUO	12 (186/3720)	VARIE		48.755,46			8.220,24	16,52%
12 (186/3721)	RIFORNIZIONE ZONA PUNTA GORZONE/CHIOGGIA	12 (186/3721)	GM 17/303-DT 13/66/03		154.937,07	72.135,41	72.135,41	151.957,15	98,08%
13 (187)	INTEGRAZIONE NUOVO CIMITERO DI CHIOGGIA	13 (187)	DT 7/97/20-5-2002		12.974,40			12.974,40	100,00%
14 (188/3760)	COMPLETAMENTO CIMITERO DI CA' BIANCA	14 (188/3760)	GM 12/04-5-01/15/04		710.065,26	1.026,63	1.026,63	46.876,15	14,41%
15 (189)	URBANIZZAZIONE SOTTOMARINA, V. PRISTE 2° LOTTO	15 (189/2780)	DT 13/03/03-03-2003		12.974,40			12.974,40	100,00%
15 (189/2780)	SISTEMAZ. VIALE TRIESTE - 1° LOTTO (Service Segala)	15 (189/2781)	GM 12/04-5-01/15/04		516.456,90			516.456,90	100,00%
16 (190)	COMPLET. VIA INCROCIO OSPEDALE SOTTOMARINA	16 (190)	DT 13/03/03-03-2003		103.291,38			103.291,38	100,00%
17 (191)	COMPLET. NUOVO CAMPO SPORT. PARCO DEI PARCHI	17 (191)	DT 13/03/03-03-2003		103.291,38			103.291,38	100,00%

IL DIRIGENTE
Ing. LUCIO NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 28-12-2001, N. 448 (1) - Es. 2002 - ELENCO OPERE PUBBLICHE												
LETTERA	ART.	C.	ART. & LEX	DESCRIZIONE INTERVENTO	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPOR TO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" - ART. 6 - "C" - ART. 6 LEX 788/84												
	1			ACQUISIZIONE AREE X EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA			1.000.000,00	0,00				0,00%
	2			ACQUISIZ. RESTAURO IMMOB. PROPRIETA' COMUNALE			200.000,00	200.000,00				99,02%
	3	1198		EX COLONIA TURATI / LOCALI AZ. LAVORI SEDE ASP		GM. 442/10-9-2003	32.1.000,00	130.535,25				99,02%
	3	1198/3860		URB. ARREDO URB. C. STORICO SOTTOMARINA-COMPL.		DT. 33/16-1-2004	94.140,00	94.140,00				99,02%
	3	1198/3860		* RIPRISTINO ACCESSI SC. TODARO DALLA PIAZZA		DT. 67/15-4-2004	86.324,75	86.324,75				26,69%
	3	1198/3861		* NUOVA RECINZ. PASSO CARRAIO VIALE ADIGE		DG. 172/04-DT. 14/9/04	516.000,00	516.000,00				56,00%
	4	1198-3890		INTERVENTI SUL CIMITERO DI CHIOGGIA		DT. 1962/2-1-2003	285.000,00	285.000,00				56,00%
	5			CHIESA DEL CUSTODE CIMITERO DI CHIOGGIA								
LETTERA "B" - LEX 788/84 - "C" - LEX 380/81												
	6	201		SECONDO LOTTO RIFACIMENTO VIA P.E. VENTURINI		GM. 383/4-DT. 20/10/04	500.000,00	49.235,33				0,00%
	6	201/4020		* 2° Strada RIFACIMENTAZ. VIA VENTURINI/RONDOLO		DT. 123/02-07-2004	300.784,87	300.784,87				32,10%
	6	4022		* SVERSAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA VENTURINI			150.000,00	150.000,00				
	7	202/4040		OPERE DI VIABILITA' A SOTTOMARINA		DT. 1029/25-5-2005	500.000,00	500.000,00				
LETTERA "C" - ART. 6 LEX 788/84												
	8			CONTRIBUTI A PRIVATI 5° BANDO RESTAURO		DT. 139/14-08-2003	1.000.000,00	1.000.000,00				0,00%
	9	204		STUDI SUL TERRITORIO (2°)			93.000,00	0,00				
	9	204/0081		* P.P. PROGETTO GHEZZI E VARIANTE PRG		DG. 21/30-1-2004	13.000,00	13.000,00				
	9	204/0081		* P.M. / PIANO INTEGRATO PER LA MOBILITA'		DG. 98/12-12-2003	80.000,00	80.000,00				
	10	205		INTERVENTI URGENTI ARTT. 146-147 DPR 554/99			229.000,00	0,00				
	10	205/4100		* INTERVENTO PONTE DI VIA DUE PALAZZI CA' LINO		DT. 899/23-5-2003	132.000,00	132.000,00				83,27%
	10	205/4100		* ROTATORIA/FERMATA AUTOBUS - ISOLA VERDE		DT. 1193/11-7-2003	62.369,97	62.369,97				99,81%
	10	205/4100		* CONSOLIDAM. PIAZZA E SCARICHI FOGN. S. ANNA		DT. 2002/21-11-2003	34.630,03	34.630,03				99,93%
R I E P I L O G O T O T A L I							4.644.000,00	3.844.000,00	1.022.150,00	0,00	1.012.840,68	

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio Marretti

COMUNE DI CHIOGGIA - Legge 23-12-2000 N. 388 (2 ^a Es. 2003) - ELENCO OPERE PUBBLICHE									
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
LETTERA "A" - ART. 6 - "C" - ART. 8 LEX 788/04									
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE								0,00%	
• MESSA IN SICUREZZA ALLOGGIO CAVANELLA CIV.9	1 (206)		1.800.000,00	81.932,35			18.309,09	0,00%	
• RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUNTA POLI	1 (206/4120)	DT. 06/17/14-2003		18.309,09	18.309,09			100,00%	
• RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUNTA POLI	1 (206/4121)	GM. 31/7/16-06-2003		551.575,78				83,69%	461.596,44
• RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SITO IN CA' BIANCA 34	1 (206/4122)	GM. 17/09/03-DT. 11/04/03		51.290,58				100,00%	51.290,58
• ADEGUAM. IMMOBILE CASA ALBERGO X ANZIANI	1 (206/4123)	DT. 12/00-128/10/03		258.228,45				99,51%	256.855,38
• RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SC. ELEM. CANAL DI VALLE	1 (206/4124)	GM. 36/10/03-DT. 13/11/03		205.252,93				0,00%	
• LAVORI URGENTI EX MAGAZZINO CLE GRADARA 309	1 (206/4125)	DT. 11/34/03-07-2003		32.684,03				100,00%	32.684,03
• MURATURE ESTERNE EDIFICIO CLE GRADARA 309	1 (206/4126)	DT. 17-03/23-10-2003		21.976,60				100,00%	21.976,60
• RISANAMENTO EDIFICIO CLE COMELLI 1050	1 (206/4127)	DT. 15/64/23-9-2003		223.556,43				100,00%	223.556,43
• STRAORD. MANUTENZ. EDIFICIO IN CA' BIANCA 98	1 (206/4128)	DT. 16/32/7-10-2003		10.800,00				100,00%	10.800,00
• EDIFICIO PUNTA POLI - SPESE TRASFERIM. INQUILINI	1 (206/4129)	DT. 17/47/7-10-2003		87.625,60				100,00%	87.625,60
• IMPIANTO ELETTRICO APPARTAM. VIA FOSSETTA 42	1 (206/4130)	DT. 20/52/2-12-2003		20.680,00				100,00%	20.680,00
• RICONOSCIM. SPESE SOSTENUTE DA INQUILINI VARI	1	Del. 97/3/20-06-2005		15.798,16				100,00%	15.798,16
• RISTRUTTI. IMMOBILE EX PARROCCHIA BRONDOLO	1 (206/4131)	CC. 97/28-01-2004		220.000,00				0,00%	109.525,16
RISTRUTTURAZ. CENTRO ASSISTENZA GR OSPEDALE	2 (207-4140)	CC. 59/29-06-2004	200.000,00	200.000,00				54,76%	109.525,16
• OPERE DI VIABILITA' A SOTTOMARINA	3 (208)		1.120.000,00	0,00				#DIV/0!	18.534,70
• SPESE COLLAUDO STRALCIO V.S. MARCOS-FELICE	3 (206/4160)	DT. 20/14/28-11-2003		18.534,70				76,99%	109.327,10
• OPERE DI VIABILITA' A SOTTOMARINA	3 (206/4161)	DT. 10/29/26-5-2005		1.101.465,30				81,40%	122.100,00
• BAGNI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO P.S. ANDREA	4 (206/4180)	DT. 30/6/18-02-2003	150.000,00	142.000,00					
• ARREDO URBANO E VERDE QUARTIERE SALONI	5 (210/4200)	DT. 22/56/22-12-2003	150.000,00	149.895,00					
LETTERA "B" - LEX 788/04 - "C" - LEX 380/01									
RIQUALIFICAZIONE VIE A VESPUCCI E M. POLO (1° LOTTO)	6 (211/4220)	GM. 09/09/03-Del. 27/15/04	900.000,00	900.000,00				6,43%	57.877,28
SISTEMAZ. FASCIA RISPETTO CIMITERO SOTTOMARINA	7 (212)	VARIE - Incaschi	900.000,00	846.333,14					
• SERVICE TECNICO Arch. LUGATO DARIO	7 (212/4240)			76.166,86					59.843,84
• RECINTO PARCOGGIO COMPARTO MCI V. MALARINA	7 (212/4241)	DT. 5/50-12/1/04		65.500,00					29.612,00
• PARCHE ESTERNA LATO SUD MURO CINTA CIMITERO	7 (212/4242)	Del. 13/56/15-07-2004		30.500,00					
REFINANZIAM. CAMPO SPORTIVO PARCO DEI PARCHI	8 (213)		500.000,00	0,00					7.351,97
SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	9 (214)		25.000,00	0,00					10.400,00
• REALIZZAZIONE 1° AREA VERDE A VALLI (partig)	9 (214/4260)	DT. 30/23/3-5-2003		14.000,00					23.133,60
• REALIZZAZIONE 2° AREA VERDE A VALLI (partig)	9 (214/4261)	DT. 10/49/7-06-2004		10.400,00					
PARCHEGGIO CENTRO SERVIZI E RISTORO TERMINAL	10 (215)		30.000,00	75.000,00					15.638,63
MANUTENZ. CAMPI DA TENNIS RIDOTTO MADONNA	11 (218/4320)	GM. 3/9/04-DT. 18/58/04	75.000,00	50.000,00					13.596,35
REALIZZ. SPOGLIAIO IMP. SPORTIVO R. MADONNA	12 (217)	GM. 3/9/04-DT. 19/58/04	50.000,00	50.000,00					
MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE B. GO SAN GIOVANNI	13 (218)	DT. 108/12/4-06-2003		90.997,52					
• INTERVENTO STRAORDINARIO MATERNA B.S.S.	13 (218/4360)	DT. 8/92/13-05-2004	20.000,00	20.000,00					15.638,63
• MANUTENZ. STRAORD. MEDIA OLIVI B.S. GIOVANNI	13 (218/4361)	Del. 10/14/25-05-2005	14.000,00	14.000,00					13.596,35
• SOSTITUIZ. SERRAMENTI ASILO NIDO "ARCOBALENO"	13			22.000,00					
• INTERVENTI VARI SCUOLA ELEMENTARE CHERIGHIN	13	VARIE		3.022,49					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	14 (219)		90.000,00	3.269,83					51.205,22
• IMPIANTO ELETTRICO MATERNA B.S. GIOVANNI	14 (219/4380)	DT. 4/68/10-03-2004		55.078,97					
• VARIE MATERNA B.S. GIOVANNI (Prin. Incaschi)	14	DT. 18/85/28-10-2004		4.651,20					
• RIFACIM. IMPIANTO ELETTRICO MATERNA DI VALLI	14 (219/4381)	DT. 15/96/28-8-2004		17.000,00					15.840,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	15 (220/4400)	DT. 12/97/25-1-2004	65.000,00	25.000,00					2.496,00
• RAZIONALIZZAZIONE SCUOLE VALLI DI CHIOGGIA	15 (220/4401)	Del. 9/02/11-05-2005		60.000,00					
SISTEMAZ. ESTERNA SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA	16 (221)		70.000,00	0,00					
• MANUTENZ. STRAORD. ELEMENTARE DON MILANI	16 (221/4420)	GM. 27/05-05-2003		21.371,20					42.486,82
• COMPLETAM. RECINZIONE LATO SUD SCDON MILANI	16 (221/4421)	DT. 7/29/30-4-2004		48.628,80					
INTEGRAZ. 1° LOTTO RIQUALIFICAZ. QUARTIERI ROMA	17 (222)		250.000,00	141.568,69					12.807,84
• RIQUALIFIC. URBANA QUARTIERI EST. ROMA-1° LOTTO	17 (222)	GM. 36/4/08-09-2004		55.907,55					
• LOTTO RIQUALIFICAZ. QUARTIERI EST. ROMA S. ANNA	18 (223/4400)	GM. 47/6/2-12-2004	775.000,00						23,00%
INTEGRAZIONE ACCORDO PROGRAMMA X CA' BIANCA	19 (224)		250.000,00						

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

NUOVO CENTRO CIVICO DI CA' BIANCA	29 (225/4500)	DT.1137/03-BOCCARDO	240.000,00	38.851,76	0,00%
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE FRAZIONI:	21 (226)		200.000,00		
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CAVANELLA	22 (227)		190.000,00		
VIA MOROSINI E ARGINE BRENTA	23 (228/4560)		1.800.000,00	75.448,45	52,29%
ASFALTATURA DI VIA AMOLARA - CA' BIANCA	24 (229/4590)	DT.983/03-06-2003	240.000,00	240.000,00	85,80%
MANUTENZ. STRAORD. SOMMITA' ARGIN. SX GORZONE	25 (230/4600)	DG.1930/03-DT.1334/03	50.000,00	50.000,00	97,49%
MANUT. STRAORD. V. MOTTA MORESOLOCA/BIANCA	26 (231)		90.000,00	13.740,00	0,00%
BITUMATURA STRADE COMUNALI VARIE	26 (231/4620)	DT.1992/28-10-2004	60.000,00	46.260,00	
LETTERA "C" - ART.8 LETT.2/2/04					
CONTRIBUTI A PRIVATI - 5° BANDO RESTAURO	27 (232/4540)	DT.138/1/14-8-2003	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00%
STUDI SUL TERRITORIO	28 (233)		265.000,00	6.697,22	0,00%
NUOVO P. P. E PROGETTI ARENILE ZONA F8 PRG	28 (233/4660)	GM.32/126-6-2003	186.120,00	186.120,00	75,94%
CONSULENZE / STUDI VARI	28 (233/4681)	VARIE	72.222,78	72.222,78	100,00%
INTERVENTI URGENTI ARTT. 146-147 DPR 55/499	29 (234)		949.000,00	6.364,77	0,00%
LAVORI SOMMA URGENZA ELEM. B. S. GIOVANNI	29 (234/4660)	DT.1405/19-8-2003	89.000,00	89.000,00	84,300000%
FABBRICATO CA' ROSSA CIV. 190	29 (234/4681)	DT.442/9-03-2004	20.323,47	20.323,47	100,00%
CANAL LOMBARDO / POSIZ. BRICCOLE SEGNALETICA	29 (234/4682)	DT.618/06-04-2004	53.183,54	53.183,54	77,77%
CAVIBOTTO ENEL CO AREA PALAZZETTO SPORT	29 (234/4683)	DT.1246/20-06-04	7.200,00	7.200,00	
TERRAZZO EDIFICIO COMUNALE "GIRASOLE" (RSA)	29 (234/4684)	DT.1825/04-pDel.29/1/05	134.472,00	134.472,00	
CHIESA CIMITERO CHIOGGIA / SCAVO ARCHEOLOGICO	29 (234/4685)	DT.2185/18-11-2004	54.107,21	54.107,21	
ALLOGGI VIA N. ZENO 260 - CONDOMINIO CORALLO	29 (234/4686)	Del.113/27-01-05	221.500,00	221.500,00	
CONSOLIDAM. PONTE SCOLO GALLARO IN PIOVINI	29 (234/4687)	Del.288/10-02-05	132.397,01	132.397,01	
PROBLEMI IDRAULICI CNL VECCHIO BRENTA CA' L'INO	29 (234/4688)	Del.735/14-04-2005	70.000,00	70.000,00	
SISTEMAZ. VIABILITA' DI ACCESSO ALL'ISOLA VERDE	29	pDel.011-05-2005	149.000,00	149.000,00	
LAVORI URGENTI VARI	29	Del.928/12-05-2005	1.492,00	1.492,00	
RIEPILOGO TOTALI			13.219.000,00	9.358.271,45	0,00%
				1.678.402,70	2.893.383,36

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

COMUNE DI CHILOGGIA - Legge 28-12-2001 N. 448 (2*) - Es. 2003 - ELENCO OPERE PUBBLICHE									
NOIE SCHEDE (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDE)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%	
LETTERA "A" - ART. 6 - "C" - ART. 8 LEX 788/84									
RISTRUTTURAZ. IMMOBILE DI CILE VIANELLI EX ULS	1 (235/4780)	GM. 6/7/2-2-2004	790.000,00	92.414,31	18.553,23		92.414,29	100,00%	
MANUTENZ. STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	2 (236)	VARIE	600.000,00	506.799,20			23.640,00	0,00%	
* VARIE PALAZZO MUNICIPALE	2 (236/4720)	VARIE		93.200,80					
MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE LUNGOMARE	3 (237)	DT. 45/103-183/04	500.000,00	491.189,50	8.180,40		8.180,40	0,00%	
* INDAGINI GEOGNOSTICHE LUNGOMARE ADRIATICO	3 (237/4740)	DT. 45/103-183/04		8.180,40	8.180,40		8.180,40	100,00%	
MANUT. STRAORD. VIABILITA' DI SOTTOMARINA	4 (238/4780)	GM. 28/09/27-2004	1.100.000,00	1.100.000,00			68.575,05	0,00%	
LETTERA "B" - LEX 788/84 - "C" - LEX 360/91									
FINANZIAM. RIQUALIFICAZ. VIA P. E. VENTURINI	5 (239/4780)	GM. 38/04-DT. 20/18/04	1.700.000,00	1.700.000,00			11.437,98	0,67%	
INTEGR. VIABILITA' INCROCIO OSPEDALE SOTTOMARINA	6 (240)	GM. 4/12/13-10-2004	2.100.000,00	2.100.000,00			147.780,70		
PISTA CICLABILE LUENZO LUNGOMARE - 1° Str. (parte)	7 (241/4820)	GM. 23/04-Del. 16/1/04	700.000,00	700.000,00			288.940,16		
ACQUISIZIONE AREE VERDI E CAMPO SPORTIVO	8 (242/4840)	CC. 1/03/1-07-2003	45.000,00	45.000,00			45.000,00		
VERDE PUBBLICO A VALLI	9 (243/4860)	DT. 9/03/23-5-2003	40.000,00	40.000,00	25.382,58		40.000,00		
COMPLETAMENTO PIAZZA DI S. ANNA	10 (244)		85.000,00						
LETTERA "C" - ART. 8 LEX 788/84									
STUDI SUL TERRITORIO	11 (245)		158.000,00	5.301,88			1.878,55	0,00%	
* P.P. PROGETTO GHEZZI E VARIANTE PRG	11 (245/4800)	GM. 2/1/00-1-2004		61.950,64			6.197,48		
* AREA TORRE DELLE BEBBE / Indagine Archeologica	11 (245/4802)	DT. 33/7/19-02-2004		6.197,48					
STUDI FATTIBILITA' VARI - FONDO SPIGA	11 (245/4801)	GM. 5/7/13-2-2004		92.000,00			11.284,40		
* PARTECIPAZIONE PROGETTI STUDIO VOSS E ISES 2003	11 (245/4803)	GM. 19/12-03-2004		22.550,00					
INTERVENTI URGENTI ARTT. 146-147 DPR 554/89	12 (246)	DT. 20/02/27-11-2003	78.000,00	0,00			49.736,16	100,00%	
* CONSOLIDAM. PIAZZA E SCARICHI FOGN. A S. ANNA	12 (348/4920)	VARIE		49.736,16			660,86	100,00%	
* INTERVENTI VARI	12 ()			660,86			27.602,99	100,00%	
* CONSOLIDAM. PONTE SCOLO GALLARO IN PIOVINI	12 (348/4921)	Da 26/10-02-2005		27.602,99					
RIEPILOGO TOTALI			7.886.000,00	7.113.414,31	52.996,19	0,00	822.968,42		

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NAPETTI

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)		CODICE (SCHEDA)	NUMERO CAPITOLO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" - C. ART. 8 LEX 780/04										
ACQUISTO/REST. IMMOBILI X UFF. / A.A.S. CULTURALI	1 (247)	500187		CC. 59/09-06-2004	2.500.000,00	2.209,37				0,00%
* CENTRO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZA MINORI	1 (247/4940)			GM. 30/021-07-2004	1.493.000,00	1.493.000,00			1.136,64	0,45%
* STRUTTURA SPORTIVA COMPARTO SIC. I.V. M. POLO	1 (247/4941)			GM. 41/13-10-2004	250.000,00	250.000,00				
* RESTAURO EX PALAZZO GRANNOI / 2° STRALCIO	1 (247/4942)			GM. 41/13-10-2004	659.033,19	659.033,19				
* PALAZZO RAVAGNANI / IMPIANTI - VARIE	1 (247/4943)			VARIE	94.957,44	94.957,44			32.453,90	
LETTERA "B" - C. ART. 8 LEX 780/04										
MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	2 (248)	500188		Del. 1026-11/99/04	450.000,00	0,00				
* ADEGUAM. IMPIANTO CALDAIA VIA FOSSETTA	2 (248/4980)			VARIE	42.656,00	42.656,00			42.656,00	
* LAVORI URGENTI S. MONICA / VIA BARBARICO 101	2 (248/4980)			VARIE	73.665,73	73.665,73			73.665,73	
* EDIFICIO CONDOMINIO CLE COMELLI / 1050	2 (4980)			VARIE	39.993,63	39.993,63			39.993,63	
* FABBRICATO CA' BIANCA, 34 / FONDO INQUILINO	2 (4980)			Del. 13/17/04-05/05	11.953,00	11.953,00			11.953,00	100,00%
* RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN LOCALITA' S. ANNA	2			Del. 16/22/05-09-04	40.912,09	40.912,09			40.912,09	100,00%
* FABBRICAZIONE EDIFICIO IN LOCALITA' S. ANNA	2			Del. 17/64/28-09-04	21.263,00	21.263,00			21.263,00	100,00%
* EDIFICIO PUNTA POLI - SPESE TRASFERIM. INQUILINI	2			Del. 18/24/04-22/02/05	87.202,86	87.202,86			87.202,86	100,00%
* VARIE EDIFICI RESIDENZIALI	2			VARIE	28.235,32	28.235,32			28.235,32	75,18%
* RISTRUTTURAZ. EDIFICIO CA' BIANCA 143	2 (248/4981)			GM. 12/81/16-03-2005	500.000,00	104.602,37			20.732,00	
MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	3 (249)	500189		VARIE	61.785,59	61.785,59			18.989,60	0,00%
* IMPIANTO ELETTRICO MEDIA G. OLIVI / B.S.G.	3 (249/4980)			VARIE	31.000,00	31.000,00				
* INSTALLAZ. NUOVI GRUPPI GEMELLARVELEM.D.MILANI	3 (249/4981)			Del. 16/51/04	27.214,41	27.214,41				
* NUOVA PAVIMENTAZ. SCUOLA MEDIA N. DE CONTI	3 (249/4982)			Del. 83/724-4-2005	380.000,00	380.000,00				
LETTERA "C" - C. ART. 8 LEX 780/04										
INTEGRAZ. MANUTENZ. RIVA LUZENGO E CAMPIELLI	4 (250)	500190			100.000,00					
* TERZO LOTTO FUNZIONALE MANUTENZ. VLE TRIESTE	4 (250)				900.000,00	131.725,00				
* MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' DI SOTTOMARINA	6 (252/5040)	500192		GM. 28/007-07-2004	500.000,00	500.000,00				
* RIFINANZIAM. ACCORDI PROGRAMMA CON IL MAV	7 (253)	500193			2.015.300,00					
LETTERA "D" - C. ART. 8 LEX 780/04										
COLLEGAM. ROTATORIA BRONDOLOV. MEDITERRANEO	8 (254)	500194		VARIE	1.800.000,00	39.752,00			7.476,00	19,23%
* VIABILITA' PARCHEGGI E VERDE CA' LINO E ISLA VERDE	8 (254)				1.800.000,00	0,00				
* RIQUALIFICAZ. URBANA ISOLA VERDE / 2° LOTTO	9 (255/5100)	500195		GM. 32/10/4-8-2004	1.035.310,98	1.035.310,98			24.196,93	2,34%
* RIQUALIFICAZ. URBANA I. VERDE / 2° LOTTO - 1° Stralcio	9			DT. 19/06/28-10-2004	484.689,02	484.689,02			125.568,08	
* PERIZIA OPERE URBANIZZAZ. FRAZ. CA' LINO	9 (255/5101)	500196		GM. 33/52/6-8-2004	500.000,00	500.000,00			119.089,91	
* OPERE URBANIZZAZ. NUOVE RETI TECNOLOGICHE ASP	10 (256/5120)	500197		DT. 12/34/04	1.500.000,00	978.000,00			522.000,00	
* RIQUALIFICAZ. VIABILITA' INCROCIO OSPEDALE	10			PCM. 17/0/4	210.000,00	978.000,00			522.000,00	0,00%
* INTEGRAZIONE OPERE URBANIZZAZ. A. B. S. GIOVANNI	11 (257)	500198		GM. 17/10/4 DT. 18/10/5	50.000,00	109.879,91				
* SISTEMAZ. / ARREDO URB. QUARTIERE PRIMAVERA	11			VARIE	109.320,99	109.320,99				
INTEGRAZ. OPERE URBANIZZ. RIADONNATEMIRAL	12 (258/5160)	500199			50.000,00					
* URBANIZZAZIONE A CAVANELLA	12 (258/5160)				240.000,00					
* SPAZIO ATTREZ. COLLETTIVO / PARCHEGGIO PUBBLICO	13 (259)	500200		GM. 24/28-01-2005	1.140.000,00	1.140.000,00				
* CENTRO CULTURALE E DI SERVIZI CORTE SALASCO	14 (260)	500201		GM. 52/29-12-2004	800.000,00	800.000,00				
* ACQUISTO AREA E REALIZZAZ. CANILE COMUNALE	15 (261)	500202		CC. 63/18-07-2004	500.000,00	452.007,54				
* ACQUISTO E RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI S. ANNA	16 (262/5240)	500203		PCM. 01/10/2005	271.000,00	31711,00			242.430,45	53,63%
LETTERA "E" - C. ART. 8 LEX 780/04										
STUDI SUL TERRITORIO	18 (264)	500204		VARIE	323.700,00	123.012,40			81.328,59	0,00%
* STUDI VAR					200.687,60	200.687,60				40,52%

IL DIRIGENTE
ing. Lucio NAPET

RIEPILOGO TOTALI	15.800.000,00	10.251.904,54	0,00	0,00	1.594.125,00
-------------------------	---------------	---------------	------	------	--------------

IL DIRIGENTE
Ing. Lucio NARETTI

COMUNE DI CHILOGGIA **Legge n. 166 del 27-12-2002 N. 289** **Es. 2004** **ELENCO OPERE PUBBLICHE (C.C. 169/4-12-2003)**

NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	CODICE (SCHEDA)	NUMERO CAPITOLO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHIESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
LETTERA "A" - ART. 6 - "C" - ART. 8 LEX 780/84									
REFINANZIAM. ACCORDI PROGRAMMA CON IL MAV	1 (285)	500205		3.984.700,00	35.199,30				0,00%
• RIAPERTURA CNL. PEROTTOLO RISANAM. AREE 1° Str.			Del. 959/19-05-2005		2.649.443,54				
• INTERVENTI DIFESA SOTTOMARINA S' STRALCIO			DM. 031-05-2005		1.299.057,16				
LETTERA "B" - LEX 780/84 - "C" - LEX 300/91									
COMPLETAM. BRETTELLA M. MARINACOMPARTO 8/C1	2 (266/6320)	500208	GM 289/14-7-04	750.000,00	750.000,00				
MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	3 (267)	500208		100.000,00					
MANUTENZIONE AREA PISTA DI PATINAGGIO	4 (268)	500208		25.000,00					
RIQUALIFICAZIONE VIA PASCOLON E SVINCOLO PIP	5 (269)	500209		750.000,00	336.141,12				
• VARIE / Service ecc.	5 (269/5380)		VARIE		4.406,40		4.406,40		
• BRETTELLA ARZERONESS.ROMEA/VIA PASCOLON	6 (270)	500210	GM 290/14-7-04	200.000,00	409.452,48		87.074,54	12.034,41	
• 2° PERIZIA MATERNA D.SCHIAVO	6 (270/400)		DT 1843/11-10-04		86.546,66		31.862,35		
• VARIE / MATERNA D.SCHIAVO	6 (270/5401)		VARIE		46.378,00		22.779,60		
REFINANZIAM. CAMPO SPORTIVO PARCO DEI PARCHI	7 (271)	500211		200.000,00					
INTEGRAZ. RIQUALIF. QUARTIERI EST ROMEA S.ANNA	8 (272)	500212		250.000,00					
CENTRO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZA MINORI	9 (273-5460)	500213	CC. 592/08-2004	1.000.000,00	1.000.000,00				
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI VALLI	10 (274/5460)	500214	GM 411/13-10-04	800.000,00	800.000,00			32.793,50	
LETTERA "C" - ART. 8 LEX 780/84									
STUDI SUL TERRITORIO	11 (275)	500215		154.500,00					
RIEPILOGO TOTALI				8.224.200,00	7.484.700,00	0,00	0,00	103.875,46	

IL DIRIGENTE
Ing. LUPID NAPETTI

COMUNE DI CHIOGGIA - Leggi 1-8-2002 N. 166 / 24-12-2003 N. 350 - Es. 2005 - ELENCO OPERE PUBBLICHE (C.C. 000/000-2005)


CODICE (SCHEDA)	NUMERO CAPITOLO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MUTUI RICHESTI	MUTUI EROGATI	MANDATI EMESSI	%
9	500232		658.025,49					
11	500234		500.000,00					
16	500239		570.000,00					
LETTERA "A" ART. 6 - "C" ART. 8 LEX 78084								
1	500224	GM 25027-5-05	988.274,51	988.274,51				
2	500225		600.000,00					
3	500226		600.000,00					
4	500227		150.000,00					
5	500228		250.000,00					
6	500229		500.000,00					
7	500230		400.000,00					
8	500231		600.000,00					
10	500233		100.000,00					
12	500235		300.000,00					
13	500236		300.000,00					
14	500237		300.000,00					
15	500238		250.000,00					
LETTERA "C" ART. 8 LEX 78084								
17	500240		138.700,00					
RIEPILOGO TOTALI			6.535.000,00	988.274,51	0,00	0,00	0,00	

Documento F ***Comune di Cavallino - Treporti***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
– Aggiornamento al 31 dicembre 2004

**COMUNE DI
CAVALLINO - TREPORI**
(Provincia di Venezia)
Settore Economico Finanziario

Prot. n. 22043



Addì, 27.6.2005



Spett.le
Magistrato alle Acque
Comitato di Indirizzo, Coordinamento
e Controllo
Palazzo X Savi
Venezia

Oggetto: Invio dati al 31.12.2004 circa gli interventi per la salvaguardia di Venezia.

In risposta alla Vs. richiesta del 24.5.2005, in allegato alla presente si inviano gli aggiornamenti ai quadri analitici al 31.12.2004 dello stato di attuazione dei finanziamenti relativamente alla legge speciale per Venezia, con riferimento alle L. 388/2000 e L.448/2001, nonché il quadro analitico riferito alla L. 166/02.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile di Settore
Dott. Dino Bonato

LEGGE N. 388/00

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGGE 388/00		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003	totale			
STATO:								
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2003	5.061	7.913	60.000	94.000	154.000	(2)		
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					89.997			
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli								
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					5.080			
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					49.157			
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					8.137			
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione								
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					1.629			
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca								
ALTRI ENTI:	1.790	4.337	21.870	52.131	74.001			
Provincia di Venezia	181	207	2.169	2.479	4.648			
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico								
Diocesi Patriarcato di Venezia (***)	=	2.374		28.488	28.488	(3)		
Procuratoria di S. Marco	=	103		1.239	1.239			
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31.12.2003	=	310		3.718	3.718	(3)		
Autorità Portuale - dati al 31.12.2003	=	362		4.300	4.300	(3)		
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2003	258	207	3.099	2.479	5.578	(2)		
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31.12.2003	465	207	5.578	2.479	8.057			
Fondazione Giorgio Cini - dati al 31.12.2003	516	207	6.524	2.610	9.134	(2)		
Consorzio Universitario (CO.R.I.L.A.) - dati al 31.12.2003	=	362		4.338	4.338	(3)		
Diocesi di Chioggia (***) - dati al 31.12.2003	370	=	4.500		4.500	(1)		
REGIONE VENETO (*) (***)	3.693	5.189	44.312	62.268	106.580			
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento					106.580			
COMUNE DI VENEZIA - dati aggiornati al 31.12.2003 (*)	3.925	6.972	43.920	90.000	133.920	(2)		
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					74.184			
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					17.937			
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					4.648			
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					10.811			
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)					26.340			
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2003 (***)	301	1.102	3.612	13.219	16.831	(2)		
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili								
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		1.102		13.219	13.219			
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia	301	=	3.612		3.612			
COMUNE DI CAVALLINO - TREPONTI - dati al 31.12.2003	207	310	2.494	3.736	6.230	(2)	6230	6230
TOTALE	14.977	25.823	176.208	315.354	491.562			

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002 e dal 2003.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002.

(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e dal 2003.

(3) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2003.

IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia e l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano

(**) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AULSS 14, l'Istituto Cavanis, Azienda Servizi Pubblici, l'Istituto per Anziani di Chioggia e la Diocesi di Chioggia, per interventi volti alla rivitalizzazione socio-economica e culturale della città di Chioggia. Solo la Diocesi ha fornito i dati di avanzamento, non compresi in quelli del Comune di Chioggia.

(***) A seguito della delibera del Comitato ex art.4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003 la Regione Veneto rinuncia ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno con decorrenza 2003 ad essa assegnati, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi (Palazzo Patriarcale di Venezia) di competenza della Diocesi.

Allegato n. 13

LEGGE N. 166/02 (Collegato Infrastrutture)
Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 166/02	IMPORTI ASSEGNATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2003	anno 2003			
STATO: ...					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova)	36.333	450.000	450.000		(*)
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		450.000	450.000		9
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					
COMUNE DI VENEZIA (**)	3.652	30.152	30.152	4.863	
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		13.755			
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		4.900			
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		4.324			
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		7.173			
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ni					
COMUNE DI CHIOGGIA (**)	685	7.563	7.563	8.224	
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI (**)	228	2.517	2.517	2.740	911
TOTALE	40.898	490.232	490.232	15.827	911

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali assegnati dal CIPE con decorrenza dal 2003

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per le Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti;
 - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Si ricorda che il primo elenco delle opere strategiche di cui alla delibera del CIPE del 21.12.2001, in attuazione della Legge Obiettivo (L. n. 443/01), ricomprende il "Sistema MOSE", per il quale è intervenuta una assegnazione di limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004 per l'attivazione di una prima tranches di finanziamenti da parte del CIPE con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, a valere sul "fondo" per le opere strategiche di cui all'art. 13 della Legge n. 166/02. Per i suddetti limiti di impegno è intervenuta la ripartizione da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 4 febbraio 2003, che ne ha destinato una quota parte alle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti. Con deliberazioni del CIPE n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003, a modifica e integrazione della precedente delibera n. 109 del 29.11.2002, è stato assegnato un unico limite di impegno di importo pari a 40,898 ME decorrente dal 2002 differito al 2003, ripartito secondo le indicazioni del Comitato.

- (*) Alcune attività sono state anticipate nelle more della formalizzazione degli Atti Attuativi finanziati con fondi CIPE.

- (**) Con il limite di impegno assegnato dal CIPE, il Comune di Venezia, quale soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto interministeriale n. 5279 del 20.03.2003, ha attivato finanziamenti in nome e per conto anche del Comune di Chioggia e di Cavallino - Treporti provvedendo a trasferire le somme di loro spettanza (10,080 ME). Per quanto attiene la quota degli importi assegnati al Comune di Venezia per il finanziamento delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia, importo pari a 10,168 ME, la devoluzione è avvenuta con apposito provvedimento. L'importo indicato (€ 30.152) è quindi al netto di tale quota.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 12

LEGGE N. 448/01

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 448/01			IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI	
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002	anno 2003	anno 2004	totale				
STATO:											
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2003				21.174			21.174				
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico				} 21.174			} 21.174				
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento											
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari											
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali											
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale											
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta											
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua											
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico											
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura											
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2003	3.254	5.268	10.325	39.000	63.000	123.000	225.000	(3)			
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche							3.861				
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli							127.000				
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insule, margin.							69.314				
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arretrato degrado							7.918				
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo							15.407				
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione							1.500				
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difese litorali							23.989				
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petrolti e valli da pesca	655	278	982	7.995	3.418	12.576					
ALTRI ENTI:											
Provincia di Venezia	113			1.356			1.356				
L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico							3.760	(4)			
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31.12.2003	155	=	129	1.860	1.900		3.024				
IUAUV dati al 31.12.2003	=	149	103		1.788		3.040	(4)			
Autonità Portuale di Venezia - dati al 31.12.2003	129	=	129	1.520	1.520		1.548				
Aeroporto Marco Polo	=	=	129				1.608				
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31.12.2003	=	=	129				6.889				
Fondazione Giorgio Cini dati al 31.12.2003	258	129	129	3.259	1.630	2.000	1.548	(4)			
Consorzio Universitario (CO.RI.LA.) dati al 31.12.2003	=	=	129				1.216				
Diocesi di Chioggia (**)	=	=	100								
REGIONE VENETO dati al 31.12.2003 (*)	3.254	4.932	9.007	39.048	59.184	108.084	206.316				
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)							206.316				
Disinquinamento											
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2003 (*)	2.505	4.170	8.780	27.372	45.448	94.824	167.644	(3)			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							51.426				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria							49.547				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati							23.398				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi							5.152				
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri (**)							38.121				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2003 (**)	387	658	1.450	4.644	7.896	17.400	29.940	(3)			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							28.140				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture							1.800				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	387	658	1.300	4.644	7.896	15.600					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	=	=	150								
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia	=	=									
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI dati al 31.12.2003	110	186	439	1.350	2.232	5.268	8.850	(2)	8838	8838	
TOTALE	10.165	15.492	30.987	140.583	181.178	361.152	682.913				

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004.

- Finanziamenti per lo Stato in amministrazione diretta:

l'importo indicato è stato finanziato in conto capitale per "spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna" sul cap. 8620 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e assegnato in conto competenza per € 10.587.366,00 nel 2002 e € 10.587.366,00 nel 2003.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

- (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002.
- (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e dal 2003.
- (3) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004.
- (4) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e/o dal 2004.

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato ri.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato ri.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia, Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, Fondazione Querini Stampalia e Fondazione Ugo ed Olga Levi, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Venezia.

(**) A seguito della delibera del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003 il Comune di Chioggia rinuncia ad una quota complessiva di limiti di impegno con decorrenza 2004, pari a 250.000 euro che viene assegnata per 150.000 euro all'AULSS 14 di Chioggia per la prosecuzione delle opere a favore dell'Ospedale Civile di Chioggia e per 100.000 euro alla Diocesi di Chioggia per la prosecuzione delle opere di risanamento delle chiese dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina.

Venezia, 1° settembre 2004

Documento G Università Ca' Foscari di Venezia

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
— Aggiornamento al 31 dicembre 2004





UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
VENEZIA

DIVISIONE
RAGIONERIA

SEGRETERIA COMITATO

Prot. n. 20148 - VIII/1
Rag/MN/af



Venezia, 28 06 2005

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo (art. 4 - Legge
29.11.1984, n. 798)
San Polo, 19

30125 VENEZIA

Oggetto: Dati per "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Come richiesto, si invia il quadro delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Con i migliori saluti



IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Ghetti

Il Responsabile del Procedimento Tecnico:
Dott. Francesco Sorrentino - Direttore Divisione Servizi Tecnici

Il Responsabile del Procedimento Contabile:
Dott.ssa Martina Nardo - Direttore Divisione Ragioneria

Sezione Contabilità
tel. 041 2348270

Sezione Stipendi
tel. 041 2348209

fax 041 2348380


CA' FOSCARI
Dorsoduro, 3246
30123 VENEZIA

COD. FISC. 80007720271

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Fondi	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
798/84	L. 67/88	12.911.422,49	S. Sebastiano	1.291.142,25	1.291.142,25	1.266.105,44
			S. Margherita	1.581.112,61	1.581.112,61	1.581.112,61
			Ca'Garzoni e Moro	1.549.370,70	1.549.370,70	1.548.043,94
			Ca'Foscari	296.446,26	296.446,26	50.167,53
			S. Marta	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,26
			Calle dei Guardiani	2.530.638,81	2.530.638,81	2.515.528,18
			Palazzo Nani Mocenigo	662.376,16	662.376,16	476.273,44
			Ca' Cappello	258.228,45	258.228,45	249.766,67
			Wolf Ferrari	258.228,45	258.228,45	258.228,45
			Celestia	569.135,50	569.135,50	569.135,50
			S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale	1.125.876,04	1.125.876,04	1.125.876,04
		12.911.422,49		12.911.422,49	12.911.422,49	12.429.105,06
	Totale L. 798/84	12.911.422,49				



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia


Legge 139/92	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
	Imi	13.090.805,21	Informatizzazione Ateneo e Biblioteche S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale Zattere - Acquisto SCI Opere varie - Manutenzione straordinaria Ca' dalla Zorza - Acq. 3° piano Totale Mutuo Imi	2.606.342,05 3.550.930,01 5.388.023,87 1.211.113,81 334.395,47 13.090.805,21	2.606.342,05 3.550.930,01 5.388.023,87 1.211.113,81 334.395,47 13.090.805,21	2.606.342,05 3.550.930,01 5.388.023,87 1.211.113,81 334.395,47 13.090.805,21
	Bnl	4.900.450,69	S. Giobbe fase A - Restauro e adeg. Funzionale Ca' Bembo - Acquisto Zattere - Acquisto Stargas 1 Zattere - Acquisto Stargas 2 Totale Mutuo Bnl	919.575,82 1.500.751,90 1.291.597,12 1.188.525,85 4.900.450,69	919.575,82 1.500.751,90 1.291.597,12 1.188.525,85 4.900.450,69	919.575,82 1.500.751,90 1.291.597,12 1.188.525,85 4.900.450,69
	Totale L. 139/92	17.991.255,90		17.991.255,90	17.991.255,90	17.991.255,90

CA' FOSCARI - VENEZIA
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI
PIÙ PER VENEZIA

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
539/95	Crediotop I	4.717.454,71	S. Giobbe - Edifici vari Ca' Garzoni - Restauro S. Marta Fabb. C Opere varie - Manutenzione straordinaria Totale Mutuo Crediotop I	3.096.994,00 901.194,40 347.723,11 371.543,20 4.717.454,71	3.096.994,00 901.194,40 347.723,11 371.543,20 4.717.454,71	3.096.994,00 773.022,10 347.723,11 371.543,20 4.589.282,41
	Interbanca	4.519.856,17	S. Giobbe fase C e B S. Giobbe Edificio Ex Poste Via Torino - Capannoni S. Marta - Teatro Poli Via Torino - Facoltà di Scienze Opere varie - Manutenzione straordinaria Totale Mutuo Interbanca	1.851.878,35 960.609,27 808.931,78 11.765,24 516.456,90 370.214,07 4.519.855,61	1.851.878,35 960.609,27 808.931,78 11.765,24 516.456,90 370.214,07 4.519.855,61	1.544.557,87 959.736,61 808.931,78 11.765,24 227.075,18 136.306,07 3.688.372,75
Totale L. 539/95		9.237.310,88		9.237.310,32	9.237.310,32	8.277.655,16



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato		
515/96	Mediocredito	14.570.918,33	S. Giobbe fase C e B	3.398.918,83	3.398.918,83	2.346.192,21		
			Zattere - Capannone	3.822.445,61	3.822.445,61	3.810.604,73		
			Attuazione D. lgs. 626/94	1.291.142,25	1.291.142,25	1.227.248,00		
			Acquisto Edificio Ex Poste	5.965.077,19	5.965.077,19	5.965.077,18		
			Ca' Foscari - restauro	93.334,45	93.334,45	91.536,00		
			Totale Mutuo Mediocredito	14.570.918,33	14.570.918,33	13.440.658,12		
			Crediotop 2	7.562.973,82	S. Giobbe fase C e B	6.089.026,84	6.089.026,84	5.293.227,85
					Zattere - Capannone	516.456,90	516.456,90	467.135,01
					Adeg. Ex falegnameria Bozzola	957.490,08	957.490,08	-
					Totale Mutuo Crediotop 2	7.562.973,82	7.562.973,82	5.760.362,86
Totale L. 515/96		22.133.892,15		22.133.892,15	19.201.020,98			


Il Rettore
Prov. del Veneto

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
345/97	Crediotop 3	19.505.426,22	S. Giobbe fase C e B Ca' Foscari - restauro Acquisto Falegnameria Ex Bozzola Opere varie - Manutenzione straordinaria S. Marta - Copertura Fabbricato B S. Margherita Auditorium - Rilascio CPI Via Torino - Adeguamento locali Palazzo Cosulich - Chiusura porticato Ca' Cappello - Manutenzione locali 1° e 2° piano Via Torino - Fac. Scienze Fondo per accordi bonari	9.626.756,60 4.229.808,87 258.228,45 1.245.840,47 66.770,00 40.250,90 78.207,00 40.495,00 57.705,00 2.568.363,93 1.293.000,00	9.626.756,60 4.229.808,87 258.228,45 1.245.840,47 66.770,00 40.250,90 78.207,00 40.495,00 57.705,00 2.568.363,93 1.293.000,00	7.850.982,30 58.824,61 258.228,45 1.024.184,93 66.770,00 - 77.285,99 37.836,60 56.471,66 - -
	Totale Mutuo Crediotop 3			19.505.426,22	19.505.426,22	9.430.584,54
	Meliorbanca*	7.040.144,43	S. Giobbe fase C e B Ca' Foscari - restauro Ca' Foscari - trasloco Via Torino - Fac. Scienze Opere varie - Manutenzione straordinaria Fondo per accordi bonari S. Sebastiano S. Sebastiano - Trasloco Ca' Foscari - Trasloco	953.803,20 7.134,57 94.630,35 3.703.631,23 531.424,00 1.000.000,00 649.521,08 50.000,00 50.000,00	953.803,20 7.134,57 94.630,35 3.703.631,23 531.424,00 1.000.000,00 649.521,08 50.000,00 50.000,00	391.670,64 7.134,57 - - - 500.000,00 - - - 898.805,21
	Totale L. 345/97	26.545.570,65	Totale Mutuo Meliorbanca	7.040.144,43	26.545.570,65	10.329.389,75


* L'Istituto di Credito ha rideterminato il mutuo in Euro 7.040.144,43.



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia


Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
295/98	San Paolo Imi 1	10.044.089,42	S. Basilio - Adeg. Funzionale	46.512,00	46.512,00	-
			Ca'Foscari - restauro	8.260.551,82	8.260.551,82	2.463.263,25
			Zattere - Capannone	469.975,78	469.975,78	215.820,00
			Via Torino - Fac. Scienze	1.267.049,82	1.267.049,82	-
			Totale Mutuo Credtop 3	10.044.089,42	10.044.089,42	2.679.083,25
San Paolo Imi 2	12.911.422,48	S. Giobbe fase A. 5° stralcio	72.671,91	72.671,91	17.811,74	
		Attuazione D.lgs. 626/94	516.456,90	516.456,90	174.333,82	
		Via Torino - Fac. Scienze	12.322.293,67	12.322.293,67	-	
		Totale Mutuo San Paolo Imi 2	12.911.422,48	12.911.422,48	192.145,56	
Totale L. 295/98		22.955.511,90		22.955.511,90	22.955.511,90	2.871.228,81



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia


Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
388/00	Opi 2	3.718.489,68	Via Torino - Facoltà di Scienze	3.718.489,68	3.718.489,68	-
			Totale Mutuo Opi 2	3.718.489,68	3.718.489,68	-
	Totale L. 388/00	3.718.489,68		3.718.489,68	3.718.489,68	-



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
448/01	Opi I	1.860.000,00	Via Torino - Facoltà di Scienze	1.860.000,00	1.860.000,00	-
			Totale Mutuo Opi I	1.860.000,00	1.860.000,00	-
	Unicredit	1.900.000,00	Via Torino - Facoltà di Scienze	1.900.000,00	1.900.000,00	-
			Totale Mutuo Unicredit	1.900.000,00	1.900.000,00	-
Totale L. 448/01		3.760.000,00		3.760.000,00	3.760.000,00	-





Documento H ***Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2004

U
A
V

SECRETARIA COMITATO

Tolentini / Santa Croce 191
30135 Venezia
t. +39 041 524 6758 f. +39 041 257 1808
asg-amm@iuav.it www.iuav.itAREA DEI SERVIZI
GENERALI, IMMOBILIARI
E PATRIMONIALIArea Servizi Generali, Patrimoniali e Immobiliari *Franco Bacciolo*
t. +39 041 257 1829 - bacciolo@iuav.itVenezia, 20/7/2005
prot. n. 12045
Tit.
anno 2005/fasc. n.Al Magistrato alle Acque
Al Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
Ing. Maria Giovanna Piva

Oggetto: Aggiornamento al 31/12/04 dello stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia svolti dall'Università luav di Venezia a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

In riferimento alla Vostra nota Prot. n. 349/GAB in data 24/05/05, si trasmette in allegato l'aggiornamento relativo agli interventi di competenza di questa Università luav di Venezia.

Con i migliori saluti.

Il dirigente asG
Franco Bacciolo

UTILIZZO MUTUI LEGGE SPECIALE VENEZIA - anno 2004
quadro analitico stato attuazione finanziam. al 31/12/04 (importi in migliaia di euro)

legge	banca	imp.sottoscritto	imp.impegnati	imp.spesi	disponibilità
139/92	Imi 92+BNL 93	10.493	10.493	10.493	0
539/95	Carisbo 1+2	6.246	6.246	6.246	0
515/96	Mediocredito	6.415	6.415	6.059	0
515/96	Crediop (600)	3.463	3.463	3.463	0
345/97	Carive	6.208	6.208	5.844	0
345/97	Crediop (1000)	5.831	5.831	5.831	0
295/98	OPI 99	6.281	2.343	2.025	3.938
295/98	OPI 00	6.281	6.281	5.019	0
448/01	OPI 03	1.788	1.788	1.788	0
448/01	Unicredit	1.236	1.236	1.236	0
Totale		54.242	50.304	48.004	3.938

Documento I ***Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia — CO.R.I.LA***

Stato di attuazione delle attività finanziate dalla legge speciale per Venezia — Aggiornamento al 31 dicembre 2004



Consorzio per la
Gestione del Centro
di Coordinamento
delle Attività
di Ricerca Inerenti
il Sistema Lagunare
di Venezia

Palazzo Franchetti
S. Marco 2847
30124 Venezia
Tel. +39.041.2402511
Fax +39.041.2402512
venezla@corila.it
www.corila.it
C.F. 94041400279
PIVA 03338290277

MAGISTRATO ALLE ACQUE
EGRETERIA -

15. LUG. 2005

Prot. N. 552 /GAB.

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

06. LUG. 2005

GABINETTO

Prot. 511/05
Venezia, 28/06/05

MAGISTRATO ALLE ACQUE
ARCHIVIO
ARR. 08. LUG. 2005 —
Prot. N. 5077

Al Presidente
del Magistrato alle Acque di Venezia
Ing. Maria Giovanna Piva
Palazzo X Savi
30121 Venezia

Gentile Presidente,

in risposta alla cortese Sua del 24/05/05 si comunicano i dati
aggiornati al 31/12/04 relativamente ai finanziamenti assegnati.

Legge n. 295/98

Limiti di impegno		Importi assegnati e disponibili		Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
1999	2000	1999	2000			
258	258	3262*	3333*	6595*	6595*	6595*

* Gli importi qui riportati differiscono da quelli presentati gli anni precedenti a motivo delle minori spese per interessi e si intendono definitivi, essendo terminato il "periodo di utilizzo" dei mutui stessi. (nota: il fattore moltiplicativo del limite di impegno è risultato 12,78)

Legge n. 388/00

Limiti di impegno	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
2003	2003			
362	4.338	4.338	4.338	927



Legge n. 488/01

Limiti di impegno	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
2004	2004			
129	1.548	1.548	1.548	0



Cordiali saluti

Il Direttore


Ing. Pierpaolo Campostrini

Documento L SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo

Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la
legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2004



Spettabile
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque
Comitato di Indirizzo,
coordinamento e controllo
Riva del Vin, 19
30100 Venezia



OGGETTO: AEROPORTO MARCO POLO TESSERA VENEZIA
*ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI OTTENUTI CON LA
LEGISLAZIONE SPECIALE.*

In riferimento alla Vostra richiesta del 24 maggio 2005 prot. n.349/GAB, con la presente si trasmette prospetto riepilogativo delle opere, eseguite presso l'Aeroporto di Venezia, per le quali Save S.p.A. ha usufruito dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Distinti saluti.

Dott. Enrico Marchi

All.: prospetto avanzamento contabile al 31.12.04

Tessera Venezia, 29 giugno 2005
Prot. n. 05/088 /Pres/EM/LS/mc

AVANZAMENTO CONTABILE OPERE AL 31/12/2004

(valori in € - aggiornamento 31 dicembre 2004)

TIPOLOGIE OPERE	IMPORTO OPERA (al netto spese generali)	AVANZAMENTO OPERA al 31 dicembre 2004	PERCENTUALE AVANZAMENTO	NOTE
RIQUALIFICAZIONE PISTE VOLO	18.175.695,82	18.175.695,82	100,00%	op. completata nel 1996
NUOVA AEROSTAZIONE: OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE	53.894.498,03	53.894.498,03	100,00%	op. completata nel 2002
NUOVA AEROSTAZIONE: IMPIANTI INFORMATIVI AL PUBBLICO	1.776.911,93	1.776.911,93	100,00%	op. completata nel 2003
NUOVA AEROSTAZIONE: SISTEMA BAGAGLI BHS	13.982.398,01	13.982.398,01	100,00%	op. completata nel 2003
NUOVA AEROSTAZIONE: IMPIANTI ELEVATORI	2.641.109,74	2.641.109,74	100,00%	op. completata nel 2003
NUOVA AEROSTAZIONE: PONTILI TELESCOPICI	1.903.832,40	1.903.832,40	100,00%	op. completata nel 2003
NUOVA AEROSTAZIONE: SICUREZZA BAGAGLI	4.589.964,41	4.589.964,41	100,00%	op. completata nel 2003
NUOVA AEROSTAZIONE: GUIDA OTTICA	241.714,16	241.714,16	100,00%	op. completata nel 2003
PIAZZALI AEROMOBILI: 1° STRALCIO	8.456.313,25	8.456.313,25	100,00%	op. completata nel 2000
PIAZZALI AEROMOBILI: 2° STRALCIO	12.561.097,48	12.561.097,48	100,00%	op. completata nel 2002
PIAZZALI AEROMOBILI: LATO NORD	1.624.217,87	1.624.217,87	100,00%	op. completata nel 2002
PIAZZALI AEROMOBILI: LATO SUD	1.191.164,14	1.191.164,14	100,00%	op. completata nel 2003
IMPIANTI TECNOLOGICI DI PIAZZALE	5.383.347,83	5.383.347,83	100,00%	op. completata nel 2002
VIABILITA' E PARCHEGGI	4.990.199,51	4.990.199,51	100,00%	op. completata nel 2000
VIABILITA' A DOPPIO LIVELLO	9.340.499,91	9.340.499,91	100,00%	op. completata nel 2001
VIABILITA' ACCESSO AREA MERCI	2.112.797,56	2.112.797,56	100,00%	op. completata nel 2001
FABBRICATO MERCI	4.714.542,27	4.714.542,27	100,00%	op. completata nel 2001
TOTALE	147.580.304,32	147.580.304,32	100,00%	

Sono riportate esclusivamente le opere parzialmente finanziate da Legge Speciale Venezia e non tutte le opere in corso di esecuzione sul sedime aeroportuale


Documento M Autorità Portuale di Venezia

Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2004




Autorità Portuale di Venezia

Direzione Amministrazione e Pianificazione



SEGRETERIA



AI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Segreteria del Comitato di coordinamento
e controllo
(art.4 - legge 29.11.1984, n.798)
S.Polo, 19
30125 VENEZIA

DPEF-124/682
Venezia, 30.06.2005

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia - Leggi 515/1996, 295/1998, 388/2000 e 448/2001. Aggiornamento al 31/12/2004.

In risposta alla lettera Prot. 349/GAB del 24 maggio 2005 si trasmettono di seguito i dati relativi allo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con le Leggi in oggetto aggiornati al 31 dicembre 2004.

Fonte di finanziamento	Dati al 31/12/2004		
	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Legge 515/96 (I° e II° tranche)	€ 36.351,00	€ 36.736,12	€ 34.214,72
Legge 295/98 (I° e II° tranche)	€ 13.685,00	€ 11.637,88	€ 6.953,09
Legge 388/00 (rif.to L.295/98 contributo dal 2003)	€ 4.300,00	€ 4.216,49	€ 1.765,36
Legge 448/01 (rif.to L.295/98 contributi dal 2002 e dal 2004)	€ 3.040,00	€ 1.685,43	€ 599,43

Si trasmettono inoltre, in allegato, le schede analitiche per ogni tranche di finanziamento con l'elenco dei singoli impegni e pagamenti.

Il Direttore
Dott. Martino Conticelli

Allegati: c.s.

Fonte di finanziamento	Dati al 31/12/2004			
	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi	Importi spesi
Legge 515/96 (1° e II° tranche)	€ 36.351,00	€ 36.736,12	€ 34.214,72	
Legge 295/98 (1° e II° tranche)	€ 13.685,00	€ 11.637,88	€ 6.953,09	
Legge 388/00 (rif. to L.295/98 contributo dal 2003)	€ 4.300,00	€ 4.216,49	€ 1.765,36	
Legge 448/01 (rif. to L.295/98 contributi dal 2002 e dal 2004)	€ 3.040,00	€ 1.685,43	€ 599,43	

TABELLA 1 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 515/96 1° TRANCHE AL 31/12/2004

Descrizione	Impegnato in Euro		Tranche	Quistanzato in Euro	
	€	€		€	€
Indagini geognostiche	15.153,36	15.153,36	1997		
Escavo canali convenzione con AMAV	1.549.375,86	1.549.375,86	1997		
Escavo bacino di evoluzione 4	402.182,88	402.182,88	1997		
Fornitura sistema software	58.258,22	58.258,22	1997		
Escavo cunetta bacino 4	242.687,14	242.687,14	1997		
Convenzione amav smaltimento fanghi	1.606.863,71	1.606.863,71	1997		
Riparazione accosto RO-Ro banchina Isonzo	222.632,47	222.632,47	1997		
Carotaggi bacini Venezia	67.710,08	67.710,08	1997		
Progettazione molo sali	134.278,79	134.278,79	1997		
Escavo canale Novisso	66.508,11	66.508,11	1997		
Escavo da 52W a 196W	723.032,69	723.032,69	1997		
Sistemazione sponda nord canale incl.le sud	727.134,30	727.134,30	1997		
Escavo fondali testata marmi	175.271,79	175.271,79	1997		
Escavo 17W - 42W	70.391,72	70.391,72	1997		
Indagini geognostiche	3.190,10	3.190,10	1997		
Ampliamento incarico progett.ne M.Sali	25.822,84	25.822,84	1997		
Collaudo bacino ev.ne 4 e canale ind.le	1.478,40	1.478,40	1997		
Escavo accosti operativi n.7 e 8 di b.na Testata Marmi ed accosti di b.na Tagliamento	206.582,76	206.582,76	1997		
Completamento Banchinamento M.Sali	8.548.063,41	8.548.063,41	1997		
Escavo Bacino 1	564.652,39	564.652,39	1997		
Escavo per ordinaria man.ne ormeggi 6-7-8-9 b.na Veneto Molo A	62.696,60	62.696,60	1997		
Escavo per ordinaria man.ne ormeggi b.na Friuli, Cadore, orm.4/5 b.na Veneto, orm. B.na Lombardia, Aosta e Piemonte	225.106,93	225.106,93	1997		
Escavo orm.24/25/26/27 b.na S.Marta e orm.28/29 b.na Di Cio	41.100,84	41.100,84	1997		
Caratterizzazione fanghi b.na Liguria	104.583,66	104.583,66	1997		
Escavo B.no Tronchetto ed accosti	1.291.142,25	1.291.142,25	1997		
Escavo accosti 7/8 Marittima	58.770,84	58.770,84	1997		
Escavo l tratto canale sud ripristino a -9.5 (imp.1465/00)	231.942,50	231.942,50	1997		
Bon. ordigni bellici B.na Sali/B.na Liguria (parte di 1,2)	362.581,09	362.581,09	1997		
Controllo movimentazione fanghi d'escavo - posizionamento satellitare GPS anno 2001	53.980,95	53.980,95	1997		
Perizia di variante b.na Molo Sali	63.214,32	63.214,32	1997		
Escavo bacino evoluzione S. Elena	312.191,08	312.191,08	1997		
Escavo banchina Idromacchine - canale ind. W	146.101,14	146.101,14	1997		
Escavo accosti antistanti banchina Liguria	3.098.741,39	3.098.741,39	1997		
TOTALE	€ 21.463.324,64	€ 21.463.324,64			€ 20.226.594,99

TABELLA 2 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 515/96 II° TRANCHE AL 31/12/2004

Descrizione	Impegnato in Euro		Tranche	Tipo Progetto	Importo Quietanzato in Euro	
	€	€			€	€
Sistemazione area Molo Sali	45.408,24	45.408,24	1998	Sistemazione area	45.408,24	45.408,24
Recinzione doganale a Marghera	121.281,04	121.281,04	1998	Sistemazione area	121.281,04	121.281,04
Sistemazione sponda nord canale ind.le	2.485.976,38	2.485.976,38	1998	Escavo Il fase	2.485.976,38	2.485.976,38
Formazione recinzione punto franco	53.145,85	53.145,85	1998	Sistemazione area	53.145,85	53.145,85
Carotaggi ed analisi	87.797,67	87.797,67	1998	Escavo Il fase	87.797,67	87.797,67
Manut.ne area ex monopoli	721.190,21	721.190,21	1998	Sistemazione area	721.190,21	721.190,21
Carotaggi ed analisi (maggiori oneri)	32.367,39	32.367,39	1998	Escavo Il fase	32.367,39	32.367,39
Escavo Bacino 4	1.187.850,87	1.187.850,87	1998	Escavo Il fase	1.187.850,87	1.187.850,87
Escavo bacino 3	1.384.157,89	1.384.157,89	1998	Escavo Il fase	1.384.157,89	1.384.157,89
Escavo Bacino 4	361.519,83	361.519,83	1998	Escavo Il fase	361.519,83	361.519,83
Escavo Bacino di evoluzione -3 lato Est	929.622,42	929.622,42	1998	Escavo Il fase	929.622,42	929.622,42
Escavo accosti CIA e curva verso ramo nord est in canale ovest a Marghera	413.165,52	413.165,52	1998	Escavo Il fase	413.165,52	413.165,52
Conferimento fanghi Isola Tresse (AMAV)	2.582.284,82	2.582.284,82	1998	Escavo Il fase	2.582.284,82	2.582.284,82
Conferimento fanghi Isola Tresse (AMAV)	2.582.284,50	2.582.284,50	1998	Escavo Il fase	2.582.284,50	2.582.284,50
Posizionamento satellitare GPS	59.961,77	59.961,77	1998	Escavo Il fase	59.961,77	59.961,77
Escavi accosti antistanti b.na Sali	502.433,81	502.433,81	1998	Escavo Il fase	502.433,81	502.433,81
Escavi canale Ovest B.na Liguria	1.000.000,00	1.000.000,00	1998	Escavo Il fase	1.000.000,00	1.000.000,00
Smaltimento fanghi Amav (giugno 2002/giugno 2003)	521.000,00	521.000,00	1998	Escavo Il fase	521.000,00	521.000,00
Smaltimento fanghi Amav (giugno 2002/giugno 2003) -maggior spesa-	131.600,00	131.600,00	1998	Escavo Il fase	131.600,00	131.600,00
Caratterizzazione sedimenti bacini 1/2/3/4	69.740,91	69.740,91	1998	Escavo Il fase	69.740,91	69.740,91
TOTALE	€ 15.272.799,12	€ 15.272.799,12			€ 13.986.126,51	€ 13.986.126,51

TABELLA 3 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 295/98 1° TRANCHE AL 31/12/2004

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA		TABELLA 3 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 295/98 1° TRANCHE AL 31/12/2004			
Descrizione	Impegnato in Euro	Tranche	Tipo Progetto	Importo Quietanzato in Euro	
Sistem. Piazzale testata molo Ponente	€ 55.209,19	1999	Sistemazione rete fognaria	€ 55.209,19	
Sistemazione rete fognaria Marittima (compresi impianti di depurazione)	€ 2.600.000,00	1999	Sistemazione rete fognaria	€ 2.500.688,36	
Ricalibratura fondali bricole 60W/196W canale Malamocco (comprende maggiori lavori dec. 1339/02)	€ 457.516,56	1999	Escavi	€ 457.516,56	
Costr. vasche l pioggia B. Friuli/Cadore	€ 190.746,19	1999	Sistemazione rete fognaria	€ 186.865,75	
Prog. impianto tratt. acque Molo Ponente	€ 675.689,45	1999	Sistemazione rete fognaria	€ 279.417,85	
Escavo bacino 4 - Canale Sud - Marghera	€ 700.000,00	1999	Escavi	€ 272.395,90	
Conferimento fanghi b.na Liguria	€ 37.500,00	1999	Escavi	€ -	
Costr. vasche l pioggia - indagini geognostiche	€ 29.969,00	1999	Sistemazione rete fognaria	€ 29.969,00	
TOTALE	€ 4.746.630,39			€	3.782.082,61

TABELLA 4 - ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 295/98 1° TRANCHE AL 31/12/2004


Descrizione	Impegnato in Euro	Tranche	Tipo Progetto	Importo Quietanzato in Euro
 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA				
Costituzione il lotto b.na Liguria	€ 2.078.957,21	2000	Il Lotto B.na Liguria	€ 2.078.957,21
Ristrutturazione ex chiesa S. Marta	€ 20.165,39	2000	Restauro ex chiesa S.Marta	€ 20.165,39
Bon. ordigni bellici B.na Sali/B.na Liguria (parte di 1,2)	€ 26.208,96	2000	Escavo	€ 26.208,96
Carotaggi + analisi fanghi fondali B. Sali	€ 108.264,34	2000	Escavo	€ 108.264,34
Perizia di variante b.na Liguria Il lotto	€ 74.046,42	2000	Il Lotto B.na Liguria	€ 74.046,42
Direzione lavori restauro ex chiesa S. Marta	€ 127.782,00	2000	Restauro ex chiesa S.Marta	€ 124.004,81
Collaudo B.na Liguria	€ 19.678,16	2000	Il Lotto B.na Liguria	€ 19.678,16
Escavo mt. - 12 accosti B. Molo Sali	€ 2.200.000,00	2000	Escavo	€ 101.676,40
Prog. Servizio accoglienza Chiesa S. Marta	€ 44.500,00	2000	Restauro ex chiesa S.Marta	€ 17.653,75
Cavidotto alimentazione Chiesa S. Marta	€ 8.108,87	2000	Restauro ex chiesa S.Marta	€ 8.108,87
Messa in sicurezza tratto B. Tagliamento	€ 245.000,00	2000	Sist. Banchine	€ 12.980,00
Prog. Preliminare messa in sicurezza tratto B. Tagliamento	€ 50.000,00	2000	Sist. Banchine	€ 42.474,50
Posa bitta in B. Tagliamento	€ 45.636,79	2000	Sist. Banchine	€ 45.636,79
Dir lavori B. Ligabue	€ 40.000,00	2000	Sist. Banchine	€ -
Esca accosti B. Tagliamento/Isonzo e Testata Marmi	€ 250.000,00	2000	Escavo	€ 89.479,95
Escavi accosti B.no Trnchetto/B. Di Ciò e B. S. Marta	€ 400.000,00	2000	Escavo	€ 167.504,63
Smalt. Fanghi accosti CIA	€ 300.000,00	2000	Escavo	€ 230.995,32
Analisi terreno per progetto B.na Tagliamento	€ 3.168,00	2000	Sist. Banchine	€ 3.168,00
Validazione progetto consolidamento b.na Tagliamento	€ 22.000,00	2000	Sist. Banchine	€ -
Rilevi subacquei b.na Tagliamento	€ 9.240,00	2000	Sist. Banchine	€ -
Lavori di man.ne B.na Ligabue	€ 300.000,00	2000	Sist. Banchine	€ -
Agg.to oneri progett.ne e dir.ne lavori ex Chiesa S. Marta	€ 148.495,07	2000	Restauro ex chiesa S.Marta	€ -
Sistemazione esterna Chiesa S. Marta	€ 370.000,00	2000	Restauro ex chiesa S.Marta	€ -
TOTALE	€ 6.591.251,21			€ 3.171.003,50


TABELLA 5 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 388/00 1° TRANCHE AL 31/12/2004

Descrizione	Impegnato in Euro	Tranche	Tipo Progetto	Importo Quietanzato in Euro
Escavo e smaltimento fanghi accosti CIA	€ 1.500.000,00	2003	Escavi	€ 1.500.000,00
Coord. secur. 3a Perizia banc. Molo Sali	€ 30.028,59	2003	Escavi	€ 30.028,60
Escavo tratto canale Vittorio Emanuele III°	€ 1.200.000,00	2004	Escavi	€ 78,00
Controllo movimentaz. Fanghi a/m GPS	€ 55.948,08	2004	Escavi	-
Smaltimento fanghi accosti CIA	€ 280.516,00	2004	Escavi	€ 235.256,03
Ricalibratura cunetta canale Malamocco	€ 850.000,00	2004	Escavi	-
Escavo lato est b.no ev.ne 3 canale Malamocco Marghera	€ 300.000,00	2004	Escavo	-
TOTALE	€ 4.216.492,67			€ 1.765.362,63



AUTORITÀ PORTUALE
DI
VENEZIA


TABELLA 6 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 448/01 1° TRANCHE AL 31/12/2004



**AUTORITÀ PORTUALE
DI
VENEZIA**

Descrizione	Impegnato in Euro	Tranche	Tipo Progetto	Importo Quietanzato in Euro
Completamento Molo Sali II perizia suppletiva di variante	€ 559.979,39	2002	Escavi e man. ne canali	€ 559.979,39
Completamento Molo Sali III perizia di variante	€ 1.125.450,68	2002	Escavi e man. ne canali	€ 39.451,71
TOTALE	€ 1.685.430,07			€ 599.431,10

TABELLA 7 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 448/01 II° TRANCHE AL 31/12/2003



**AUTORITA' PORTUALE
DI
VENEZIA**

Descrizione	Impegnato in Euro	Tranche	Tipo Progetto	Importo Quistanzato in Euro
	€ -	2004		€ -
	€ -	2004		€ -
	€ -	2004		€ -
	€ -	2004		€ -
TOTALE	€ -			€ -


Documento N Azienda Speciale per il Porto di Chioggia

Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti
ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia —
Aggiornamento al 31 dicembre 2004




GABINETTO

AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA VENEZIA



Prot. n. 313/287

Anticipata via fax
al n. 041/794384



Chioggia, 20 Giugno 2005

Spett.le

Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle acque di Venezia

Comitato di Indirizzo Coordinamento e

Controllo

San Polo, 19

30100 - VENEZIA (VE)

Oggetto: Legge Speciale per Venezia - Utilizzo dei finanziamenti

In riferimento alla Vostra nota prot. 349/GAB del 24 maggio 2005, questa Azienda trasmette in allegato i dati richiesti in merito all'utilizzo dei fondi assegnati con la legislazione speciale, aggiornato al 31 dicembre 2004.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i Nostri più cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Com.te Oscar Nalesso

Allegato

Allegato

FONDI LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

(Importi in migliaia di euro)

SOGGETTI	Limiti di impegno ex Legge 448/98		Importi assegnati e disponibili		Contratti di mutuo	Importi assegnati	Importi spese
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999			
Azienda Speciale per il Porto di Chioggia	129	=	=	1.548	1.559	1.559	1.559

Contratto di Mutuo con la Banca San Paoli Imi

Base d'asta: euro 1.935.000,00

Netto incassato in relazione ai tassi d'interesse annui: euro 1.559.000,00

SOGGETTI	Limiti di impegno ex legge 388/00		Importi assegnati e disponibili		Contratti di mutuo	Importi assegnati	Importi spese
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003			
Azienda Speciale per il Porto di Chioggia	465	207	5.578	2.479	7.170	7.170	162.041

Contratto di Mutuo con la Banca UNICREDITO

Base d'asta: euro 10.080.000,00

Netto incassato in relazione ai tassi d'interesse annui: euro 7.170.000,00

SOGGETTI	Limiti di impegno ex Legge 448/01		Importi assegnati e disponibili		Contratti di mutuo	Importi assegnati	Importi spese
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002			
Azienda Speciale per il Porto di Chioggia	=	=	134		1.608	1.608	

In fase di avvio per la contrazione di mutuo

Documento O **La Biennale di Venezia**

Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti
ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia —
Aggiornamento al 31 dicembre 2004


GABINETTO

la Biennale di Venezia
Ca' Giustinian, San Marco
30124 Venezia
tel. + 39 041 5218711
fax +39 041 5218810
p.IVA e C.F. 00330320270
www.labiennale.org

**MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -**

Arr. 3 - AGO. 2005

Prot. N. 648 /GAB.



la Biennale di Venezia

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Ufficio di Piano
S. Polo, 19
30125 VENEZIA

Venezia, 22.08.05

Oggetto: Trasmissione dati Legge n. 488/99

In ottemperanza a quanto da voi richiesto con lettera del 29 giugno 2005 (prot. n. 515/GAB) alleghiamo di seguito un quadro dettagliato, aggiornato al 31.12.2004, sullo stato di attuazione delle attività svolte, unitamente al supporto informatico, debitamente integrato.

Cordiali saluti

PROGETTI SPECIALI
Il Responsabile
Arch. Pina Maugeri



26-ago-05 15.38
Prot.n: 1532 PS

la Biennale di Venezia

la Biennale di Venezia
 Ca' Giustinian, San Marco
 30124 Venezia
 tel. + 39 041 5218711
 fax + 39 041 2728329 - 041 5218810
 p.IVA e C.F. 00370720276
 www.labiennale.org




la Biennale di Venezia

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL 31.12.2004
(finanziamento legge 488/99)

ANNO 2004		
1.	ARSENALE DI VENEZIA - INTERVENTI SUGLI EDIFICI IN CONCESSIONE	
1.a	Interventi di recupero e adeguamento funzionale degli edifici 228, 229, 229B, 306, ex-mensa e Giardino delle Bombarde nell'area Sud dell'Arsenale	250.963,99
1.b	Allestimento Siti e Altri interventi	2.803,04
1.c	Interventi, allestimento e infrastrutturazione dell'edificio Pleiadi al VEGA destinati a depositi e laboratori ASAC	139.913,03
1.d	Sposo generali di produzione e spese mutuo	649.592,21
2.	CONCORSO INTERNAZIONALE NUOVO PALAZZO DEL CINEMA	
2.a	Concorso Internazionale di progettazione del Nuovo Palazzo del Cinema e riqualificazione dell'area pertinente	147.287,64
TOTALE DICHIARAZIONE ANNO 2004		1.190.559,91

Documento P — Fondazione Scientifica Querini Stampalia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
— Aggiornamento al 31 dicembre 2004




FONDAZIONE SCIENTIFICA
QUERINI STAMPALIA

BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

IL DIRETTORE



Venezia 29 giugno 2005
Prot.n. 881/A7
BR/br

Gent.ma Signora
Ing. Maria Giovanna Piva
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Magistrato alle Acque Comitato di indirizzo
coordinamento e controllo
S. Polo,19
30125 Venezia

Oggetto: legge n. 798/ 84 e 295/98. Invio dati richiesti

In riscontro alla Vs richiesta, lettera prot. n° 349/GAB del 24/05/2005, si comunicano i dati relativi alle opere eseguite nell'ambito delle leggi 798/84 e 295/98.

1 – Legge n° 798/84 – finanziamento di € 920.768,58 ottenuto mediante Convenzione stipulata con il Comune di Venezia in data 19 luglio 2004, registrata a Mestre il 27 luglio 2004 n° di repertorio 100167; si evidenzia che la cifra deliberata dal Consiglio Comunale in data 28 marzo 2002 PD 2002/1158 ammontava a € 1.033.000,00.

2 – Legge n. 295/98 – finanziamento ottenuto tramite il Crediop (istituto finanziatore) stipulando i seguenti contratti:

- a) contratto stipulato in data
30.12.1999 n° di repertorio 12461
(notaio Alberto Gasparotti)
per la somma valutabile,
compreso gli interessi di

€ 3.615.198,29

b) contratto stipulato in data
29.12.2000 n° di repertorio 13705
(notaio Alberto Gasparotti)
per la somma valutabile,
compreso gli interessi di € 3.615.198,29


Totale somma ottenibile comprensiva degli interessi € 7.230.396,58

Si allegano i quadri aggiornati dei piani di settore distinti in, Allegato A, Legge 798/84,
Allegato B, Legge n° 295/98.

Si allega dischetto contenente la relazione.

Distinti saluti

Chiara Simonato Rabitti



FONDAZIONE SCIENTIFICA
QUERINI STAMPALIA

BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

ALLEGATO A

Legge 798/84

Prospetto 1° - Elenco delle opere in progetto

- A) Completamento della corte coperta
- B) Ristrutturazione locale "M"
- C) Ristrutturazione ingresso civico 5252
- D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso corte Nova
- E) Sistemazione facciata esterna e piante su Rio di Santa Maria Formosa
- F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dell'umidità dell'auditorium
- G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 - 0.36 - 0.37
- H) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità dello "Stabile Nuovo"

1) Importo presunto delle opere a base di gara	€ 1.968.828,99
2) Somma a disposizione per progettazione e	
Direzione Lavori	€ 98.441,45
3) A disposizione per IVA	€ 196.882,90
Importo generale di progetto	€ 2.264.153,34

Su detto importo è stato ottenuto un contributo in conto capitale di € 920.768,58.

Prospetto 2° - Elenco delle opere eseguite a tutto il 31.12.2004

A) Completamento della Corte Coperta

B) Ristrutturazione locale "M"

1) Importo dei lavori	€ 348.800,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 17.500,00
3) Spese per IVA	€ 34.880,00
Spesa generale delle opere eseguite	€ 401.180,00

Opere ancora da collaudare da parte dei tecnici del Comune di Venezia e per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di € 200.000,00.

Prospetto 3° - Opere in fase di appalto (Impegno entro agosto 2005)

1) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità per auditorium	€ 480.000,00
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 24.000,00
3) Somma a disposizione per IVA	€ 48.000,00
Sommano	€ 552.000,00

Opere per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di circa il 49,90% pari a € 275.000,00.

FONDAZIONE SCIENTIFICA
QUERINI STAMPALIA
BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

Allegato B**Legge n. 295/98****Prospetto 1° - Piano d'intervento previsto**

Categoria delle opere	Descrizione dell'intervento	Importo presunto	IVA importo	Importo totale
Opere edili	- area pianoterra per servizi al pubblico - realizzazione scala C e locali adiacenti - area sottotetto - opere di rinforzo solaio stanza piano 1° per biblioteca multimediale - assistenza muraria per impianto contro le scariche atmosferiche - ristrutturazione ingresso Civico n. 5252 - restauro corte scoperta - restauro corte coperta compreso impianto di condizionamento - ristrutturazione			

	locale su riva - sistemazione facciata su Rio			
		€ 1.595.851,82	€ 159.585,18	€ 1.755.437,00
Impianti tecnologici	- impianto antintrusione locali piano terra - impianto segnalazione acustica locali piano terra - arredi elettrici servizi e sala regia - impianti locali piano 1°. Sottotetto e scala C - installazione impianto contro le scariche atmosferiche - impianto pressurizzato per antincendio (gruppo elettropompe) - spostamento impianti antintrusione, segnalazione fumi con fornitura nuove centrali - installazione centralino telefonico dect, compreso acquisto impianto condizionamento piani terra, 1° e 2° - installazione gruppo elettrogeno per antincendio e sistemazione impianti elettrici giardino - completamento sala Control Room compreso arredo, insonorizzazione e unità di raccordo per energia di emergenza - opere di insonorizzazione cabina elettrica e			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	impianto di condizionamento in altana - completamento opere climatizzazione locali			
		€ 671.393,97	€ 67.139,40	€ 738.533,37
Deposito libri				
	- ristrutturazione adiacenze Nord- Est per deposito libri compreso arredo con COMPAT			
		€ 1.291.142,25	€ 129.114,22	€ 1.420.256,47
Auditorium				
	- ristrutturazione locali, acquisto arredi e attrezzature, tecnologie			
		€ 1.549.370,70	€ 154.937,07	€ 1.704.307,77
Restauri conservativi				
	- area Scarpa - stucchi e affreschi piani 1° e 2° - interventi straordinari per la conservazione di strutture e impianti del complesso sede			
		€ 1.910.890,52	€ 191.089,05	€ 2.101.979,57
Acquisto arredi				
	- guardaroba piano terra - emeroteca piano primo - completamento locali piano terra			
		€ 92.962,24	€ 9.296,22	€ 102.258,46
Acquisto attrezzature				
	- attrezzature informatiche e multimediali			
		€ 258.228,45	€ 25.822,84	€ 284.051,29
Spese per la preorganizzazione del cantiere				
	- magazzini per deposito provvisoriale dei libri della Chiesa S. Giovanni Novo e			

	attrezzature - Locali da destinare a ampliamento e supporto logistico dei servizi bibliotecari e museali			
		€ 743.697,94	€ 68.172,30	€ 811.870,24
Acquisizioni immobiliari				
	- immobili adiacenti e/o locali piani terra, primo e secondo, adiacenze a Nord virtualmente collegabili con il palazzo sede			
		€ 2.065.827,60	---	€ 2.065.827,60
Competenze professionali				
	- progettazione, direzione e contabilità lavori, collaudi tecno - amministrativi e statici, pratica prevenzione incendi (onorari più CNAPAIA)			
		€ 490.634,05	€ 98.126,81	€ 588.760,86
Sommano		€ 10.699.999,54	€ 903.283,09	€ 11.573.282,63

Venezia 29 giugno 2005


 di direttore
 Chiara Saffonato Rabatti

FONDAZIONE SCIENTIFICA
QUERINI STAMPALIA
BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

Allegato B

Legge n. 295/98

Prospetto 2° - Piano di settore attuato a tutto il 31.12.2004

Fino al 31.12.2004 è stato attuato solo parte del programma e la spesa occorsa ammonta, compreso gli oneri fiscali a € 6.112.611,22.

Il tutto è meglio specificato nel quadro seguente. L'Iva è applicata secondo la legge vigente e quindi variabile a seconda del tipo dei lavori.

Categoria delle opere	Descrizione dell'intervento	Importo presunto	IVA importo	Importo totale
Opere edili	- area pianoterra per servizi al pubblico - realizzazione scala C e locali adiacenti - area sottotetto - opere di rinforzo solaio stanza piano 1° per biblioteca multimediale - restauro corte coperta - nuova via di fuga piano 1° - opere varie di manutenzione straordinaria indispensabili per la utilizzazione del			

	palazzo			
Mutuo 1999		€ 1.013.846,41	€ 104.675,87	€ 1.118.522,28
Mutuo 2000		€ 540.287,75	€ 57.784,92	€ 598.072,67
Totale		€ 1.554.134,16	€ 162.460,79	€ 1.716.594,95
Impianti tecnologici	- impianto antintrusione locali piano terra - impianto segnalazione acustica locali piano terra - impianti locali piano 1°. Sottotetto e scala C - impianto pressurizzato per antincendio - installazione centralino telefonico dect, compreso acquisto apparecchi telefonici - installazione antitaccheggio biblioteca e bookshop - completamento impianti condizionamento piani terra 1° e 2° - climatizzazione locali uffici - impianti elettrici e di segnalazione corte coperta, locale "M", nuova via di fuga al piano 1° - completamento impianti informatici - interventi di straordinaria manutenzione per il funzionamento degli impianti			
Mutuo 1999		€ 244.244,69	€ 35.499,53	€ 279.744,22
Mutuo 2000		€ 108.638,78	€ 19.779,24	€ 128.418,02
Totale		€ 352.883,47	€ 55.278,77	€ 408.162,24
Deposito libri				
	- ristrutturazione adiacenze Nord- Est per deposito libri			

	compreso arredo con COMPAT e impianti			
Mutuo 1999		€ 581.127,44	€ 69.736,98	€ 127.849,42
Mutuo 2000		€ 1.076.401,92	€ 120.099,62	€ 1.196.501,54
Totale		€ 1.657.529,36	€ 189.836,60	€ 1.847.365,96
Auditorium				
	- sono in corso di completamento i progetti esecutivi e gli elaborati per la gara d'appalto - l'inizio dei lavori è programmato per il mese di settembre 2005			
		---	---	----
Restauri conservativi	- restauro del ponte Scarpa - riordino del giardino Scarpa - interventi straordinari per la conservazione delle strutture degli arredi e degli impianti delle aeree museali e della biblioteca di Palazzo Querini			
Mutuo 1999		€ 123.102,92	€ 14.999,30	€ 138.102,22
Mutuo 2000		€ 40.488,71	€ 8.097,74	€ 48.586,45
Totale		€ 163.591,63	€ 23.097,04	€ 186.688,67
Acquisto arredi				
	- guardaroba piano terra - emeroteca piano primo - completamento arredi locali piano terra per servizio al pubblico del piano terra - arredi per gli uffici			
Mutuo 1999		€ 107.272,28	€ 21.454,50	€ 128.726,78
Mutuo 2000		€ 101.067,38	€ 20.203,51	€ 121.270,89
Totale		€ 208.339,66	€ 41.658,01	€ 249.997,67
Acquisto attrezzature				
	- attrezzature informatiche e multimediali			

	- attrezzature video e audio per le attività culturali - attrezzature per gli uffici			
Mutuo 1999		€ 157.366,50	€ 29.870,86	€ 187.237,36
Mutuo 2000		€ 120.889,07	€ 24.177,82	€ 145.066,89
Totale		€ 278.255,57	€ 54.048,68	€ 332.304,25
Spese per la preorganizzazione del cantiere	- magazzini per deposito provvisorio dei libri della Chiesa S. Giovanni Novo e attrezzature - allestimento spazi a Santa Croce di proprietà della Querini Stampalia per deposito provvisorio libri - Locali da destinare a ampliamento e supporto logistico dei servizi bibliotecari e museali - uffici provvisori per la presidenza e la direzione			
Mutuo 1999		€ 265.731,07	€ 34.525,95	€ 300.257,02
Mutuo 2000		€ 191.698,80	€ 6.935,54	€ 198.634,34
totale		€ 457.429,87	€ 41.461,49	€ 697.525,70
Acquisizioni immobiliari				
	- immobili adiacenti e/o locali piani terra, primo e secondo, adiacenze a Nord virtualmente collegabili con il palazzo sede			
		---	---	---
Competenze professionali				
	- progettazione, direzione e contabilità lavori, collaudi tecno – amministrativi e statici, pratica prevenzione incendi			

	Direzione artistica			
Mutuo 1999		€ 278.362,77	€ 55.173,04	€ 333.535,80
Mutuo 2000		€ 283.836,26	€ 56.599,71	€ 340.435,97
Totale		€ 562.199,03	€ 111.772,75	€ 673.971,78
Totale generale				€ 6.112.611,22

Come si evince dai prospetti precedenti i piani di intervento elaborati in occasione dell'ottenimento dei finanziamenti nell'ambito della Legge Speciale di Venezia con i mutui concessi negli anni 1999 e 2000 sono stati attuati per il 52% circa.

Venezia 29 giugno 2005

il direttore
Chiara Simonato



FONDAZIONE SCIENTIFICA
QUERINI STAMPALIA
BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

Allegato B**Legge n. 295/98****Prospetto 3° - Piano di intervento nuovo programma**

Per completare i programmi della Fondazione a suo tempo elaborati e per attuare le nuove deliberazioni presumibilmente sono ancora necessarie le seguenti somme.

L'Iva è applicata secondo la legge vigente e quindi variabile a seconda del tipo dei lavori.

Categoria delle opere	Descrizione dell'intervento	Importo presunto	Iva importo	Importo totale
Opere edili	- ristrutturazione ingresso Civico n., 5252 - sistemazione facciata su Rio - restauro della corte coperta - opere di straordinaria manutenzione necessarie per il mantenimento di Palazzo Querini Stampalia - approntamento del 3° piano uffici amministrativi			
		€ 280.000,00	€ 28.000,00	€ 308.000,00
Impianti	- arredi elettrici			

tecnologici	servizi e sala regia - adeguamento impianti antintrusione, segnalazione fumi con nuove forniture della centrali - installazione gruppo elettrogeno per antincendio - sostituzione gruppi di condizionamento in altana - insonorizzazione cabina elettrica - adeguamento impianto elettrico della biblioteca			
		€ 420.600,00	€ 42.000,00	€ 462.000,00
Auditorium				
	- nel mese di settembre 2005 è programmato l'inizio delle opere edili strutturali e di ristrutturazione - negli anni 2005-2007 dovranno essere eseguiti gli impianti tecnologici e l'arredamento			
		€ 1.600.000,00	€ 260.000,00	€ 1.860.000,00
Restauri conservativi	- restauro area Scarpa - restauro stucchi e affreschi piani 1° e 2° (fino ad oggi sono state restaurate solo due stanze del museo) ed è in corso il restauro di altre 4 sale - completamento degli interventi straordinari per la conservazione di strutture e impianti del complesso sede			
		€ 1.300.000,00	€ 130.000,00	€ 1.430.000,00
Acquisto arredi				
	- per l'arredamento			

	dell'ingresso 5252 - per arredare i nuovi uffici			
		€ 105.000,00	€ 21.000,00	€ 176.000,00
Acquisto attrezzature				
	- completamento delle attrezzature informatiche e multimediali			
		€ 55.000,00	€ 11.000,00	€ 66.000,00
Spese per la preorganizzazione del cantiere dell'auditorium	- allestimento nuovi uffici provvisori - disallestimento magazzini e uffici provvisori - locazione per ulteriori 3 anni della chiesa di S. Giovanni Novo (deposito libri) - locazione per anni 6 degli uffici per la presidenza e la segreteria			
		€ 270.000,00	€ 18.000,00	€ 288.000,00
Acquisizioni immobiliari				
	- immobili adiacenti e/o locali piani terra, primo e secondo, adiacenti al palazzo sede			
		€ 3.065.827,60	---	€ 3.065.827,60
Nuove ristrutturazioni				
	- ristrutturazione area Segarizzi (ex deposito libri) per ampliare i servizi al pubblico, l'area bibliotecaria e l'area da adibire a mostre			
		€ 1.800.000,00	€ 180.000,00	€ 1.980.000,00
Competenze professionali				
	- progettazione, direzione lavori, consulenze artistiche, collaudi e altre spese per la realizzazione del			

	programma			
		€ 775.00,00	€ 155.000,00	€ 930.000,00
Sommano		€ 9.391.427,60	€ 845.000,00	€ 10.236.427,60

Come si evince la spesa occorrente per i nuovi programmi che la Fondazione Querini Stampalia ha in animo di realizzare è notevolmente superiore ai fondi rimasti a disposizione con il mutuo del 2000 (il mutuo del 1999 è già esaurito).

La realizzazione del nuovo piano, come pure il completamento del piano precedente sarà possibile con l'eventuale contributo di ulteriori finanziamenti pubblici e solo in minima parte con i fondi che a la Fondazione reperirà dal proprio bilancio.

Venezia 29 giugno 2005

il direttore
Chiara Sinigaglia Rabitti



Documento Q Fondazione Giorgio Cini

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
– Dati consuntivi delle attività svolte – Aggiornamento al 31
dicembre 2004

GABINETTO

SEZ. 1 ^a	
SEZ. 2 ^a	UFFICIO TECNICO
SEZ. 3 ^a	
SEZ. 4 ^a	
SEZ. 5 ^a	

MAGISTRATO alle ACQUE
ISPETTORE GENERALE

17 GIU. 2005

A.F. 11/0

fondazione
GIORGIO CINI onlus

08. SET. 2005

GABINETTO

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
ISPETTORATO GENERALE PER LA
LAGUNA DI VENEZIA MARANO E GRADO
S.Polo, 19 - 30125 VENEZIA

Venezia, 22 aprile 2004

PROT. N. 135/05 SG

Oggetto : **COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO**
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia - Dati consuntivi al 31/12/2004 delle attività svolte
dalla Fondazione Cini
Rif.: Vs. comunicazione prot. n. 349/GAB del 24/5/2005.

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 08. SET. 2005
Prot. N. 662 /GAB.

1) Relazione sulle attività :

La Fondazione Cini ha completato, nel corso del 2004, i lavori di di restauro del convitto dell'Istituto Nautico Giorgio Cini (ambito "B1").

I lavori erano stati iniziati nella seconda metà del 2003 e al 31/12/2004 sono stati consuntivati su tale ambito 1.236.906,67 €.

Nel corso del 2004 sono stati approvati dal CTM i progetti esecutivi della nuova centrale termofrigorifera che servirà l'intero complesso dell'Isola di San Giorgio (Ambito "B2"), e il progetto esecutivo di ambito "E1" che comprende il restauro dei porticati del chiostro palladiano e dell'intero chiostro dei cipressi, comprese anche tutte le coperture relative. Sono state svolte le procedure di gara e appalto dei lavori, ed entrambi i cantieri sono stati avviati.

Sull'ambito B1 al 31/12/2004 sono stati spesi 121.867,91 €.

Sull'ambito E1 al 31/12/2004 sono stati spesi 115.074,84 €.

Sono inoltre stati completati i progetti per il restauro di tutti i serramenti della parte seicentesca (B6), per il secondo lotto di restauri della sala degli Arazzi (B5/1) e del padiglione delle capriate (B5-2).

Procede l'iter approvativo per il Piano di Recupero per le ex-officine (ambiti "C" e "D").

L'ambito "B0" (attività preliminari alle progettazioni esecutive, rilievi, mappature dei sottoservizi, indagini sugli intonaci, ricerche storiche e di archivio) è stato completato.

Si stanno ora avviando le procedure per la gara di progettazione dei lavori di restauro dell'edificio denominato "Manica Lunga del Buora" e per la realizzazione della nuova grande biblioteca di storia dell'Arte della Fondazione Cini (Ambito "P").

Sono stati progettati ed appaltati i lavori di restauro della Foresteria (ambito "B7") che si concluderanno entro settembre 2005.

E' in fase di completamento la progettazione del restauro dell'ex "casetta delle suore" (ambito H2) che verrà ristrutturata per ospitare un bar per l'isola di San Giorgio (completamento dei lavori previsto entro ottobre-novembre 2005).



ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE - 30124 - VENEZIA

Telefono: 041 5289900 - Fax: 041 5238540

E-mail: fondacini@cini.it - Sito Internet: www.cini.it

Codice Fiscale: 80009330277

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

7 GIU. 2005

Prot. N. 5573

**2) Consuntivi al 31/12/2004****Legge 488/1999****Capitolo 7187 :****Annualità quindicennali per l'aggiornamento degli studi sulla Laguna di Venezia**

- IMPORTO ASSEGNATO : 7.746.853,49 €
- IMPORTO IMPEGNATO : 7.746.853,49 €
- IMPORTO SPESO : 3.192.555,44€

Capitolo 7195**Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO : 8.600.000 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 8.600.000 €
- IMPORTO SPESO : 0,00 €

Legge 388/2000**Capitolo 7195 :****Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : 6.523.766,06 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : 2.609.501,37 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 9.133.267,43 €
- IMPORTO SPESO : 0,00 €

Legge 448/2001**Capitolo 7195 :****Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : 3.259.002,98 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : 1.629.501,49 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2004) : 2.000.000,00 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 6.888.504,47 €
- IMPORTO SPESO : 0,00 €

Distinti saluti

FONDAZIONE GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 VENEZIA



Documento R Procuratoria di San Marco - Venezia



Stato di attuazione degli interventi — Aggiornamento al 31
dicembre 2004

GABINETTO**PROCURATORIA DI SAN MARCO**

San Marco, 328 30124 - Venezia

Tel. 041.5225205 - fax 041.5208289

UFFICIO TECNICO



Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO
San Polo n. 19
30125 - VENEZIA

Oggetto: Art. 4 della Legge 798/84. Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la Salvaguardia di Venezia. Risposta lettera prot. 349/GAB del 24 maggio 2005.

Si fa seguito alla lettera in oggetto e si invia la relazione annuale richiesta sullo stato di attuazione degli interventi svolti al 31.12.2004 dalla Procuratoria di San Marco.

Cordiali saluti.

Venezia, 30 giugno 2005

Il Procuratore delegato ai
Servizi di Segreteria
Mons. Antonio Meneguolo

PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A
FRONTE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI CON LA
LEGISLAZIONE SPECIALE**

**Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti
Legge 488/99 e Legge 388/00**

PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA**STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DEI
FINANZIAMENTI OTTENUTI CON LA LEGISLAZIONE SPECIALE**

**Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti
Legge 488/99 e Legge 388/00**

RELAZIONE

La Procuratoria di San Marco ha ottenuto dallo Stato finanziamenti per gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro della basilica di San Marco con la legislazione speciale di cui alla Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti e Legge 488/99 e 388/00.

Dal 1818 il governo austriaco finanzia i restauri della basilica di San Marco sulla base di una perizia generale. Dal 1861 l'impegno di tale governo è trasformato in un contributo annuale. Con l'annessione di Venezia al Regno d'Italia, dalla fine del 1866 il contributo viene assunto dal nuovo governo. Salva l'interruzione negli anni della seconda guerra mondiale, il contributo continua fino a tutto il 1987 e cessa con la Finanziaria n. 67/1988 che consente di attingere ai finanziamenti di cui alla Legge speciale per Venezia 798/84. I finanziamenti si estendono per alcuni anni e consentono di realizzare le seguenti indagini ed opere.

Indagini per la valutazione della tensione strutturale complessiva individuabile nelle varie membrature della struttura muraria della fabbrica marciana, con particolare riguardo alla tensione nei pilastri, nelle volte e nelle cupole. Il risultato fu condensato nel modello matematico della struttura della fabbrica. Modello che, con opportuni aggiornamenti e modifiche, è ora utilizzabile per definire le tensioni in ogni zona della struttura muraria della basilica.

Le indagini compresero il completamento del rilievo fotogrammetrico della basilica, edificio caratterizzato da strapiombi e dislivelli in tutte le sue membrature e da deformazioni della geometria di archi e cupole. La fotogrammetria risultò il più adeguato strumento al rilevamento di questa particolare architettura.

Assieme al rilievo iniziò la catalogazione dell'archivio storico della basilica e della notevole serie di disegni esistenti presso l'ufficio tecnico.

Questa attività di studio e indagine consentì di procedere nei restauri con sicurezza ed efficacia.

I principali interventi finanziati con la Legge 798/84 ed eseguiti fino al 31/12/2002 sono:

- consolidamento del pilastro a destra dell'altare della Madonna Nicopeia, con rimozione del rivestimento marmoreo, iniezioni di consolidamento del "sacco" laterizio, stilatura di tutti i corsi di malta tra i mattoni e successiva riapplicazione delle lastre marmoree di rivestimento;
- restauro della cupola di San Giovanni, quella sul braccio nord del transetto. Negli anni 1988-1991 fu completato il restauro della struttura lignea della calotta emisferica, fu rifatto il fasciame di legno di larice di chiusura e restaurato e riposto in opera il manto di lastre di piombo dopo averle restaurate e sostituiti gli aggrappaggi. Fu completato il sistema di salita con una scaletta interna fino alla botola da cui si esce all'esterno sotto il cupolino;
- restauro di un'edicola di facciata, lato meridionale con rimozione della cuspide lignea rivestita di piombo; restauro delle colonne, dei capitelli e degli archetti gotici con sostituzione dei tiranti di ferro, che rischiavano la rottura del marmo con altri di rame. Rifacimento della struttura lignea della cuspide e riposa in opera del manto di lastre di piombo dopo averle restaurate;
- restauro della copertura con interventi urgenti sopra le cupolette del Battistero con sostituzione della struttura principale degradata, rinnovo del tavolato e riposa in opera del manto di lastre di piombo dopo averle restaurate;
- rimozione della grande vetrata di vetro a piombo del quarto arcone del portale centrale, detta "a rulli", per consentire il restauro dell'arcone;
- restauro dell'arcone dei profeti, quarto arcone del portale centrale della facciata della Basilica. Eseguite indagini preliminari fisico-chimiche, rilievo fotogrammetrico di dettaglio delle due facce dell'arcone, rimozione delle formelle per consentire il loro consolidamento e quello dell'arcone;
- restauro della Cripta. Si completano l'impermeabilizzazione delle murature della navata centrale, della retro-cripta e della navata destra, si restaura l'ex tomba di San Marco, viene

studiato un adeguato impianto di ventilazione e quello di illuminazione con la consulenza dell'Enel. Si esegue il trattamento desalinizzante e il consolidamento delle murature delle volte;

- restauro dei pavimenti. Vengono restaurati quadri centrali e sei quadri sotto la volta sud della cupola dell'Ascensione, con rimozione, restauro in laboratorio e integrazione delle tessere distrutte;

- restauro dei mosaici. Iniziano i rilievi grafici e fotografici per i mosaici del Battistero. Il consolidamento comprende volta, archi di sostegno e pennacchi della cupola orientale, nonché la lunetta della Crocifissione e dell'Annuncio della nascita di Giovanni Battista. Si iniziano i lavori della cupola centrale.

In occasione dei rilievi fotografici dei mosaici a cura dell'Enel si utilizzano le speciali impalcature per la riposa in opera di parte del pennacchio di Sant'Ambrogio, da oltre cinquant'anni in attesa nello Studio di mosaico;

- impianto di riscaldamento. Si rinnova completamente il complesso termoventilante;

- ascensore. Viene installato un ascensore adeguato ai portatori di handicap con portata massima di 10 persone, che serve il museo, il coperto e i due livelli degli uffici;

- impianto elettrico. Si procede alla costruzione di nuove linee e del quadro nel settore destro della Basilica assieme alla manutenzione ordinaria dell'intero impianto elettrico;

- impianto antincendio. Adeguamento dell'impianto antincendio secondo la normativa. Si procede all'elaborazione, assieme ai Vigili del Fuoco, di un progetto che viene approvato dalla Soprintendenza;

- indagini e ricerche. Vengono eseguite indagini sui livelli della Basilica, la verticalità delle cupole e del campanile e integrato il rilievo fotogrammetrico con parti del piano terreno e degli spazi esterni alla Basilica, nonché dei sotterranei;

Viene predisposto con il prof. Creazza e i prof. Vitaliani, Mola, Strada e Biscontin, il programma per le indagini strutturali e quelle sul pavimento, che vengono poi eseguite dall'ISMES per conto del Magistrato alle Acque.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 ed eseguiti fino al 31/12/2002 sono:

- restauro del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro con rimozione di quadri opportunamente suddivisi, restauro in laboratorio con integrazione delle tessere distrutte e restauro del sottofondo in opera. Lavoro pressoché ultimato, inizia la posa nel prossimo 2003;
- restauro dei mosaici nel nartece, Nascita di Isacco e sopraporta di San Clemente, nonché lunetta sopra il portale di San Teodoro. I mosaici vengono restaurati parte in loco con consolidamenti, parte in laboratorio. Si inizia il rilievo del degrado dei mosaici della Cappella di Sant'Isidoro;
- restauro della copertura del lato sud, sopra il Battistero con rinnovo del tavolato e restauro delle lastre di piombo;
- Museo Marciano sopra il nartece. Si realizza il collegamento tra il Museo e i matronei. Si completano gli impianti antintrusione e di TVCC, si realizzano i pannelli espositori;
- restauro del rivestimento di marmo della parete ovest del transetto sud e della parete nord del transetto nord, nell'area dell'altare della Nicopeia con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario;
- manutenzioni varie degli impianti e del pavimento;
- cupola del Coro. Si completano gli studi preliminari e l'approvvigionamento dei materiali, si inizia la realizzazione della grande impalcatura;
- restauro delle "cassine" di mosaico originale da esporre nel Museo Marciano, opera eseguita in laboratorio;
- restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne acquitane e capitelli bizantini;
- restauro del mosaico del pilastro dell'Inventio.
- inizia ed è in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 e Legge 388/00 ed eseguiti fino al 31/12/2003 sono:

MOSAICI

- Restauro dei mosaici nel narcece, Nascita di Isacco e sopraporta di San Clemente: i mosaici restaurati e consolidati in laboratorio sono stati riposti in opera;
- Cappella di Sant'Isidoro: Ultimato il rilievo del degrado dei mosaici;
- Restauro del mosaico del pilastro dell'Invenio.
- Restauro mosaico sopra il portale di San Teodoro: ultimato il restauro in laboratorio si procederà nel 2004 alla posa in opera;

PAVIMENTO

- Restauro del primo dei tre lotti del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro: è stato restaurato in laboratorio con integrazione delle tessere distrutte e restauro del sottofondo in opera, poi completamente riposto in opera il primo quadro;
- Restauro degli altri due tre lotti del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro: completati i rilievi esecutivi in scala al vero del restante pavimento; si è previsto l'inizio dei lavori di restauro del II° lotto durante il 2004 con lievo d'opera dei quadri da restaurare;
- Manutenzione del pavimento;

CUPOLA DEL CORO

- Cupola del Coro: si completano gli studi preliminari e l'approvvigionamento dei materiali, si completa la realizzazione della grande impalcatura;

TETTO

- Copertura: restauro della falda sud della copertura sopra la volta del Paradiso, con rinnovo del tavolato e restauro delle lastre di piombo;

PARAMENTI MARMOREI

- Restauro del rivestimento di marmo della parete nord del transetto nord: presso l'area dell'altare della Nicopeia, con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio (2003), desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario (2003 ancora in corso nel 2004);
- Restauro del rivestimento di marmo della parete Cappella Zen e porta San Clemente: con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e riposa in opera;

MURATURE ..

- Sant' Apollonia: Chiostro, restauro muratura verso il cortile interno;

IMPIANTI E VARIE

- Manutenzioni varie degli impianti
- Opere varie di falegname, manutenzione porte, serramenti e arredi;

MUSEO

- Museo Marciano: Completato l'intervento di restauro, il collegamento tra Museo e i matronei con servoscala, gli impianti antincendio e TVCC, i pannelli espositori, la posa di tutte le opere d'arte per l'apertura del museo dell'8 ottobre 2003;
- Si completa il restauro delle "cassine" di mosaico originale da esporre nel Museo Marciano: opera eseguita in laboratorio;

INTERVENTI DI DITTE ESTERNE CON NOSTRA ASSISTENZA E FORNITURE

BASILICA DI SAN MARCO

- E' in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco (Ottorino Nonfarmale S.r.l.);
- Manutenzione straordinaria della Cripta (IAR);
- Restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne acquitane e capitelli bizantini (SERES);
- Restauro di oggetti lignei del Museo (Leutenmayer);
- Restauro di dipinti "cartone" dell'inferno (Walter Piovon: in corso anche nel 2004);
- Manutenzione tessili del Museo (Annamaria Morassutti);
- Restauri di disegni e carte dipinte Opera Ongania (Pignatelli - Tecnauro);
- Allestimento espositivo carte e dipinti su carta (Herrera - Filigrana);
- Restauro tessili e pizzi (Esedra);
- Restauro oggetti del tesoro (Corinna Mattiello);

COMPLESSO DI SANT'APOLLONIA

- Sant'Apollonia: interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e ristrutturazione del complesso Ex Jesurum di Sant'Apollonia (Impresa Antonio Toniolo). Progetto e D.L. a cura della Procuratoria con collaborazioni esterne. Per realizzazione di alloggi e uffici ad uso della Curia Patriarcale, con Sala Riunioni, depositi e laboratori ad uso della Procuratoria, ampliamento dell'area del Museo Diocesano.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 e Legge 388/00 ed eseguiti fino al 31/12/2004 sono:

MOSAICI

- Cappella di Sant'Isidoro: è iniziato il lavoro di restauro dei mosaici dopo il completo rilievo dello stato di degrado; si interviene in modi diversi in funzione delle diverse problematiche riscontrate e della localizzazione, consolidando il supporto con iniezioni di apposito legante, ricollocando in opera tessere mancanti o ancorate malamente al supporto. Si procede poi con le operazioni per rendere uniforme nel colore gli interstizi tra le tessere e quindi pulire la superficie decorata;
- Restauro mosaico sopra il portale di San Teodoro: dopo la preparazione ed il restauro in laboratorio è stata ultimata la posa in opera;
- Restauro mosaici facciata Nord esterna: in occasione degli interventi in corso nella facciata nord sono stati restaurati i decori a mosaico previo stacco, risanamento in laboratorio e successiva posa in opera;

PAVIMENTO

- Restauro del secondo dei tre lotti del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro: completati i rilievi esecutivi in scala al vero del restante pavimento sono iniziate le fasi preliminari al lievo d'opera con le verifiche e la composizione delle stampe necessaria alla suddivisione che verrà poi attuata;
- Manutenzione del pavimento;

CUPOLA DEL CORO

- Cupola del Coro: si completa la realizzazione della grande impalcatura;

PARAMENTI MARMOREI

- Restauro del rivestimento di marmo della parete nord del transetto nord: presso l'area dell'altare della Nicopeia, con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario;
- Restauro del rivestimento di marmo della parete Cappella Zen e porta San Clemente: con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e riposa in opera;
- Sistemazione deposito marmi Sant' Apollonia: sono stati movimentati i marmi del deposito per consentire le opere di restauro del fabbricato adiacente e con lo scopo di dare una prossima disposizione più razionale di elementi lapidei utilizzati per fini di restauro;

MURATURE

- Cripta: ricostruzione dei paramenti murari delle nicchie dove sono state eseguite opere di impermeabilizzazione da parte della ditta IAR;
- Sant' Apollonia: Chiostro, restauro muratura verso il cortile interno;

IMPIANTI E VARIE

- Impianto televisivo Basilica: è stato realizzato l'impianto televisivo interno alla chiesa con 7 video e completo di telecamere;
- Manutenzioni varie degli impianti
- Opere varie di falegname, manutenzione porte, serramenti e arredi;
- Soffitte: eseguita in parte la messa in sicurezza antincendio delle soffitte mediante l'eliminazione del materiale infiammabile e la formazione dei nuovi piani in metallo;

MUSEO

- Museo Marciano: Completata la messa in sicurezza e a norma del museo con l'installazione delle lampade di segnalazione evacuazione, delle telecamere di controllo e dei rivelatori antintrusione;

ATENEIO DI SAN BASSO

- Eseguita la messa a norma di tutti gli impianti, elettrico, antincendio, antintrusione e dell'impianto per l'utilizzo come sala multimediale nonché esecuzione dei lavori funzionali all'accoglienza e alla custodia dei bagagli dei visitatori della Basilica;

INTERVENTI DI DITTE ESTERNE CON NOSTRA ASSISTENZA E FORNITURE

BASILICA DI SAN MARCO

- E' in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco (Ottorino Nonfarmale S.r.l.);
- Manutenzione straordinaria della Cripta (IAR);
- Restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne aquitane e capitelli bizantini (SERES);
- Restauro di oggetti lignei del Museo (Leutenmayer);
- Restauro di dipinti "cartone" dell'inferno (Walter Piovan: in corso anche nel 2004);
- Restauro oggetti del tesoro (Corinna Mattiello);

COMPLESSO DI SANT'APOLLONIA


- Sant'Apollonia: interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e ristrutturazione del complesso Ex Jesurum di Sant'Apollonia (Impresa Antonio Toniolo). Progetto e D.L. a cura della Procuratoria con collaborazioni esterne. Per realizzazione di alloggi e uffici ad uso della Curia Patriarcale, con Sala Riunioni, depositi e laboratori ad uso della Procuratoria, ampliamento dell'area del Museo Diocesano.

PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA**OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO****CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 3 luglio 2001 con Dexia Crediop S.p.A. Roma****RIEPILOGO ANNO 2004**

(voci ricavate dal SAL n. 1, SAL n.2 e spese)


<i>Opere in economia</i>		
SAL n. 1	<i>Euro</i>	62.130,82
SAL n. 2	<i>Euro</i>	-----
<i>Spese dipendenti tecnici</i>	<i>Euro</i>	9.358,38
<i>Oneri collaboratori esterni</i>	<i>Euro</i>	26.190,04
<i>Spese per restauri</i>	<i>Euro</i>	29.452,50
<i>Spese acquisto materiali e manutenzioni varie</i>	<i>Euro</i>	28.296,25
		<hr/>
TOT.	<i>Euro</i>	155.427,99
<i>Spese generali 15%</i>	<i>Euro</i>	23.314,20
		<hr/>
TOT.	<i>Euro</i>	178.742,19
<i>Imposte e tasse</i>	<i>Euro</i>	17.190,48
		<hr/>
TOTALE COMPLESSIVO	<i>Euro</i>	195.932,66

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio



Venezia, 11 febbraio 2005

Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv. to Giorgio Orsoni



PROCURATORIA DI SAN MARCO – VENEZIA*OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO*

CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 3 luglio 2001 con Dexia Crediop S.p.A. Roma


Riepilogo Pagamenti al 31 dicembre 2004

	<i>Contabilità lavori</i>	<i>Somma Erogata (al lordo delle tasse)</i>
<i>1° SAL ANNO 2001</i>	<i>Euro 973.110,51</i>	<i>Euro 973.110,51 (di cui Tasse Euro 2.432,78)</i>
<i>2° SAL ANNO 2001</i>	<i>Euro 362.422,08</i>	<i>Euro 362.422,08 (di cui Tasse Euro 906,06)</i>
<i>1° SAL ANNO 2002</i>	<i>Euro 761.878,06</i>	<i>Euro 761.878,06 (di cui Tasse Euro 1.904,69)</i>
<i>2° SAL ANNO 2002</i>	<i>Euro 444.687,97</i>	<i>Euro 444.687,97 (di cui Tasse Euro 1.111,72)</i>
<i>1° SAL ANNO 2003</i>	<i>Euro 614.358,92</i>	<i>Euro 614.358,92 (di cui Tasse Euro 1535,90)</i>
<i>2° SAL ANNO 2003</i>	<i>Euro 1.199.126,31</i>	<i>Euro 1.199.126,31 (di cui Tasse Euro 2997,82)</i>
<i>1° SAL ANNO 2004</i>	<i>Euro 195.932,66</i>	<i>Euro 70.368,92 (di cui Tasse Euro 175,92)</i>
<i>2° SAL ANNO 2004</i>	<i>Euro -----</i>	
<u>TOTALE MATURATO</u>	<u>Euro 4.551.516,51</u>	
	<u>TOTALE EROGATO</u>	<u>Euro 4.425.952,77</u>


Finanziamento Esaurito

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 11 febbraio 2005



Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv. ~~Giorgio~~ Orsoni




PROCURATORIA DI SAN MARCO – VENEZIA***OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO*****CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 26 giugno 2002 con Dexia Crediop S.p.A. Roma****RIEPILOGO ANNO 2004**

(voci ricavate dal SAL n. 1, SAL n.2 e spese)


<i>Opere in economia</i>		
SAL n. 1	<i>Euro</i>	180.772,46
SAL n. 2	<i>Euro</i>	183.362,07
<i>Spese dipendenti tecnici</i>	<i>Euro</i>	64.734,34
<i>Oneri collaboratori esterni</i>	<i>Euro</i>	121.016,08
<i>Spese per restauri</i>	<i>Euro</i>	218.424,17
<i>Spese acquisto materiali e manutenzioni varie</i>	<i>Euro</i>	928.572,10
TOT.	<i>Euro</i>	1.696.881,21
<i>Spese generali 15%</i>	<i>Euro</i>	254.532,18
TOT.	<i>Euro</i>	1.951.413,39
<i>Imposte e tasse</i>	<i>Euro</i>	255.351,52
TOTALE COMPLESSIVO	<i>Euro</i>	2.206.764,91

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 11 febbraio 2005



Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv. to Giorgio Orsoni




PROCURATORIA DI SAN MARCO — VENEZIA*OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO*

CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 26 giugno 2002 con Dexia Crediop S.p.A. Roma

Riepilogo Pagamenti al 31 dicembre 2004


	<i>Contabilità lavori</i>	<i>Somma Erogata (al lordo delle tasse)</i>
2° SAL ANNO 2002	<i>Euro 602.138,74</i>	<i>Euro 602.138,74 (di cui Tasse Euro 1.505,35)</i>
1° SAL ANNO 2003	<i>Euro 656.339,37</i>	<i>Euro 656.339,37 (di cui Tasse Euro 1.640,85)</i>
2° SAL ANNO 2003	<i>Euro 979.329,49</i>	<i>Euro 979.329,49 (di cui Tasse Euro 2.448,32)</i>
1° SAL ANNO 2004	<i>Euro 1.254.889,03</i>	<i>Euro 1.254.889,03 (di cui Tasse Euro 3.137,22)</i>
2° SAL ANNO 2004	<i>Euro 951.875,88</i>	<i>Euro 951.875,88 (di cui Tasse Euro 2.379,69)</i>
<i>TOTALE MATURATO</i>	<i>Euro 4.444.572,51</i>	
	<i>TOTALE EROGATO</i>	<i>Euro 4.444.572,51</i>

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio



Venezia, 27 giugno 2005

Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv.to Giorgio Orsoni




PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA**OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO****CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 23 luglio 2003 con BANCA OPI****RIEPILOGO ANNO 2004**

(voci ricavate dal SAL n. 1, SAL n.2 e spese)


<i>Opere in economia</i>		
SAL n. 1	<i>Euro</i>	85.390,96
SAL n. 2	<i>Euro</i>	147.580,42
<i>Spese dipendenti tecnici</i>	<i>Euro</i>	41.416,69
<i>Oneri collaboratori esterni</i>	<i>Euro</i>	77.425,46
<i>Spese per restauri</i>	<i>Euro</i>	38.366,00
<i>Spese acquisto materiali e manutenzioni varie</i>	<i>Euro</i>	559.491,38
TOT.	<i>Euro</i>	949.670,92
<i>Spese generali 15%</i>	<i>Euro</i>	142.450,64
TOT.	<i>Euro</i>	1.092.121,55
<i>Imposte e tasse</i>	<i>Euro</i>	135.975,60
TOTALE COMPLESSIVO	<i>Euro</i>	1.228.097,16

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 11 febbraio 2005



Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv.to Giorgio Orsoni




PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA*OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO*

CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 23 luglio 2003 con BANCA OPI

Riepilogo Pagamenti al 31 dicembre 2004


	<i>Contabilità lavori</i>	<i>Somma Erogata (al lordo delle tasse)</i>
2° SAL ANNO 2003	<i>Euro 35.053,75</i>	<i>Euro 35.053,75 (di cui Tasse Euro 87,63)</i>
1° SAL ANNO 2004	<i>Euro 554.246,46</i>	<i>Euro 554.246,46 (di cui Tasse Euro 1385,62)</i>
2° SAL ANNO 2004	<i>Euro 673.850,70</i>	<i>Euro 650.196,35 (di cui Tasse Euro 1.625,49)</i>
TOTALE MATURATO	<i>Euro 1.263.150,91</i>	
	<i>TOTALE EROGATO</i>	<i>Euro 1.239.496,56</i>

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio



Venezia, 27 giugno 2005

Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv. to Giorgio Orsoni



**STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA
BASILICA DI SAN MARCO, SUDDIVISO PER SETTORI,
COMPRESA PROGRAMMAZIONE DI MEDIO LUNGO TERMINE**

L'attività della Procuratoria di San Marco è relativa al compendio immobiliare costituito da:

- Basilica di San Marco
- Campanile di San Marco
- Ateneo di San Basso
- Chiosstro di Sant' Apollonia con ex chiesa dei Santi Filippo e Giacomo

I lavori che la Procuratoria affronta sono di conservazione del patrimonio monumentale attraverso interventi di restauro, di consolidamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione sui soli casi di immobili destinati a magazzini, laboratori, o altri in ogni caso funzionali alla conservazione del patrimonio. Specificamente si ha:

BASILICA DI SAN MARCO

1. Mosaici

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
A. Cappella di S. Isidoro	864	339	39
B. Cupola di San Giovanni	864		
B1. Volta nord	1.699		
B2. Volta ovest	1.699		
B3. Volta est	1.699		
B4. Parete ovest	1.080		
B4. Pennacchio di S. Agostino	12		
C. Nartece	360	81	22
D. Facciata ovest			
D1. Lunette del registro superiore	1.944		
E. Pilastro del Santissimo	20	9	45
F. Portale san Teodoro	65	65	100
G. Cassine Museo	230	230	100

2. Cupola del presbiterio

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Lavori di consolidamento della struttura lignea della	2.160	134	6

cupola e del suo rivestimento plumbeo			
---------------------------------------	--	--	--

3. Copertura della Basilica

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Restauro della struttura lignea e della copertura plumbea di oltre la metà dell'intera superficie	540	150	28

4. Murature e pilastri

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Consolidamento della struttura del pilastro NE della cupola di San Giovanni, pilone SO ridossato alla muratura N del registro inferiore, presso l'altare della Beata Vergine Nicopeia	216	21,6	10
Muratura di volta in volta scoperta in occasione del restauro dei marmi della facciata nord e della soprastante terrazza	144	36	25
Interventi di riduzione dell'umidità di risalita	144	28,8	20
Consolidamento pilastro NE - S. Giovanni	120	50,4	35
Consolidamento pilastro SE - S. Leonardo	169		
Consolidamento pilastro SO - S. Leonardo	169		
Volta S - cupola S. Leonardo	169		
Volta E - cupola S. Leonardo	1.699		
S. Apollonia - Chiostro	150	129	86

5. Rivestimenti marmorei e colonne

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Restauro delle lunette, cornici e intarsi marmorei delle facciate O	516		
Restauro della facciata N con la posa dei calchi dei bassorilievi di <i>San Giovanni</i> , di <i>Gesù Cristo in trono</i> e delle <i>Pecorelle alla fonte presso due alberi</i> , rimossi negli anni '60 del Novecento e ora in museo	948	800	84
Restauro della terrazza N	900	210	23
Restauro delle lunette, cornici e intarsi marmorei delle facciate N	540		
Restauro delle cuspidi gotiche della facciata N	486		
Restauro delle cuspidi gotiche della facciata S	289		
Manutenzione straordinaria Cappella Sant'Isidoro e Cappella dei Mascoli	1.080		
Restauro rivestimenti parete nord Nicopeia e parete O transetto S	580	187	32
Colonne, capitelli, rivestimenti marmorei del narcece	720	133	18
Rivestimenti marmorei interni della chiesa	340		

6. Pavimento

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Generale manutenzione ordinaria	580	157	27
Restauro nei pressi dell'entrata nel Tesoro di San Marco, dell'altare di San Leonardo, della navata S specie sotto il pilastro SO della cupola dell'Ascensione	1.080	318	29
Restauro di tutto il pavimento del narcece	1.680		
Altare di San Leonardo	576	57	10

7. Cripta

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Lavori di straordinaria manutenzione dopo 10 anni dalla conclusione del restauro (1986-1994)	162	162	100

8. Porte bronzee e serramenti lignei

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Manutenzione ordinaria	820	207	25
Museo di san Marco	210	210	100

9. Cappella Zen

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Restauro del paliotto d'altare, delle basi marmoree dei pilastri di bronzo e delle basi del sarcofago del cardinale Giovanni Battista Zen	288		
Restauro del rivestimento marmoreo	486		

10. Battistero

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Interventi di adeguamento impianti per uso continuo dello spazio per l'adorazione e manutenzione	250	144	58

11. Impianti

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Impianti di adeguamento delle protezioni, segnalazioni antincendio, antintrusione, di sicurezza con Tv a circuito chiuso, di ripresa delle funzioni religiose, di riscaldamento, di manutenzione dell'impianto elettrico, di illuminazione	1.152	892	77

12. Rilievi, progetti

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Studi per consolidamenti strutturali, per interventi sul tappeto marmoreo del pavimento e completamento rilievi fotogrammetrici	1.152	756	66
Elaborazione di software interattivo ad elementi finiti per calcolare lo stato di tensione nelle strutture della Basilica	432	404	94

CAMPANILE DI SAN MARCO

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura compresi gli impianti	720	135	19
Restauro e consolidamento dell'apparato fondazionale in collaborazione con il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova	3.240	324	10

EX CHIESA DI SAN BASSO

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Restauro di superfici e soffitto con inserimento di mobili per un deposito bagagli dei turisti, per sicurezza della visita in Basilica e manutenzione impianti	340	340	100
Completamento degli impianti elettrici di Tv a circuito chiuso di rilevazione incendi e antintrusione, di proiezioni elettroniche di introduzione alla visita della Basilica	260	260	100

COMPLESSO DEL CHIOSTRO DI SANT'APOLLONIA ED EX CHIESA SS. FILIPPO E GIACOMO

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Lavori di restauro e ricostruzione straordinaria con ristrutturazione degli spazi dell'ex chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, dei locali annessi per uso depositi e laboratori della Procuratoria e per uffici, compresi appartamenti di servizio	3.898	111 1	29

COSTI TECNICI E DITTE ESTERNE

	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %
Costi tecnici	2500	1061	42
Restauri esterni	2100	955	47
Forniture materiali e impianti	1550	874	56
Ditte esterne Museo	825	825	100

TOTALE	PREVISIONE EURO (MIGLIAIA)	ATTUAZIONE EURO (MIGLIAIA)	PERCENTUALE ATTUAZIONE %	FINZIATI EURO (MIGLIAIA)	DA FINANZIARE EURO (MIGLIAIA)
In totale si sommano	48.615	10978	23	12.621	35.994

I mutui attualmente in essere con lo Stato sono:


- 1 - £.10 MLD del 21/12/00 con contratto del 3/07/01
 - 2 - £.12 MLD del 21/12/00 con contratto del 26/06/02
 - 3 - £. 3 MLD del 17/07/02 con contratto del 20/07/03
- pari a circa 12.500.000,00 Euro.

La programmazione dei lavori è estesa ad un periodo di un decennio. Il valore medio annuo della spesa residua da finanziare di 35.994.000,00 Euro risulta pari a circa 3.600.000,00 Euro, di poco superiore alla spesa registrata nell'ultimo anno.

Venezia, 30 giugno 2005

Il Primo Procuratore
Prof. ~~Giorgio Orsoni~~

Arch. Ettore Vio
Proto di San Marco



Documento S Curia Patriarcale di Venezia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
– Aggiornamento al 31 dicembre 2004





CURIA PATRIARCALE DI VENEZIA

Venezia, 12.9.2005

Prot. 98
Pos. D (L.S.)

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente
Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
S. Polo, 19
30125 VENEZIA



Oggetto: Diocesi: Patriarcato di Venezia.
Richiesta dati finanziari. - Rilevazione dati L. 798/84, al 31.12.2004.

In risposta alla Vs. del 24.05 c.a., Prot. N. 349/GAB, questa Amministrazione allega le schede relative ai finanziamenti assegnati con la legislazione speciale, suddivisi per numero di legge.

Si precisa che gli importi indicati nei contratti di mutuo risultano superiori all'effettivo erogato, a seguito del breve periodo di utilizzo e per la variazione dei tassi.

Con distinti saluti.

L'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA
Il Segretario U.A.D.
Rag. Arrigo Memo

ALLEGATI: scheda finanziamento L. n. 295/98
" L. n. 488/99
" L. n. 388/00

Att.M/ "OPILEGGESPECIALE"

FINANZIAMENTO LEGGE n. 295/98 al 31.12.2004					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	12.394	12.394	12.394
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 295/98			12.394	12.394	12.394

FINANZIAMENTO LEGGE n. 388/00-al 31.12.2004					
CATEGORIA	VOCI	IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000-€)	IMPORTI SPESI (000 €)	
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	ambiente				
	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia				
	beni culturali				
	economia				
	gestione dati				
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili		28.488	28.488	7.846	
	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:				
	culto (chiese, etc.)				
	cultura/musei/beni architettonici				
	istruzione				
	altri usi (specificare)				
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 388/00		28.488	28.488	7.846	

Documento T Diocesi di Chioggia


Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
– Aggiornamento al 31 dicembre 2004

DIOCESI DI CHIOGGIA

D.M. 20 ott. 1986, n. 328 - G.U. 17 nov. 1986, n. 267

Rione Duomo, 1006 - 30015 CHIOGGIA (Ve)
Tel. 041 400513 - 041 5507177 - fax 041 401321**SECRETARIA COMITATO**

Chioggia, 30 giugno 2005




Al Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
(Art. 4 legge 29.11.1984 n. 798)
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
VENEZIA

Risposta a Prot. N 349 GAB del 24/05/2005

Oggetto: Stato di attuazione interventi finanziari della legislazione speciale al 31-12- 2004

In riscontro alla Vs/ richiesta a margine ed in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 abbiamo predisposto lo schema sullo stato degli utilizzi dei finanziamenti concessi a questa Diocesi relativi alla legge sulla Salvaguardia di Venezia., che alleghiamo.

In fede.



Diocesi di Chioggia
Vicario Generale
Mozzato Mons. Dr. Pietro

All'uno

DIOCESI DI CHIOGGIA

Finanziamenti legge speciale per Venezia

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti al 31 dicembre 2004*(importi in migliaia di euro)*

Anno 1999	Limiti d'impegno - ex lege 448/98	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	215	3.098	3.098	2.718	2.718

N.B. Finanziamento totalmente speso

1

Anno 2000	Limiti d'impegno - ex lege 488/99	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	55	723	723	674	674

N.B. Finanziamento totalmente speso.

2

Anno 2002	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	370	4.500	4.500	2.361	2.361


3

Anno 2004	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	100	-	-	-	-

4

NB: Non potuto utilizzare in quanto tuttora in attesa schema di mutuo da Ministero del Tesoro

Chioggia 30/06/2005

Il Vicario Generale
(Mons. Mozzato dr. Pietro)

Mozzato A. Pietro
