

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

Doc. CIX-bis
n. 5

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000**

(Anno 1998 e Primo trimestre 1999)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000**

(MICHELI)

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 1999

Doc. CIX-bis
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000

(Anno 1998 e Primo trimestre 1999)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000**

(MICHELI)

ANNO 1998

INDICE

ANNO 1998

1. <i>Premessa</i>	Pag.	4
2. <i>La gestione amministrativa</i>	»	8
2.1 Sintesi delle relazioni precedenti	»	8
2.1.1 La prima relazione trimestrale (18 settembre 1996-31 marzo 1997).	»	8
2.1.2 La seconda relazione trimestrale (1° aprile-30 giugno 1997)	»	10
2.1.3 La terza relazione trimestrale (1° luglio-30 settembre 1997).	»	11
2.1.4 La quarta relazione trimestrale (1° ottobre-31 dicembre 1997)	»	12
2.2 La riprogrammazione del piano nei quattro trimestri del 1998.	»	15
2.3 Gli interventi definanziati	»	19
2.4 Gli accordi di programma e le conferenze di servizi	»	31
2.5 I rapporti tra la Santa Sede e lo Stato italiano	»	38
3. <i>Il piano a fine 1998</i>	»	40
3.1 Sintesi del piano e sue variazioni	»	40
3.2 Una lettura del piano per settori	»	52
3.3 Lo stato di attuazione	»	55
3.4 Schede di approfondimento	»	57
3.4.1 Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere	»	57
3.4.2 Interventi inerenti i principali complessi museali.	»	58
3.4.3 Interventi per la viabilità nell'area di San Pietro.	»	63
3.4.4 Interventi inerenti la mobilità a Roma e nell'area romana	»	65
3.4.5 Interventi inerenti le «Aree basilicali»	»	69
3.4.6 Principali interventi per la sanità.	»	72
3.4.7 Principali interventi concernenti la «sicurezza»	»	73
3.4.7 Area per grandi eventi presso Tor Vergata	»	74

4. <i>Gestione finanziaria</i>	Pag.	79
4.1 Situazione al 31 dicembre 1998	»	79
4.2 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie	»	80
5. <i>La vigilanza</i>	»	82
5.1 Il monitoraggio	»	82
5.1.1 Il quadro normativo	»	82
5.1.2 La metodologia e le procedure per l'affidamento	»	82
5.1.3 Relazioni trimestrali del soggetto monitoratore - Sintesi	»	87
5.1.4 Gli interventi ad «alto rischio»	»	92
5.2 La vigilanza del Ministro dei lavori pubblici	»	96
5.3 La vigilanza della BEI	»	96
APPENDICE	»	101
Decreto ministeriale dell'8 maggio 1998.	»	105
Decreto ministeriale del 15 maggio 1998	»	112
Decreto ministeriale del 16 luglio 1998	»	115
Decreto ministeriale del 7 gennaio 1999.	»	118
ALLEGATI	»	123
1. Le modifiche al piano degli interventi secondo i vari decreti.	»	125
2. Situazione finanziaria in relazione al singolo intervento	»	257
3. Lo stato di attuazione per singolo intervento (istogrammi)	»	323
PRIMO SEMESTRE 1999		
1. Sintesi del quinto rapporto trimestrale	»	377
2.8 Struttura attuale del piano	»	377
2.9 Lo stato di attuazione.	»	378
2.10 Valutazione del rischio di ritardo finale.	»	379
2.11 Considerazioni complessive	»	379
2.12 Situazione finanziaria	»	381
2.12.1 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie	»	381
ALLEGATI	»	383
2.1 Graficizzazione dello stato di attuazione	»	383
2.2 Tabulato dell'attuazione finanziaria	»	383

I Premessa

Alla data di presentazione della presente Relazione, sono ormai trascorsi più di due anni dalla adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000, avvenuta con DPCM in data 18 settembre 1996.

Tale lasso di tempo e segnatamente quello relativo all'anno appena trascorso, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000. A differenza, pertanto, dalle precedenti Relazioni, la presente intende tracciare un primo, ancorché necessariamente sommario, bilancio delle attività fin qui svolte dalla Commissione stessa e da tutti gli altri soggetti a diverso titolo impegnati nella attuazione del Piano.

Per rendere comunque conto dell'attività pregressa è stata predisposta una breve sintesi delle Relazioni precedenti, mentre più ampio spazio è stato dedicato all'operato della Commissione durante il 1998 ed agli avvenimenti, rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano, intervenuti durante il periodo anzidetto.

Una sezione a parte è stata dedicata : all'utilizzo degli strumenti di snellimento procedurale ai fini dell'attuazione del Piano; agli interventi "definanziati", per spiegare le motivazioni che hanno portato la Commissione ad assumere determinazioni in tal senso e le conseguenze programmatiche e finanziarie di tali deliberazioni sul Piano; ai rapporti che, per la realizzazione di taluni interventi, è stato necessario porre in essere fra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

Il Piano, nella configurazione al 31 dicembre 1998, viene quindi analizzato, sia nel suo complesso che attraverso una lettura per settori, in modo da renderne comprensibile l'evoluzione e lo stato di attuazione. Di alcuni interventi o gruppi di interventi sono stati poi esaminati in modo più approfondito.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano ed agli strumenti di controllo dello stesso ed ai soggetti ad esso deputati.

Completano il testo tre Allegati che consentono di leggere l'evoluzione del Piano, sia programmatica, che finanziaria, nonché lo stato di attuazione, in relazione ad ogni singolo intervento.

Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- *Commissione – Commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 396/90, integrata – ai sensi del comma 2.bis, art. 1 della legge n. 651/96 - per le questioni di specifico interesse delle rispettive provincie, dai presidenti delle provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

2 La gestione amministrativa

2.1 Sintesi delle relazioni precedenti

2.1.1 La prima relazione trimestrale (18 settembre 1996 - 31 marzo 1997)

Con la prima relazione trimestrale, la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651, ha dato conto delle decisioni e degli atti programmati assunti in merito alla definizione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi comunque inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

Con DPCM in data 18 settembre 1996, è stato adottato il Piano degli interventi, definito dalla Commissione con delibera n. 2 dell'8 luglio 1996, Piano che, come diffusamente esplicitato nella Relazione di accompagnamento, è stato articolato nei settori di seguito elencati, suddivisi, a loro volta, in sotto-settori riferiti a singoli interventi, ovvero a gruppi d'interventi fra loro tipologicamente omogenei.

- **A. Sociale ed accoglienza**

Centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie"); n. 74 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 330, 8 miliardi.

- **B. Beni culturali**

Tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico; realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali; n. 256 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 560,2 miliardi.

- **C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale**

Riorganizzazione urbana, risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.), salvaguardia e riqualificazione ambientale, tutela della salute, ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione; n. 65 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 590,55 miliardi.

- **D. Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana**

Accessibilità e mobilità pedonale e veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche); n. 37 per un finanziamento complessivo di Lit. 1.588,05 miliardi.

- **E. Servizi speciali e formazione**

Piani straordinari di prevenzione e di interventi in casi di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, protezione civile, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.) valorizzazione e promozione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'evento giubilare; n. 58 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.330 miliardi.

- **F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento**

Programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi di informazione dei cittadini e dei visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.); n., 10 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.90,4 miliardi.

Il numero complessivo degli interventi ricompresi nel Piano era pari a 500 a fronte di una assegnazione finanziaria, ai sensi dell'art.2, comma 1 del DL n. 455 /96, pari a 3.500 miliardi.

Con DPCM in data 5 novembre 1996, nelle more della conversione in legge del DL n.551 del 23 ottobre 1996, sono stati recepiti alcuni provvedimenti che la Commissione ha adottato fra cui:

- il definanziamento, totale o parziale, di alcuni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Galleria Principe Amedeo d'Aosta (D.08.01) e del suo collegamento con il Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed il Parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area dello Stato Città del Vaticano ;
- il mandato all'Ufficio per Roma Capitale di trasferire ai soggetti beneficiari le occorrenze finanziarie per far fronte agli oneri relativi alla progettazione degli interventi ed alle eventuali attività di indagine a questa strumentali;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedurale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione del contributo complessivo di Lit. 40 miliardi a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di accoglienza e di monitoraggio, rispettivamente in 32 miliardi (accoglienza) ed 8 miliardi (monitoraggio) e la calendarizzazione del trasferimento delle quote relative ai 32 miliardi (art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996).

Con il successivo DPCM in data 11 dicembre 1996, sono state adottate alcune importanti direttive in ordine alla gestione ed al controllo sull'attuazione del Piano:

- “Indirizzi per l’attuazione finanziaria del Piano”;
- “Indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l’attuazione del Piano e l’informazione della pubblica opinione”;
- “Criteri per il monitoraggio”.

Infine, con D.M. in data 21 dicembre 1996, è stato adottato il parziale definanziamento dell’intervento relativo alla realizzazione dell’asse viario Olimpica - Pineta Sacchetti (D.12.01), deliberato dalla Commissione al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione del Sottopasso di Castel Sant’Angelo e della Galleria Principe Amedeo d’Aosta, fissate rispettivamente in 169 e 68 miliardi. Tale definanziamento che doveva essere “momentaneo”, è poi divenuto definitivo.

2.1.2 *La seconda relazione trimestrale (1° aprile – 30 giugno 1997)*

La suddetta relazione, sulla scorta della precedente, ha dato atto dei provvedimenti adottati nel periodo in esame e segnatamente dei DD.MM. 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

Con il primo, tra l’altro:

- è stato ridotto l’importo dello stanziamento a favore dell’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione n.651/96 del citato DL n. 551/96, recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”, ha limitato il contributo in questione alle prestazioni connesse al “piano di accoglienza”, eliminando, pertanto, qualsiasi riferimento a compiti nel campo del “monitoraggio”;
- si è stabilito di subordinare l’effettivo trasferimento delle somme stanziate a favore di interventi presenti anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l’autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale;
- si è precisato che con la locuzione “termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi” di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura;
- si è, altresì, precisato che con la locuzione “sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione”, di cui al comma 3 bis, dell’articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l’aumento superiore al 20% dell’importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, nel caso di gara non ancora espletata;
- si è stabilito che la Commissione procedesse, in sede di modifica ed integrazione al Piano, ad una valutazione comparativa delle richieste di inclusione, dando priorità alla finalità perseguita dagli interventi proposti, al relativo grado di

fattibilità in relazione al livello di definizione progettuale conseguito, alla complessità realizzativa ed al grado di perfezionamento degli adempimenti amministrativi;

- si è stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra - alberghiere fossero indirizzate direttamente alla Regione Lazio, titolare dell'intervento relativo agli incentivi previsti per questo specifico settore;
- è stato inserito nel Piano con codice F.04.02 e con apposito finanziamento, l'intervento denominato "Osservatorio sul Piano del Giubileo";
- in merito all'attività di "monitoraggio" del Piano, il cui coordinamento era già stato affidato all'U.R.C.G.E., si è demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore e sono stati approvati il "Disciplinare tecnico e capitolato d'oneri" elaborati dall'Ufficio anzidetto.

Con il DM 24 giugno 1997 sono state apportate altre modifiche ed integrazioni al Piano che si sono concretizzate principalmente in :

- taluni definanziamenti, cambi di soggetti beneficiari e proroghe temporali, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino al fine di garantire la sicurezza dell'accesso a quest'ultimo e per consentire un migliore espletamento delle funzioni di soccorso a mare;

sono inoltre state assunte le seguenti determinazioni:

- si è stabilito di sottoporre ad ulteriore istruttoria - per la verifica di conformità ai criteri indicati dalla LR n. 20/97 in materia di ricettività - tutti gli interventi ricompresi nel Piano, rubricati con codice A.07, ad eccezione di quelli di nuova costruzione ed ampliamento di strutture ricettive;
- si è stabilito che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse presentata direttamente dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia;
- si è stabilito inoltre che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti fossero prioritariamente destinate ai settori della mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell'accoglienza, della ricettività e della gestione dell'evento.

2.1.3 *La terza relazione trimestrale (1° luglio - 30 settembre 1997)*

L'attività di modifica ed integrazione del Piano esercitata, nel periodo in esame, dalla Commissione si è formalizzata con il D.M. del 4 agosto 1997. In particolare con tale atto:

- si è confermato l'inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A.07, sottoposti al supplemento istruttorio succitato, e concernenti il "Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e

nella regione, al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo", vuoi in quanto conformi ai criteri della LR n. 20/97, vuoi perché contraddistinti da finalità coerenti con le celebrazioni giubilari;

- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi rubricati con codice A.07, dovessero attenersi alle disposizioni del comma 1, art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo;
- sono state assentite modifiche di titoli e termini temporali relative ad alcuni interventi;
- si è preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari ad un costo stimato di Lit. 11.950.000.000, e la Commissione si è impegnata a reperire tale somma a valere sui ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture finanziati ai sensi della legge n. 651/96.

La Relazione oltre a fornire elementi circa lo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi, riportava anche lo stato di avanzamento della fase realizzativa, riferendo che, in merito alla gestione finanziaria, al 30 settembre 1997, erano stati effettuati 104 mandati di pagamento per complessive Lit. 133.371.290.000, nonché trasferimenti, con variazione compensativa di bilancio, al Ministero BB.CC.AA. per Lit. 327.315.000.000 ed al Ministero degli Interni per Lit. 5.000.000.000.

Nel trimestre in esame la Commissione è stata inoltre aggiornata sull'attività svolta dall'U.R.C.G.E. in ordine a tutte le procedure relative all'appalto del "Servizio di monitoraggio del Piano". In particolare sono stati resi noti i tempi e le modalità della procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE, in relazione alla quale, in data 29 settembre si era ormai giunti alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice - all'uopo nominata dal Ministro dei lavori pubblici - , con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata essere quella presentata dall'ATI fra Italconsult, S.p.A., SIM - Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A..

2.1.4 La quarta relazione trimestrale (1° ottobre - 31 dicembre 1997)

La relazione relativa a tale periodo fa riferimento al D.M. 22 dicembre 1997 con il quale, tra l'altro:

- sono state recepite le modifiche ed integrazioni che la Commissione ha apportato al Piano, nel quadro della propria attività di programmazione ed indirizzo, ed in particolare è stato inserito nel Piano, con codice D.08.03, l'intervento avente per oggetto le "Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna", con un finanziamento di 11.950 milioni;

- si è stabilito l'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di comunicare tempestivamente alla Commissione la data relativa all'intervenuta aggiudicazione dei lavori;
- si è altresì stabilito l'obbligo, in capo al soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, di comunicare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto.

La Relazione dava inoltre notizia dell'avvenuto scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, di cui al comma 13, art. 1, della legge n. 651/96, concernente le modalità di attuazione dell'intervento relativo al parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area extraterritoriale (tale argomento è comunque più diffusamente trattato al punto 1.4 della presente Relazione).

In ordine allo stato di avanzamento della fase realizzativa del Piano, la Relazione riportava il seguente prospetto relativo agli impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie aggiornato al 31 dicembre 1997:

Impegni	Lit. 534.949.437.700
Trasferimenti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
Trasferimenti al Ministero degli Interni	Lit. 50.000.000.000

per un totale di Lit. 916.762.937.700 di cui Lit. 646.539.703.400 trasferite anche in termini di cassa. Gli impegni assunti si riferivano a 193 interventi, vuoi per anticipi per le attività progettuali (circa 76 miliardi), vuoi per anticipazioni su lavori o forniture già appaltate (circa 358 miliardi).

Il trasferimento al Ministero per i beni Culturali e Ambientali era riferito all'avvio di tutti gli interventi di competenza ricompresi nel Piano. Il trasferimento al Ministero degli Interni era riferito agli interventi in materia di sicurezza.

Alla fine del trimestre in questione sono intervenuti altresì due fatti significativi ai fini del controllo e della gestione del Piano del Giubileo ed di tutte le attività ad esso comunque connesse.

Il primo concerne la stipula del contratto di appalto relativo al "Servizio di monitoraggio del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000", appalto affidato in data 18 dicembre 1997 alla già citata ATI fra le Soc. Italconsult, SIM - Società Italiana per il Monitoraggio e Infraplan, per un importo contrattuale di Lit. 4.019.037.400 (IVA esclusa).

Con tale atto ha preso così avvio quella importante attività di verifica e controllo dell'avanzamento del Piano prevista dalla legge n.651/96 - alla quale è dedicata una apposita sezione della presente Relazione -, che si è affiancata a quella già esercitata dalla Commissione, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla BEI, dall'U.R.C.G.E.,

nonché da tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del Piano.

Il secondo riguarda la “Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000 nell’ambito del territorio comunale di Roma” avvenuta con DPCM in data 31 dicembre 1997.

Con tale provvedimento al Sindaco di Roma – affiancato da un Comitato di coordinamento composto di quindici membri e costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un nucleo di esperti in numero massimo di cinque- è stato affidato, con mandato fino al giugno 2001, il compito di coordinare i soggetti titolari di interventi localizzati nel Comune di Roma al fine di:

- formulare al Ministro competente per delega, proposte di rimodulazione del Piano, anche in ordine alla priorità delle iniziative da assumersi, nonché alle possibili intese con altre amministrazioni, per le attività ed i servizi di loro competenza;
- proporre misure organizzative e procedurali tese alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;
- coordinare le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, segnatamente nelle aree delle basiliche e nel centro della città;
- assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri inclusi nel Piano e quelli comunque realizzati benché non ricompresi nello stesso;
- armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle della comunità locale, con riferimento sia ai problemi del funzionamento dei servizi a rete ed alla persona, che a quelli relativi alla sicurezza e salubrità ambientale, nonché alla informazione ed alla trasparenza delle procedure;
- coordinare le attività previste dal “piano dell’accoglienza”, anche in riferimento al programma delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti ;
- assicurare l’attuazione delle indicazioni della Commissione mista fra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Per il raggiungimento dei fini anzidetti, al Commissario Straordinario è stato conferito il potere di impartire, alle amministrazioni competenti, direttive ed indicazioni operative, e di ottenere dalle stesse tutte le informazioni e la documentazioni ritenute utili all’espletamento del mandato.

Al Commissario è stato altresì attribuito il compito di promuovere la convocazione di conferenze di servizi, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché quello di riferire periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, “*sull’andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione*”.

2.2 La riprogrammazione del Piano nei quattro trimestri del 1998

Nel corso del 1998 la Commissione per Roma Capitale ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere anche per sopravvenute esigenze non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, si è resa possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza sempre crescente, passavano dalla fase relativa agli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

In particolare occorre innanzitutto menzionare il definanziamento, provvedimento adottato con apposito DM in data 5 febbraio 1998, dell'intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant'Angelo (D.07.01) e l'inserimento nel Piano di un nuovo intervento denominato "Sottovia Lungotevere in Sassia" rubricato con codice D.07.02 e dotato di un'assegnazione finanziaria pari a Lit. 43,5 miliardi.

Il definanziamento del "Sottopasso" - un'opera particolarmente significativa per la sua rilevanza strategica nell'assetto della viabilità del più importante settore della città di Roma in occasione del Giubileo - è intervenuto a seguito del mancato raggiungimento dell'unanimità dei consensi in sede di conferenza dei servizi (19.12.1997), dovuto, fra l'altro, a perplessità emerse in ordine alla realizzabilità dell'opera nei tempi prescritti, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti archeologici ed idrogeologici richiesti.

E' però con la seduta dell'11 marzo 1998 che la Commissione ha apportato un significativo ed incisivo insieme di modifiche ed integrazioni al Piano, recepito con D.M. in data 8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1998. Con detto decreto si è provveduto:

- ad accogliere le richieste di proroga dei tempi programmati - lettere c) e d) - concernenti una serie di interventi per i quali tali slittamenti temporali erano compatibili con il completamento degli interventi stessi entro l'inizio dell'anno giubilare;
- a modificare il titolo del settore E del Piano da "Servizi speciali e formazione" in "Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione", per renderlo congruente con l'effettiva tipologia di interventi in esso attualmente ricompresi;
- a definire puntualmente, sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali eseguiti dai soggetti attuatori, gli interventi - di valenza strategica

- in relazione alle celebrazioni giubilari - concernenti le aree delle Basiliche (S. Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le mura) che sono stati disaggregati, peraltro senza aumento di spesa, in interventi inerenti settori specifici ed attribuiti agli effettivi soggetti attuatori con i relativi finanziamenti;
- a definanziare totalmente o parzialmente cinque interventi (A01.08, A09.01, C01.17, C03.05, D.04.01) -per i quali e per i successivi si rinvia all'apposito paragrafo - in quanto giudicati non fattibili in tempo utile, per un totale di Lit. 97.250 milioni. Fra questi va segnalato quello relativo alla linea tranviaria Archeotram ed opere connesse;
 - a definanziare inoltre (al netto dei trasferimenti già operati), su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte al finanziamento di interventi ritenuti di importanza strategica ai fini delle celebrazioni giubilari, undici opere, ancorché valutate fattibili (B01.01, B08.06., B12.01, B16.21, B16.22, B.16.23, C.01.08, C01.09, C.19.01/a1, D.02.01, D.03.01, per un totale di Lit. 196.478 milioni.

Ancora, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari, sono stati definanziati i seguenti interventi, A.07.02, C01.26, C07.01, D19.02; -E04.01 -E04.04, per un totale di £. 51.600 milioni.

E' stato altresì revocato il finanziamento relativo all'intervento A07.02 - "Campeggio da realizzare nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi" per Lit.321.100.000.

Si è provveduto anche al definanziamento parziale di alcuni interventi localizzati a Castel Gandolfo: C.04.01, C.04.02/A, C.04.02/B, C.04.03, C.04.04, per un totale di 11.050 milioni.

Quest'ultima decisione è scaturita a seguito dell'accertamento, avvenuto in sede di conferenza di servizi, della sussistenza di vincoli di tutela ambientale sulle aree interessate dagli interventi suddetti e dalla conseguente impossibilità di realizzare le opere proposte.

Si è inoltre accertato in circa 71 miliardi l'ammontare, immediatamente disponibile, dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto già intervenute in relazione ad interventi ricompresi nel Piano.

La Commissione ha pertanto avuto a disposizione, fra definanziamenti e ribassi d'asta, una somma di circa 550 miliardi, pari ad un settimo dell'intero ammontare finanziario del Piano, da destinare a modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Tale considerevole somma è stata destinata, per circa 121 miliardi ad integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano e per circa 428 miliardi al finanziamento di 66 nuovi interventi, scelti nell'ambito dei settori ritenuti prioritari in relazione ai criteri di selezione già precedentemente stabiliti dalla Commissione stessa. Si segnalano in particolare 140 miliardi destinati a due

interventi promossi dal Comune di Roma per "Incentivi per la manutenzione ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali"; 93 miliardi circa al Ministero dell'Interno e a quello della Difesa per 18 interventi riferiti alla realizzazione di strutture o di forniture o prestazioni di servizi inerenti problemi di "pubblica sicurezza" o "servizi speciali"; 50 miliardi sono poi stati destinati alle provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per interventi finalizzati al miglioramento della viabilità provinciale. Nell'elenco figurano inoltre sei interventi concernenti le Basiliche di S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e S. Paolo fuori le Mura, per i quali, essendo gli immobili di proprietà della Santa Sede, si è reso necessario un ulteriore scambio di note, del quale si riferisce al punto 1.5.

Con il DM in data 15 maggio 1998 le modifiche ed integrazioni al Piano sono state limitate alla sola ridefinizione degli interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo, mentre sono state introdotte importanti modifiche agli "Indirizzi di attuazione finanziaria del Piano". Queste ultime sono state deliberate dalla Commissione, anche al fine di snellire ulteriormente le procedure amministrative di natura finanziaria e ridurre i relativi tempi, in analogia a quelle previste in relazione alla legge n. 270/97 concernente il Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio. In particolare l'erogazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dei lavori o delle forniture, una volta intervenuta l'aggiudicazione della gara d'appalto, è passata dal 20 al 50% delle risorse stesse.

Con il successivo DM in data 16 luglio 1998, la Commissione ha movimentato circa 150 miliardi, ripartendo tale somma in quanto a 42 miliardi circa in integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano ed in quanto a 106 miliardi circa, in finanziamenti di 23 nuovi interventi, fra i quali circa 38 miliardi per tre interventi concernenti la Stazione Termini, 24 miliardi all'ATAC per una ulteriore fornitura di mezzi pubblici, nonché altri finanziamenti nel campo dei "servizi speciali" - sicurezza e sanità - ed uno di tre miliardi destinato alla definizione progettuale ed agli studi relativi alla "Area Grandi Eventi", individuata, dopo lunghe e difficili trattative, nell'ambito di Tor Vergata.

Nel Piano, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1, della legge n. 270/1997 - quella concernente il Piano degli interventi per il Giubileo in località al di fuori del Lazio - sono inoltre stati inseriti tre interventi proposti da soggetti privati, senza oneri a carico dello Stato ed ai soli fini di poter utilizzare le procedure acceleratorie richiamate dal citato testo di legge.

Al Decreto in questione è stata inoltre allegata, sub E, la "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo Lazio" che la Commissione ha definito, anche in questo caso in analogia con l'operato dalla Commissione preposta alla definizione del Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio, per dissipare alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ad interventi finanziati ai sensi della legge n. 651/96 e realizzati da enti ecclesiastici.

Con delibera n. 6 del 1 dicembre 1998, recepita con DM in data 7 gennaio 1999, la Commissione ha movimentato circa 179 miliardi, dei quali, circa 53 assegnati al finanziamento di 11 nuovi interventi e circa 109 ad integrazioni di interventi già presenti nel Piano. La Commissione ha stabilito, inoltre, di accantonare circa 13 miliardi quale fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. La Commissione ha altresì individuato i settori o le tipologie di intervento, elencati in ordine di priorità, da finanziarsi con le future somme rivenienti dai ribassi d'asta.

Nel periodo in esame sono altresì state emanate tre direttive del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo del 2000

Con la n. 1 del 5 maggio 1998, il Commissario Straordinario ha impartito disposizioni e richiesto informative coerentemente con i compiti di coordinamento conferitigli in materia di Giubileo, ed ha altresì delineato la suddivisione delle competenze e le rispettive titolarità in ordine alle strutture chiamate a collaborare con l'Ufficio del Commissario stesso. Quest'ultimo Ufficio ha altresì, in attuazione della Direttiva. 1, impartito alcune disposizioni per disciplinare la "anticipazione dei lavori appaltati" ed il relativo "premio di accelerazione".

Con la Direttiva n. 2 del 18 maggio 1998, il Commissario ha posta in essere la nuova organizzazione finalizzata al coordinamento dei cantieri insistenti sul territorio del Comune di Roma ed articolata nel nuovo "Ufficio Centrale Temporaneo" e del già operante "Ufficio Speciale coordinamento cantieri".

Con la Direttiva n. 3 del 29 dicembre 1998, il Commissario ha provveduto ad individuare, nell'ambito delle attività afferenti al Piano dell'accoglienza, le seguenti aree tematiche (settori) e le rispettive amministrazioni o enti incaricati della gestione dell'anno 2000:

Settore	Responsabile Istituzionale
Sicurezza	Prefettura di Roma
Grandi Eventi	Agenzia per il Giubileo
Protezione civile	Prefettura di Roma
Igiene Urbana	AMA
Sanità	Regione Lazio
Mobilità locale	Comune di Roma
Volontariato (parte italiana)	Agenzia per il Giubileo
Ricettività	Regione Lazio
Informazione di servizio	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione locale	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione ed informazione nazionale ed internazionale	Dipartimento per il Turismo
Sala Situazioni	Agenzia per il Giubileo
Coordinamento attività operative Giubileo Lazio ed Extra Lazio	Dipartimento per il Turismo

2.3 Gli interventi definanziati

Nel corso dell'attività di modifica ed integrazione al Piano attuata dalla Commissione e recepita, a tutto il 1998, in 12 decreti, sono stati definanziati totalmente o parzialmente gli interventi di seguito elencati secondo il settore di appartenenza.

In linea di massima i definanziamenti di taluni interventi sono stati deliberati dalla Commissione vuoi per l'imprevisto manifestarsi di cause ostative alla realizzazione totale o parziale degli stessi, vuoi per l'impossibilità di completare le opere di interventi, ancorché fattibili, entro i tempi programmati.

E' questo, ad esempio, il caso degli interventi di maggiore dimensione, complessità ed impegno finanziario, concernenti infrastrutture e nodi di scambio per il miglioramento della mobilità nella città di Roma, la cui realizzazione ha palesato difficoltà obiettive tali da non garantire con certezza l'ultimazione entro tempi compatibili con la scadenza giubilare. Per gran parte di essi il soggetto attuatore ha deciso di rinviarne la realizzazione in tempi successivi al Giubileo, anche al fine di evitare che gli inevitabili inconvenienti prodotti dai relativi cantieri non si aggiungessero al maggior carico di afflussi previsti per l'anno 2000.

Si tratta, pertanto, di una rimodulazione temporale di programmi attuativi che saranno comunque realizzati, e ciò anche per utilizzare il lavoro progettuale già svolto e portare a compimento l'iter procedurale ed autorizzativo avviato.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Estremi del provvedimento	Importo del definanziamento
A.01.01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma	DM 24/6/97	900.000.000
A.01.08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	DM 8/5/98	1.350.000.000
A.01.09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	Comune di Roma	DM 24/6/97	700.000.000
A.01.20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero israelitico". (Roma) Recupero del complesso di S. Ambrogio della Masisima	Comune di Roma	DM 24/6/97	5.000.000.000
A.07.02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	DM 16/7/98	321.100.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A.07.08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	DM 22/12/97	1.000.000.000
A.07.17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	DM 16/7/98	2.700.000.000
A.07.38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	DM 16/7/98	1.200.000.000
A.08.01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extraalberghiere	Regione Lazio	DM 24/6/97	30.365.000.000
A.09.01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	DM 8/5/98	9.350.000.000
B.01.01	Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento, restauro e musealizzazione del Tabularium (prima fase)	Comune di Roma	DM 8/5/98	8.075.000.000
B.08.06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	1.300.000.000
B.12.07	Arsenale Pontificio (Roma) Restauro completo dell'immobile per utilizzazione museale (Museo del Tevere)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 18/4/97	1.500.000.000
B.13.37	Chiesa della SS. Annunziata (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 18/4/97	500.000.000
B.13.53	Chiesa S. Andrea in via Flaminia (Roma) Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 18/4/97	400.000.000
B.16.21	Acquedotto della Villa dei Quintili (Roma) Restauro, risanamento funzionale e tecnico impiantistico. Completamento restauro arcate e piloni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	1.000.000.000
B.16.22	Parco delle tombe della Via Latina (rOma). Scavi archeologici, restauri e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	1.723.000.000
B.16.23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma) Scavi archeologici, restauri e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	DM 8/5/98	2.320.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.18.15	Riqualificazione del comprensorio della Mentorella (Capranica Prenestina/Roma) Sistemazione dell'area circostante e realizzazione di un'area parcheggio	Provincia di Roma	DM 18/4/97	400.000.000 (1)
B.19.01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma	DM 24/6/97	2.500.000.000
B.19.11	Monastero di Santa Scolastica (Subiaco/Roma) Restauro	Comune di Subiaco	DM 18/4/97	2.000.000.000 (1)
C.01.08	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Venezia.	Comune di Roma	DM 8/5/98	18.810.000.000
C.01.09	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Aurelia	Comune di Roma	DM 8/5/98	7.600.000.000
C.01.16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma	DM 24/6/97	27.000.000.000
C.01.17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	DM 8/5/98	13.700.000.000
C.02.07	Pista ciclabile Castel S. Angelo-Ponte Sublicio	Comune di Roma	DM 16/7/98	2.000.000.000
C.03.05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	DM 8/5/98	19.000.000.000
C.04.01	Terminal bus	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	1.500.000.000
C.04.02 /a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	12.000.000.000
C.04.02 /b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	6.000.000.000
C.04.03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	1.650.000.000
C.04.04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	1.200.000.000
C.04.G	Recupero e restauro monumenti	Comune di Castel Gandolfo	DM 15/5/98	500.000.000
C.19.01 /a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).	Comune di Roma	DM 8/5/98	40.000.000.000
D.02.01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma	DM 8/5/98	47.500.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.03.01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma	DM 8/5/98	67.450.000.000
D.04.01	Linea tramviaria Archeotram	Comune di Roma	DM 8/5/98	53.200.000.000
D.07.01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	DM 5/2/98	161.638.184.000
D.09.01	Area della Stazione Tiburtina (Roma) Infrastrutturazione	Ferrovie dello Stato	DM 16/7/98	34.000.000.000
D.12.01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma	DM 5/11/96 DM 21/12/96	91.700.000.000
D.18.01 /1	Linee A e B della metropolitana (Roma) Potenziamento nodo di Termini	Comune di Roma	DM 16/7/98	29.726.856.210
D.19.01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina	Comune di Roma	DM 24/6/97	40.000.000.000
D.19.02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	DM 8/5/98	30.000.000.000
E.01.10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA	DM 24/6/97	2.380.000.000
E.01.21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA	DM 24/6/97	1.790.000.000
E.01.23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA	DM 24/6/97	7.140.000.000
E.04.01	Piano di valorizzazione delle risorse umane(Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti alla P.A. Impiego operatori in servizio civile	Regione Lazio	DM 8/5/98	10.728.000.000
E.04.04	Piano di valorizzazione delle risorse umane(Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri formazione professionale	Regione Lazio	DM 8/5/98	2.872.000.000
E.05.10	Acquisto 4 gruppi elettrogeni con relativi shelter	Ministero Difesa	DM 7/1/99	1.000.000.000
E.05.31	Ampliamento e ristrutturazione sede EUR	Min. Interno - Corpo nazionale VV. FF - Dip. Protezione Civile	DM 7/1/99	1.500.000.000

(1) Si tratta di definanziamenti apparenti in quanto gli interventi sono stati incorporati, con il relativo finanziamento, in altri già presenti nel Piano stesso.

Per dar modo di valutare le ragioni di cancellazione dal Piano, ovvero di definanziamento totale o parziale dei sopra elencati interventi, viene riportato di seguito il dettaglio delle relative motivazioni, limitatamente agli interventi di importo superiore ai 3 miliardi di lire.

A.08.01 - *“Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere”
- Finanziamento 130 miliardi.*

Con DM 24/6/97 l'intervento, che vede come soggetto attuatore la Regione Lazio, è stato parzialmente definanziato per circa 30 miliardi. Tale riduzione finanziaria è stata deliberata dalla Commissione in relazione al fatto che le finalità perseguite dall'intervento in questione erano già in parte soddisfatte da alcuni interventi ricompresi nel settore A del Piano e rubricati con il codice A.07 “Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella Regione, al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo”. Di tale intervento si riferisce più diffusamente in altra parte della presente relazione.

A.09.01 - *“Corsia Sistina-Ospedale S. Spirito - Centro temporaneo di accoglienza dei pellegrini nell'area della Basilica di S. Pietro - Lavori di restauro e allestimento” - Finanziamento 10 miliardi.*

L'intervento concerne il restauro della monumentale ala dell'Ospedale S. Spirito, finalizzato ad un riuso a fini culturali e di accoglienza.

Erano previsti interventi conservativi agli affreschi distribuiti su tutte le pareti della grande sala e lavori di rifacimento del tetto, del pavimento oltreché di allestimento e climatizzazione.

L'intervento, il cui progetto ha ottenuto tutte le necessarie approvazioni è stato definanziato con il D.M. 8.5.1998 sulla base di una temuta non fattibilità entro i tempi utili per le celebrazioni giubilari.

Sono stati mantenuti in favore dell'intervento solo 650 milioni destinati ai lavori urgenti per le riparazioni delle coperture della Corsia Sistina, il cui cattivo stato di manutenzione minacciava l'ulteriore compromissione dei dipinti murali.

B.01.01 - *“Area del Grande Campidoglio: Palazzo Senatorio. Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro” - Finanziamento 5 miliardi.*

L'intervento si riferisce all'ampio progetto di restauro, consolidamento e musealizzazione del Palazzo Senatorio che è stato diviso in due distinte fasi.

La prima ha riguardato il consolidamento e restauro del Tabularium, tuttora in corso di esecuzione per un importo di 10 miliardi e mezzo, finanziato con i fondi di Roma Capitale.

La seconda fase, cui si riferisce l'intervento in oggetto riguarda invece il restauro ed il consolidamento dei piani superiori al Tabularium, e prevede, tra l'altro il trasferimento di alcuni uffici allocati nel palazzo del Campidoglio.

Proprio in relazione alle difficoltà connesse alla presenza degli uffici, è stata valutata la difficoltà di portare a compimento l'opera entro i tempi stabiliti dal

programma del giubileo e si è pertanto deciso, da parte del Comune, di chiederne il definanziamento.

Il progetto, peraltro inserito nel Programma di Roma Capitale nell'ambito di finanziamenti attribuiti per l'anno 1998, è stato approvato da tutti gli uffici competenti ed è in corso la gara di appalto.

C.01.08 - *"Intervento urbanistico connesso alla linee San Pietro-Venezia"-
Finanziamento 12 miliardi.*

D.03.01 - *"Tram Venezia-San Pietro, realizzazione della linea tranviaria"-
Finanziamento 71 miliardi.*

I due interventi attengono entrambi, per un totale di 83 miliardi, alla realizzazione di una linea tranviaria San Pietro-Piazza Venezia, con percorso lungo Corso Vittorio Emanuele e Via del Plebiscito.

Il progetto è da considerare collegato alla tranvia San Pietro-Aurelia, che ne costituisce la prosecuzione verso i quartieri della zona Ovest della città.

Il progetto ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie. Il Comune di Roma ha comunque deciso di non intraprendere la realizzazione dell'opera prima del Giubileo e quindi di chiederne il definanziamento, dal momento che i suoi cantieri andavano ad interferire proprio con quella parte del Centro storico che è adiacente all'area critica della Basilica di San Pietro.

Gli eventuali cantieri di questa tranvia sarebbero andati dunque ad assommarsi agli altri cantieri già installati, creando effetti moltiplicativi dei disagi che già attualmente gravano su questo settore di Roma.

La realizzazione della linea tranviaria, considerata di vitale importanza, è stata pertanto rimandata al periodo immediatamente successivo alla conclusione delle celebrazioni giubilari.

C.01.09 - *"Intervento urbanistico connesso alla linee San Pietro-Aurelia"-
Finanziamento 8 miliardi.*

D.02.01 - *"Linea tranviaria San Pietro-Aurelia"- Finanziamento 59 miliardi.*

I due interventi attengono entrambi alla realizzazione di una linea tranviaria S; Pietro-Aurelia lungo il percorso di Via Gregorio VII.

Il progetto, da considerare quale prosecuzione della linea P. Venezia-San Pietro, ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie.

Il progetto completo in tutte le sue parti è stato vagliato anche dal soggetto monitore, che lo ha dichiarato fattibile sia pure con una certa criticità.

Anche per questi interventi il Comune di Roma ha inteso non intraprendere i lavori in occasione del Giubileo e quindi proporre il definanziamento dal momento che avrebbero interferito con l'area di massima concentrazione di interventi che è appunto quella circostante S. Pietro, al fine di non creare ulteriori rischi ad un'area già sufficientemente interessata da cantieri di grande importanza ed estensione e che già comportano pesanti riflessi sul traffico urbano.

Il progetto continua ad essere ritenuto assolutamente valido ed è stata rinviata la sua realizzazione, al periodo immediatamente successivo alle celebrazioni giubilari.

C.01.16 - *“Attraversamento di Villa Pamphily mediante galleria artificiale (prima fase)
“- Finanziamento 27 miliardi.*

L'opera prevede l'interramento dell'attuale Via Olimpica, che, realizzata in occasione delle Olimpiadi del 1960, ha spezzato in due parti il comprensorio unitario della Villa Doria Pamphily.

L'opera riveste pertanto un alto valore ambientale, ma è anche finalizzata alla velocizzazione del traffico su questo importante asse viario, con l'eliminazione di vari incroci e semafori.

Il progetto era pronto ed anche l'iter delle approvazioni si poteva dire concluso. Di fatto, però, il costo totale dell'intervento era stimato in 85 miliardi, dei quali si rendevano disponibili nell'ambito del programma giubilare solo 27. Anche sulla base di questo, con molto anticipo già con il decreto ministeriale del 24 giugno 1997, l'intervento è stato defianziato per supportarne altri ritenuti di prioritaria importanza strategica, nel quadro delle finalità giubilari.

C.01.17 - *“Via Pineta Sacchetti: allargamento del tratto da Piazza Giuriconsulti fino a Via Trionfale“- Finanziamento 14 miliardi.*

L'intervento di allargamento della Via Pineta Sacchetti riveste grande importanza anche perché su di essa andrà a connettersi, in futuro, il collegamento in tunnel tra la via Olimpica e la stessa via Pineta Sacchetti, denominato “passaggio a nord-ovest”.

L'intervento è stato diviso in tre tratte: una prima da via Trionfale a via La Nebbia, che è stata già realizzata ed ultimata nel corso del 1998; una seconda tratta da via La Nebbia a via di Forte Braschi e una terza tratta da via di Forte Braschi a Piazza Giureconsulti. L'intervento in oggetto si riferisce alla seconda tratta (via La Nebbia-Via di Forte Braschi) il cui progetto è stato già predisposto ed approvato.

Il defianziamento è da mettersi in relazione alle vicende dell'intero asse viario Olimpica - Circonvallazione Cornelia di cui fa parte anche il “passaggio a nord-ovest” che è stato a sua volta defianziato.

Si è deciso, infatti, da parte del Comune di realizzare l'intera opera con fondi ordinari, al fine di svincolarsi dai tempi predeterminati e troppo costrittivi del Giubileo, ma anche per non appesantire ulteriormente i quartieri Aurelio e Trionfale, che già vedono fortemente diminuita la loro accessibilità lungo le direttrici principali di accesso di Via Gregorio VII, impegnata dai cantieri della Galleria PASA e di via Ubaldo degli Ubaldi, tuttora interessata dai lavori del prolungamento della metro A.

Interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo

C.04.01 *“Terminal bus“- Finanziamento 1,5 miliardi.*

C.04.02 *“Centro accoglienza e galleria pedonale“- Finanziamento 18 miliardi.*

C.04.03 *“Parcheggio bus lunga sosta“- Finanziamento 1,65 miliardi.*

C.04.04 *“Stazione La Villetta potenziamento“- Finanziamento 1,2 miliardi.*

L'insieme degli interventi era stato studiato allo scopo di agevolare l'arrivo ed il deflusso dei pellegrini che si recheranno a Castel Gandolfo nel periodo giubilare in occasione delle udienze estive del Pontefice.

I predetti interventi sono stati definanziati, perché quasi tutti localizzati in ambiti che, ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge 431/85, sono sottoposti a vincolo di inedificabilità fino alla definitiva approvazione dei piani paesistici che, all'epoca della presentazione ed esame dei progetti, erano stati solo adottati.

Il definanziamento è stato determinato, peraltro, anche dal parere negativo espresso in merito dalla competente Soprintendenza.

Con DM del 15 maggio 1998, una parte dei finanziamenti attribuiti al Comune Castelgandolfo è stata recuperata nella misura di circa 11 miliardi, per far fronte ad una serie di interventi più numerosi, ma di più ridotte dimensioni, e precisamente:

C.04.A	Terminal bus	1.300 milioni
C.04.B	Centro servizi di prima necessità	1.500 milioni
C.04.C	Sottopasso pedonale via Maremmana	300 milioni
C.04.D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio al servizio del centro storico	2.550 milioni
C.04.E	Sistemazione viabilità urbana	1.800 milioni
C.04.F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago Comune di Castelgandolfo	1.000 milioni
C.04.G	Recupero e restauro monumenti	500 milioni
C.04.H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	2.100 milioni
	Totale	11.050 milioni

C.19.01/a1 - *"Depurazione delle acque del Bacino del Tevere. Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma-Rio Galeria (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione località Casalotti)" - Finanziamento 40 miliardi.*

In origine l'importo dell'intervento era di 75 miliardi ed il soggetto beneficiario la Regione Lazio.

Successivamente l'importo dell'intervento è stato ridotto da 75 a 40 miliardi ed attribuito al Comune di Roma quale soggetto beneficiario.

L'intervento è stato completamente definanziato poiché in fase di progettazione definitiva si è evidenziata la necessità di realizzare un depuratore nella parte terminale dell'adduttrice in località Pantan Monastero, che ha comportato l'adozione di una variante di Piano regolatore preliminare all'esproprio e ciò ha messo in discussione i tempi preventivati.

L'intervento sarà comunque realizzato, poiché successivamente al definanziamento, è stato inserito nel Programma di Roma Capitale, con l'assegnazione di risorse a valere sullo stanziamento per il 1998 della legge n. 396/90.

Il progetto e la variante sono stati, nel frattempo approvati ed è in corso il provvedimento deliberativo per l'indizione della gara di appalto.

D.04.01 - *"Linea tranviaria Archeotram" Finanziamento 56 miliardi.*

C.03.05 - *"Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram" Finanziamento 20 miliardi.*

I due interventi, facenti capo ad una stessa opera, sono stati defianziati con DM 8 maggio 1998 in quanto valutati non fattibili in tempi compatibili con le celebrazioni giubilari.

Il progetto non era giunto a sufficiente maturazione, in particolare per quello che riguarda la tratta dalla via Appia Antica alla Piramide.

Le FS che in precedenza si erano dichiarate disponibili a consentire il passaggio della linea nelle aree di loro pertinenza, in sede di conferenza di servizi, hanno ritirato la loro disponibilità rendendo necessaria una variante di percorso che ha messo in discussione la realizzabilità dell'opera nei tempi giubilari.

Il progetto, seppure defianziato, è in via di definizione per essere realizzato successivamente al Giubileo con fondi ordinari del Comune.

D.07.01 - *"Sottopasso di Castel S. Angelo: costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per 25 pullman"- Finanziamento 169 miliardi.*

Il Sottopasso di Castel Sant'Angelo è l'opera più rilevante tra quelle defianziate.

L'intervento prevedeva la costruzione di una galleria stradale destinata ad assorbire il traffico veicolare del lungotevere allo scopo di pedonalizzare l'area antistante Castel Sant'Angelo, Piazza Giovanni XXIII (che consente il collegamento tra l'area antistante il Castello e via della Conciliazione) e Lungotevere in Sassia davanti all'ospedale S. Spirito.

L'intervento ha avuto due distinte fasi progettuali.

Nella prima fase è stato individuato un percorso sotterraneo da realizzare con la tecnica dello scavo a cielo aperto ad una quota di poco inferiore all'attuale piano di scorrimento viario sul Lungotevere.

Questa soluzione è stata abbandonata con decisione del 30 luglio 1997, in quanto la Commissione Interministeriale di vigilanza ha verificato che il tunnel avrebbe intercettato reperti ritrovati nel corso degli scavi, riconosciuti di grande pregio e non rimovibili.

In quell'occasione è stata impostata una nuova progettazione che prevedeva un tunnel da realizzare a quote inferiori del precedente ma sempre lungo lo stesso percorso.

Il nuovo tunnel, situato a circa 20 metri sotto il piano di calpestio, si sarebbe dovuto realizzare con uno scavo in galleria mediante l'uso di una macchina speciale.

A dicembre del 1998 però, a seguito delle valutazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in considerazione delle necessità di approfondire ulteriormente lo studio geologico per evitare rischi della stabilità di Castel Sant'Angelo, la Commissione ha definitivamente deliberato, data l'impossibilità di poter concludere i lavori in tempo utile per le celebrazioni giubilari, il defianziamento dell'intervento e finanziato il c.d. "Sottopassino" o "Sottovia del Lungotevere in Sassia", di dimensioni più contenute, ma comunque utile al raggiungimento dell'obiettivo di

decongestionamento viario dell'area e di collegamento al parcheggio sul Gianicolo in corso di realizzazione.

D.09.01 - *"Stazione Tiburtina" - Finanziamento 150 miliardi.*

L'intervento è stato parzialmente definanziato con DM 16/7/98, riducendo lo stanziamento iniziale di 34 miliardi.

Il progetto della Stazione Tiburtina comprende sostanzialmente 4 diverse opere tra loro connesse:

1. il completamento, l'ammodernamento e la meccanizzazione della galleria pedonale (sottostante i binari) la quale dal binario 17 verrà prolungata fino al binario 24, per raggiungere il fronte Pietralata della stazione.
2. il nuovo assetto del piano del ferro, con l'ampliamento degli attuali marciapiedi, che verranno portati ad una larghezza di 9 metri e la nuova conformazione del fronte Pietralata della stazione.
3. la realizzazione sul sedime dell'area ferroviaria della nuova tangenziale Est per il tratto che va dalla via Monti Tiburtini (Ponte Lanciani) all'immissione del tratto urbano della A-24 nella tangenziale, all'altezza del cimitero del Verano.
4. la costruzione della piastra della stazione ponte che coprirà l'intero fascio di binari e relativa copertura, con la quale si andrà a realizzare un galleria sopraelevata dell'altezza di circa 10/12 metri.

Il definanziamento di 34 miliardi riguarda quest'ultima componente dell'opera di ristrutturazione della stazione Tiburtina.

La piastra e la relativa galleria ponte hanno subito rallentamenti nel corso della progettazione, a seguito delle prescrizioni e relativi aggiustamenti richiesti dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Roma.

La realizzazione di questa parte dell'opera verrà comunque realizzata, senza soluzione di continuità, rispetto alle altre parti, con i fondi delle FS.

D-12-01 - *"Tratto viario Olimpica-Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti - Finanziamento 100 miliardi.*

Il progetto del "passante a nord-ovest" che prevedeva la realizzazione di un tunnel viario a quattro corsie di marcia, tra la via Olimpica e via Trionfale, al momento dell'inserimento nel Piano del Giubileo era ancora allo stadio di definizione progettuale di livello preliminare.

I successivi approfondimenti progettuali, connessi alla complessità dell'opera e ai numerosi problemi di impatto ambientale da risolvere, hanno comportato significative modifiche onde pervenire alla migliore soluzione progettuale.

Ciò ha comportato, da un lato, una notevole dilazione dei tempi prevedibili per la realizzazione con l'impossibilità di ottemperare agli obblighi di completamento dell'opera entro i termini prescritti dalla legge n. 651/96 e, dall'altro, una forte lievitazione dei costi, che sono passati da 100 a 215 miliardi.

In considerazione di ciò l'opera è stata parzialmente definanziata ed inserita nel piano di investimenti del bilancio comunale per l'anno 1998. A valere sui fondi ex lege n. 651/96 sono comunque rimasti 8,3 miliardi da sommarsi ai 1,7 miliardi già destinati all'opera con i fondi di cui alla legge n. 396/90.

Il progetto definitivo è stato completato e sarà esaminato in una prossima conferenza di servizi convocata per il marzo del 1999.

D-18-01/1 - *“Linee A e B” della metropolitana – Nodo di Termini – Ristrutturazione del nodo di scambio tra le due stazioni- Finanziamento 40 miliardi.*

L'opera è finalizzata a migliorare la funzionalità dei collegamenti pedonali tra le due stazioni di Termini della metro A e della metro B, attualmente assai problematici, a causa della lunghezza e tortuosità dei percorsi.

Per provvedere alla ristrutturazione del nodo di scambio tra le due stazioni sono state eseguite in prima battuta una serie di opere provvisorie (per il mantenimento del servizio) e di opere propedeutiche (ai lavori veri e propri di ammodernamento, di abbreviazione dei percorsi e meccanizzazione degli stessi tramite scale mobili e tapis roulant) che hanno comportato una spesa di 10 miliardi.

I lavori propedeutici di scavo hanno messo in luce, dietro e al di sotto delle pareti delle gallerie pedonali una serie di reperti murari antichi, già fortemente intaccati e resi in gran parte inintelligibili dai lavori della metro B completati in occasione del giubileo del 1950.

Questi ritrovamenti hanno determinato comunque un supplemento di indagini archeologiche, imposte dalla competente Soprintendenza di Roma, che hanno inevitabilmente comportato un allungamento dei tempi oltre il limite dell'inizio dell'anno giubilare e quindi il definanziamento dell'opera per i residui 30 miliardi.

Tale deliberazione non ha tuttavia annullato l'esecuzione di quest'opera di grande importanza, che è stata finanziata con i fondi ordinari del Comune di Roma. Attualmente le opere di ristrutturazione del nodo sono in corso di realizzazione.

D.19.01 - *“Nodi di scambio (Roma), connessioni con metropolitane e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminio, Anagnina”- Finanziamento 40 miliardi.*

Nel corso di progettazione dei succitati nodi di scambio si è sempre più evidenziata la necessità di predisporre programmi unitari complessi per ciascuno dei quattro siti.

Nei quattro nodi di scambio figurano infatti opere ed infrastrutture che fanno capo a competenze molto diverse (ANAS, COTRAL, FS, ENEL, ACEA etc.), che richiedono l'inquadramento in un progetto urbanistico generale che renda compatibili tra loro tutti gli obiettivi ed i progetti che fanno capo a diversi interlocutori.

E' stato pertanto necessario desistere da una progettazione affrettata che si sarebbe rivelata difficilmente realizzabile nei tempi prescritti ed è stato deliberato il definanziamento dell'intervento nella sua globalità.

Per i nodi di scambio, Trionfale-Ipogeo degli Ottavi e Flaminio-Saxa Rubra il Comune ha avviato la progettazione urbanistica particolareggiata con un finanziamento di due miliardi da reperirsi nell'ambito dei finanziamenti del Programma per Roma Capitale.

D.19.02 - *“Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e ‘Passante dei laghi’” - Finanziamento 40 miliardi.*

L'intervento riguarda i nodi di scambio delle Stazioni Aurelia e Ostiense.

Alla Stazione Aurelia sono stati destinati 10 miliardi per il nodo di scambio gomma-rotaia costituito da un parcheggio per 45 posti bus, 30 posti auto e relative corsie di afflusso e deflusso connesse direttamente alla stazione Aurelia.

Questa opera è stata confermata ed è in corso di esecuzione.

Gli altri 30 miliardi per i quali è stato decretato il definanziamento erano invece destinati al nodo di scambio del Terminal Ostiense che prevede questa serie di opere:

- ampliamento del viadotto della Via Cristoforo Colombo sulla ferrovia con sistemazione viaria di via Capitan Bavastro e corsie di accesso e deflusso dalla via Cristoforo Colombo.
- Nuova sistemazione del parcheggio esterno all'Air Terminal Ostiense.
- Sottopassaggio pedonale ferroviario da costruire ex novo tra l'Air Terminal ed il binario 8 situato nella zona mediana del fascio dei binari della stazione Ostiense, ove corrono i binari dedicati al passante ferroviario dei laghi, che collega la stazione Ostiense con la stazione S. Pietro idoneo a facilitare l'afflusso dei pellegrini all'area del Vaticano.

Il definanziamento di questa opera è stato determinato dalla complessità dei problemi urbanistici da risolvere che non hanno consentito di pervenire in tempo utile alla progettazione definitiva

E.01.23 - *“Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense” - Finanziamento 7.140 milioni.*

Per il Giubileo, al fine di rendere più efficiente il servizio di smaltimento di rifiuti, sono state proposte dall'AMA, la municipalizzata cui compete tale servizio, una serie di zone attrezzate ove poter svolgere il lavoro di scambio del carico di rifiuti tra i mezzi più piccoli e più agili (piccole compattatrici, spazzatrici e furgoni con cassone aperto) e quelli di maggior capienza destinati a raggiungere le discariche.

Nell'ambito del programma per il Giubileo sono state individuate 20 aree intermedie attrezzate.

Per tre di esse: Bravaria, ex Caserma Pepe e Terminal Ostiense (quella in esame il cui costo richiedeva un finanziamento superiore alle altre) è stato decretato il definanziamento a seguito della sopravvenuta indisponibilità dell'area, pur di proprietà comunale, da mettersi in relazione con la scarsa compatibilità con altri programmati impieghi delle aree circoscrizionate.

2.4 Gli Accordi di Programma e le Conferenze di Servizi

La legge n. 651/96 recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", pur nella sua natura di "legge speciale", non ha inteso introdurre alcuna deroga in materia di procedure inerenti i "lavori pubblici"; al contrario, al comma 6 dell'art. 1 si è ribadita l'assoluta "ordinarietà" delle disposizioni da applicare agli interventi finanziati ai sensi della legge medesima, richiamando esplicitamente l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi ricompresi nel Piano, in ordine all'iter degli adempimenti amministrativi, hanno pertanto potuto beneficiare delle procedure di snellimento già previste dell'ordinamento legislativo vigente; in particolare si è fatto ampio ricorso agli istituti della "conferenza di servizi" e dell'"accordo di programma", già peraltro positivamente sperimentati in relazione all'attuazione degli interventi ricompresi nel Programma per Roma Capitale, di cui alla legge n. 396/90, legge che, fra l'altro, aveva introdotto alcune importanti innovazioni proprio in relazione agli istituti in questione.

Come si può evincere dalla tabella di seguito riportate, numerosi "accordi di programma" si sono resi necessari per tutte le opere per la cui realizzazione si rendeva necessaria una variante agli strumenti urbanistici vigenti e segnatamente per quelle afferenti il settore della viabilità. Sono inoltre in corso di sottoscrizione gli accordi relativi ai seguenti interventi: D.14.03 - S.P. Laurentina; D.13.08 - S.P. San Marino - Due Santi; C.18.04 - Bosco di Cave - Castelli Romani, nonché quello relativo alla "Area grandi eventi", individuata, dopo complesse ricerche e trattative, a Tor Vergata.

Anche l'istituto della "conferenza di servizi" è stato ampiamente utilizzato, come evidenziato dal lungo elenco di seguito riportato, che testimonia l'enorme sforzo cui sono state sottoposte le pubbliche amministrazioni e segnatamente quella del Comune di Roma, per far fronte al massiccio e contemporaneo avvio di numerosissimi interventi, molto sovente contraddistinti da complessi iter autorizzativi.

Sempre in merito alle "conferenze di servizi", come già precedentemente ricordato, al Commissario Straordinario di Governo è stato attribuito il compito di promuoverne la convocazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

Si segnala, infine, che, al fine di favorire la partecipazione anche di soggetti privati al conseguimento delle finalità del Piano, il comma 6, art. 1 della legge 7 agosto 1997 n. 270, concernente il Piano degli interventi per il Giubileo fuori del Lazio, ha previsto la possibilità di inserimento nel Piano stesso di interventi realizzati da privati, ai soli fini, però, dell'applicazione agli stessi degli snellimenti procedurali previsti dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione è stata estesa anche agli interventi proposti da privati e ricadenti all'interno della Regione Lazio.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDI DI PROGRAMMA					
Codice			Oggetto	Data Accordo	Publicazione sul B.U.R.
A	07	01	Convitto ITA "Garibaldi"(Roma)	18/03/97	13/97
A	07	29	Area attrezzata sosta campers (Frasso Sabino)	16/03/98	15/98
B	19	31	Riqualificazione Borgo di Farfa e restauro Monastero (Fara Sabina)	24/04/98	17/98
B	19	26	Santuario Fonte Colombo (Rieti)	07/07/98	27/98
C	18	02	Santuario della Mentorella (Capranica Prenestina)	26/05/98	20/98
D	08	03	Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	19/03/98	Approvato
D	10	01	Autostrada Roma Fiumicino. Realizzazione terza corsia. Lotto 2° e 3°	07/01/98	Approvato
D	13	01	Parcheggio di Ciampino	25/11/98	01/99
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio Collesferro /Roma a servizio traffico linea Roma - Cassino	11/06/98	23/97
D	13	03	Parcheggio di scambio a Zagarolo	21/05/97	20/97
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli	16/06/97	25/97
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di Civitavecchia	16/06/97	25/97
D	13	07	Parcheggio a raso per il nodo di scambio di Ladispoli	25/06/97	25/97
D	13	10	Strada Pedemontana dei Castelli	26/05/98	20/98
D	13	11	S.P. Maremmana II	11/03/98	12/98
D	13	12	Collegamento S.P. Nomentana - S.P. San Martino - Via Vallagati (Monterotondo - Roma)	22/04/98	Approvato
D	14	05	S.P. Tiberina	06/08/98	25/98
D	14	06	S.P. Settecamini (Guidonia Roma) Raddoppio rete stradale	19/12/98	Approvato
D	14	07	S.P. Pratica di Mare	06/08/98	25/98
D	14	08	Collegamento S.P. Settecamini - S.P. Pantano - SS 636 Maremmana.	19/12/98	Approvato
D	18	02/2	Potenziamento Ferrovie concesse : Roma Nord	05/03/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONFERENZE DI SERVIZI						
N.	Codice			Oggetto	Data	Esito
1	C	09	02/1	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Sistemazione del Parco della Caffarella	29/01/98	Approvato
2	D	08	03	Progetto nodo Piazza Rovere	29/01/98	Approvato
3	A	05	01/1	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Risanamento parco)	30/01/98	Approvato
4	A	05	01/2	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Parcheggi)	30/01/98	Approvato
5	A	05	01/3	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Manutenzione straord. Padiglioni direz.)	30/01/98	Approvato
6	A	05	01/4	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Manutenzione ordin. cappella e 3 padiglioni)	30/01/98	Approvato
7	A	05	01/5	S.Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane.(Ristrutturazione 5 padiglioni)	30/01/98	Approvato
8	A	05	02	Ex Colonia marina Vittorio Emanuele III	03/02/98	Approvato
9	D	14	06	Potenziamento S.P. Settecamini	19/02/98	Approvato
10	D	14	08	Prolungamento S.P. Settecamini	19/02/98	Approvato
11	E	02	03	Complesso ospedaliero S. Eugenio Realizzazione dipartimento emergenza accettazione (1° stralcio funzionale)	20/02/98	Rinviata
12	C	01	10	Piazze S. Pietro in Vincoli, S.Prassede.... Riqualificazione ambientale, risagomatura strade, ripristino selciati.	23/02/98	Approvato
13	C	03	01	Ristrutturazione sede stradale via Giubbonari.	26/02/98	Approvato
14	C	03	02	Ristrutturazione Piazza della Minerva	26/02/98	Approvato
15	C	04	15	Riqualificazione Appia Antica.	27/02/98	Approvato
16	C	01	12	Percorso "C" autobus turistici .	04/03/98	Approvato con prescrizioni.
17	C	01	13	Percorso "D" autobus turistici .	04/03/98	Approvato
18	C	12	04/2	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini di villa Vecchia.	13/03/98	Approvato
19	C	01	22/1	Villa Doria Pamphily. Restauro Casale di Giovio	16/03/98	Approvato
20	C	01	22/2	Villa Doria Pamphily. Restauro e allestimento museale Cascina Falsetti.	16/03/98	Approvato
21	A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione immobile a Vigne Nuove	26/03/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22	C	12	04/1	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del teatro.	09/04/98	Approvato
23	B	19	56	Abbazia Montecassino - area esterna	15/04/98	
24	D	08	03	Parcheggio del Gianicolo e viabilità	15/04/98	Approvato
25	C	11	04	Area archeologica del Celio	16/04/98	Approvato
26	E	02	02	Ospedale S. Giovanni	16/04/98	Approvato
27	D	09	01	Infrastrutture area stazione Tiburtina	23/04/98	Rinviata
28	E	02	03	Ospedale S. Eugenio	30/04/98	Approvato
29	E	01	01	Automezzi e attrezzature per il territorio comunale	04/05/98	Approvato
30	C	01	24	Restauro e recupero Villino Corsini	05/05/98	Approvato
31	C	01	26	Riqualificazione area Teatro Marcello	07/05/98	Approvato
32	E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Gomenizza	11/05/98	Approvato
33	E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Giolitti	11/05/98	Approvato
34	E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona Arco di Travertino	11/05/98	Approvato
35	E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona via Bellami	11/05/98	Approvato
36	E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Area intermedia attrezzata	11/05/98	Approvato
37	E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Sede di zona Tor di Quinto	11/05/98	Approvato
38	E	01	26	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate. Potenz. Area intermedia via Campoboario	11/05/98	Approvato
39	C	11	06	Parco del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Tertesa di Calcutta	15/05/98	Approvato
40	D	18	02/2	Riqualificazione e potenziamento Ferrovia Roma Nord	19/05/98	Parere sospeso per PRG
41	B	01	01	Area del grande Campidoglio	22/05/98	Approvato
42	E	01	08	Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali	25/05/98	Approvato
43	B	02	01.3	Area archeologica Fori Imperiali. Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	28/05/98	Sospesa
44	C	11	03	Parco del Celio. Restauro ex palestra dei vigili.	28/05/98	Sospesa
45	D	18	02/2	Ferrovie Concesse. Potenziamento linea Roma Nord.	02/06/98	Rinviata
46	E	02	04	Ospedale G.B.Grassi di Ostia	04/06/98	Approvato
47	F	01	02	Cinema Castello - Centro servizi stampa	05/06/98	Rinviata
48	B	04	01	Palazzo delle Esposizioni - Progetto restauro ed adeg. Funzion. e Tecnolog.	09/06/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49	C	03	04	Area pedonale del Colosseo	09/06/98	Approvato
50	C	11	01.1	Parco del Celio - Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali. restauro e manut.	09/06/98	Approvato
51	C	11	01.2	Parco del Celio - Sistemazione dei percorsi pedonali e carrabili, integrazione illuminazione e nuovi impianti.	09/06/98	Approvato
52	C	11	07	Lavori di restauro del Pulpito di S. Domenico	09/06/98	Approvato
53	C	13	01.1	Lavori di restauro dei Casali Mellini nel Parco di Monte Mario.	09/06/98	Rinviata
54	B	02	01.1	Area archeologica Fori Imperiali. Allestimento del Museo dei Fori Imper. e Mercati Traianei	16/06/98	Sospesa
55	C	01	25	Villa Doria Pamphili - Recupero e restauro Arco dei quattro Venti	16/06/98	Approvato
56	C	12	03	Villa Doria Pamphily. Bonifica e recupero vegetazione della Valle dei Daini.	17/06/98	Approvato
57	E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie(Roma). Realizzazione area intermedia attrezzata Via Acquafredda (1° LOTTO)	17/06/98	Rinviata
58	E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma Nord (1° LOTTO)	17/06/98	Approvato
59	E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma Sud (1° LOTTO)	17/06/98	Approvato
60	C	19	01/b	Risanamento e trattamento acque.Sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana	25/06/98	Rinviata
61	D	19	04	Nodo di scambio Valle Aurelia	25/06/98	Approvato
62	C	13	01/1	Parco di Monte Mario - Recupero dei Casali Mellini	26/06/98	Approvato
63	F	01	02	Sala stampa - Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	03/07/98	
64	E	03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione restauro e adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce"	13/07/98	Sospesa
65	A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro di servizi socio-sanitari. Recupero edilizio ex Convento S. Bartolomeo all'Isola.	23/07/98	Approvato
66	E	02	02/3	Ospedale S. Giovanni. Restauro Ospedale antico	27/07/98	Approvato
67	E	01	22/1	Ristrutturazione Area Intermedia Attrezzata Via Sannio	28/07/98	Approvato
68	E	01	30	Servizi igienici pubblici. Realizzazione e ristrutturazione attrezzature igieniche fisse.	28/07/98	Rinviato
69	C	09	02/2	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici.	29/07/98	Approvato
70	D	18	02/2	Riqualificazione e potenziamento Ferrovia Roma Nord	30/07/98	Approvato
71	E	03	02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in viale Trastevere 18 - Roma	26/08/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

72	E	03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in via Ferruccio 9 - Roma	26/08/98	Approvato
73	E	03	02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in viale Togliatti 987 - Roma	26/08/98	Approvato
74	E	03	02/5	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative dell'edificio sito in via della Consolazione 4 - Roma	26/08/98	Approvato
75	C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche	03/09/98	Approvato
76	C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) : restauro arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro.	03/09/98	Approvato
77	E	03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione restauro e adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce"	10/09/98	Approvato
78	C	13	1/2	Parco di Monte Mario e Casali Mellini - Monte Mario : consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	14/09/98	Approvato
79	C	02	1.1	Area della Basilica di S.Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
80	C	02	2.2	Area della Basilica di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
81	C	02	3.1	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture e rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.	15/09/98	Sospesa
82	C	01	18/1	Villa Borghese Portico dei leoni ecc.	18/09/98	Approvato
83	C	01	18/2	Villa Borghese propilei egizi ecc.	19/09/98	Approvato
84	C	04	04	Area Castel Gandolfo Potenziamento infrastrut. Fermata la villetta	21/09/98	Approvato
85	C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis-Catacombe di S. Marcellino. Sistemazione delle aree a verde.	24/09/98	Approvato
86	C	08	01/2	Restauro del Parco di Villa Borghese	28/09/98	Rinviata
87	E	01	30	Servizi igienici pubblici. Realizzazione e ristrutturazione attrezzature igieniche fisse.	12/10/98	Approvato
88	C	02	04	Itinerari giubilari e storici. Contributo alla manutenzione delle sedi stradali.	15/10/98	Approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

89	C	11	05	Recupero dell'area di S.Gregorio al Celio recupero delle aree a verde di S.Gregorio al Celio, ex antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	23/10/98	Approvato
90				Croce Rossa	27/10/98	Propedeutica Approvato
91	C	06	01	Giardini di S. Giovanni e Via Carlo Felice (Roma). Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	28/10/98	Approvato
92	D	18	04	Stazione Termini	03/11/98	Approvato
93	C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) : sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati.	13/11/98	Approvato
94				Tor Vergata	20/11/98	Propedeutica Approvato
95	C	02	05	Intervento di adeguamento dei parcheggi a disposizione delle catacombe aperte al pubblico in Roma.	23/11/98	Approvato
96	A	01	29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia per famiglie disagiate	25/11/98	Approvato
97	C	05	1.1	Giardini di Castel S. Angelo - Lavori di recupero infrastr. e vegetaz.: giardini dei bastioni	16/12/98	Rinviato
98	C	05	1.2	Giardini di Castel S. Angelo - Lavori di recupero fossato	16/12/98	Rinviato
99	B	20	02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini	21/12/98	Approvato

2.5 I rapporti tra la Santa Sede e lo Stato Italiano

Il comma 13, art.1, della legge n. 651/96 prevede che : *“I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, delle modalità di attuazione degli interventi”*.

Nella stesura iniziale del Piano (settembre 1996), l'unica opera prevista nel territorio dello Stato Città del Vaticano e parzialmente finanziata dallo Stato Italiano, era quella relativa al “Parcheggio in area Gianicolo”(D.08.02).

Lo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la realizzazione dell'opera suddetta è avvenuto tra il 3 ed il 19 dicembre 1997.

Dal carteggio, emerge che:

- la Santa Sede, per la costruzione del parcheggio nell'area di sua proprietà in zona extraterritoriale, intende avvalersi dei diritti di cui al 2° comma dell'art.16 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, diritti che conferiscono alla Santa Sede di dare ai suddetti immobili l'assetto che crede, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la chiesa cattolica;
- ad avvenuta realizzazione dell'opera la Santa Sede procederà alla sospensione del privilegio per quanto attiene all'uso del manufatto in ragione della sua destinazione a parcheggio, al quale verrà applicata la normativa e la giurisdizione italiana;
- sul costo totale del progetto, previsto in 85 miliardi di lire italiane, il Governo della Repubblica darà un contributo di 40 miliardi di lire ai sensi della legge 651/96 e della deliberazione n.7/97 del 4 giugno 1997 della Commissione per Roma Capitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le interconnessioni del parcheggio con il sistema di viabilità esterno sono a carico dello Stato italiano; le relative opere saranno realizzate dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio;
- l'affidamento dei lavori è regolato dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, ma nel contratto di appalto è stato convenuto, in linea di massima, un rinvio alla normativa italiana in materia;
- in tema di accesso e di facilitazioni di agibilità di area il Comune di Roma provvederà a garantire un'appropriata disciplina della sosta nelle aree circostanti ed a mantenere in perpetuo, gratuitamente, l'uso del suolo pubblico per le uscite sia pedonali che veicolari.

Il Governo della Repubblica Italiana si è impegnato a corrispondere il relativo finanziamento direttamente alla Santa Sede in tre soluzioni e precisamente:

- il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- il 40 % alla notifica dell'avvenuta utilizzazione dell'80% del primo acconto;
- il 10% su certificazione dell'avvenuto completamento dell'intervento.

Il 15 luglio 1998 è poi intervenuto un ulteriore scambio di note tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, in ordine alla realizzazione dei lavori concernenti le Basiliche patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore.

In particolare, con tale scambio di note si è convenuto che, l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori saranno disciplinati dall'ordinamento giuridico vaticano, assoggettandone la realizzazione al rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltre che di abbattimento delle barriere architettoniche.

La Santa Sede si è inoltre impegnata a realizzare le opere nel rispetto dei termini indicati nel Piano.

Per ciò che concerne le modalità di erogazione dei finanziamenti, sono stati ribaditi gli impegni già assunti in merito, con il precedente scambio di note, relativo al Parcheggio in area Gianicolo.

3 Il Piano a fine 1998

3.1 Sintesi del Piano e sue variazioni

Anche in ragione della complessità di molti degli interventi facenti parte del Piano, quest'ultimo ha subito, nel corso del 1998, numerose modifiche ed integrazioni ispirate sia, come si è già detto, alla volontà di rendere tale atto programmatico sempre più aderente alle effettive esigenze emergenti in ordine alla celebrazione dell'evento giubilare, sia alla necessità di garantire la conclusione e la "piena funzionalità" delle opere, delle forniture e dei servizi, in una data utile ad affrontare i fabbisogni relativi all'afflusso dei pellegrini e dei visitatori a Roma e nella Regione Lazio.

Le variazioni fin qui apportate configurano, pertanto, le attuali caratteristiche che assume il Piano e ne individuano lo stato di definizione programmatica al 31 dicembre del 1998 (vedi Allegato 1).

Il Piano, a tale data, consta di 754 interventi complessivi, riconducibili ad 81 sotto-settori o ambiti complementari di azione, riferiti ai già ricordati sei settori di intervento in cui, ab origine, è stato articolato il Piano stesso e segnatamente: sociale ed accoglienza; beni culturali; manutenzione, arredo urbano e patrimonio ambientale; accessibilità e mobilità nell'area metropolitana; sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione; informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento

Il valore complessivo del Piano in termini di investimento è pari a circa Lit. 3.652,4 miliardi di lire (pari a 1.875 milioni di Euro). Il costo complessivo del Piano è coperto per 3.500 miliardi di lire (1.807 milioni di Euro) attraverso il finanziamento pubblico statale derivante dalla Legge 651/96 e per 181 miliardi (93,5 milioni di Euro) - corrispondenti a meno del 5% del costo totale del Piano - da altre fonti di finanziamento sempre pubbliche o di Enti ecclesiastici.

Per quanto attiene all'articolazione del Piano per soggetti beneficiari raggruppati per tipologia, il più alto numero di interventi, pari a 278, riguarda le amministrazioni comunali del Lazio (incluso il Comune di Roma), per un importo totale di finanziamento pari a 851,9 miliardi di lire (439,8 milioni di Euro) seguite dalle amministrazioni ed aziende centrali (inclusa FS S.p.A.) con 257 interventi pari a un finanziamento di 1.034,8 miliardi di lire (534,2 milioni di Euro). Altri soggetti locali hanno in carico la realizzazione di 157 interventi per 1.194,8 miliardi di lire (616,8 milioni di Euro) e 62 interventi sono ripartiti fra amministrazione regionale del Lazio

ed amministrazioni provinciali per un importo del finanziamento di 389,9 miliardi di lire (201,3 milioni di Euro). (Tab. 1 e Tav. 1)

La residuale cifra di 28,6 miliardi di lire (12, 4 milioni di Euro) è riferita, in quanto a 12,7 miliardi alla creazione di un fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, sia per far fronte alle maggiori occorrenze dovute a varianti o ad accordi bonari; in quanto a 15,9 miliardi circa, a somme già trasferite, per progettazioni o altre occorrenze, ad interventi poi defianziati.

Tab. 1 - Sintesi degli interventi inseriti nel Piano al 31/12/1998

Tipologie di soggetti beneficiari	Interventi (N°)	Finanziamenti (miliardi di lire)	Cofinanziamenti (miliardi di lire)	Totale costo interventi (miliardi di lire)
Amministrazioni ed aziende centrali	257	1.034,8	51,3	1.086,1
Amministrazione regionale e provinciale	62	389,9	10,8	400,7
Amministrazioni comunali	278	851,9	14,8	866,7
Altri soggetti	157	1.194,8	104,1	1.298,9
Totale	754	3.471,4	181,0	3.652,4,8
Altro (1)	-	28,6	-	
		3.500,0		

(1) Tale voce include le somme già erogate per interventi poi defianziati ed il "fondo" accantonato per eventuali premi di incentivazione

Fonte: URCGE, 1999

Analizzando in dettaglio l'articolazione degli interventi fra i principali soggetti beneficiari (Tab. 2), si osserva che il 27,3% degli interventi (per un ammontare, però, del 9,1% dei finanziamenti) attiene alle iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, promosse e realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Naturalmente i soggetti che per localizzazione sono maggiormente coinvolti nella preparazione e gestione dell'evento giubilare, vale a dire il Comune di Roma e le aziende ad esso collegate, risultano essere le più impegnate nella realizzazione, oltre che nella programmazione del Piano.

Difatti, il Comune di Roma e le aziende ad esso collegate risultano le amministrazioni ed i soggetti procedenti per la realizzazione di 210 interventi, pari al 27,8% del totale e con un importo complessivo pari al 40,6% dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato Italiano per il Giubileo nel Lazio.

Data la diversità degli ambiti di competenza, delle scelte di natura programmatoria e delle modalità operative che contraddistinguono i soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano, si osserva che quest'ultimo è articolato in un insieme di interventi assai differenziati per dimensione ed i cui costi di realizzazione si discostano anche significativamente dal costo medio per intervento.

A fronte di una media di circa 5,1 miliardi di lire per iniziativa, gli interventi realizzati dal Comune di Roma sono quelli che si avvicinano maggiormente a tale dato, mentre l'importo medio è ampiamente superato dagli interventi promossi o in corso di realizzazione a cura delle amministrazioni ed aziende centrali (ad esclusione del Ministero per i beni le attività culturali i cui interventi sono contraddistinti da un costo medio particolarmente basso), nonché da quelli relativi alla Regione Lazio ed alle aziende collegate al Comune di Roma, che presentano valori rispettivi superiori ai 10 miliardi per intervento.

La dimensione dell'intervento, in termini di complessità realizzativa e di costo, ha inciso fortemente sulla concreta attuazione del programma. Se infatti si confronta il valore medio degli interventi per ente attuatore e la percentuale degli stessi avviati ed in fase di realizzazione, si evidenzia un rapporto di avanzamento inversamente proporzionale alla dimensione di ciascun intervento.

Tab. 2 - Piano degli interventi relativi al Giubileo nel Lazio per principali categorie di beneficiari (situazione al 31/12/1998)

Soggetti beneficiari	Interventi		Finanziamento		Costo complessivo degli interventi		Costo medio per intervento milioni di lire
	n°	%	miliardi di lire	%	miliardi di lire	%	
Ministero per i beni e le attività culturali	206	27,3	317,3	9,1	364,3	9,4	1.768
Altre amministrazioni ed aziende centrali	51	6,8	717,5	20,7	721,7	23,8	14.15
Regione Lazio	16	2,1	214,2	6,2	218,8	5,6	13.678
Amministrazioni provinciali	46	6,1	175,7	5,0	181,9	4,7	3.954
Comune di Roma	139	18,4	697,3	20,1	723,6	18,6	5.206
Aziende del Comune di Roma	71	9,4	727,6	20,5	769,4	19,8	10.836
Altre amministrazioni comunali	139	18,4	154,6	4,4	168,4	4,3	1.211
Enti religiosi	36	4,8	95,8	2,8	142,6	3,7	3.961
Altri soggetti	50	6,6	371,4	10,7	386,9	10,0	7.738
Totale	754	100,0	3.471,4	100,0	3.652,4	100,0	5.148

Fonte: URCGE, 1999

A fronte infatti di 51 interventi programmati dalle amministrazioni centrali, il cui valore è di circa 3 volte superiore alla media, ne risultano in fase di realizzazione 21 con una quota del 41,1%, inferiore al valore medio dell'intero Piano. Tale andamento trova conferma sia per ciò che concerne gli interventi di competenza della Regione Lazio, che per quelli attuati dalle aziende del Comune di Roma, o comunque ad esso collegate (Tab. 3).

Tab. 3- Rapporto tra costo medio degli interventi ed avanzamento nella realizzazione

	Costo medio degli interventi		Stato di avanzamento degli interventi		
	Miliardi di lire	N. indice valore medio =100	Programmati n.	In fase di realizzazione (2) n.	% su interventi programmati
1) Ministeri ed aziende centrali (1)	14,1	276	51	21	41,1
2) Regione Lazio	13,7	267	16	6	37,5
3) Aziende del Comune di Roma	10,4	204	57	13	22,8
4) Altri soggetti	8,5	167	64	29	45,3
5) Comune di Roma	5,2	101	139	63	45,3
Valore medio	5,1	100	754 (3)	507 (3)	67,2
6) Amministrazioni provinciali	4,0	77	46	31	67,4
7) Enti religiosi	4,0	77	36	23	63,9
8) Ministero beni e attività culturali	1,8	34	206	202	98,0
9) Altre amministrazioni comunali	1,2	24	139	118	84,9

(1) Escluso Ministero per i beni e le attività culturali

(2) Situazione al 31.12.1998

(3) Numero totale interventi

Fonte: URCGE, 1999

All'estremo opposto si colloca il Ministero per i beni e le attività culturali, con un valore per intervento inferiore al 34% del valore medio, ed un tasso di attuazione pari al 98%. Si può pertanto concludere che, in termini di attuazione, per i ristretti tempi di programmazione e di progettazione degli stessi, alla fine del 1998, risultano in avanzata realizzazione le attività previste da amministrazioni fortemente strutturate, con impegni relativamente circoscritti e di piccola dimensione.

Il Piano è articolato in una serie di obiettivi differenziati per tipologie. Si è già rilevato come una parte assai significativa di questi riguarda la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Complessivamente a questa categoria appartengono 352 interventi sui complessivi 754, con un finanziamento accordato pari al 16,1% del totale (Tab. 4). La quota di interventi in fase di realizzazione per questa categoria è pari all'85,8% (302 su 352 programmati). In termini di incidenza sul finanziamento complessivo il settore a maggiore assorbimento di risorse riguarda la accessibilità e la mobilità cui sono

destinati 1.372,4 miliardi di lire (pari a 708,5 milioni di Euro) e corrispondenti al 39,5% del finanziamento complessivo; si tratta di 63 interventi, dei quali risultano in fase di realizzazione 37 (pari al 58,7% del complesso).

Tab. 4 - Settori e sotto-settori di intervento (al 31/12/1998)

Settori	Sotto-	Interven	Finanziamento		Costo		Quota di	Interventi in	
	settori	ti	accordato		complessivo			cofinanz	realizzazione
	n.	n.	milioni	%	milioni	%	iamento	n.	%
A. Sociale e Accoglienza	7	85	300.342	8,7	323.469	8,9	7,1	59	69,41
B. Beni culturali	17	352	557.320	16,1	607.971	16,6	8,3	312	88,64
C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale	18	136	571.217	16,5	572.217	15,7	0,2	62	45,59
D. Accessibilità e mobilità nell'Area Metropolitana	18	63	1.372.361	39,5	1.417.281	38,8	3,2	37	58,73
E. Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione	7	104	489.717	14,1	551.117	15,1	11,1	32	30,77
F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	3	14	180.359	5,2	180.359	4,9	0,0	5	35,71
Totale	70	754	3.471.407	100,0	3.562.415	100,0	5,0	507	67,2

Fonte: URCGE 1999

Di particolare rilievo, sia per numerosità che per impegno finanziario, sono gli interventi destinati alla manutenzione, alla rete urbana ed alla tutela dell'ambiente: 136 interventi che assorbono il 16,5% dei finanziamenti complessivi.

La realizzazione di questi progetti risulta particolarmente complessa e per tale ragione quelli in corso di realizzazione coprono il 37,5% del totale (51 sui 136 programmati).

Uno dei settori strategicamente più importanti per il Piano, attiene l'accoglienza ed il "sociale", vale a dire quell'insieme di interventi finalizzati alle categorie disagiate; in tale settore al quale afferiscono 85 progetti per una quota dell'8,7% del finanziamento totale. Gran parte di questi progetti sono in corso di realizzazione e la quota in attuazione si attesta attorno alla media generale.

Di particolare importanza sono i programmi relativi ai servizi speciali (sicurezza, sanità, ecc.) ed alla formazione delle figure professionali che saranno maggiormente

coinvolte nella gestione quotidiana dell'evento giubilare; il settore di cui fanno parte (E) concentra 104 progetti ed il 14% circa delle risorse complessive messe a disposizione, ma che vede una relativamente bassa capacità di spesa ed attuazione, visto che poco meno di 1/3 degli interventi sono stati attivati ed avviati.

Nel settore, infine, dell'informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento, da effettuarsi soprattutto attraverso sistemi informatici, sono previsti 14 interventi, cui è destinato il 5,2% delle risorse.

Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi è, naturalmente, la città di Roma a concentrare su se stessa la gran parte delle necessità di supporto all'accoglienza dei flussi di pellegrinaggio che troveranno nella capitale il terminale dei diversi itinerari, in parte interessanti anche altre aree territoriali del nostro Paese (Tab. 5).

Tab. 5- Ripartizione degli interventi per localizzazione

Localizzazione	Numero		Finanziamento		Costo totale		Quota % cofinanz iamento %	Interventi in fase di realizzazione	
	n.	%	milioni	%	milioni	%		n.	%
Comune di Roma	499	66,2	2.578.005	74,3	2.732.934	74,8	5,7	308	61,72
Altri Comuni della Prov. di Roma	141	18,7	540.258	15,6	548.786	15,0	1,6	116	82,27
Totale Prov. Roma	640	84,9	3.118.262	89,8	3.281.720	89,8	5,0	424	66,25
Prov. di Frosinone	29	3,8	40.503	1,2	42.930	1,2	5,7	27	93,10
Prov. di Latina	32	4,2	36.434	1,0	41.649	1,1	12,5	20	62,50
Prov. di Rieti	20	2,7	41.336	1,2	45.239	1,2	8,6	18	90,00
Prov. di Viterbo	17	2,3	33.698	1,0	35.054	1,0	3,9	16	94,12
Senza riferimento territoriale	16	2,1	201.173	5,8	205.823	5,6	2,3	2	12,50
	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	507	67,20

Fonte: URCGE 1999

All'interno del territorio del Comune di Roma sono, infatti, concentrati 499 interventi su 754, per un importo complessivo di finanziamenti accordati di 2.578 miliardi di lire (pari a 1.330,9 milioni di Euro) ed una concentrazione del 74,3% di tutte le risorse disponibili. Nella città di Roma sono, attualmente, in fase di realizzazione 308 interventi dei 499 anzidetti, pari al 61,7%.

Anche gli altri comuni della provincia di Roma e, quindi, parte dell'hinterland metropolitano della città, sono interessati agli interventi per un ulteriore finanziamento di 540,3 miliardi di lire (pari a 278,9 milioni di Euro). In complesso nella provincia di Roma sono concentrati l'84,9% degli interventi e l'89,8% dei finanziamenti accordati.

Dei 507 interventi in fase di realizzazione 424 sono localizzati nella Provincia di Roma dove, quindi, la preparazione del Giubileo risulta in avanzata fase attuazione

Equilibrata appare inoltre la situazione programmatica ed attuativa in ordine alle altre provincie della Regione Lazio, sia come numero di interventi che come entità di finanziamenti attribuiti.

Per quanto attiene la struttura finanziaria del Piano si è già detto che esso è praticamente a totale carico del finanziamento statale, essendo la quota di cofinanziamento pari al 5% dell'importo globale del Piano stesso (Tab. 6).

Tale dato percentuale è comunque il frutto di una realtà assai differenziata che vede solo pochi soggetti impegnati con quote di cofinanziamento significative e comunque non superiori ad un terzo dell'investimento globale. E' questo il caso degli Enti religiosi e dell'azienda del Comune di Roma AMA.

Per ciò che concerne i dati relativi ai Comuni delle provincie del Lazio o delle provincie stesse, esclusa quella di Roma, va ricordato che la presenza di una percentuale di cofinanziamento superiore alla media è dovuta al fatto che per gli interventi afferenti il sotto-settore A.07 "Completamento della rete degli ostelli e dei campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo" era previsto, fin dalla prima stesura del Piano, un finanziamento pari al 75% del costo di realizzazione.

Negli altri casi la quota di cofinanziamento supera di poco il valore medio o è del tutto assente.

Tab. 6- Soggetti beneficiari con quote di cofinanziamento superiori al 5% del costo complessivo degli interventi.

Soggetto beneficiario	Quota di cofinanziamento % sul costo dell'intervento
Enti religiosi	32,8
AMA	30,0
Comuni della Provincia di Rieti	14,1
Ministero per i beni e le attività culturali	12,9
Provincia di Latina	11,9
Comuni della Provincia di Latina	11,8
Comuni della Provincia di Frosinone	8,2
Aziende sanitarie	7,5
Comuni della Provincia di Roma	6,3
Valore medio	5,0

Fonte: URCGE 1999

Per una più completa descrizione dell'attuale configurazione del Piano e del suo stato di attuazione, si riportano di seguito, una tavola analitica ed alcuni grafici illustrativi dei dati precedentemente riportate.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO
(LEGGE 651/96)

TAVOLA 1


NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SOGGETTO BENEFICIARIO

Soggetto beneficiario	NUMERO		FINANZ. ACCORDATO		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.	INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE	
		%	milioni	%	milioni	%		numero	%
AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
Min. BB. CC. AA.	206	27,3	317.320	9,1	364.320	10,0	12,9	202	98,06
Min. Interni	25	3,3	130.426	3,8	130.426	3,6	0,0	8	32,00
Min. LL. PP.	5	0,7	132.200	3,8	132.200	3,6	0,0	4	80,00
altri Ministeri	13	1,7	37.546	1,1	37.546	1,0	0,0	2	15,38
ANAS	3	0,4	127.295	3,7	131.565	3,6	3,2	3	100,00
FS	5	0,7	290.022	8,4	290.022	7,9	0,0	4	80,00
Totale Amm. Centrali	257	34,1	1.034.808	29,8	1.086.079	29,7	4,7	223	86,77
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE									
Regione Lazio	16	2,1	214.194	6,2	218.844	6,0	2,1	6	37,50
Provincia di Roma	35	4,6	97.971	2,8	100.149	2,7	2,2	25	71,43
Provincia di Frosinone	3	0,4	19.537	0,6	19.912	0,5	1,9	2	66,67
Provincia di Latina	5	0,7	22.132	0,6	25.132	0,7	11,9	3	60,00
Provincia di Rieti	1	0,1	17.500	0,5	17.500	0,5	0,0	0	0,00
Provincia di Viterbo	2	0,3	18.566	0,5	19.177	0,5	3,2	1	50,00
Totale Amm. Regionale e Provinc.	62	8,2	389.900	11,2	400.714	11,0	2,7	37	59,68
AMM. COMUNALI									
Roma	139	18,4	697.285	20,1	698.285	19,1	0,1	63	45,32
altri Comuni in Prov. di Roma	66	8,8	93.788	2,7	100.138	2,7	6,3	56	84,85
Comuni in Prov. di Frosinone	18	2,4	17.262	0,5	18.814	0,5	8,2	18	100,00
Comuni in Prov. di Latina	26	3,4	13.340	0,4	15.121	0,4	11,8	16	61,54
Comuni in Prov. di Rieti	19	2,5	23.836	0,7	27.739	0,8	14,1	18	94,74
Comuni in Prov. di Viterbo	10	1,3	6.394	0,2	6.644	0,2	3,8	10	100,00
Totale Amm. Comunali	278	36,9	851.906	24,5	866.741	23,7	1,7	181	65,11
ALTRI SOGGETTI									
Istituzioni sanitarie	29	3,8	184.115	5,3	199.115	5,5	7,5	20	68,97
Agenzia Romana Giubileo	14	1,9	174.423	5,0	174.423	4,8	0,0	4	28,57
AMA	36	4,8	97.394	2,8	139.144	3,8	30,0	6	16,67
STA	5	0,7	50.276	1,4	50.276	1,4	0,0	1	20,00
ACEA	4	0,5	10.677	0,3	10.677	0,3	0,0	0	0,00
ATAC-COTRAL	12	1,6	394.865	11,4	394.865	10,8	0,0	6	50,00
Istituzioni culturali	7	0,9	47.161	1,4	47.161	1,3	0,0	1	14,29
Enti religiosi	36	4,8	95.809	2,8	142.551	3,9	32,8	23	63,89
altri beneficiari	14	1,9	140.074	4,0	140.670	3,9	0,4	5	35,71
Totale altri soggetti	157	20,8	1.194.793	34,4	1.298.881	35,6	8,0	66	42,04
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	507	67,24


NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)

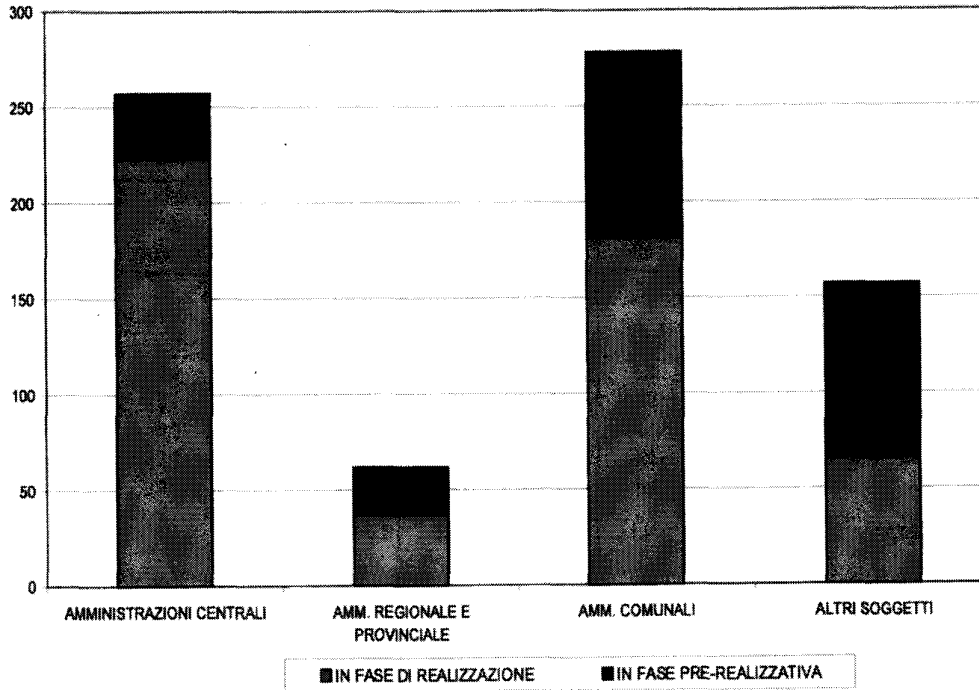


FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)

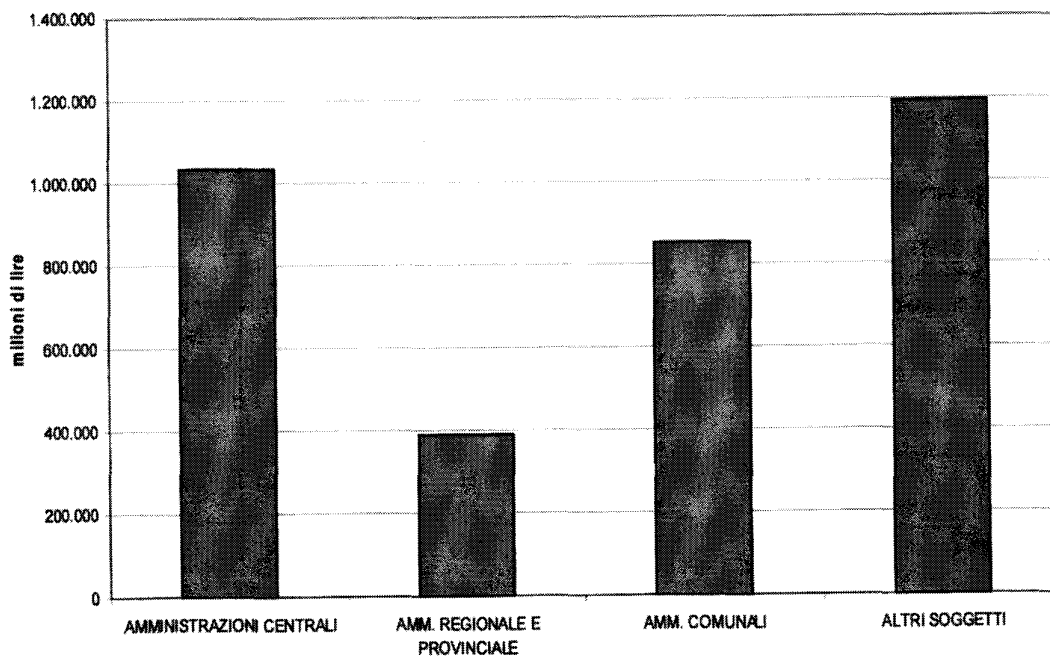


PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L.651/96)

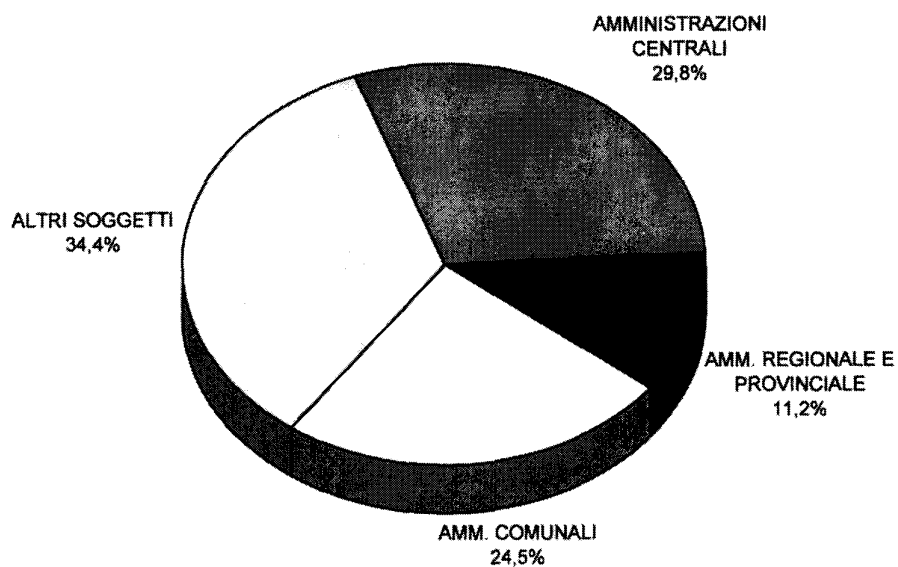


COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L. 651/96)

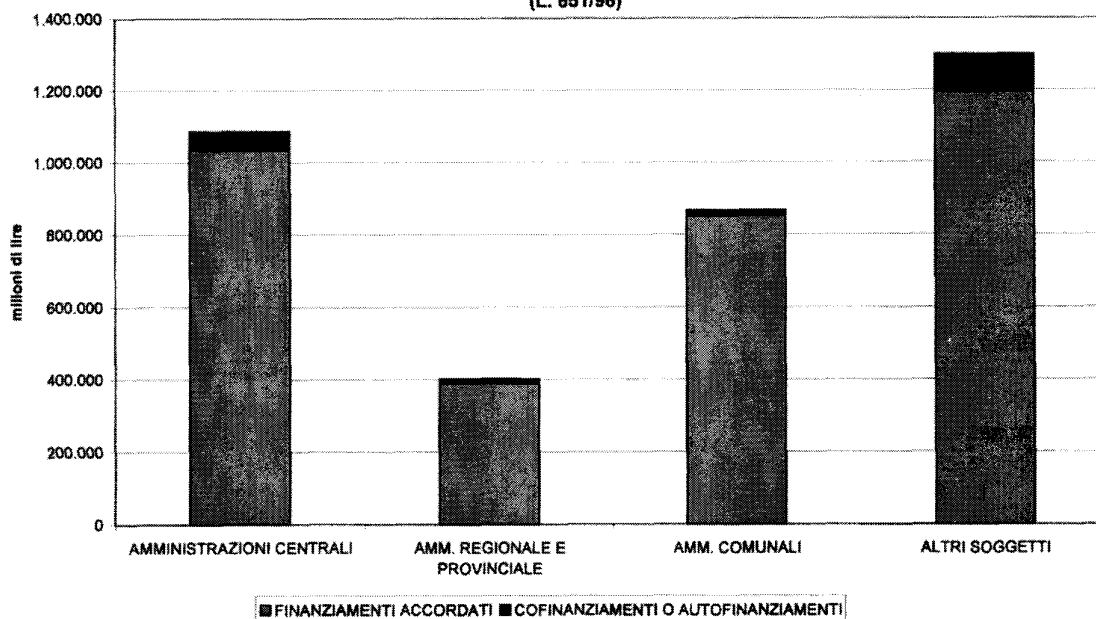


**NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)**

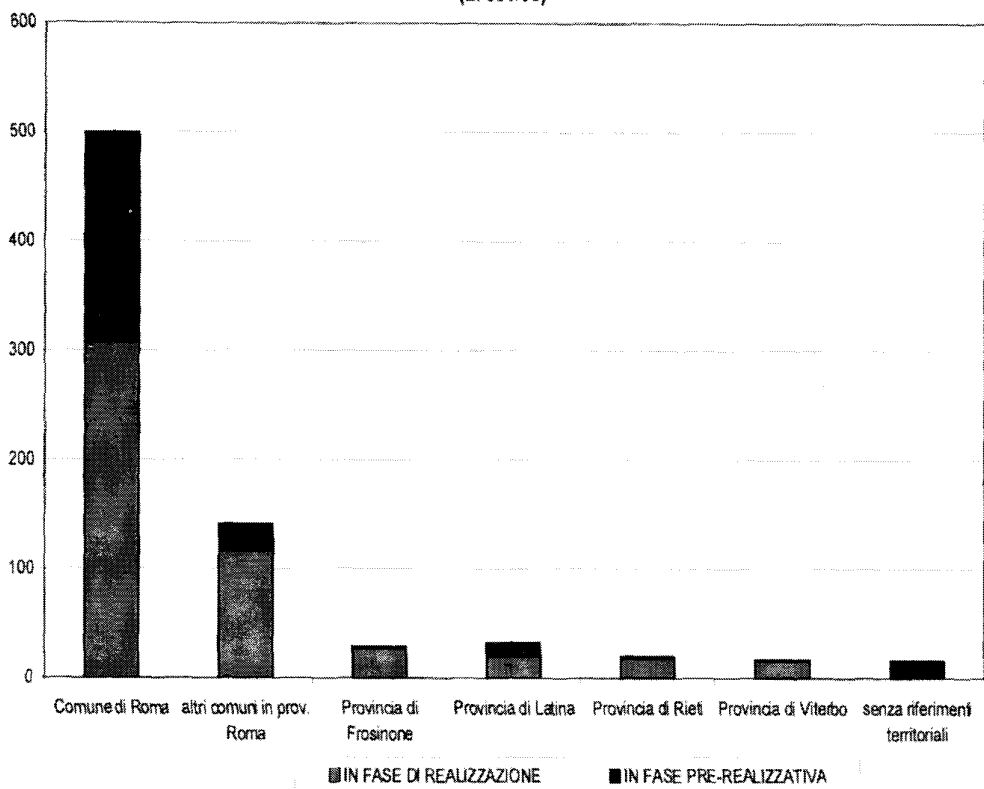


**FINANZIAMENTI ACCORDATI PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)**

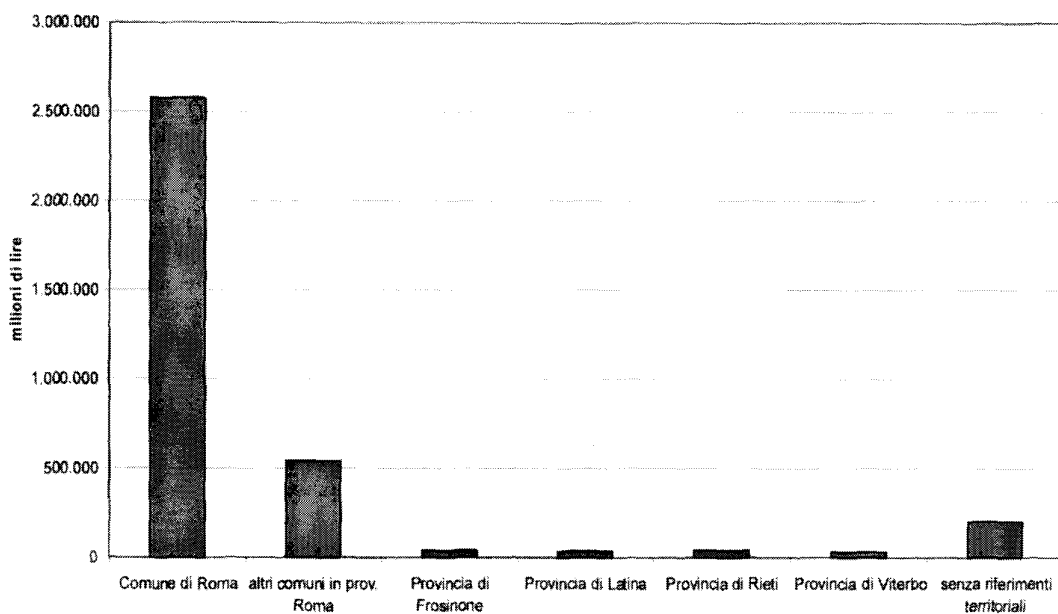

**PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER LOCALIZZAZIONE
(L.651/96)**

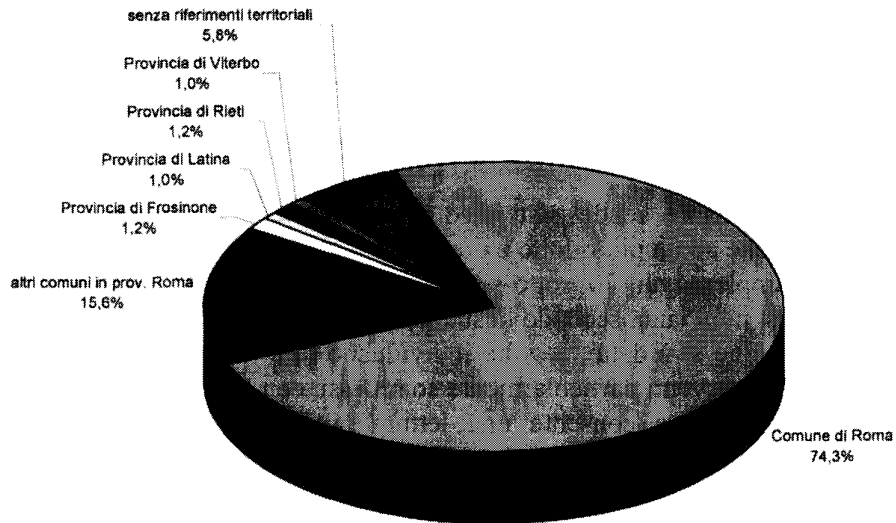

**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)**

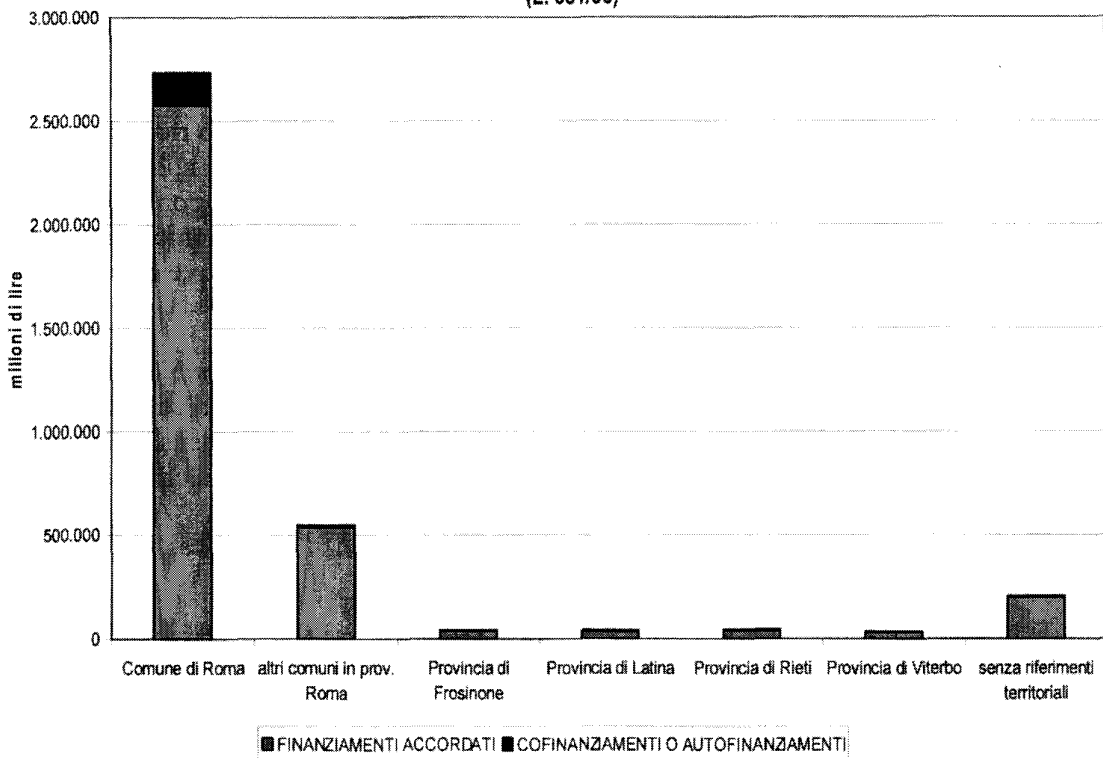

3.2 Una lettura del Piano per settori

Come più volte ricordato, il complesso degli interventi attualmente ricompresi nel Piano è riconducibile a 6 principali settori che rispecchiano altrettante aree-obiettivo di adeguamento di Roma e del Lazio in vista delle celebrazioni dell'evento giubilare. L'articolazione degli interventi fa, inoltre, riferimento a sotto-settori che meglio rappresentano la portata dei programmi attualmente in corso.

Una lettura settoriale rende sistemico l'insieme dei programmi in corso, riducendone la diffusione ad un più ridotto e preciso insieme di linee operative.

Si tratta in complesso di 70 sotto-settori, cui si riferiscono i 754 interventi attualmente ricompresi nel Piano, secondo la suddivisione indicata nelle Tabelle 5 e 7.

I sotto-settori, come si è detto, a volte individuano una "area-obiettivo", a volte coincidono, in caso di interventi particolarmente complessi, con l'intervento stesso.

Una siffatta architettura consente una lettura più sintetica di quanto si sta realizzando a Roma e nel Lazio.

Tale riaggregazione è motivata da diverse situazioni: interventi a rete, ovvero programmi seriali o complementari, programmi diversificati, ma posti in uno stesso ambito o contesto.

Nel settore A. *Sociale e accoglienza*, i sotto-settori con una significativa numerosità di interventi riguardano la rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione (43 interventi) e le strutture per l'assistenza ed accoglienza delle categorie disagiate (27 interventi). Vi è poi un sotto-settore che comprende un unico intervento e segnatamente quello relativo agli "Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere" che, gestiti con apposita legge regionale, costituiscono un contributo agli interventi eseguiti dai privati nel campo della ricettività e che, sicuramente, riguarderanno un elevato numero di interventi.

Per quanto attiene il settore B. *Beni culturali*, che, come si è detto ricomprende quasi la metà degli interventi del Piano, sono 69 gli interventi conservativi attinenti beni archeologici, 101 quelli riferiti alle chiese, basiliche e monasteri, 25 concernenti i complessi museali; sono poi 110 i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale nella provincia di Roma e nella regione Lazio; sono poi previste 10 iniziative nel campo delle "attività culturali".

Nel settore C. *Manutenzione, arredo urbano e salvaguardia ambientale*, 30 interventi afferiscono alla manutenzione straordinaria di strade, piazze, aree pedonali, giardini ed aree verdi, 33 all'adeguamento dell'accessibilità alle aree di visita giubilare, 20 al restauro di parchi e giardini, 11 ad opere di risanamento ambientale. Di questo settore fanno parte gli interventi concernenti le sistemazioni della "Aree delle basiliche", interventi di cui è superfluo rammentare la valenza strategica, nonché le opere previste nel Comune di Castel Gandolfo.

L' *Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana* (settore D) è caratterizzata da un elevato numero di sotto-settori, in quanto, data la rilevanza economica e dimensionale di taluni interventi, essi coincidono sovente con una singola opera; è

questo il caso, ad esempio, della Infrastrutturazione della Stazione Tiburtina, del Passante dei Laghi, della Terza corsia della Roma-Fiumicino, del Porto di Civitavecchia. In questo settore sono comprese poi altre opere di forte valenza strategica quali: la riqualificazione dell'area del Gianicolo in relazione al parcheggio che si sta realizzando in area extraterritoriale; numerose opere di adeguamento della viabilità del comune e della provincia di Roma, nonché delle altre provincie del Lazio; la realizzazione di parcheggi di scambio; l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico su gomma o su ferro.

Per quanto attiene il settore E la maggior parte dei sottosectori prevede una pluralità di azioni concernenti : i *servizi pubblici*, quali ad esempio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (33 interventi) e il potenziamento dei mezzi di soccorso e di pronto soccorso ospedaliero (25 interventi); la *sicurezza e la protezione civile* (41 interventi); la *formazione e la valorizzazione di risorse umane* (5 interventi).

Più concentrato, anche se non meno significativo, è il numero di interventi relativo all'*informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento* (settore F), affidati all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., ad eccezione di quello che concerne il "Monitoraggio del Piano".

Se le rimodulazioni del Piano avvenute durante il biennio 1997-98, non hanno apportato modifiche ai settori in cui lo stesso è articolato, hanno invece significativamente variato il numero degli interventi nello stesso ricompresi, che sono passati da 500 agli attuali 754, con un incremento del 50% circa. (Il numero anzidetto fa riferimento ai soli interventi attualmente in corso di realizzazione, ad esclusione, pertanto, di quelli totalmente defianziati).

Tale notevole incremento corrisponde solo parzialmente ad un effettivo aumento di opere, in quanto frutto del successivo frazionamento di interventi che, sotto un unico titolo, ricomprendeavano più interventi, anche se omogenei per tipologia o afferenti una opera complessa. Il primo caso è esemplificato dagli interventi facenti capo al settore B. *Beni culturali* , passati da 256 a 352 e segnatamente quelli eseguiti dal Ministero per i beni e le attività culturali; il secondo caso è invece ben rappresentato dai settori C e D, concernenti tipologie di interventi più complessi, quali, ad esempio, quelli riguardanti le Aree delle Basiliche o gli interventi di risanamento ambientale.

Il forte aumento delle iniziative previste nel settore E concernente la "*Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione*", passate da 58 a 104, è invece in buona parte dovuto ad un effettivo inserimento di nuovi interventi, con il quale la Commissione ha provveduto a colmare alcune lacune presenti nel Piano in merito ai sotto-settori della sicurezza e della protezione civile, entrambi di estrema importanza ai fini della celebrazione del Giubileo del 2000 ed in relazione ai quali, all'epoca dell'adozione del Piano, non erano ancora state definite le iniziative da assumersi (Tab. 7).

Tab. 7 - Articolazione del Piano per settori - Variazioni del numero degli interventi

Settori	Situazione al 18/09/96		Situazione al 31/12/1998		Variazioni	
	n.	%	n.	%	n.	%
A - Sociale e accoglienza	74	14,8	85	11,3	+11	14,9
B - Beni culturali	256	51,2	352	46,7	+96	37,5
C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	65	13,0	136	18,00	+71	109,2
D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	37	7,4	63	8,4	+26	70,3
E - Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione	58	11,6	104	13,8	+46	79,3
F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	10	2,0	14	1,8	+4	40,0
TOTALE	500	100,0	754	100,0	+254	50,8

Tab. 8 - Articolazione del Piano per settori - Variazioni della ripartizione dei finanziamenti

Settori	Situazione al 18/09/96	Situazione al 31/12/1998	Variazioni	
	milioni	milioni	Assolute milioni	%
A - Sociale e accoglienza	330.800	300.489	-30.311	-9,16
B - Beni culturali	560.200	559.225	-975	-0,17
C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	590.550	573.907	-16.643	-2,81
D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	1.598.050	1.383.552	-214.498	-13,4
E - Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione	330.000	489.716	+159.716	+48,3
F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	90.400	180.359	+89.959	+99,0
Accantonamento	-	12.743		
TOTALE	3.500.000	3.500.000		

Per ciò che attiene invece alle conseguenze delle modifiche ed integrazioni apportate al Piano in ordine alla ripartizione dei finanziamenti, esse assumono particolare rilevanza in rapporto ai settori D, E ed F, come desumibile dalla tabella allegata (Tab. 8).

Difatti mentre i settori A, B e C evidenziano scostamenti che rappresentano semplici assestamenti fisiologici, i settori E ed F presentano incrementi rispettivamente del 48% (+ 160 miliardi circa) e del 99 % (+ 90 miliardi circa) delle risorse economiche originariamente assegnate, e di contro, il settore D fa registrare una sensibile contrazione (-13,4%) del budget originariamente previsto, che è passato da Lit. 1.598.050.000.000 a Lit. 1.383.552.000.000 (- 214 miliardi).

Nel procedere ad ulteriori rimodulazioni, sarà posta particolare attenzione alla natura degli interventi che dovessero essere espunti dal Piano, in considerazione della necessità di assicurare alla BEI, per il cui tramite è stata effettuata parte della provvista finanziaria, la permanenza nel Piano stesso di interventi aventi natura di "investimento", per un importo complessivo pari ad almeno 2.800 miliardi.

Al riguardo, il Presidente del Consiglio si era impegnato all'epoca a garantire, per il tramite dell'U.R.C.G.E., il monitoraggio sull'attuazione degli interventi ai quali la Commissione Tecnica della BEI ha accordato le risorse comunitarie.

3.3 Lo stato di attuazione

Relativamente allo stato di attuazione del Piano oltre a quanto già detto nei paragrafi precedenti, si rinvia per una lettura analitica dello stesso all'Allegato 3, dove viene riportato lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento, nonché a quanto riportato in merito nelle relazioni trimestrali prodotte dal Soggetto Monitore e sintetizzate al punto 4.1.3 della presente Relazione.

Per consentire una immediata e sintetica lettura dell'evoluzione dello stato di attuazione del Piano è stata elaborata la tabella di fianco riportata.

Si segnala che le leggere discordanze esistenti fra alcuni dati riportati nella citata tabella e nelle altre elaborate dall'U.R.C.G.E. ed i dati riportati dal Soggetto Monitore nelle proprie relazioni in ordine, sia al numero complessivo degli interventi, che a quello degli interventi in fase di realizzazione, sono dovute ad oggettive difficoltà interpretative di talune situazioni, nonché agli effetti delle riprogrammazioni del Piano stesso, su tutti i sistemi di verifica e controllo, ivi compreso il servizio di "monitoraggio"; esse, comunque, non incidono significativamente sulla valutazione complessiva dei fenomeni osservati.

L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GIUBILEO NEL CORSO DELL'ANNO 1998

PARAMETRI	TOTALE				LAVORI				BENI CULTURALI				FORNITURE			
	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar. 98
Numero interventi																
totali	754 (1)	720 (1)	720 (2)	632 (2)	438	435	447	376	209	205	205	192	90	71	63	59
non appaltati	216	224	304	342	148	181	257	281	7	0	1	11	57	43	45	50
appaltati	528(2)	487	411	285	290	254	190	95	202	205	204	181	33	28	18	9
in realizzazione	432(3)	359	307	215	262	161	102	57	148	192	201	156	21	6	4	2
completati	76	19	7	2	17	4	3	1	54	9	1	1	5	6	3	0
Indicatori procedurali																
Avanzam. Medio (%)	62%	55%	40%	40%	58%	52%	42%	40%	75%	65%	41%	40%	45%	41%	35%	30%
Ritardo affidamento (gg)	100	94	57	-	109	100	75	-	74	74	18	-	136	129	124	-
Margine finale (gg)	50	61	80	105	58	78	93	91	44	44	83	138	19	14	-27	68
Indicatori di costo																
Finanziamento L.651 (mld)	3471(5)	3265	3380	3446	2051	2083	2350	2425	322	306	325	323	785	591	565	560
Costo totale (mld)	3652(5)	3407	3550	3700	2171	2163	2432	2611	369	354	379	377	799	606	595	577
Economie (mld)	303	118	110	91	247	86	102	75	52	50	28	-15	4	-18	-20	1
% economie	8,3%	3,5%	3,1%	2,5%	11,4%	4,0%	4,2%	2,9%	14,1%	14,1%	7,4%	-4,0%	0,5%	-3,0%	-3,4%	0,2%
Valutazione di criticità																
Alta criticità	85	99	98	187	66	66	83	129	4	20	25	33	15	11	14	23
Media criticità	147	167	219	200	90	109	126	157	35	37	41	21	22	21	26	22
Bassa criticità	377	317	276	216	230	165	127	74	129	138	138	138	18	13	10	4
Valutazione di rischio																
Alto rischio	52	37	73	-	45	36	70	-	0	0	0	-	7	1	3	-
Medio rischio	238	250	214	-	178	156	126	-	30	68	66	-	30	26	22	-
Basso rischio	322	308	313	-	155	155	149	-	138	127	138	-	29	26	26	-
Rischio nullo	58	23	8	-	13	8	5	-	36	9	0	-	9	6	3	-
Importo Alto rischio (mld)	978	882	933	-	912	877	917	-	0	0	0	-	66	5	16	-
Importo Medio rischio (mld)	1092	1118	1114	-	781	648	700	-	67	178	124	-	244	292	290	-
Importo Basso rischio (mld)	804	696	647	-	369	364	226	-	271	172	254	-	164	160	167	-
Importo rischio Nullo (mld)	190	133	110	-	18	12	11	-	15	3	0	-	157	118	99	-

(1) - compresi 17 incentivi

(2) - compresi 3 incentivi

(3) compreso 1 incentivo e 10 interventi di cui non si hanno informazioni

(4) inclusi 13 mld. Per incentivi

3.4 Schede di approfondimento

3.4.1 Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere

Fin dalla sua prima stesura, nel Piano è stato inserito un intervento (cod. A.08.01) finalizzato alla riqualificazione delle strutture ricettive di proprietà privata, avente come proponente e soggetto beneficiario la Regione Lazio ed una dotazione finanziaria di 130 miliardi, poi ridotti, con DM in data 24/6/97, a circa 99,7.

A tale scopo è stato costituito (con L.R. 20/97, integrata dalla L.R.9/98) un fondo speciale per l'erogazione di contributi in c/capitale e c/interessi a enti e soggetti privati che intendono ampliare e riqualificare immobili destinati ad attività ricettive.

Le iniziative ammissibili al finanziamento devono riguardare interventi su determinate strutture (es. : alberghi fino a tre stelle; campeggi e villaggi turistici; alloggi agro-turistici; case per ferie; ostelli per la gioventù) e devono prevedere la realizzazione di opere di costruzione e ampliamento strutturale (compreso l'acquisto di immobili adiacenti alla struttura ricettiva, per il potenziamento delle capacità di accoglienza), di adeguamento degli impianti, di superamento delle barriere architettoniche.

Le opere previste dagli interventi ammessi al contributo dovranno concludersi entro il 30/11/99.

La Regione Lazio aveva affidato la gestione del fondo speciale alla FILAS, che avrebbe dovuto condurre l'istruttoria delle domande di finanziamento, l'erogazione dei contributi ai beneficiari e il monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi. Tuttavia, successivamente alla fase di recepimento delle domande di finanziamento da parte della FILAS, la Regione Lazio ha avvocato nuovamente a sé la gestione del fondo speciale e trasferito le competenze per l'espletamento dell'istruttoria delle domande e per il monitoraggio dell'esecuzione delle opere finanziate, all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

L'IPI ha condotto l'istruttoria delle 923 domande che la FILAS aveva ritenuto ammissibili e che prospettano, in sede di istanza, opere che comporterebbero lavori per circa 2.260 miliardi. A seguito dell'istruttoria tecnica e finanziaria l'importo dei lavori ammissibili si è ridotto a circa 1.547 miliardi. In base agli ulteriori accertamenti istruttori, peraltro ancora in corso, sembra si possa ipotizzare un importo dei lavori ammissibili al contributo, pari a circa 978 miliardi. A tale dato corrisponderebbe, secondo la Regione Lazio, un fabbisogno così ripartito:

- Lit. 17,2 miliardi per contributi in conto capitale
- Lit. 222,2 miliardi per contributi in conto interessi (dato massimo)
- Lit. 239,4 miliardi Totale fabbisogno contributo.

3.4.2 Interventi inerenti i principali complessi museali

Fra i numerosi interventi in corso di esecuzione su "beni culturali", sia nella città di Roma, che nel Lazio, vengono di seguito descritti più in dettaglio quelli concernenti il "sistema museale" pubblico. Tale scelta è dovuta sia alla rilevanza dell'impegno finanziario di tali interventi, che al indubbio ruolo che i musei svolgeranno all'interno della "offerta culturale" cui potranno fare riferimento i pellegrini durante l'Anno Santo.

Fra gli interventi in corso di esecuzione a cura dal Comune di Roma si segnalano:

- Area del Grande Campidoglio. Musei Capitolini. Secondo lotto funzionale (B.01.02)

La riorganizzazione dei musei Capitolini (forse la più antica collezione archeologica del mondo) inquadrata nel progetto "Area del Grande Campidoglio" ha preso avvio, almeno a livello programmatico, ormai da molto tempo ed è inclusa nel Programma per Roma Capitale. Essa è finalizzata ad un radicale rinnovamento dell'impianto museale, sia attraverso l'ampliamento degli spazi ad esso dedicati, sia tramite la realizzazione di un percorso di visita che consentirà, una volta realizzato, di collegare fra loro il Palazzo Nuovo ed il Palazzo dei Conservatori con l'ampliamento da realizzarsi tramite la copertura del Giardino Romano, passando attraverso gli ambienti del Tabularium, posti al di sotto del Palazzo Senatorio.

La realizzazione del lotto finanziato con i fondi ex lege 651/96 ha preso avvio a settembre del '98 con la consegna del Cortile di Michelangelo, cui è seguita, a novembre, la consegna del Palazzo Nuovo. Data la complessità della fase preparatoria che implica lo spostamento di circa 3.000 opere d'arte, l'inizio dei lavori vero e proprio è previsto per gennaio '99. La consegna del Palazzo dei Conservatori per la realizzazione degli impianti è prevista per luglio '99. La fine dei lavori è programmata per dicembre '99.

- Museo dei Fori Imperiali (B.02.01/1 - B.01.01/2)

Gli interventi previsti nei Mercati Traianei, nel più ampio ambito del sistema museale che comprende le aree archeologiche, ed in diretta prosecuzione con i lavori di restauro ed adeguamento funzionale attualmente in corso, consistono nella risoluzione di alcuni problemi architettonici non risolti nei lavori del 1930, funzionali alla nuova destinazione d'uso e nell'allestimento museale. La consegna dei lavori è stata effettuata il 22/12/98. La durata dei lavori è prevista in 300 giorni.

- Palazzo delle Esposizioni (B.04.01)

Il progetto di intervento prevede la valorizzazione della sede espositiva per consentire un uso più intensivo rendere la struttura più adatta ad un circuito espositivo internazionale. L'intervento si configura come manutenzione straordinaria. La consegna dei lavori, con procedura d'urgenza, è prevista per i primi di gennaio '99. La durata dei lavori è prevista in 300 giorni.

- *Palazzo Braschi (B.05.01/2)*

Il Palazzo ospita il Museo di Roma ed è oggetto di due distinti interventi finanziati con i fondi ex lege 651/96. Il primo, che beneficia di un finanziamento di 2 miliardi, è finalizzato alla realizzazione di prerestauri, imballaggi, movimentazione delle opere attualmente contenute nel museo. Il secondo, finanziato per 13 miliardi, prevede: interventi strutturali al solaio di copertura e del IV piano; consolidamento, ristrutturazione, adeguamento degli impianti dal piano terra al terzo piano, limitatamente alla zona d'angolo compresa fra via di Pasquino, Piazza di Pasquino, via di S. Pantaleo; realizzazione degli impianti e realtice centrali; realizzazione del corpo ascensore.

Per la realizzazione dell'intervento si è scelta la formula dell'appalto integrato; la consegna del cantiere è stata effettuata a settembre '98; l'impresa ha elaborato il progetto esecutivo ed i lavori sono attualmente in corso.

Fra gli interventi in corso di esecuzione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si segnalano:

Museo Nazionale Romano

Il Museo Nazionale Romano, sarà articolato, alla fine del programma di lavori avviati ormai da molti anni, in quattro sedi: il Museo delle Terme, l'ex Collegio Massimo, Palazzo Altemps e la Crypta di Balbo. Quasi tutti gli interventi sugli immobili anzidetti fanno già parte del Programma per Roma Capitale ed i lavori sono stati avviati con i relativi fondi. Con i finanziamenti per il Giubileo del 2000 il programma museale ha avuto nuovo impulso e dovrebbe essere portato a compimento prima dell'inizio delle celebrazioni giubilari, almeno per ciò che concerne tre delle quattro sedi citate.

- *Palazzo Altemps (B.08.01)*

I lavori sono finalizzati alla completa apertura al pubblico del palazzo. L'intervento, riguarda i lavori di restauro e primo scavo della zona centrale e sistemazione del cortile, con completamento ed allestimento del museo antiquario, del teatro e dei locali di servizio. L'importo del finanziamento è pari a 5 miliardi.

L'intervento è nella fase di esecuzione lavori; attualmente si sta procedendo alla sistemazione interna dell'edificio.

- *Museo delle Terme di Diocleziano (B.08.02, B.08.03, B.08.04, B.08.05, B.08.06, B.08.07, B.08.0, B.16.18/16)*

Il Museo Nazionale Romano, nella sede delle Terme di Diocleziano, è oggetto di 8 distinti interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità, all'apertura al pubblico di nuovi spazi espositivi ed all'adeguamento delle strutture, con un finanziamento complessivo di circa 21 miliardi. I lavori riguardano il completamento dei restauri del Chiostro di Michelangelo, il restauro ed allestimento delle Olearie, dell'ex Museo delle Cere e della zona delle Grandi Aule presso le Terme.

Sono previsti anche lavori di impiantistica e la realizzazione della zona di ingresso

con biglietteria e guardaroba, nonché la realizzazione di apparati didattici e la sistemazione del giardino presso Piazza dei Cinquecento.

Risultano attualmente in fase di esecuzione e procedono secondo programma: il restauro di parte delle superfici esterne del Chiostro di Michelangelo; la sistemazione del giardino con la nuova collocazione del materiale lapideo ivi conservato; l'apertura di un nuovo ingresso per il pubblico. A conclusione delle opere edili e impiantistiche nelle sale espositive si procederà all'allestimento museale.

- Crypta Balbi (B.08.09)

L'intervento presso la Crypta Balbi, prevede un finanziamento di 10 miliardi di lire. Esso è finalizzato alla valorizzazione del monumento romano e prevede il restauro e l'apertura al pubblico di un settore.

I lavori riguardano: la sistemazione dell'area archeologica rinvenuta in più di un decennio di scavi; il recupero dei reperti; il restauro delle strutture edilizie su Via delle Botteghe Oscure e su Via Caetani, per la loro utilizzazione come museo della Roma altomedioevale.

Lo stato di avanzamento dei lavori può essere valutato pari a circa un terzo del totale. Le lavorazioni già avviate riguardano: il consolidamento fondale delle murature; il consolidamento e la pulitura delle volte; il ripristino di un solaio.

I lavori di scavo archeologico hanno riportato alla luce un pilastro del Porticus Minucia che ha provocato dei rallentamenti nei lavori. Ciò nonostante l'intervento appare realizzabile entro il 1999.

- Palazzo Barberini (B.09.01, B.16.18/1 e B.16.18/2)

L'intervento, finanziato con circa 7 miliardi di lire, tende al miglioramento della fruibilità ed agli adeguamenti funzionali. Gli attuali lavori si inseriscono nel quadro di un più ampio progetto di restauro dell'intero complesso, che le Soprintendenze competenti (in particolare l'Architettonica di Roma) stanno svolgendo da numerosi anni. I lavori della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Roma riguardano il restauro del piano terra nell'ala nord, del cortile della Cavallerizza, dell'androne e della rampa; la realizzazione di canalizzazioni di servizio che circondano l'intero edificio, ed infine la posa in opera di una centrale termica. Gli interventi attuati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma sono: lo scavo, il restauro e la sistemazione delle strutture del complesso monumentale antico sotto il giardino del Palazzo e lo scavo archeologico, la documentazione degli ambienti e dei reperti, ed il restauro degli affreschi e delle strutture ritrovate sotto l'ala nord del Palazzo.

- Villa Giulia (B.10.01/a, B.10.01/b e B.10.01/c)

Gli interventi sul Museo Nazionale di Villa Giulia prevedono opere di restauro sul complesso di Villa Poniatowsky, Villa Strohl-Fern e Villa Giulia, il finanziamento globale è di 23 miliardi di lire.

I lavori relativi a Villa Poniatowsky prevedono il recupero strutturale e funzionale dell'edificio del Valadier e l'organizzazione degli spazi espositivi destinati alle collezioni del Latium Vetus.

Nell'edificio di Villa Giulia si intende portare a compimento la valorizzazione della villa completando il restauro conservativo del complesso monumentale e realizzando itinerari di visita nei giardini e negli ambienti sotterranei, con l'apertura della "neviera" affrescata e l'accesso, all'interno del Ninfeo, ai diversi livelli della costruzione. E' previsto il restauro architettonico dei prospetti interni (emiciclo) ed esterni (ala destra), l'allestimento museale delle sezioni Agro falisco-capenate e Castellani, oltre ad adeguamenti funzionali e impiantistici, servizi di accoglienza e realizzazione di un padiglione didattico.

La porzione di parco di Villa Strohl-Fern dovrà restituire parte dell'originaria unità ai due fabbricati (Villa Giulia e Villa Poniatowsky) nel loro complesso. Su questa fascia saranno realizzate opere di canalizzazione di servizio, recinzioni e sistemazione finale a verde.

Attualmente sono in corso lavori di restauro dei prospetti dell'emiciclo e dell'ala destra di Villa Giulia; nella Villa Poniatowsky - dove sono state rinvenute interessanti decorazioni murali - i lavori procedono sia all'interno della villa che nei fabbricati annessi delle ex concerie Riganti e studi; così come nella porzione di parco di Villa Strohl-Fern.

- Galleria Nazionale d'Arte Moderna (B.11.0)

L'intervento, per un importo di 11 miliardi, è seguito direttamente dagli Uffici della Galleria. Prevede l'adeguamento e la sistemazione di numerose sale poste nelle due ali dell'edificio che accoglieranno l'esposizione permanente.

Nel prossimo mese di febbraio è prevista l'ultimazione dei lavori e la consegna dell'ala est dell'edificio, ad esclusione della sala libraria per la quale i tempi di ultimazione saranno posticipati di alcuni mesi. Il cantiere si sposterà quindi nell'ala ovest, il cui lavori dovrebbero terminare ad ottobre 1999.

- Vittoriano (B.12.03)

L'intervento, finanziato per 8 miliardi di lire, è finalizzato alla riapertura al pubblico del monumento. I lavori sono curati dalla Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Roma e prevedono il restauro delle superfici esterne, delle decorazioni musive e di alcuni gruppi bronzei. È previsto inoltre il progetto di un allestimento museale ed il rilievo dell'intero complesso monumentale.

I lavori attualmente stanno procedendo nel portico superiore, con il restauro e la pulitura delle superfici marmoree; il restauro dei bronzi procede a rilento a causa di difficoltà di natura tecnica. Procedono invece senza difficoltà le attività di rilievo.

- Museo Nazionale della Grafica (B.14.01)

L'intervento in oggetto riguarda il restauro e l'adeguamento funzionale ai fini museali

del complesso monumentale Calcografia - Palazzo Poli, nuova sede dell'Istituto Nazionale per la Grafica in Roma.

Gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere in vista del Giubileo sono:

- la realizzazione dei depositi per i disegni e le stampe per la ricollocazione delle collezioni;
- il recupero funzionale di aree da destinarsi ad apertura al pubblico, in particolare delle zone da dedicare a mostre temporanee.

- Museo di Palazzo Venezia (B.14.02)

Il restauro del complesso edilizio di Palazzo Venezia è finanziato per 8 miliardi. L'intervento prevede il restauro delle facciate interne ed esterne, il consolidamento strutturale e la revisione delle coperture. I lavori sui prospetti esterni sono relativi al fronte su piazza Venezia ed a quello su piazzetta San Marco. È stata approvata una perizia di variante che prevede la sostituzione dei lavori di restauro relativi al prospetto su via del Plebiscito - che non verrà realizzato - con il prospetto opposto su via di San Marco. Verranno inoltre restaurati i prospetti del cortile cosiddetto degli aranci.

Sono stati conclusi i restauri dei prospetti su piazzetta San Marco e sul fronte di piazza Venezia, ad eccezione della torre d'angolo. I lavori di rifacimento delle coperture ed il restauro dei prospetti relativi al cortile interno sono in una fase avanzata di lavorazione e probabilmente saranno ultimati in anticipo rispetto al previsto. I lavori relativi al prospetto su via di San Marco sono in fase iniziale.

- Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo (B.14.04 e B.14.05)

L'intervento è teso al miglioramento della fruibilità del Monumento, oltre che del museo. Le opere di restauro previste tendono ad agevolare i percorsi di cinta ed a favorire le comunicazioni tra i contenuti storici del mausoleo adrianeo. Si stanno conducendo opere di scavo che prevedono il restauro di tutti i manufatti ritrovati e la relativa catalogazione. E' previsto inoltre l'allestimento di un deposito attrezzato per la conservazione dei reperti. Interessante è la prevista realizzazione di un prodotto informatico a scopo didattico e la creazione di un modello tridimensionale del monumento, al fine di evidenziare le diverse fasi costruttive dello stesso.

I lavori procedono secondo programma. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Roma si sta effettuando il restauro della rampa elicoidale e lo scavo negli ambienti interni del mausoleo.

- Museo delle Navi Romane di Nemi (B.14.06)

Nel quadro delle iniziative destinate al recupero delle funzioni proprie del museo, il Piano ha stanziato 800 milioni da destinare alla valorizzazione dell'attuale allestimento. I lavori sono rivolti soprattutto all'inserimento di strutture e servizi destinati alla riqualificazione del museo, anche in vista dell'inaugurazione della mostra sui Santuari precristiani del Lazio fra la costa ed i monti Albani, ove si esporranno il ciclo statuariale proveniente dal Santuario di Minerva di Pratica di Mare,

cui faranno corona reperti provenienti dai Santuari di Ardea e di Diana Nemorensis. I lavori, attualmente in esecuzione, nonostante alcuni ritardi dovuti a difficoltà di reperimento di materiali speciali, che non hanno reso possibile la posa in opera della copertura prevista, si concluderanno nel rispetto dei tempi previsti.

- *Museo Ostiense di Ostia Antica (B.15.03)*

Il finanziamento di 2 miliardi di lire consente di proseguire lavori già iniziati con fondi ordinari. Il progetto attuale riguarda l'adeguamento e l'allestimento del museo e la sistemazione delle collezioni che vi saranno esposte e del materiale illustrativo didattico.

I lavori prevedono sia il restauro di paramenti murari esterni dell'edificio, che la sistemazione degli ambienti interni, degli impianti museali e di sicurezza.

Le attività di tipo strutturale sono state eseguite secondo i tempi previsti. Sono stati inoltre predisposti gli impianti tecnologici che saranno poi collegati ad un terminale centrale collocato nell'Antiquarium Ostiense, a cui faranno capo tutti gli impianti di sicurezza dell'area archeologica.

Attualmente si sta realizzando la tinteggiatura delle pareti interne e delle murature esterne con la pulitura e il consolidamento degli apparati decorativi della facciata. Una volta terminato il restauro esterno e l'adeguamento degli ambienti espositivi si procederà all'allestimento museale.

Le date delle singole attività di cantiere riportate dal programma dei lavori sono state rispettate e si prevede una conclusione anticipata dei lavori.

Per ciò che concerne sempre il settore "museale" si segnalano i seguenti interventi in corso di esecuzione in ambito regionale:

- *Palazzo Chigi di Ariccia (B.18.06)*

- *Genazzano (B.12.16 - B.19.08)*

3.4.3 Interventi per la viabilità nell'area di San Pietro

- *Galleria principe Amedeo Savoia Aosta (PASA) (D.08.01)*

L'intervento prevede la realizzazione di una galleria stradale da Piazzale della Rovere a Piazzale Gregorio VII lungo e sotto la galleria Principe Amedeo e Via di Porta Cavalleggeri. E' finanziato con 56 miliardi di lire ed è affidato al Comune di Roma, che data la complessità dell'opera si è avvalso come stazione appaltante del Provveditorato OO.PP. per il Lazio.

L'opera permette di pedonalizzare Via della Conciliazione, raccogliendo il traffico che percorre il Lungotevere in Sassia (tramite il costruendo sottovia) e percorre in sotterranea la galleria Principe Amedeo e un lungo tratto di Via Gregorio VII fino all'omonimo piazzale, con uno sviluppo di 850 m.

L'inizio effettivo dei lavori è avvenuto il 9/2/98.

La prima fase esecutiva è stata dedicata alla rimozione delle interferenze (attraverso richieste di preventivi alle aziende per gli spostamenti dei pubblici servizi, relative approvazioni, preparazione di documentazione integrativa, accordi con il Comune per la gestione del traffico, ecc).

Contemporaneamente sono iniziati i lavori nella Galleria PASA per la realizzazione delle paratie laterali con metodo "Trencher". Il cattivo funzionamento del "Trencher" ha portato, su iniziativa della Direzione Lavori, a modificare la tecnologia ricorrendo alla "berlinese di micropali"; la variante è stata approvata dal CTA con voto n.2436 del 15/9/98. Su tale base i lavori sono ripresi e, al 6/11/98, le paratie di destra risultavano finite, quelle di sinistra completate al 67%.

Alla stessa data, la situazione dei lavori all'esterno era la seguente: lungo Via di P. Cavalleggeri le paratie (doppie) di destra risultano completate al 57%, quelle di sinistra appena iniziate; su P.za della Rovere le paratie risultano completate al 26%. E' stato quasi ultimato il minitunnel, che correndo parallelo alla galleria, ospiterà tutti i cavi dei servizi.

Nel complesso l'avanzamento risulta essere pari al 32%, sensibilmente inferiore a quanto programmato ad aprile '98. L'impresa, tuttavia, ha presentato un programma aggiornato, basato sul potenziamento della produzione del cantiere, che dovrebbe consentire il recupero del ritardo ed il completamento entro il 2/11/99.

Un prossimo evento critico è rappresentato dal completamento del solettone di copertura all'interno della galleria e la relativa pavimentazione, con conseguente riapertura al traffico della galleria stessa. Il Comune ha preteso la riapertura per metà dicembre '98 e l'impresa si è impegnata a soddisfare la richiesta.

- Sottovia lungotevere in Sassia (D.07.02)

Questo intervento è stato inserito nel Piano del Giubileo in sostituzione del Sottopasso di Castel Sant'Angelo, che è stato definanziato all'inizio del 1998. Il sottovia è stato inserito nel Piano in Febbraio '98 con un finanziamento di 43,5 miliardi di lire e affidato al Comune di Roma, che data la complessità dell'opera si è avvalso come stazione appaltante del Provveditorato OO.PP per il Lazio.

Il Sottovia inizia da Piazza Pia e tramite una rampa di discesa percorre in sotterranea il Lungotevere in Sassia fino a riemergere sul lungotevere all'inizio di Via della Lungara, eliminando le intersezioni a raso dei ponti Vittorio Emanuele e Principe Amedeo, nonché favorendo l'accesso alla galleria PASA ed al parcheggio del Gianicolo. Lo sviluppo totale dell'opera è di 450 m.

Altro effetto atteso dell'opera è un miglioramento della vivibilità della zona ed in particolare dell'Ospedale Santo Spirito.

I lavori sono in corso.

- Interconnessioni tra la viabilità ed il parcheggio del Gianicolo (D.08.03)

L'intervento, finanziato con Lit. 15,4 mld ed affidato al Provveditorato OO.PP. del

Lazio, consiste nella realizzazione dei collegamenti tra la Galleria PASA ed il costruendo Parcheggio del Gianicolo: l'accesso da Piazza della Rovere viene realizzato attraverso l'allargamento della salita Sangallo mentre l'accesso dalla Galleria PASA viene realizzato attraverso una galleria sotterranea (rampa Torlonia) che raggiunge Piazza Urbano VIII sottopassando la salita del Gianicolo. La sistemazione della stessa Piazza Urbano VIII con gli accessi al parcheggio fanno parte dell'intervento. I lavori hanno avuto inizio il 12.08.1998 e sono articolati su cinque fasi.

I primi due mesi di attività sono stati dedicati alla cantierizzazione ed alla rimozione di pubblici servizi.

Successivamente ha preso avvio la Fase 1: è stata completata la realizzazione dei micropali sulla rampa Sangallo ed è stata avviata la realizzazione di pali sulla tratta terminale della rampa Torlonia.

L'esecuzione della tratta centrale della suddetta rampa in terreno di proprietà Torlonia è stata necessariamente differita fino al 18 novembre quando è stato raggiunto l'accordo tra le parti e siglato un verbale di accesso e asservimento.

Alla data del 18.11.1998 risultava un avanzamento globale pari circa al 6%, per un importo di 491 milioni sul totale di 8,2 miliardi. al netto del ribasso. L'avanzamento risulta sensibilmente inferiore a quello programmato; l'impresa, tuttavia, ha presentato un programma aggiornato (tuttora all'esame della Direzione Lavori), basato sul potenziamento della produzione del cantiere, che dovrebbe consentire il recupero del ritardo e il completamento entro il 12.11.1999.

3.4.4 Interventi inerenti la mobilità a Roma e nell'area romana

- Infrastrutturazione della stazione Tiburtina (D.09.01)

L'intervento è stato inizialmente dotato di un finanziamento di 150 mld affidato alle FF.SS. Esso comprende la fase funzionale prioritaria del programma di infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina e nodo di interscambio, oggetto dell'accordo di programma del 11.11.1997. La Conferenza dei Servizi conclusa l'11.05.1998 ha evidenziato che solo una parte degli interventi poteva essere realizzata nei tempi giubilari. In conseguenza il finanziamento è stato ridotto a 116 miliardi, relativo alle seguenti parti dell'opera: viabilità di accesso al piazzale posteriore (stralcio 2000 della Circonvallazione interna ramo Nord), allargamento e ampliamento del piano di stazione comprese le strutture di fondazione della piastra-ponte, prolungamento del sottopasso pedonale fino al piazzale posteriore. Sono rimaste a carico di FF.SS. le seguenti opere: le strutture in elevazione della piastra-ponte e gli interventi sul fabbricato viaggiatori.

L'appalto dei lavori per un importo netto di 79,3 mld relativo sia alle opere finanziate con i fondi del Giubileo che quelle a carico di FF.SS., è avvenuto in data 06.08.1998.

L'avvio dei lavori è avvenuto all'inizio di settembre 1998 con la cantierizzazione e la rimozione delle interferenze con i sottoservizi. Tale fase iniziale ha incontrato notevoli difficoltà operative da parte dell'impresa determinando un certo ritardo

nell'inizio effettivo dei lavori. Recentemente nel mese di novembre i lavori hanno progredito speditamente con la demolizione di fabbricati e lo spostamento delle interferenze nella fascia di realizzazione della circonvallazione.

Il programma lavori redatto dall'impresa ha incontrato difficoltà nell'approvazione da parte della Direzione Lavori. Si ritiene che solo alla fine di novembre si potrà disporre di un programma lavori concordato.

L'avanzamento dei lavori al 20 novembre è valutato sommariamente al 3%; tuttavia la mancanza di un programma lavori aggiornato ed approvato dalla Direzione Lavori non permette al momento di valutare i ritardi e le relative possibilità di recupero entro novembre 1999.

- Autostrada Roma - Fiumicino - Realizzazione terza corsia (lotto 2°) (D.10.01/a)

L'intervento consiste nella realizzazione della terza corsia dal km 10+800 al km 14+000 (dal ponte su Rio Galeria allo svincolo per l'autostrada Roma - Civitavecchia compreso).

La programmazione dei lavori prevede quattro macrofasi:

- km 11+790 - km 13+140 - Realizzazione di una variante provvisoria di 1700 metri con la costruzione di un sovrappasso ferroviario, al quale, in fase di realizzazione, sono stati aggiunti due passaggi, realizzati con elementi corrugati "Armco", che consentono il prolungamento della Via Sabbatino con la possibilità di raggiungere la stazione ferroviaria ed il collegamento dell'azienda agricola Rinaldi;
- km 13+140 - km 14+000 - Realizzazione e adeguamento delle rampe esistenti al bivio con l'autostrada A12 Roma - Civitavecchia;
- km 10+800 - km 11+790 - In questo tratto è previsto l'allargamento dei due ponti su Via Portuense e su Rio Galeria;
km 11+790 - km 13+140 - Allargamento della sede stradale con la realizzazione di due opere strutturali per lo scavalco della ferrovia e di Via Sabotino. Per quanto riguarda l'opera ferroviaria, viene realizzata un'opera gemella a quella già realizzata per la variante provvisoria della macrofase 1, dopo la demolizione dell'opera esistente.

La realizzazione della variante provvisoria si è resa necessaria per riallineare la livelletta stradale senza interrompere il traffico, essendosi verificati cedimenti localizzati della massicciata.

L'importo del finanziamento è di 90 miliardi.

A seguito di un ricorso al TAR per opposizione all'affidamento d'appalto, con delibera n. 492/98 del 25-03-1998 notificata all'ANAS il 30-03-1998, il cantiere è stato fermo dall'1-04-1998 al 24-04-1998. L'ultimazione lavori è stata spostata, in conseguenza, al 22-12-1999.

E' stato riformulato un programma lavori con ultimazione al 30-10-1999, escluse le opere di segnaletica.

E' in via di realizzazione la variante provvisoria di 1,7 km che, correndo

parallelamente all'attuale tracciato, consentirà la deviazione del traffico autostradale per la realizzazione del ponte sulla ferrovia, riducendo al minimo i disagi per il traffico sia verso Civitavecchia che verso l'aeroporto.

Sono state apportate due varianti al progetto, la prima per consentire il passaggio di mezzi agricoli all'azienda Rinaldi e la seconda concernente il prolungamento della via Sabbatino per garantire il collegamento con l'attuale stazione ferroviaria.

E' in corso l'ultimazione del ponte sulla ferrovia, che consente il passaggio della variante provvisoria, con il montaggio delle travi prefabbricate per l'impalcato.

La sospensione e le varianti hanno determinato un forte ritardo nell'avanzamento dei lavori rispetto al programma iniziale.

L'apertura al traffico della variante è prevista per il 15/12/98: a questa data sarà possibile effettuare una verifica dell'andamento dei lavori e sulla possibilità di ultimazione nei tempi previsti.

Ad oggi l'avanzamento dei lavori è pari al 22,5% con un sensibile ritardo sul programma iniziale è in corso di predisposizione un programma aggiornato che, grazie al raddoppio dei turni di lavoro ed attività contemporanee su diverse tratte, dovrebbe permettere il recupero del ritardo ed il completamento entro il 22.12.1999.

- Linea ferroviaria La Storta - Viterbo (D.15.01)

L'intervento si inserisce nel quadro del più vasto progetto della così detta "Passante dei laghi" che collega Viterbo, nella zona dei laghi al nord di Roma, a Velletri, nella zona dei laghi a sud di Roma passando per l'anello ferroviario intorno alla capitale. La parte nord del passante inizia alla stazione San Pietro e termina a Viterbo: di questa, la tratta S.Pietro - La Storta è in corso di realizzazione con i fondi di Roma Capitale, mentre l'intervento giubilare riguarda la tratta rimanente e prevede:

- il raddoppio della linea La Storta - Cesano, subito dopo la Stazione La Storta, dal km 15+492 al km 23+725. In questo tratto vengono realizzate la fermata dell'Olgiata, la stazione di Cesano, tre sottovia, un cavalcavia, quattro tombini, un'opera di protezione dell'acquedotto Traiano Paolo ed altre opere minori, oltre ad una variante stradale sulla via Braccianese fino all'intersezione con la Cassia, per alleggerire il traffico nell'abitato di La Storta;
- elettrificazione da Cesano a Viterbo, con la realizzazione di tre sottostazioni elettriche.

L'importo del finanziamento è di 193.5 miliardi.

Sono previsti 14 appalti, di cui:

- 8 appalti conclusi;
- 1 con avviso di gara pubblicato il 18-3-1998, in via di ultimazione;
- 5 con trattativa privata, convenzioni esistenti o gare tramite servizio acquisti e forniture;

Le gare sono state divise in più categorie:

1. Opere civili, (di questa categoria fanno parte quattro appalti)

2. Elettrificazione
3. Impianti di sicurezza e segnalamento
4. Impianto di telecomando
5. Adeguamento impianto CTC (DCO di Viterbo)
6. Stralcio galleria artificiale strada Braccianese
7. Autoservizi sostitutivi
8. Allaccio ENEL alla SSE
9. Acquisto materiale di esercizio
10. Spostamento sottoservizi e attraversamenti interferenti.

I cantieri hanno superato le difficoltà della fase organizzativa iniziale e sono state avviate le lavorazioni di tutte le opere. E' stata completata la bonifica di tutta la linea.

Le indagini archeologiche, sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, hanno portato ad importanti ritrovamenti. In conseguenza, si sono rese necessarie delle modifiche di leggera entità alla fermata Olgiata, mentre nell'area dello svincolo tra la Cassia e la Braccianese, i lavori di scavo sono stati bloccati in attesa di trovare una soluzione, con il rischio di un possibile ritardo sul completamento della linea.

Le numerose interferenze con i sottoservizi si stanno risolvendo, attraverso la cooperazione degli Enti Gestori.

I lavori risultano attualmente in ritardo rispetto ai programmi iniziali; tuttavia i programmi aggiornati predisposti dall'impresa prevedono il completamento nei tempi giubilari.

-Interventi sul Grande Raccordo Anulare (D.11.01)

Il G.R.A. ha un'estensione di km. 68 + 223. Oggi, in considerazione dei volumi di traffico, presenta alcune caratteristiche assolutamente insufficienti rispetto alla classificazione di autostrada avvenuta nel 1978.

L'Anas, di concerto con le Amministrazioni Comunale e Regionale, ha da tempo intrapreso il potenziamento dell'autostrada con la realizzazione della terza corsia per ogni senso di marcia secondo un progetto generale esecutivo redatto nel 1985.

L'intervento è stato poi inserito nel programma per Roma Capitale e, per il lotto 23 bis, anche nel piano del Giubileo.

L'opera pur rientrando solo per un lotto nel piano del Giubileo, riveste una fondamentale importanza per la mobilità in vista delle celebrazioni dell'Anno Santo.

Sotto il coordinamento dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, si è pertanto proceduto alla conclusione dell'accordo di programma e della conferenza di servizi in modo che l'opera medesima sia completata entro il 1999.

L'adeguamento previsto consiste nel trasformare l'attuale sede, mediamente larga 22 metri e costituita da due corsie per ogni senso di marcia separate da aiuole spartitraffico di due metri, in una nuova piattaforma con caratteristiche autostradali di larghezza complessiva di metri 33 con tre corsie per ogni senso di marcia e

spartitraffico di 4 metri.

Risultano già adeguati, per complessivi km.32 + 800 circa, i tratti compresi tra:

- la statale n.4 via Salaria e la strada provinciale Prenestina;
- le statali Tuscolana ed Anagnina;
- l'Ardeatina e la statale Pontina,
- l'autostrada per l'aeroporto e la strada comunale Pisana.

Un primo programma di completamento (lotti 16, 17, 17b, 18b, 19, 22a,23b) prevede l'eliminazione delle soluzioni di continuità esistenti sul tratto compreso tra le autostrade Roma - Firenze, Roma - L'Aquila, Roma - Napoli e Roma - Fiumicino, dove sono state avviate le progettazioni esecutive, propedeutiche all'appalto dei lavori ed intrapresi i rapporti con gli Enti e Amministrazioni competenti per il rilascio dei prescritti pareri relativi all'impatto delle opere sul territorio.

Per la restante tratta compresa tra la statale n.1 via Aurelia e la statale n.3 via Flaminia sono state avviate le progettazioni preliminari e definitive, in particolare per il tratto Flaminia - Salaria, nuovo ponte di Castel Giubileo e per il tratto Aurelia svincolo di Boccea.

L'ampliamento a tre corsie per ogni senso di marcia è previsto, nella quasi totalità del percorso, su uno o su due lati in aderenza al corpo stradale esistente del quale mantiene le stesse caratteristiche geometriche di tracciato.

Allo stato attuale non si registrano ostacoli significativi all'esecuzione dei lavori che nella totalità dei casi procede secondo il programma concordato con l'impresa ed approvato dalla Direzione Lavori dell'Anas.

E' doveroso far rilevare che le opere di allargamento del G.R.A. e della Roma - aeroporto di Fiumicino per la realizzazione della terza corsia insistono su aree intensamente antropizzate con la presenza di edifici anche industriali o destinati ad attività commerciale di grande interesse economico.

L'occupazione delle relative pertinenze ha generato nella quasi totalità dei casi un contenzioso che non sempre è stato facile risolvere.

E' risultato indispensabile procedere all'occupazione dei relativi piazzali.

Si è resa necessaria nella totalità dei casi l'indagine archeologica e l'adeguamento della fitta rete di servizi interferenti con i lavori stradali.

3.4.5 Interventi inerenti le "Aree basilicali"

Si tratta di un insieme di interventi per un finanziamento globale di circa 73 miliardi nelle seguenti aree basilicali:

- Area della Basilica di San Pietro (C-02-01/1);
- Area della Basilica di S. Giovanni, S. Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme (C-02-02/2);
- Area della Basilica di San Paolo (C-02-03/1);

aventi per oggetto l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione

delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini. Beneficiario era il Comune di Roma che però ha preferito mantenere, per motivi di snellimento procedurale, la sola titolarità degli interventi di effettiva competenza.

In tal senso, per ogni area, l'intervento principale (infrastrutture e sistemazioni superficiali) è rimasto al Comune di Roma, mentre quelli accessori sono stati affidati alle società comunali competenti, al Ministero dell'Interno, alle Ferrovie dello Stato e alle Amministrazioni patriarcali delle Basiliche.

Gli interventi attuali sottoelencati risultano dalla disaggregazione di tre interventi finanziati nella prima stesura del Piano (uno per ogni area basilicale) per ognuno dei quali si indica il finanziamento in milioni di lire:

Intervento	Soggetto attuatore	San Pietro	San Giovanni	San Paolo
A - Infrastrutture a rete. Strutture temporanee	Comune di Roma	25.955	22.213	13.500
B - Illuminazione pubblica	ACEA	1.869	3.864	1.944
C - Impianti semaforici e pannelli informativi	STA	1.786	224	615
D - Risanamento igienico-ambientale	AMA	907	1.457	386
E - Impianti tecnologici TVCC, Sicurezza	Ministero Interno	2.805	3.285	1.491
F - Percorso pedonale Ponte Gelsomino	F.S.	1.446		
G - Restauro transetto Basilica	Amm. Patriarcale			1.256
Totale		35.141	28.686	19.192

Gli interventi principali sono stati ulteriormente suddivisi in cantieri, la cui situazione è ricapitolata di seguito.

Area Basilicale di San Pietro:

L'intervento è stato articolato in 3 cantieri, da appaltare separatamente, contrassegnati dalle seguenti sigle:

CON (Via della Conciliazione) 7.248 ml

La progettazione non è stata approvata dalle Soprintendenze. La Commissione incaricata si sta orientando alla eliminazione del proposto rialzo della sede stradale. La nuova progettazione dovrà essere effettuata dalla STA. Tempi di esecuzione da determinare

RIS (Piazza Risorgimento) 10.250 ml
BOR (Ristrutturazione di Borgo) 3.197 ml

Le progettazioni definitive sono state approvate dalla Conferenza dei Servizi il 15/09/98; le progettazioni esecutive sono in corso e gli appalti sono previsti all'inizio del 1999. La durata dei lavori dovrebbe essere di 6-8 mesi.

Area Basilicale di San Giovanni:

L'intervento è stato articolato in 4 cantieri, da appaltare separatamente, contrassegnati dalle seguenti sigle:

MAR (S. Maria Maggiore) 4.005 ml
CRO (S. Croce in Gerusalemme) 1.583 ml

Le progettazioni definitive sono state approvate dalla Conferenza dei Servizi il 15/09/98; le progettazioni esecutive sono in corso e gli appalti sono previsti all'inizio del 1999. La durata dei lavori dovrebbe essere di 6-8 mesi.

GIO (Piazza di Porta S. Giovanni) 8.171 ml

La progettazione non è stata approvata dalle Soprintendenze che hanno richiesto di adottare una sistemazione temporanea per il 2000, per poi trasferirla altrove. Le varianti progettuali dovranno essere effettuate dalla STA e poi appaltate. Tempi di esecuzione da determinare.

QUA (Via dei SS. Quattro) 1.533 ml

Progettazione esecutiva completata. Delibera indizione gara in preparazione. Inizio lavori previsto gennaio 1999, durata 4-6 mesi.

SOT (Sottopasso Piazzale Appio) 3.202 ml

L'ufficio cantieri ha sollevato obiezioni per il forte impatto sul traffico della costruzione; le interferenze con i sottoservizi sono rilevanti. La fattibilità dell'intervento è in discussione.

Area Basilicale di San Paolo:

L'intervento è stato articolato in tre cantieri, da appaltare separatamente, contrassegnati dalle seguenti sigle:

PAO (San Paolo, area limitrofa alla Basilica e Parco Schuster) 7.351 ml

La progettazione definitiva è stata approvata dalla Conferenza dei Servizi il 15/09/98; la progettazione esecutiva è in corso e l'appalto è previsto all'inizio del 1999. La durata dei lavori dovrebbe essere di 4-6 mesi.

OST (Via Ostiense) 1.679 ml

Progettazione esecutiva completa. Delibera indizione gara in preparazione. Inizio lavori previsto gennaio 1999, durata 4-6 mesi.

LUN (Lungotevere San Paolo) 1.552 ml

b - Gli interventi dell'ACEA comprendono l'adeguamento dell'illuminazione pubblica. Le progettazioni sono avviate e saranno completate non appena sarà definita la progettazione STA. Non si prevedono difficoltà esecutive.

c - L'intervento, affidato alla STA, sugli impianti semaforici e pannelli informativi, è stato progettato ed è pronto per l'appalto. La STA ha proposto di affidarlo ad un unico appaltatore.

d - Gli interventi dell'AMA comprendono attività di disinfezione, disinfestazione e rattizzazione delle aree basilicali. L'AMA ha definito le aree specifiche per tipologia d'intervento e la programmazione strategica negli anni 1999 e 2000. Non si prevedono difficoltà esecutive.

e - Il Ministero dell'Interno realizzerà interventi per il potenziamento del livello di sicurezza delle basiliche e delle aree circostanti. Affidamenti per oltre metà delle forniture sono già intervenuti, mentre gli altri (riguardanti apparecchiature

radiografiche a struttura fissa e metal detector a porta) sono previsti per metà dicembre p.v. Ulteriori apparecchiature minori per la sicurezza (metal detector portatili per armi ed esplosivi) saranno acquistati successivamente.

f - Per il percorso pedonale protetto Ponte Gelsomino la progettazione è stata approntata da FS, ma l'appalto non è stato ancora affidato dato che l'ente propone di inserirla in un più vasto piano di opere di urbanizzazione della Stazione S. Pietro per il quale il finanziamento deve ancora essere assicurato.

3.4.6 Principali interventi per la sanità

Degli interventi indicati nel seguente prospetto riepilogativo, sono in fase di esecuzione tutti quelli ricompresi nella categoria "lavori" (con completamento previsto nell'ultimo trimestre '99), mentre gli interventi per "forniture" sono in fase di aggiudicazione.

Intervento	Cat.	Beneficiario	Descrizione/Importo
Ospedale Santo Spirito	(L)	USL RME	DEA 1° livello 25 mld
Ospedale San Giovanni	(L)	Complesso San Giovanni Addolorata	DEA 2° livello 10 mld
Ospedale Sant'Eugenio	(L)	USL RMC	DEA 2° livello 30 mld
Ospedale Grassi - Ostia	(L)	USL RMD	DEA 1° livello 6 mld
Policlinico Gemelli	(L)	Univ. Sacro Cuore	DEA 2° livello 15 mld
Policlinico Gemelli	(L)	Univ. Sacro Cuore	Struttura Sanitaria di Ospitalità protetta 7 mld
Policlinico Umberto I	(L)	Azienda Polic. Umberto I	DEA 2° livello 10 mld
Ospedale San Filippo Neri	(L)+(F)	Azienda Ospedaliera San Filippo Neri	Unità terapia intensiva 3 mld
Manutenzione sede Osserv. Epidemiologico Regionale	(L)	Protettorato San Giuseppe	1,8 mld
Ospedale Spallanzani	(L)	IRCCS Lazzaro Spallanzani	Laboratorio 9,3 mld
Completamento servizio emergenza	(F)	Azienda Osp. San Camillo Forlanini	Sistema regionale di emergenza 118 (Lazio) 10,5 mld

Il monitoraggio degli interventi afferenti la categoria "Lavori", con particolare riferimento alle realizzazioni delle Strutture Emergenza/Accettazione, ha messo in luce i seguenti aspetti:

- ritardi nell'assegnazione dei lavori per tutti gli interventi rispetto ai tempi inizialmente programmati, eccetto l'Ospedale Santo Spirito;

- ritardi nelle consegne delle aree effettuate (in tutti i casi sotto riserva di legge), nelle more della stipula dei contratti con le imprese;
- difficoltà nella fase iniziale dei lavori in relazione ai necessari spostamenti di servizi esistenti, in conseguenza dell'obbligo di realizzazione in regime di operatività della struttura sanitaria. Fa eccezione l'Ospedale Santo Spirito dove si è optato per la chiusura dei servizi durante i lavori.

Si nota altresì che nel caso di alcuni interventi per Lavori (vedi ospedali: San Giovanni, Sant'Eugenio, Policlinico Gemelli, Spallanzani) è prevista un'ulteriore gara di appalto per l'acquisto di attrezzature, che risultano indispensabili per la fruibilità complessiva dell'opera da consegnare. Attualmente si registra ritardo nella definizione delle attrezzature e nell'indizione delle gare per l'acquisto delle stesse.

Nel quadro degli interventi concernenti il settore sanitario si segnalano come particolarmente complesse le opere di ristrutturazione dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) negli ospedali Santo Spirito, Policlinico Gemelli e Sant'Eugenio.

La chiusura dell'Ospedale Santo Spirito ha permesso un rapido sgombero delle aree con conseguente avanzamento dei lavori in linea con i programmi prefissati.

Può invece diventare critica la situazione negli altri due ospedali citati.

Al Policlinico Gemelli l'assegnazione dei lavori è avvenuta con ritardo rispetto ai programmi e ciò è problematico tenendo conto della complessità dell'opera da realizzare: piastra servizi, edificio di sei piani all'interno del quale il servizio DEA +2° livello, finanziato dalla 651/98, occupa soltanto 2 livelli. Le opere di fondazione sono appena iniziate; si sono registrati ritardi e difficoltà nella deviazione e sistemazione provvisoria dei servizi esistenti. Potenziali margini di recupero della presente situazione di difficoltà si potranno determinare successivamente, quando si disporrà di uno stato di avanzamento lavori più consistente di quello attuale.

All'ospedale Sant'Eugenio le opere sono state assegnate con ritardo a causa di difficoltà sorte nella fase di approvazione del progetto in Conferenza di Servizi. Altri problemi sorti nella fase di consegna delle aree di progetto hanno ritardato l'inizio dei lavori e costretto la direzione lavori a rivedere i programmi iniziali. Si valutano comunque realistiche le possibilità di recupero dichiarate dalla direzione lavori.

3.4.7 Principali interventi concernenti la "sicurezza"

Nel Piano così come definito ed adottato nel settembre 1996, gli interventi riguardanti espressamente la "sicurezza pubblica" facevano parte del settore E "Servizi speciali e formazione", sotto-settore 05 "Sicurezza pubblica e protezione civile" ed erano i seguenti:

- E.05.01 – Sicurezza Pubblica (Lazio, Roma) Piano degli interventi di potenziamento e adeguamento tecnologico del Sistema di Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno – Finanziamento 5 miliardi.
- E.05.02 – Sistemi e servizi per la protezione civile (Lazio, Roma) Piano degli interventi e dei servizi per la sicurezza e la protezione civile – Dipartimento della Protezione civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Finanziamento 1 miliardo.

Oltre a quelli anzidetti erano previsti tre interventi inerenti la “Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)” aventi come soggetto beneficiario il Comune di Roma ed un finanziamento complessivo di 20 miliardi di Lire.

Con le successive modifiche ed integrazioni al Piano, la Commissione ha provveduto, ponendoselo anche quale autovincolo, a destinare le somme rivenienti da definanziamenti e ribassi d’asta soprattutto al sotto-settore “sicurezza pubblica e protezione civile”, data la sua importanza strategica ai fini delle celebrazioni del Giubileo del 2000.

I finanziamenti destinati a tale sotto-settore sono difatti passati dai 6 miliardi iniziali agli attuali 178.

3.4.8 Area per Grandi Eventi presso Tor Vergata

Nel Piano sono previsti Lit. 3 miliardi (cod. D 22.01) destinati alle spese di progettazione per la realizzazione a Tor Vergata, del Centro di Accoglienza per la Manifestazione come previsto dal protocollo d’Intesa, in data 30.6.1998, sottoscritto dai seguenti soggetti istituzionali e non : Santa Sede, Regione, Provincia, Comune di Roma, Commissariato Straordinario, Agenzia per il Giubileo, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Con l’anzidetto protocollo è stato approvato dal Commissario Straordinario di Governo, dalla Santa Sede, dall’Università di Roma “Tor Vergata”, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, dal Comune di Roma, il progetto di prefattibilità elaborato dall’Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. per lo svolgimento, nell’area dell’Università di Tor Vergata, della 15° Giornata della Gioventù, che si svolgerà nel corso dell’anno 2000.

Stante la complessità della progettazione che coinvolge competenze dirette di molteplici istituzioni e soggetti, è stata ravvisata dal Comune di Roma l’opportunità di ricondurre ad unità tutte le attività finalizzate all’organizzazione della manifestazione attraverso una complessa azione tecnica di coordinamento sia progettuale che operativo.

Con apposita convenzione in data 15.10.1998 tra il Commissario Straordinario di Governo, il Comune di Roma, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio è stato incaricato dell’attività di coordinamento della progettazione degli interventi strutturali, infrastrutturali provvisori e definitivi connessi alla realizzazione del Centro di Accoglienza nel comprensorio Universitario

di Tor Vergata per la celebrazione della 15° giornata Mondiale della Gioventù in occasione del Giubileo 2000.

A seguito di numerose riunioni tra tutti i soggetti coinvolti nella manifestazione, il Provveditorato ha predisposto, con l'apporto della propria struttura tecnica, una proposta di progetto preliminare, individuando gli interventi indispensabili per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

L'azione di coordinamento svolta ha consentito, infatti, di elaborare il progetto preliminare attraverso una stretta e fattiva collaborazione tra le varie Amministrazioni Statali (Ministero dell'Interno, Prefettura, Questura, Ministero Beni Culturali, Soprintendenze, Protezione Civile, Università), locali (Regione, Provincia, Comuni) e le Società di Servizio (ENEL, ACEA, AMA) e di utilizzare Studi e Programmi, già esistenti, che, per molteplici motivazioni, non erano stati oggetto di ulteriori sviluppi.

In particolare il territorio interessato dalla manifestazione, compreso tra la Via Casilina, il GRA, la Via Tuscolana ed attraversato dal tratto terminale dell'A2, riveste una notevole importanza strategica per il futuro sviluppo urbano con riferimento sia alla limitrofa area individuata per lo SDO, di cui alla Legge 396/90 sia per la presenza dell'Università "Tor Vergata" in fase di ultimazione.

Per tali motivazioni, questo quadrante, posto a sud-est della città, era già stato oggetto di numerosi studi da parte dei Dipartimenti tecnici del Comune di Roma finalizzati alla razionalizzazione viaria del territorio proprio in previsione del futuro sviluppo indotto dal trasferimento nello SDO, di attività del settore terziario.

Inoltre, a tutt'oggi il Comprensorio Universitario di "Tor Vergata" risulta ancora completamente sconnesso dal territorio circostante con conseguente difficile accessibilità da parte degli utenti.

In ultimo la costruzione della terza corsia del GRA in avanzata fase di realizzazione ha costituito una ulteriore barriera al collegamento sia dell'Università che del limitrofo territorio urbano con il resto della città.

Per quanto sopra il Provveditorato in relazione all'attività di coordinamento affidata ha prefissato i seguenti obiettivi in ordine di priorità:

- Come primo obiettivo con la collaborazione del Comune di Roma, della Provincia e della Regione si sono individuate quelle opere infrastrutturali viarie che consentissero di collegare il Comprensorio universitario al limitrofo tessuto urbano sia per consentire lo svolgimento della manifestazione con idonei standards di accessibilità per il flusso ed il deflusso dei partecipanti sia per rendere in modo permanente funzionale ed organico il territorio urbano esistente con adeguate direttrici varie.
- Come secondo obiettivo si è imposto il limite progettuale di non sovvertire o modificare lo sviluppo del programma universitario preventivato individuando quegli interventi, già previsti che potevano essere anticipati senza danno per i programmi di costruzione in esecuzione.
- Come terzo obiettivo si è preordinato di limitare in relazione alla manifestazione, le modifiche ambientali del Comprensorio Universitario, che si sviluppa per circa 300 ettari, proponendo un intervento di rinaturazione a verde, l'eliminazione degli

elettrodotti ENEL ed ACEA ad alta tensione presenti, la chiusura di una vecchia cava esistente, il recupero e pulizia dei fossi esistenti per il ripristino idrologico dell'area, la bonifica degli ordigni bellici.

Sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo, della Protezione Civile e della Questura si sono poi ipotizzate quelle opere, a carattere provvisorio, connesse alla Manifestazione che ne consentissero in sicurezza lo svolgimento, Tali interventi consistenti principalmente nella viabilità provvisoria, nell'allestimento dei centri servizi, nella distribuzione impiantistica per l'illuminazione, la diffusione sonora, visiva e telefonica e nella dotazione dei servizi igienici-sanitari sono stati ipotizzati prevedendone la rimozione ed il ripristino dopo la manifestazione.

La proposta di progetto preliminare è stata trasmessa a più di 40 soggetti coinvolti sull'argomento ed è stata convocata in data 20.11.1998 apposita Conferenza di Servizio sull'argomento al fine di verificare la possibilità di proseguire l'attività progettuale propedeutica alla realizzazione.

In data 20.11.1998 la Conferenza di Servizi sulla proposta di progetto preliminare si è regolarmente svolta con esito positivo, consentendo di acquisire ulteriori indicazioni e suggerimenti progettuali.

Sono stati, quindi, predisposti i progetti definitivi dei singoli interventi inclusi nella proposta di progetto preliminare al fine di proseguire l'attività approvativa.

Il Comune di Roma ha delegato al Provveditorato anche la predisposizione delle progettazioni definitive degli interventi di propria competenza, possibilità prevista nella citata convenzione in data 15.10.1998.

In data 23.12.1998, come previsto nel cronoprogramma allegato al progetto preliminare i progetti definitivi sono stati consegnati dalla competenti Amministrazioni al Provveditorato per la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri definitivi sulle singole opere:

I progetti definitivi predisposti sono stati i seguenti:

A. Infrastrutture stradali urbane previste nei programmi del Comune di Roma di riorganizzazione varia del quadrante Sud-Est della città. Opere permanenti in variante al PRG vigente

- 1 Svincolo del collegamento Romanina – Tor Vergata e viabilità complementare;
- 2 Svincolo di collegamento Torrenova – Tor Vergata e viabilità complementare;
- 3 Completamento tangenziale Tor Vergata – Casilina;
- 4 Collegamento Via del Fosso di S. Maura – Viale dei Romanisti;
- 5 Soprapasso GRA – Collegamento Romanina – Via Alimena.

B. Interventi permanenti di Urbanizzazione primaria previsti nei programmi del Comune di Roma:

- 6 Collettore fognario nell'area Tor Vergata – Tronco 1 – Casilina – Nuovo Policlinico;
- 6/a Collettore fognario nell'area Tor Vergata – Tronco 2 – Policlinico – Fosso del Lombardo;

- 7 Cabina primaria ENEL
- C. Infrastrutture stradali Università di Roma "Tor Vergata" di collegamento area universitaria con il territorio circostante. Opere permanenti conformi agli indirizzi del vigente Piano di assetto generale dell'Università, oggetto di apposito Accordo di programma in fase di revisione
- 8 Collegamento area universitaria – Via del Vermicino (in parte Comune di Roma e in parte Comune di Frascati);
- 8/a Collegamento area universitaria – Via del Vermicino – tratto ASI Stazione FF.SS. (manutenzione straordinaria stradale Provinciale);
- 9 Collegamento area universitaria Via Casilina – GRA;
- 10 Viabilità di secondo livello di collegamento interno complesso edilizio Universitario.
- D. Interventi permanenti di recupero ambientale del territorio Universitario:
- 11 Bonifica ordini bellici;
- 12 Recupero ambientale della cava;
- 13 Sistemazione fossi;
- 14 Rinaturazione a verde del territorio.
- E. Opere infrastrutturali provvisorie finalizzate alla predisposizione dell'area universitaria per accogliere le manifestazioni:
- 15 Viabilità provvisoria compreso i ripristino;
- 16 Impianti idrico-sanitari (potabile e non potabile);
- 17 Impianti elettrici;
- 18 Impianti audio;
- 18/a Impianti video (maxi schermo);
- 18/b Impianti telefonici;
- 19 Recinzione perimetrale comparti;
- 20 Allestimento delle attrezzature per i servizi nell'area delle celebrazioni (servizi igienici chimici – cartellonistica – segnaletica).
- F. Opere permanenti di edilizia universitaria conformi agli indirizzi del vigente Piano di Assetto Generale dell'Università:
- 21 Parcheggi a raso e pluripiano di pertinenza del Policlinico.

Sono stati inoltre predisposti ulteriori due progetti preliminari relativi ad infrastrutture stradali urbane, anch'essi previsti nell'ambito dei futuri programmi di riorganizzazione viaria del Comune di Roma, richiesti dal Comune stesso per aumentare l'accessibilità e la funzionalità del Comprensorio universitario sia in relazione alle manifestazioni che al futuro sviluppo urbano della città del quadrante Sud-Est.

Gli ulteriori preliminari predisposti sono i seguenti e si pongono anch'essi in variante rispetto al vigente PRG:

- Collegamento stradale tra Cinecittà est – Via Ciamarra – Via Scinto – Osteria del Curato;

- Collegamento stradale tra viabilità complementare svincolo Romanina - Tor Vergata e Via Tuscolana;

I progetti pervenuti sono stati verificati per accertare sia la rispondenza alla proposta preliminare che per controllare il recepimento di tutte le indicazioni le prescrizioni e i pareri già resi dalle varie Amministrazioni.

Effettuata la verifica è stata quindi predisposta la Convocazione per la Conferenza di Servizi del 12.1.1999.

4 GESTIONE FINANZIARIA.**4.1 Situazione al 31 dicembre 1998.**

Il Piano è stato più volte rimodulato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha modificato, aumentando o diminuendo, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali di cui si è già detto precedentemente.

La situazione finanziaria del Piano a fine '98, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000				
INDICATORI FINANZIARI				
Suddivisione per settori - Situazione al 31/12/1998				
Settori	Assegnazioni al 31/12/1998	Impegni	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	300.498	161.174	53,6%	130.489
Settore B - Beni culturali	559.225	418.003	74,7%	364.022
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	573.907	81.856	14,3%	35.267
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	1.383.552	601.934	43,5%	324.986
Settore E - Servizi speciali e formazione	489.716	137.582	28,1%	116.060
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	180.359	64.512	35,8%	50.529
Fondo (1)	12.743	-	-	-
TOTALE	3.500.000	1.465.066	41,8%	1.021.353

(1) La cifra di circa 12,7 miliardi alla creazione di un fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, che per poter far fronte alle maggiori occorrenze dovute a varianti o ad accordi bonari.

Anche per ciò che concerne l'attuazione finanziaria del Piano, la Commissione con Delibera n.3/98, recepita con DM in data 15 maggio 1998, ha apportato significative modifiche a quanto in merito stabilito negli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" dalla Commissione medesima deliberati subito dopo la definizione e l'adozione del Piano (Allegato A del DPCM in data 11/12/96).

Tali modifiche hanno riguardato, fra l'altro, le modalità e l'entità delle anticipazioni da erogarsi ai soggetti beneficiari dei finanziamenti in relazione alla realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità. Particolarmente significativo, anche al fine dello snellimento procedurale, è la riduzione di un passaggio nella procedura di erogazione dei fondi a valle dell'aggiudicazione della gara di appalto. Difatti mentre con il precedente criterio l'erogazione avveniva con un primo anticipo del 20%, quindi con uno del 30% ed un successivo fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato, con le modifiche apportate il primo anticipo è passato al 50% ed il successivo al 35%, ferma restando l'erogazione delle somme residue dopo l'emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione.

4.2 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 dicembre 1998 sono stati:

- assunti impegni per	Lit.1.083.456.318.309
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero Interni	Lit. 50.000.000.000
- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE	Lit. 1.465.065.818.30

A fronte dei predetti impegni sono state effettuate erogazioni per Lit. 1.021.353.000.000, pari a circa il 30% delle risorse assegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 1.083.456.318.309, si riferiscono al finanziamento di n. 340 interventi e più precisamente:

- risultano emessi n. 265 decreti di impegno pari al 5% dell'importo dell'assegnazione finanziaria del singolo intervento, per consentire al soggetto beneficiario di provvedere alla progettazione dell'intervento per un complessivo importo di Lit. 94.943.267.588. Contestualmente si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni di pagamento ed i titoli di spesa;
- Sono stati emessi n. 205 Decreti di impegno per l'importo di Lit. 980.363.747.308 ai fini della realizzazione degli interventi, ed emessi n. 300 autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50% e successivamente fino alla concorrenza dell'85% degli impegni sopracitati. Delle predette anticipazioni Lit. 292.459.015.506 si riferiscono a lavori e Lit. 81.392.828.130 riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi;

- In unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane Lit. 42.740.000.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di 50 miliardi trasferita al Ministero degli Interni si riferisce a n. 7 interventi in materia di sicurezza.

5 LA VIGILANZA

5.1 Il Monitoraggio

5.1.1 Il quadro normativo

Fin dal primo D. L. in data 26 aprile 1996, n. 225, recante "Misure urgenti" per la predisposizione di un insieme coordinato di interventi finalizzati alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000, il legislatore aveva previsto l'attuazione di una attività di "monitoraggio permanente, sia qualitativo che quantitativo" da effettuarsi in base ai criteri indicati dalla Commissione preposta alla definizione e gestione programmatica del Piano. Tale previsione è stata mantenuta anche nei successivi decreti di reitero.

La legge di conversione n. 651, del 23 dicembre 1996, nel confermare sostanzialmente quanto previsto nei decreti precedenti in materia di "monitoraggio" degli interventi, ha però introdotto alcune modifiche ed integrazioni che, da un lato hanno rafforzato la rilevanza della suddetta attività ai fini programmatori, stabilendo un collegamento organico fra la stessa e quella di "riprogrammazione del piano" (art. "il piano può essere modificato ed integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio.."), e, dall'altra, ha introdotto elementi chiarificatori in merito all'individuazione del "soggetto o dei soggetti" cui affidare tale attività. Se nei decreti il compito di assicurare il monitoraggio "in maniera coordinata" compete ai soggetti beneficiari dei finanziamenti, nella legge viene mantenuta tale competenza, ma si parla di "maniera unitaria" indicando così implicitamente la necessità dell'unicità del "soggetto monitore", mentre viene mantenuta la competenza del Ministro dei lavori pubblici in merito alla vigilanza e monitoraggio delle opere pubbliche di competenza dello Stato.

Forse per la prima volta, in un piano coordinato di interventi di natura prevalentemente edilizia e di così rilevante impegno economico-finanziario, si è inteso far ricorso a quella forma di "rilevazione sistematica" che, da tempo, in altri contesti extranazionali, contribuisce ad un efficiente ed efficace realizzazione di programmi di investimento pubblico.

5.1.2 La Metodologia e le procedure per l'affidamento

Con DPCM in data 5 novembre 1996 l'U.R.C.G.E. è stato incaricato di "coordinare ed armonizzare le ipotesi di criteri di monitoraggio e di presentare uno schema unitario di criteri di monitoraggio da sottoporre alle determinazioni della Commissione": Con DPCM in data 11 dicembre 1996 sono stati approvati i "Criteri per il Monitoraggio" elaborati dall'U.R.C.G.E.

Sulla base di tali disposizioni l'U.R.C.G.E. ha provveduto preliminarmente a specificare la natura e l'articolazione dei servizi di monitoraggio da richiedere al soggetto monitore, partendo dall'assunto che per "monitoraggio" debba intendersi l'organizzazione di una serie di attività tese a massimizzare la probabilità che un progetto, venga realizzato con il minimo impiego di risorse economiche ed in modo da conseguire i risultati quantitativi e qualitativi voluti originariamente, ovvero quelli ridefiniti in corso d'opera in seguito a nuove circostanze e nuove conoscenze. L'attività di monitoraggio, perché abbia significato deve, quindi, contemplare anche adeguati meccanismi di retroazione che permettano una possibile revisione degli obiettivi in base alle risultanze del processo di monitoraggio stesso.

La caratteristica fondamentale dell'attività di monitoraggio è, pertanto, la sistematica verifica dell'avanzamento di un determinato intervento. Questa può essere effettuata attraverso l'individuazione di specifici indicatori attraverso i quali misurare gli scarti tra quanto previsto e quanto realizzato. Il principale problema da definire nella fase di progettazione di un sistema di monitoraggio è, quindi, lo studio e la specificazione degli indicatori più adatti al tipo di intervento da sottoporre a controllo.

In base a tali considerazioni si è ritenuto che la attività di monitoraggio di norma riguardi:

- la fase ex ante: messa a punto del progetto e la selezione e ammissione al finanziamento;
- la fase on going: implementazione e controllo sulla gestione dei fondi;
- la fase ex post: verifica e collaudo dei risultati.

All'interno di un processo di monitoraggio si possono, pertanto, distinguere tre livelli:

- quello della raccolta dei dati di avanzamento degli interventi e di organizzazione di un sistema informativo;
- quello del controllo e della certificazione, intesi come aspetto formale dell'attuazione degli interventi;
- quello della diagnostica e delle raccomandazioni, intesi come aspetti propriamente valutativi dell'intervento.

L'U.R.C.G.E. ha ritenuto che nel caso in esame i servizi dovessero essere:

- l'acquisizione, al fine di preconstituire un quadro di riferimento rispetto al quale riportare i successivi riscontri, di informazioni relative alle caratteristiche strutturali degli interventi contenuti nel Piano;
- il rilevamento dei dati consuntivi degli adempimenti in relazione alle diverse fasi attuative degli interventi (progettazione, affidamento dei lavori, stipula contrattuale, inizio dei lavori, esecuzione dei lavori e collaudo dei lavori);
- confronto dei dati consuntivi con quelli del quadro di riferimento iniziale in modo da rilevare gli scostamenti e da permettere le opportune decisioni e azioni;
- analisi ed organizzazione dei dati rilevati in un sistema informativo unificato in grado da renderli disponibili ai soggetti competenti;
- elaborazioni di grafici e tabelle con l'impiego di procedure informatizzate,

compatibili con il sistema informativo unificato utilizzato dall'U.R.C.G.E, sulla scorta dei dati del singolo intervento e delle eventuali interconnessioni spazio - temporali con altri interventi del contesto;

- elaborazione trimestrale di indicatori sintetici attinenti ai costi, ai tempi, ai fabbisogni e gli aspetti ambientali, tecnologici e procedurali, di competenza del Ministro delegato per le aree urbane, della Commissione.

Per quanto riguarda la specificazione degli indicatori in base ai quali valutare l'andamento degli interventi, l'U.R.C.G.E. ha ritenuto necessario preliminarmente individuare, per ogni intervento, oltre ai normali indici fisici, amministrativi e finanziari, anche un indice, definito indice di criticità, che permettesse di misurare quale fosse il rischio che un intervento non fosse realizzato nei tempi programmati.

L'U.R.C.G.E. ha individuato quali elementi di criticità degli interventi: il livello di definizione progettuale; il rapporto tra la durata degli adempimenti amministrativi e la durata complessiva dell'intervento; il rapporto tra il tempo residuo ed il tempo di esecuzione; il rapporto tra il costo dell'intervento e la durata dello stesso; la complessità di realizzazione anche in relazione alla priorità dell'obiettivo; la necessità di fare ricorso a procedure di variante urbanistica; la disponibilità dell'area; la dimensione sopra/sotto soglia comunitaria dell'appalto; ed ha determinato il loro contributo al suddetto indice impiegando il metodo del confronto a coppie.

Tale indice ha permesso di graduare quale dovesse essere, durante il monitoraggio, la cadenza temporale e il contenuto delle verifiche da effettuare. È stato, inoltre, programmato il ricalcolo di tale indice durante l'attività di monitoraggio. Qualora l'indice aumenta è previsto di incrementare i momenti di verifica e, se è possibile, di prendere delle decisioni correttive.

L'U.R.C.G.E. successivamente alla definizione dei contenuti del servizio di monitoraggio ha provveduto a predisporre gli elaborati necessari per indire la gara ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del soggetto monitore stabilendo, fra l'altro, che il compenso relativo alle prestazioni del servizio fosse previsto parte a corpo (a forfait) e parte a misura.

Sono stati predisposti:

- il disciplinare tecnico contenente la descrizione e le prescrizioni delle diverse attività da affidare;
- un elaborato contenente i criteri per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a corpo (tariffa);
- l'elenco dei prezzi unitari per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a misura.

Con DM in data 18 aprile 1997 la Commissione ha demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore di tutti gli interventi ricompresi nel Piano, a prescindere dalla titolarità degli stessi e, contestualmente, ha approvato il "Disciplinare tecnico e Capitolato d'onori" comprensivo dei principi generali relativi al monitoraggio degli interventi ricompresi nel Piano, nonché la modulistica unificata.

Con DM in data 24 giugno 1997 è stato inserito nel Piano senza codice

l'intervento denominato "Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo" con una dotazione finanziaria di Lit. 6 miliardi.

- il bando di gara;
- disciplinare di gara;
- schema di contratto.

L'U.R.C.G.E. ha quindi elaborato il Bando di gara e lo Schema di contratto, sulla base del quale è quindi indetta una gara a procedura aperta in ambito CEE, per un importo presunto di Lit. 5.743.582.000.

Il bando di gara è stato predisposto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 157/95.

In particolare per quanto riguarda le condizioni minime di carattere economico-finanziario e tecnico - organizzativo che dovevano essere soddisfatte dagli offerenti si sono seguiti, ove possibili, i criteri ed i parametri previsti dal D.P.C.M. n. 55/91 (bando tipo relativo alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori) e per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione è stato previsto di impiegare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata con la metodologia contenuta nel DPCM 27 febbraio 1997 n. 116.

Si è previsto di adoperare come elementi di valutazione il merito tecnico, le modalità organizzative dell'espletamento della commessa e modalità di assistenza tecnica all'U.R.C.G.E., la certificazione di qualità ed il ribasso percentuale da applicarsi al compenso a corpo ed ai prezzi unitari per i quali sono stati rispettivamente stabiliti i pesi di 40,15,5 e 40.

Il bando di gara, che prevedeva come termine per la presentazione delle offerte la data del 10 marzo 1998, è stato:

- inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) il 3 luglio 1997;
- pubblicato sulla GUCE S 132 in data 11 luglio 1997;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) Foglio Inserzioni n.159 in data 10 luglio 1997;
- pubblicato per estratto il 18 luglio 1997 sui seguenti quotidiani : Il sole 24 ore, La repubblica il Messaggero.

Il bando di gara prevedeva che i soggetti interessati a concorrere potessero ritirare direttamente all'Ufficio per Roma Capitale : il disciplinare di gara, lo schema di contratto, il disciplinare tecnico, la tariffa, l'elenco prezzi nonché l'elenco dei documenti da presentare a riprova del possesso dei requisiti previsti dal bando, nel caso di aggiudicazione.

Il termine per il ritiro della documentazione era fissato al 4 settembre 1997 ed a tale data risultavano 31 richieste di acquisizione della documentazione.

In data 2 settembre 1997 il Ministro per i lavori pubblici nominava, ai sensi di quanto disposto dal disciplinare di gara, la apposita Commissione giudicatrice. A tale Commissione, a norma del suddetto disciplinare, era demandato il compito di procedere, in seduta aperta al pubblico, all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed, in sedute riservate, alla valutazione

delle offerte tecniche, e, di nuovo in seduta aperta al pubblico, alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed alla compilazione della graduatoria dei concorrenti.

Al termine ultimo di presentazione, così come stabilito dal bando di gara, risultavano pervenute due offerte, presentate rispettivamente dall'ATI fra Italconsult S.p.A., SIM Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A. e l'ATI fra Bonifica S.p.A., Italeco S.p.A., Reconta Ernst & Young S.p.A..

La Commissione ha iniziato i propri lavori il giorno successivo al termine previsto dal bando per la ricezione delle offerte e, cioè, il giorno 5 settembre 1997. In tale seduta venivano ammesse alle fasi successive entrambe le due offerte pervenute.

Dopo la riunione aperta al pubblico, la Commissione ha tenuto altre cinque riunioni riservate per esaminare le offerte tecniche ed assegnare i relativi punteggi ai due concorrenti ammessi. La Commissione ha concluso i propri lavori il giorno 29 settembre 1997 nel corso di una seduta aperta al pubblico durante la quale sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche e stabilita la graduatoria definitiva dei concorrenti.

In data 3 ottobre 1997 l'U.R.C.G. sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione ha aggiudicato provvisoriamente il servizio all'ATI Italconsult S.p.A., SIM Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A.

Dopo i controlli e le verifiche previste dal Disciplinare di gara, il servizio è stato aggiudicato definitivamente il 5 dicembre 1997 e il 18 s.m. si è provveduto alla stipula del contratto d'appalto.

5.1.3 Relazioni trimestrali del Soggetto monitore - Sintesi

Come si è detto, il contratto con il Soggetto Monitore è stato sottoscritto a dicembre 1997. Per obbligo contrattuale esso era soggetto a produrre la prima Relazione Trimestrale sullo stato di attuazione del Piano entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'obbligazione.

La prima Relazione è pertanto stata consegnata ad aprile 1998 con riferimento al primo trimestre di quell'anno. Per consentire una lettura dell'evoluzione dello stato di attuazione del Piano durante il 1998, così come emergente dall'attività di "monitoraggio", si allegano di seguito le sintesi delle Relazioni prodotte dal Soggetto Monitore durante l'anno suddetto.

Va rammentato che la IV Relazione del Soggetto Monitore non ha potuto tenere conto degli effetti sul Piano delle modifiche allo stesso apportate dalla Commissione con la delibera della n. 6 del 1 dicembre 1998, che è stata recepita con DM in data 7 gennaio 1999. Eventuali leggere discrepanze fra i dati riportati dall'U.R.C.G.E. e dal Soggetto Monitore devono pertanto essere imputati a tale fatto.

Si segnala altresì che non sono sottoposti a monitoraggio tutti gli interventi ricadenti in aree extraterritoriali o concernenti immobili di proprietà della Santa Sede (S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano, S. Paolo Fuori le Mura).

• **I RELAZIONE - Situazione al 31/3/98**

- Struttura del Piano

A tale data 632 interventi del Piano erano sottoposti a monitoraggio, ripartiti in:

- N. 376 di categoria Lavori per un importo totale di 2.611 mld,
- N. 59 di categoria Forniture per un importo totale di 577 mld,
- N. 192 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 377 mld
- N. 5 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 135 mld.

- Stato di avanzamento

Su 632 interventi monitorati, 285 pari al 45% sono stati appaltati e di questi 215 interventi (pari al 34%) sono in fase di realizzazione, mentre 2 (pari al 0,3%) sono stati completati.

L'avanzamento medio del processo attuativo è del 40%.

La categoria relativa ai beni culturali è quella in più avanzata fase realizzativa, essendo il 94,3% degli interventi già stati appaltati (rispetto al 99,5% inizialmente previsto), mentre solo il 25,3% degli interventi della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 61,5% inizialmente previsto) ed il 14,5% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 56,7% inizialmente previsto). Appare evidente il forte ritardo sul previsto di queste due ultime categorie.

• **II RELAZIONE - Situazione al 30/6 /1998**

- Struttura del Piano

A tale data 720 interventi del Piano erano sottoposti a monitoraggio, ripartiti in:

- N. 447 di categoria Lavori per un importo totale di 2432 mld,
- N. 63 di categoria Forniture per un importo totale di 595 mld,
- N. 205 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 379 mld
- N. 5 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 144 mld.

- Stato di avanzamento

Su 720 interventi, 411 pari al 57% erano stati appaltati e di questi 307 interventi (pari al 42,5%) erano in fase di realizzazione, mentre 7 (pari al 1%) erano completati.

L'avanzamento medio del processo attuativo è del 40%, con un ritardo medio di 57 giorni negli affidamenti; l'avanzamento è inalterato rispetto a quello registrato alla fine del trimestre precedente a causa dell'inserimento di 88 nuovi interventi che hanno appena iniziato l'iter attuativo.

Viene confermato che la categoria dei beni culturali è quella in più avanzata fase di realizzazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre solo il 42,5% degli interventi della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 82,9% inizialmente previsto) e il 27,8% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 78,1% inizialmente previsto). E' evidente il forte ritardo sul previsto di queste due ultime categorie.

Notevole è l'avanzamento rispetto al trimestre precedente, con 411 (57%) interventi appaltati contro 285 (45%) nel trimestre precedente e 307 (42%) interventi in esecuzione contro 215 (34%) precedenti. In particolare nella categoria lavori si è passati dal 25% al 42% di interventi appaltati, mentre ancora molto arretrate sono le forniture passate dal 15% al 28% di interventi appaltati. L'avanzamento degli interventi dei beni culturali è stato minimo in quanto già quasi interamente appaltati (94% a marzo '98).

Il numero di interventi completato è passato da 2 a 7.

- Valutazione del "Rischio di ritardo finale"

Una valutazione di rischio di ritardo finale svolta su 611 interventi ha dato il seguente quadro:

- ALTO RISCHIO N. 73 per un importo totale di 933 mld (33%)
- MEDIO RISCHIO N. 215 per un importo totale di 1114 mld (40%)
- BASSO RISCHIO N. 315 per un importo totale di 647 mld (23%)
- RISCHIO NULLO N. 8 per un importo totale di 110 mld (4%)

Si ricorda che gli interventi ad alto rischio sono quelli la cui data di completamento è a ridosso della data di inizio delle celebrazioni giubilari (24 dicembre 1999) e che presentano rilevanti difficoltà d'attuazione/esecuzione.

• **III RELAZIONE - Situazione al 30/9/98**

- Struttura del Piano

A tale data 720 interventi del Piano erano sottoposti a monitoraggio, ripartiti in:

- N. 435 di categoria Lavori per un importo totale di 2163 mld,
- N. 71 di categoria Forniture per un importo totale di 606 mld,
- N. 205 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 354 mld,
- N. 9 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 284 mld.

- Stato di avanzamento

Su 720 interventi monitorati, 488 pari al 68% sono stati appaltati, di questi 359 interventi sono in fase di realizzazione e 19 sono stati completati.

L'avanzamento medio del processo attuativo è del 55%, con un ritardo medio di 94 giorni negli affidamenti ed un margine residuo medio di tempo tra il completamento e inizio Giubileo di 61 giorni.

La categoria "beni culturali" è quella che mantiene il più avanzato livello di attuazione, essendo tutti gli interventi già appaltati, mentre solo il 58,4% della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 90% inizialmente previsto) e il 40% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 95% inizialmente previsto).

Notevole è stato l'avanzamento della categoria lavori passata dal 42,4 al 58,4% di interventi appaltati, mentre minore è stato quello delle forniture passato dal 26,3 al 40%. L'avanzamento degli interventi su beni culturali è stato minimo in quanto già quasi interamente appaltati a giugno '98.

- Valutazione del "Rischio di ritardo finale"

La valutazione di rischio di ritardo finale riferita a 622 interventi ha dato il seguente risultato:

- ALTO RISCHIO N. 37 interventi per un importo totale di 901 mld (32%)
- MEDIO RISCHIO N. 254 interventi per un importo totale di 1143 mld (40%)
- BASSO RISCHIO N. 308 interventi per un importo totale di 647 mld (23%)
- RISCHIO NULLO N. 23 interventi per un importo totale di 133 mld (5%)

Rispetto alla valutazione di giugno '98, il numero di interventi ad alto rischio si è notevolmente ridotto (da 73 a 37), ma l'importo totale non è cambiato significativamente; molti interventi di importo ridotto hanno ottenuto una valutazione migliore, mentre sono stati inseriti nuovi interventi ad alto rischio, di importo elevato.

Tra i 38 interventi giudicati ad alto rischio 26 non sono ancora appaltati, mentre 11 sono in fase di esecuzione. La quasi totalità degli interventi a rischio (36) ricade nella categoria "lavori", mentre non se ne trova alcuno nella categoria relativa ai beni culturali, solo 1 nella categoria "forniture" e 1 nella categoria "incentivi".

• **IV RELAZIONE - Situazione al 31/12/98**

- Struttura del Piano

A tale data erano sottoposti a monitoraggio 746 interventi, ripartiti in:

- N. 446 di categoria Lavori per un importo totale di 2288 mld
- N. 82 di categoria Forniture per un importo totale di 665 mld
- N. 209 di categoria Beni Culturali per un importo totale di 365 mld
- N. 9 di categoria Incentivi o misti per un importo totale di 284 mld

- Stato di avanzamento

Su 746 interventi, 527 pari al 70% sono stati appaltati e di questi 407 interventi (pari al 55%) sono in fase di realizzazione, mentre 51 (pari al 7%) sono stati completati.

L'avanzamento nel processo attuativo è in media del 62%, con un ritardo medio di 100 giorni negli affidamenti.

La categoria dei beni culturali è quella più avanzata essendo tutti gli interventi già appaltati, mentre solo il 72,2% della categoria lavori sono stati appaltati (rispetto al 99% inizialmente previsto) e il 58% delle forniture è stato appaltato (rispetto al 98% inizialmente previsto). E' evidente il forte ritardo sul previsto di queste due ultime categorie.

Costante è stato l'avanzamento con 527 (70%) di interventi appaltati contro 488 (68%) nel trimestre precedente e 407 (55%) di interventi in esecuzione contro 359 (50%) precedenti. In particolare nella categoria lavori si è passati dal 58,4% al 72,2% di interventi appaltati, mentre minore è stato quello delle forniture passato dal 40% al 45%. Gli interventi dei beni culturali, già interamente appaltati a settembre '98, sono sempre nella stessa fase.

In termini percentuali l'avanzamento medio nel processo attuativo attuale del 62% rispetto al 55% registrato alla fine del trimestre precedente.

Il numero di interventi completato è passato da 19 a 51.

- Valutazione del "Rischio di ritardo finale"

Nel complesso con riferimento alle date di completamento previsto, si osserva un notevole "affollamento" di interventi in esecuzione nell'ultimo trimestre del '99 (molto superiore a quello già segnalato nel precedente trimestre): il 62% degli interventi per un importo dell'82% del totale termineranno (secondo i programmi) tra ottobre e dicembre '99. Ciò è preoccupante sia per il rischio di possibile superamento della data di inizio del Giubileo sia per la concomitanza di tanti cantieri, molti dei quali con forte impatto sulla città di Roma.

A tale proposito si contano attualmente 35 interventi con cantieri aperti a Roma con diretto impatto sulla circolazione e 28 di imminente apertura. Da osservare che in molti casi per ogni intervento viene aperto più di un cantiere. Del totale di 63 interventi "impattanti" 46 sono al centro città e 17 sono ubicati in periferia.

Una valutazione di rischio di ritardo finale svolta su 677 interventi ha dato il seguente quadro:

- ALTO RISCHIO N. 53 per un importo totale di 1077 mld (33%)
- MEDIO RISCHIO N. 240 per un importo totale di 1178 mld (37%)
- BASSO RISCHIO N. 326 per un importo totale di 759 mld (24%)
- RISCHIO NULLO N. 58 per un importo totale di 190 mld (6%)

Rispetto alla valutazione di settembre '98 il numero di interventi ad alto rischio è aumentato (da 37 a 53) ed anche l'importo totale è aumentato (da 901 a 1063 mld).

Tra i 53 interventi giudicati ad alto rischio, 29 riguardano lavori non ancora appaltati, 16 lavori appaltati, 7 forniture non ancora affidate e 1 è un incentivo (vedi punto 5.1.4).

• Valutazioni complessive del Soggetto Monitore sui quattro trimestri del 1998

In base ai dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno 1998 è stata costruita la tabella allegata che presenta i dati più significativi per documentare l'evoluzione dello stato di attuazione del Piano nel suo complesso e per le tre principali categorie di opere.

In merito il Soggetto monitore ha espresso le seguenti considerazioni:

- Si osserva un ritardo generalizzato nell'avanzamento degli interventi rispetto alla programmazione iniziale, con un aumento sensibile del ritardo medio negli affidamenti degli appalti ed un'analoga riduzione del margine finale previsto fra la data di completamento delle opere e la data d'inizio del Giubileo (24/12/99).
- I suddetti ritardi si sono riscontrati soprattutto nelle fasi amministrative (predisposizione delle progettazioni, approvazioni, gare d'appalto, affidamenti) conseguentemente, al fine di restare nei termini finali molti beneficiari hanno operato una riduzione dei tempi d'esecuzione delle opere.
- Riguardo alle diverse categorie si osserva che l'andamento generale è più favorevole per gli interventi dei beni culturali (75% di avanzamento medio a dicembre '98), e meno favorevole per i lavori (58% di avanzamento medio) e per le forniture (45% di avanzamento medio). Ovviamente gli interventi più critici si riscontrano nella categoria lavori, mentre per la loro natura le forniture richiedono tempi di esecuzione più rapidi e quindi possono più facilmente recuperare i ritardi.

- Costi: rimanendo l'importo totale del finanziamento entro i 3.500 miliardi stanziati dalla Legge, si osserva che il costo totale (comprensivo di altri finanziamenti) ha subito delle oscillazioni nel corso dell'anno a seguito delle rimodulazioni, mentre le economie (dovute a ribassi d'asta o riduzioni di costo) sono cresciute gradualmente fino a superare i 300 miliardi a fine anno.
- Criticità: si registra una graduale riduzione della criticità degli interventi evidenziata dall'incremento degli interventi giudicati a media o bassa criticità a scapito di quelli giudicati ad alta. Tra gli 85 interventi valutati ad alta criticità a fine del '98 si trovano essenzialmente quelli di importo più rilevante o quelli d'importo più ridotto, ma con forti ritardi nelle fasi amministrative o date di completamento a ridosso dell'inizio del Giubileo.
- Rischio: le valutazioni di rischio di ritardo degli interventi sono iniziate nel secondo trimestre del '98. Si ricorda che il giudizio di rischio tiene conto del livello di criticità, della valutazione dei ritardi nella fase di esecuzione e della possibilità di recuperarli.
Il numero degli interventi ad alto rischio è passato da 73 a fine giugno a 37 a fine settembre, per poi risalire a 52 a fine dicembre '98. Ricadono in questa categoria non solo gli interventi di importo più rilevante in ritardo di esecuzione, ma anche interventi di minore dimensione in forte ritardo nell'affidamento.

5.1.4 *Gli interventi ad "alto rischio"*

Si riporta di seguito l'elenco elaborato dal Soggetto Monitore in ordine agli interventi ritenuti ad "alto rischio", aggiornato al 31 dicembre 1998.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI AD ALTO RISCHIO - DICEMBRE 1998								
Codice	Categoria	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	lett. c)	lett. d)	Fase in corso	

LAVORI - NON APPALTATI

A	01	21	L	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma - Ufficio Città Storica	5.500.000	ott-98	nov-99	L5
A	07	03	L	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	1.110.000	ott-98	nov-99	L4
A	07	07/a	L	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	ott-98	nov-99	L4
A	07	10	L	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	800.000	ott-98	nov-99	L5
A	07	23	L	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	giu-98	giu-99	L6
A	07	25	L	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	ott-98	nov-99	L4
A	07	39	L	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	ago-98	ott-99	L5
B	19	39	L	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	set-98	dic-99	L4
B	20	02	L	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	2.985.000	nov-98	nov-99	L3
C	05	01/1	L	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma - Dip. X	3.300.000	dic-98	lug-99	L4
C	05	01/2	L	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma - Dip. X	1.700.000	dic-98	lug-99	L4
C	06	01	L	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma - Dip. X	3.500.000	set-98	giu-99	L4
C	07	01	L	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.000.000	ott-98	ago-99	L4
C	08	01/5	L	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	nov-98	lug-99	L3
C	09	02/2	L	Riqualficaz. parchi della Caffarella e degli Acquadotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma - Dip. X	5.500.000	ago-98	nov-99	L4
C	12	01	L	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma - Dip. X	4.600.000	dic-98	ago-99	L3

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	12	02	L	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	ott-98	mag-99	L3
C	13	01/2	L	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma - Dip. X	4.300.000	nov-98	nov-99	L4
C	18	04	L	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000	gen-99	ott-99	L4
D	13	12	L	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	6.200.000	ott-98	ott-99	L7
D	14	03	L	SP Laurentina (Roma) dal GRA fino al km 28+200. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria	Provincia di Roma	15.000.000	ott-98	ott-99	L7
D	14	06	L	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	6.210.000	ott-98	ott-99	L7
D	14	08	L	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	11.205.000	ott-98	dic-99	L7
D	20	02	L	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	20.000.000	dic-98	dic-99	L3
E	01	11	L	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	3.601.000	set-98	nov-99	L3
E	01	20	L	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	8.330.000	set-98	nov-99	L3
E	05	13	L	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	Ministero Difesa - Arma Carabinieri	26.500.000	dic-98	dic-99	L5
E	05	14	L	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero dell'Interno	19.000.000	set-98	dic-99	L5
E	05	19	L	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'Interno	11.000.000	lug-98	ott-99	L4
						N.29			182.098.000

LAVORI - APPALTI

A	01	16	L	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	633.593	dic-97	giu-99	L8
B	18	22	L	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	300.000	lug-97	gen-99	L8
B	19	33	L	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (I fase)	Provincia di Latina	5.000.000	dic-98	dic-99	L8
C	01	15/2	L	Via Appia Antica. 2° Lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	14.906.733	lug-98	nov-99	L8
C	03	03	L	Via delle Muratte	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	2.600.000	ott-98	nov-99	L8
D	07	02	L	Sottovia Lungotevere in Sassia	Provveditorato OO. PP. del Lazio	43.500.000	apr-98	dic-99	L8
D	08	01	L	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Provveditorato OO. PP. del Lazio	56.050.000	mag-97	giu-99	L8

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D	08	03	L	Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Prov. OO. PP. Lazio	15.390.000	ago-98	nov-99	L8
D	09	01	L	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	116.000.000	ago-98	dic-99	L8
D	10	01/a	L	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	67.044.994	feb-98	nov-99	L8
D	15	01/1	L	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	174.504.261	feb-98	dic-99	L8
D	16	01	L	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto)	Autorità portuale di Civitavecchia	88.075.341	nov-97	mag-99	L8
D	18	01/2a	L	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 1° stralcio	Comune di Roma - Dip. VII	20.940.000	ago-98	ago-99	L8
D	18	01/2b	L	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 2° stralcio	Comune di Roma - Dip. VII	79.970.000	ago-98	ago-99	L8
E	02	03	L	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del DEA di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	mar-98	ott-99	L8
E	02	05	L	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	15.000.000	feb-98	nov-99	L8
						N. 16	729.914.922		

FORNITURE (NON APPALTATE)

C	19	02	F	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	dic-98	nov-99	F3
E	05	04	F	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	24.948.000	mar-98	nov-99	-
E	05	06	F	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	8.252.000	mar-98	nov-99	-
E	03	01	F	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA	5.000.000	lug-98	nov-99	F3
E	05	18	F	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'Interno	4.046.000	giu-97	dic-99	F3
E	05	25	F	Acquisto eliambulanza	Min. Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	11.000.000	mag-98	ott-98	F5
F	05	02	F	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Ag. Romana Prep. Giubileo	5.000.000	ott-98	mag-99	F3
						N. 7	66.246.000		

INCENTIVI

A	08	01	I	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	lug-98	giu-99	I3
						N. 1	99.653.000		
TOTALE						N. 53	1.077.911.922		

5.2 La Vigilanza del Ministro dei lavori pubblici

Ai sensi del comma 8, art. 1 della legge 651/96 *“Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.”*.

Il Ministro dei lavori pubblici, avendo già provveduto ad assicurare il “monitoraggio”, come specificato in precedenza, tramite un unico soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica, prima con Circolare Ministeriale n. 1109/5074/447 del 3 febbraio 1998, poi con Direttiva ministeriale in data 15 settembre 1998 – pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998 – ha demandato lo svolgimento della funzione di “vigilanza” al Servizio di Ispettorato Tecnico sui lavori pubblici, operante presso il proprio Dicastero, ed ha, contestualmente, definito: i Criteri generali della vigilanza, l’Ambito soggettivo ed oggettivo della stessa, nonché i criteri in base ai quali esercitarla.

L’U.R.C.G.E. ha provveduto, a partire da agosto 1998, ha trasmettere al Servizio anzidetto l’elenco degli interventi ritenuti ad “Alto rischio” dal soggetto monitore - così come ha comunicato tale valutazione ai soggetti titolari dei medesimi interventi - permettendo così l’avvio dell’attività di vigilanza prevista per legge. Quest’ultima ha consentito al Ministro dei lavori pubblici di avere una ulteriore e più puntuale fonte di informazione, oltre a quella rappresentata dalle “relazioni” del soggetto monitore, su tutti gli interventi di competenza, ma in particolare su alcune grandi opere eseguite da amministrazioni dello Stato o da Aziende di rilevanza statale.

La stretta collaborazione instauratasi fra il Servizio di Ispettorato, il Soggetto Monitore e l’U.R.C.G.E. ed il flusso di informazioni che ne scaturito, hanno fornito alla Commissione ulteriori elementi conoscitivi in base ai quali procedere agli aggiustamenti programmatici del Piano.

5.3 La Vigilanza della BEI

La legge n. 651/96 ha previsto, all’art. 2, uno stanziamento di Lit. 3.500 miliardi per la realizzazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo ed all’uopo ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad accendere mutui quindicennali di pari importo. Dopo una attenta indagine di mercato il Ministero del Tesoro ha individuato quale offerta più conveniente quella proposta da un pool di istituti di credito, che utilizza, in parte, una provvista riveniente da un finanziamento della Banca Europea di Investimenti pari a Lit. 1400 miliardi.

L’intervento della BEI si è rilevato fondamentale in quanto ha consentito di abbassare sensibilmente l’onere del Tesoro per il pagamento degli interessi, ma, nel contempo ha posto alcune condizioni operative quali:

- L’individuazione dei progetti da ancorare alla provvista finanziaria della Banca stessa
- Il monitoraggio, tramite la Banca capofila, dei suddetti interventi

- L'effettuazione di visite e ispezioni delle opere oggetto di finanziamento.

In data 12 dicembre 1996, con nota n. 2973, il Presidente del Consiglio pro tempore ha incaricato l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi di assumere l'impegno irrevocabile nei confronti della BEI a collaborare con questa e con gli Istituti finanziatori per individuare, nell'ambito del Piano del Giubileo, gli interventi sui quali la BEI riterrà di ancorare la quota della provvista finanziaria da fornire agli Istituti finanziatori; di trasmettere alla BEI e all'Istituto coordinatore finanziatore la documentazione inerente il monitoraggio degli interventi approvati e di informare la stessa BEI dello stato di erogazioni ai soggetti beneficiari, nonché di acquisire, da parte di coloro ai quali siano state destinate risorse finanziarie rivenienti dal prestito concesso dalla BEI agli Istituti finanziatori, un atto formale con il quale il soggetto beneficiario si impegni irrevocabilmente nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e della BEI a:

1. Realizzare gli interventi di competenza secondo quanto previsto nella scheda tecnica o nelle eventuali modifiche della stessa concordate con la BEI;
2. Completare e rendere pienamente funzionali le opere entro il termine indicato nel Piano;
3. Procedere agli appalti ed alle commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione degli interventi, facendo ricorso, per quanto possibile, ed in maniera soddisfacente per la BEI, ad una concorrenza internazionale estesa almeno ai Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e nel rispetto delle direttive del Consiglio dell'Unione Europea in materia;
4. Provvedere a che le opere costituenti l'intervento formino oggetto di adeguata copertura assicurativa nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
5. Provvedere a che le opere relative a ciascun intervento formino oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o ripristino delle loro normali capacità di utilizzo per la durata dell'ammortamento del finanziamento, fermo restando che la manutenzione straordinaria degli interventi storici oggetto del finanziamento BEI verrà effettuato compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei soggetti ed enti competenti;
6. Consentire che gli Istituti Finanziatori e la BEI effettuino o facciano effettuare a persone da essi designate, visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori oggetto degli interventi da essi finanziati.

Anche nel corso dell'anno 1998 si sono svolte una serie di visite programmate dai rappresentanti della BEI al fine di acquisire informazioni circa le modalità dell'istruttoria dei progetti inclusi nel Piano, della revisione del Piano medesimo, della erogazione delle risorse, delle procedure di appalto e della metodologia di monitoraggio. In particolare, nel 1998 si sono tenute numerose riunioni per approfondire l'esame dei sottoprogetti: "Trasporto Pubblico Urbano", "ANAS - Roma, realizzazione della terza corsia su parti del GRA e su parti dell'Autostrada Roma Fiumicino", "FS Roma - Stazione Tiburtina e Passante dei laghi", "Roma Sistema

Stradale Urbano” e “Azienda Municipalizzata Ambiente”, nonché dei progetti relativi ai “Beni culturali” ed alla “Riabilitazione Urbana”.

In ottemperanza a quanto disposto dal Presidente del Consiglio, in data 16 settembre 1998, con nota n. 4681, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunicava alla BEI di aver acquisito, da tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti ex lege n. 651/96, le formali dichiarazioni di assunzione di impegno a realizzare gli interventi di propria competenza e di renderli funzionanti nei termini indicati nel Piano. Inoltre, informava l'Istituto che dalla data del primo decreto di approvazione del Piano del Giubileo (18 settembre 1996) erano intervenuti sei decreti di modifica ed integrazione, lo aggiornava sull'entità dei fondi impegnati ed erogati ed inviava i primi rapporti trimestrali del Monitore.

A tutt'oggi, risultano approvati dagli organi decisionali della Bei i seguenti sottoprogetti:

Settore D

Anas*	D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione Anas terza corsia (2° e 3° lotto)	
Anas	D	10	01/a	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione Anas corsia (2° lotto)	
Anas	D	10	01/b	Autostrada Roma/Fiumicino. Realizzazione Anas corsia (3° lotto)	
Anas	D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (R Anas Realizzazione 3° corsia e svincoli (lotto 23b	
FS**	D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Sta Ferrovie Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio Stato	
FS	D	15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto Ferrovie Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Vite Stato	
Tpu***	D	02	01	Linea tramviaria S. Pietro -Aurelia	Comune Roma
Tpu	D	03	01	Tram Venezia San Pietro, Realizzazione linea tranviaria	Comune Roma
Tpu	D	04	01	Linea tranviaria Archeotram	Comune Roma
Tpu	D	05	01/1	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo mt	Atac
Tpu	D	05	01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media capacità	Atac
Tpu	D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tranviarie di g capacità	Atac
Tpu	D	051	01/6	Fornitura equipaggiamento “Chopper” motrici linea metro “A”	Cotral
Tpu	D	18	01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune Roma
Tpu	D	18	01/2a	Linea metropolitana. Adeguamento metro	Comune

			stralcio	Roma
Tpu	D	18 01/2b	Linea metropolitana. Adeguamento metro stralcio	Comune Roma
Tpu	D	18 02/1a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Lido	Comune Roma
Tpu	D	18 02/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Lido. Manutenzione	Cotral
Tpu	D	18 02/2a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Nord 1° stralcio: Labaro	Comune Roma
Tpu	D	18 01/2b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea R Nord 2° stralcio: Saxa Rubra	Comune Roma

Sotto progetti BEI

* Anas Roma 2000

** FS - Roma 2000

*** Trasporto Pubblico Urbano

Settori B e C

B Beni Culturali

- B 1 Area del grande Campidoglio, Palazzo senatorio e Musei capitolini
- B 2 Area dei Fori Imperiali
- B 3 Restauro e manutenzione percorso Mura Antiche
- B 4 Palazzo delle Esposizioni
- B 5 Palazzo Braschi (Museo di Roma)
- B 8 Museo nazionale Romano
- B 9 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini
- B 10 Museo Nazionale di Villa Giulia
- B 11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna
- B 12 Interventi di restauro di immobili storici/artistici
- B 13 Restauri ed interventi conservativi di Chiese e Basiliche
- B 14 Restauro ed adeguamento di altri Musei archeologici, medievali, moderni
- B 15 Interventi nelle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano
- B 16 Restauro e consolidamento di beni culturali archeologici
- B 18 Valorizzazione del patrimonio culturale nella provincia di Roma
- B 19 Valorizzazione patrimonio culturale regionale (Circuito abbazie)
- B 20 Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata

Escluso

C Manutenzione e arredo urbano patrimonio ambientale

- C 1 Manutenzione straordinaria aree verdi e abbattimento barriere architettoniche
- C 2 Adeguamento delle strutture per l'accessibilità nelle aree di visita (Escluso C.02.06 "Ponti pedonali temporanei...")

C	3	Arredo urbano e manutenzione delle facciate – (Esclusi C.03.06/07 “Incentivi e contributi...”)
C	4	Adeguamento infrastrutture area di Castel Gandolfo
C	5	Giardini di Castel Sant’Angelo - manutenzione
C	6	Giardini San Giovanni /Via Carlo Felice - manutenzione
C	7	Parco Casilino – Labicano. Sistemazione a verde
C	8	Restauro del Parco di Villa Borghese
C	9	Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e Acquadotti (Appia Antica)
C	10	Restauro del Parco Villa Ada Savoia
C	11	Recupero dell’area di San Gregorio al Celio
C	12	Restauro del Parco di Villa Doria Pamphili
C	13	Sistemazione ambientale pendici Monte Mario e Casale Mellini
C	14	Bonifica delle pendici del Gianicolo
C	15	Manutenzione straordinaria / restauro del Parco del Colle Oppio
C	18	Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma (Escluso C.18.01 “Piano straordinario di prevenzione e sicurezza”)
C	19	Opere di risanamento del Bacino del Tevere - Escluso
C	20	Orto botanico - Escluso

Nelle successive rimodulazioni del Piano, alcuni di questi interventi sono stati disaggregati in numerosi sotto interventi, con conseguenti modificazioni o integrazioni finanziarie.

Alcuni si sono rivelati irrealizzabili nei termini di legge, altri sono stati sostituiti con altri che più si confacevano alle finalità giubilari.

Allo stato attuale, sono stati defINANZIATI totalmente gli interventi rubricati con i codici: D.02.01, D.03.01 e D.04.01, relativi al sottoprogetto “Trasporto Pubblico Urbano – Linee Tranviarie ed Archeotram”, quelli rubricati con i codici : B.01.01, B.08.06, B.16.23, attinenti i Beni Culturali, e quelli rubricati con i codici : C.01.08, C.01.09 e C.03.05, attinenti la Manutenzione e l’Arredo Urbano, mentre quello attinente al potenziamento del nodo Termini, è stato defINANZIATO solo parzialmente.

Si pone pertanto l’esigenza di includere nel Piano, con successivi provvedimenti, altri interventi che abbiano natura di investimento, al fine di mantenere in necessario equilibrio tra la quota di finanziamento comunitario ed il volume di investimenti.

APPENDICE

Cronologia degli atti normativi

- 26 aprile 1996 – Decreto Legge n. 225 recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 31 maggio 1996 – DPCM con il quale viene conferita al Ministro dei lavori pubblici delega per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.
- 3 luglio 1996 – Decreto Legge n. 349 recante “ Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 30 agosto 1996 – Decreto Legge n. 455 recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 18 settembre 1996 – DPCM di adozione del “ Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000” (Presidente del Consiglio Prodi) – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 23 ottobre 1996 - Decreto Legge n. 551 recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”.
- 5 novembre 1996 – DPCM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” - Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 11 dicembre 1996 – DPCM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” - Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997.
- 21 dicembre 1996 – DM recante “ Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000 previsto dal decreto-legge n.23 ottobre 1996, n. 551” - Pubblicato sulla G.U. n.76 del 2 aprile 1997.
- 23 dicembre 1996 – Legge n. 651 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”, pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 1997.
- 18 aprile 1997 – DPCM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n.161 del 12 luglio 1997.
- 24 giugno 1997 – DM recante “Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000” – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n.205 del 3 settembre 1997.
- 4 agosto 1997 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo”– Pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 1998.

- 22 dicembre 1997 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651” – Pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 1998.
- 8 maggio 1998 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 651” – Pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1998.
- 15 maggio 1998 – DM recante “Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651” – Pubblicato sulla G.U. n.162 del 14 luglio 1998.
- 16 luglio 1998 – DM recante “Modificazioni al Piano degli interventi per il Giubileo” – Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 28 settembre 1998.

D. M. dell'8 maggio 1998.

Rep. N.150/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/1998 dell'11 marzo 1998, concernente: "Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998 concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

CONSIDERATO che per la riunione della Commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, con nota del 9 marzo 1998, n. 1223/R.C. ha delegato il Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44, del 27 aprile 1998;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/98, con le modifiche conseguenti al succitato rilievo della Corte dei Conti;

DECRETA

1. Sono stabiliti i nuovi termini relativi alle lettere c) e d) dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, limitatamente agli interventi indicati nell'allegato A;
2. Il titolo della sezione E: "Servizi speciali e formazione" del Piano per il Giubileo è così modificato "Sicurezza, Protezione civile, Servizi speciali e Formazione";
3. Gli interventi già rubricati con codici C02.01; C02.02/2; C02.03, sono disaggregati e sostituiti dai seguenti interventi individuati sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali relativi a ciascuna area basilicale:

☞ C02.01/1 - Area delle basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza. Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico. Installazione di elementi di arredo urbano;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 25.955.600.000

Risorse ex lege n. 651 £ 25.955.600.000

Termini lett. c): aprile 1999

- Termini lett. d): ottobre 1999*
- ☐ C02.01/2 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;
Soggetto beneficiario: ACEA
Costo dell'intervento £ 1.869.560.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.869.560.000
Termini lett. c): marzo 1999
Termini lett. d): dicembre 1999
- ☐ C02.01/3 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;
Soggetto beneficiario: STA
Costo dell'intervento £ 1.786.400.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.786.400.000
Termini lett. c): giugno 1999
Termini lett. d): novembre 1999
- ☐ C02.01/4 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;
Soggetto beneficiario: AMA
Costo dell'intervento £ 907.430.000
Risorse ex lege n. 651 £ 907.430.000
Termini lett. c): settembre 1998
Termini lett. d): novembre 1999
- ☐ C02.01/5 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;
Soggetto beneficiario: Ministero Interno
Costo dell'intervento £ 2.805.000.000
Risorse ex lege n. 651 £ 2.805.000.000
Termini lett. c): aprile 1999
Termini lett. d): novembre 1999
- ☐ C02.01/6 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Ponte Gelsomino;
Soggetto beneficiario: F.S.
Costo dell'intervento £ 1.446.500.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.446.500.000
Termini lett. c): aprile 1999
Termini lett. d): novembre 1999
- ☐ C02.02/2 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; Realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza; Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la riqualificazione urbana; fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni; ristrutturazione e manutenzione di sedi viarie e pedonali con abbattimento delle

- barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico; installazione di elementi di arredo urbano. Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali;*
- Soggetto beneficiario: Comune di Roma*
- Costo dell'intervento £ 22.213.751.000*
- Risorse ex lege n. 651 £ 22.213.751.000*
- Termini lett. c): aprile 1999*
- Termini lett. d): ottobre 1999*
- ⊖ *C02.02/7 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;*
- Soggetto beneficiario: ACEA*
- Costo dell'intervento £ 3.864.003.000*
- Risorse ex lege n. 651 £ 3.864.003.000*
- Termini lett. c): marzo 1999*
- Termini lett. d): dicembre 1999*
- ⊖ *C02.02/4- Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;*
- Soggetto beneficiario: STA*
- Costo dell'intervento £ 224.400.000*
- Risorse ex lege n. 651 £ 224.400.000*
- Termini lett. c): giugno 1999*
- Termini lett. d): novembre 1999*
- ⊖ *C02.02/5 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi di risanamento igienico-ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;*
- Soggetto beneficiario: AMA*
- Costo dell'intervento £ 1.456.866.000*
- Risorse ex lege n. 651 £ 1.456.866.000*
- Termini lett. c): settembre 1998*
- Termini lett. d): settembre 1999*
- ⊖ *C02.02/6 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;*
- Soggetto beneficiario: Ministero interno*
- Costo dell'intervento £ 2.385.350.000*
- Risorse ex lege n. 651 £ 2.385.350.000*
- Termini lett. c): aprile 1998*
- Termini lett. d): novembre 1999*
- ⊖ *C02.03./1 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza. Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico. Installazione di elementi di arredo urbano;*
Soggetto beneficiario: Comune di Roma
Costo dell'intervento £ 13.500.184.000
Risorse ex lege n. 651 £ 13.500.184.000
Termini lett. c): aprile 1999
Termini lett. d): ottobre 1999
- ▣ C02.03/2. - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;*
Soggetto beneficiario: ACEA
Costo dell'intervento £ 1.943.700.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.943.700.000
Termini lett. c): marzo 1999
Termini lett. d): dicembre 1999
- ▣ C02.03/3 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;*
Soggetto beneficiario: STA
Costo dell'intervento £ 614.900.000
Risorse ex lege n. 651 £ 614.900.000
Termini lett. c): giugno 1999
Termini lett. d): novembre 1999
- ▣ C02.03/4 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;*
Soggetto beneficiario: AMA
Costo dell'intervento £ 386.536.000
Risorse ex lege n. 651 £ 386.536.000
Termini lett. c): settembre 1998
Termini lett. d): settembre 1999
- ▣ C02.03/5 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;*
Soggetto beneficiario: Ministero Interno
Costo dell'intervento £ 1.491.600.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.491.600.000
Termini lett. c): aprile 1999
Termini lett. d): novembre 1999
- ▣ C02.03/6 - *Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento del transetto della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo;*
Soggetto beneficiario: P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo
Costo dell'intervento £ 1.256.320.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.256.320.000
Termini lett. c): aprile 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Termini lett. d): novembre 1999

Per effetto della disaggregazione e delle sostituzioni di cui al presente punto, restano nella disponibilità £ 625.900.000; pari alla differenza fra le previgenti assegnazioni finanziarie per £ 84.734 milioni e le attuali assegnazioni finanziarie pari a £ 84.108.100.000.

4. Per gli interventi per i quali si dispone il definanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, il soggetto già beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione delle somme utilizzate fino alla data della comunicazione dell'intervenuto definanziamento e ad inviarla all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della detta comunicazione.
5. Gli interventi di seguito indicati, in quanto valutati non fattibili in tempo utile per le celebrazioni giubilari, sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, computata al netto dei trasferimenti già operati a favore dei soggetti beneficiari:

A01.08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro "Massimina")	£ 1.350 milioni
A09.01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: Centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di S. Pietro (Roma). Lavori di restauro e allestimento.	£ 10.000 milioni
C01.17	Via Pineta Sacchetti (Roma). Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	£ 13.700 milioni
C03.05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	£ 19.000 milioni
D04.01	Linea tranviaria Archeotram	£ 53.200 milioni
	TOTALE	£ 97.250 milioni

6. Gli interventi di seguito indicati, ancorché valutati fattibili, sono definanziati, su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie per il finanziamento di interventi ritenuti di prioritaria importanza strategica, nel quadro delle finalità giubilari. L'importo del definanziamento è computato al netto dei trasferimenti già operati a favore del soggetto beneficiario ed è indicato a latere di ciascun intervento:
7. Gli interventi di seguito indicati sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari:

C01.26	Riqualficazione area Teatro Marcello, P.zza Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Peschiera, via della Tribuna Campitelli	£ 3.000 milioni
C07.01	Parco Casilino Labicano - Sistemazione delle aree a verde	£ 5.000 milioni
D19.02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "passante dei laghi"	£ 30.000 milioni
E04.01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'anno 2.000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti alla P.A. Impiego operatori in servizio civile	£ 10.728 milioni
E04.04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio) Strumenti formativi per l'auto apprendimento; riqualificazione centri formazione professionale	£ 2.872 milioni
	TOTALE	£ 51.600 milioni

8. L'intervento di seguito indicato è definanziato, a causa del parere negativo della Conferenza dei servizi, nella misura a fianco indicata, computata al netto del trasferimento già operato a favore del soggetto beneficiario:

- | | | |
|--------|--|-------------------|
| A07.02 | Campeggio e area di sosta per camper (Roma) da realizzare nell'area dell'Istituto tecnico agrario G. Garibaldi | £ 321,100 milioni |
|--------|--|-------------------|
9. Le assegnazioni finanziarie degli interventi di seguito indicati sono ridotti, sulla base delle prime verifiche di fattibilità, nella misura di seguito indicata:
- | | | |
|----------|---|-------------------------|
| C04.01 | Area di Castel Gandolfo (Roma). Terminal bus | £ 500 milioni |
| CO4.02/A | Area di Castel Gandolfo (Roma). Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico | £ 4.000 milioni |
| C04.02/B | Area di Castel Gandolfo (Roma). Centro di prima accoglienza | £ 5.700 milioni |
| CO4.03 | Area di Castel Gandolfo (Roma). Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta | £ 650 milioni |
| C04.04 | Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta" | £ 200 milioni |
| | TOTALE | £ 11.050 milioni |
10. Le somme rivenienti da ribassi d'asta, conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto relative agli interventi di cui **all'allegato B**, ammontano complessivamente a £ 71.066.998.985, immediatamente disponibili. Le originarie assegnazioni finanziarie, relative agli interventi indicati nello stesso allegato **B**, sono conseguentemente ridotte nella misura degli importi dei rispettivi ribassi d'asta, come indicato a fianco di ciascuno.
11. Risultano pertanto, al momento, complessivamente disponibili £ 549.364.321.985, pari alla somma dei seguenti importi:
- | | |
|--------------------|--|
| £ 93.472.323.000 | rivenienti da precedenti definanziamenti |
| £ 625.900.000 | rivenienti da riduzione delle assegnazioni finanziarie precisate al punto 3 |
| £ 356.699.100.000, | rivenienti da definanziamenti degli interventi indicati ai punti 5,6,7,8 e 9 |
| £ 71.066.998.985 | rivenienti da ribassi d'asta come indicato al punto 10 |
| £ 27.500.000.000 | rivenienti a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, relativo all'intervento già rubricato con codice D.07.01. |
12. Sono approvati i cambi di titolo, di soggetto beneficiario e le disaggregazioni di interventi, senza oneri aggiuntivi a carico della legge n. 651/96, di cui **all'allegato C**.
13. Sono assentite le integrazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi indicati **nell'allegato D**, nella misura ivi prevista e per un importo complessivo pari a £ 120.766.680.000.
14. Sono inseriti nel Piano del Grande Giubileo dell'anno 2000, gli interventi meglio specificati **nell'allegato E**, che comportano assegnazioni finanziarie per complessive £ 427.962.000.000, comprensive dell'assegnazione finanziaria relativa all'intervento del Comune di Roma, intitolato "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (II° stralcio)", pari a £ 27.500.000.000, che è posta a carico delle corrispondenti risorse che si renderanno disponibili a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, relativa all'intervento già rubricato con codice D.07.01.
15. Conseguentemente le risorse finanziarie assegnate ammontano £ 548.728.680.000, e pertanto restano nella disponibilità della Commissione ulteriori £ 635.641.985, che, unitamente alle risorse rivenienti da ribassi d'asta nel settore dei Beni Culturali, allo stato pari a £ 8.096.257.412, ed a quelle ulteriori che potranno derivare da successivi ribassi d'asta, saranno assegnate, prioritariamente, nell'ambito delle richieste pervenute, per la realizzazione dei seguenti interventi elencati in ordine di priorità:
- ☐ Acquisto mezzi logistici per la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco (Min. Interno)
 - ☐ Interventi speciali di illuminazione cittadina (ACEA)
 - ☐ Incentivi per iniziative culturali (Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma)
 - ☐ Interventi nell'area del comune di Castel Gandolfo
 - ☐ Gestione dell'accoglienza (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo)

- ☞ *Accoglienza assistita - Opera Don Bosco*
 - ☞ *Accoglienza assistita - Campus Biomedico*
 - ☞ *Ampliamento e ristrutturazione della sede dei Vigili del Fuoco dell'EUR*
 - ☞ *Restauro e risanamento conservativo delle ex scuderie papali al Quirinale*
 - ☞ *Acquisto di mezzi di trasporto (ATAC, COTRAL)*
 - ☞ *Manutenzione ed adeguamento delle reti viarie provinciali (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)*
 - ☞ *III° e IV° Struttura mobile per parcheggio di interscambio nel comune di Roma.*
16. *I soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi ai nuovi interventi inclusi nel Piano sono tenuti a presentare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, entro 30 giorni dalla richiesta, nuova certificazione di fattibilità conforme alle previsioni della presente deliberazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Commissione e pubblicata sul supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1997.*

Roma, li 08/05/1998

Il Ministro

F.to Costa

Registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 1998

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 79

D..M. del 15 maggio 1998

Rep. N. 159/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 3/1998 del 11 marzo 1998 con la quale, a fini di semplificazione amministrativa sono state parzialmente modificati gli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui all'allegato A al D.P.C.M. 11 dicembre 1996, per quanto concerne in particolare le modalità e l'entità dei trasferimenti di fondi in favore dei soggetti beneficiari;

TENUTO CONTO che con successiva deliberazione n. 4 del 6 maggio 1998, la Commissione per Roma Capitale ha ritenuto, anche in conformità ai rilievi informalmente mossi dagli organi di controllo, di riconsiderare le suddette decisioni e di rielaborare nuove e diverse modalità circa gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 4/98;

DECRETA

1. All'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio del 11/12/1996 recante "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" sono apportate le seguenti modifiche:
2. "Per la realizzazione di ciascun intervento l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi assume il relativo impegno di spesa, al netto delle somme già impegnate per la progettazione e di quelle indicate nel Piano a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto, sulla base del quadro tecnico-economico, riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione dello stesso. L'Ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 50% dell'importo impegnato, al netto delle somme eventualmente già trasferite, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata dal relativo verbale di consegna dei lavori, ancorché sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa.
3. Sulla base della certificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, idoneamente documentata, dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del precedente punto 1.9, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale e Grandi Eventi provvede all'erogazione di un ulteriore 35% dell'importo dell'impegno di spesa assunto.
4. La somma residua è erogata su richiesta documentata dell'avvenuta certificazione del collaudo ovvero di regolare esecuzione.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Qualora l'intervento consista nella fornitura di beni o prestazione di servizi, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, sulla base della certificazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'intervenuta stipulazione del contratto, provvede, a richiesta del soggetto beneficiario medesimo, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale erogazione di un acconto del 50 % dell'impegno assunto. Per gli interventi consistenti in prestazione di servizi, le successive erogazioni sono effettuate con le modalità di cui ai punti 1.10 e 1.11. Per gli interventi consistenti in fornitura di beni, le successive erogazioni sono effettuate, sempre su richiesta del soggetto beneficiario, in conformità alle clausole contrattuali. Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla certificazione, da parte del soggetto beneficiario, della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione.
6. 1.12.bis Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento sia una società a totale o prevalente capitale pubblico, e in relazione alla natura dell'intervento, non siano direttamente applicabili le procedure relative agli appalti di lavori o alle forniture di beni e servizi di cui ai punti precedenti, secondo le modalità ivi previste, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, assume l'impegno di spesa sulla base di idonea documentazione, comprovante il complessivo onere dell'intervento e le relative modalità di esecuzione, al netto delle somme già impegnate per la progettazione. Il 50% dell'importo dell'impegno assunto è corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, attestante l'inizio delle attività. Un ulteriore 35% dell'importo dell'impegno assunto è corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato, sulla base di idonea documentazione, comprovante l'utilizzazione dell'80% dell'importo erogato nonché l'attività effettivamente svolta. La somma residua è erogata sulla base della rendicontazione finale, approvata dai competenti organi del soggetto beneficiario."
7. Gli interventi rubricati con codice C04 - 01; C04 - 02/A; C04 - 02/B; C04 - 03; C04 - 04 sono espunti dal Piano degli interventi per il Giubileo. Si rende pertanto disponibile la somma di £ 11.300 milioni.
8. Sono inseriti nel Piano degli interventi per il Giubileo, per un complessivo ammontare di finanziamenti assentiti pari a £ 11.050 milioni:

Codice.	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato in milioni	Risorse DL 651 In milioni	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 04 A	Terminal Bus	Comune di Castel Gandolfo	1.300	1.300		ott-98	set-99
C 04 B	Centro Servizi di prima necessità	"	1.500	1.500		ott-98	set-99
C 04 C	Sottopasso pedonale di Via Maremmana	"	300	300		ott-98	set-99
C 04 D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	"	2.550	2.550		ott-98	set-99
C 04 E	Sistemazione della viabilità urbana	"	1.800	1.800		ott-98	set-99
C 04 F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	"	1.000	1.000		ott-98	set-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	04	G	Recupero e restauro dei monumenti	"	500	500	ott-98	set-99
C	04	H	Potenziamento infrastruttura fermata Ferroviaria "LA VILLETTA"	"	2.100	2.100	ott-98	set-99
TOTALE DELLE OPERE					11.050.	11.050		

Roma, li 15 maggio 1998

Il Ministro

f.to Costa

Registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271

D. M. del 16 luglio 1998

Rep. N. 166/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: <Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".>, in G.U. - serie generale- n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in supplemento ordinario alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 5/1998 del 14 luglio 1998, avente ad oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti delega di funzione del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, rispettivamente in G.U. - serie generale- n. 278 del 27/11/1996 e n. 95 del 24/4/1998;

Considerato che nella riunione della Commissione per Roma Capitale del 14 luglio 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 5/1998;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte le assegnazioni finanziarie relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 62.933.535.655 (£ 18.267.221.866 + £ 44.666.313.789);

2. Sono totalmente defianziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi con recupero di complessive £ 6.400.000.000:

A07-17	"Ostello della Gioventù"	Nettuno	Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza"	£ 2.700.000.000
A07-38	"Ostello della Gioventù"	Norma	Recupero e riconversione ex edificio scolastico"	£ 1.200.000.000
C04.G	"Recupero e restauro dei monumenti"	Castel Gandolfo		£ 500.000.000
C02-07	"Pista ciclabile Castel Sant'Angelo-Ponte Sublicio"		che sarà realizzato con i fondi ordinari del Comune di Roma	£ 2.000.000.000

3. Gli interventi di seguito indicati sono parzialmente defianziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, con recupero di complessive £ 79.417.585.657, in quanto ritenuti non realizzabili in tempo utile per la celebrazione del Giubileo:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C03-02	"Isole pedonali di piazza della Minerva. Interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali" modificato in:	"Ristrutturazione della pavimentazione stradale di Piazza della Minerva",	definanziato per £ 779.459.147;
C04-D	"Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del Centro storico",		definanziato per £ 2.000.000.000;
C04-H	"Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria - LA VILLETTA"		definanziato per £ 700.000.000
D09-01	"Infrastrutturazione della Stazione Tiburtina e nodo di interscambio",		definanziato per £ 34.000.000.000;
D18-01/1	"Potenziamento nodo Termini",		definanziato per £ 29.762.826.510,
D21-01	"Realizzazione tranviaria largo Argentina-Via del Plebiscito"	modificato in "Qualificazione nodo di scambio tram-bus Piazza Argentina"	definanziato per £ 12.175.300.000;
4. Le risorse disponibili sono determinate, pertanto, in complessive £ 149.636.763.297, pari alla somma dei seguenti importi:			
£ 885.641.985.	Risorse residue non assegnate dopo l'emanazione del D.M. n. 150/RC dell'8/7/1998		
£ 44.666.313.789	Risorse rivenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 della presente deliberazione		
£ 18.267.221.866	Risorse rivenienti da ribassi d'asta relativi ad appalti di competenza del Ministero dei BB.CC.AA.		
£ 6.400.000.000	Risorse rivenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 della presente deliberazione		
£ 79.417.585.657	Risorse rivenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 3 della presente deliberazione		
5. Sono approvati i nuovi termini relativi alle lettere c) e d) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, relativamente agli interventi indicati nell'allegato B, in conformità delle richieste dei soggetti beneficiari o come modificate dal soggetto monitore nonché delle proposte di differimento formulate dal soggetto monitore medesimo.			
6. Sono assentite le integrazioni finanziarie, i cambi di titolo e del soggetto beneficiario nonché le aggregazioni e disaggregazioni degli interventi, come indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £ 42.727.084.510.			
7. Sono inclusi nel Piano gli interventi indicati nell'allegato D, per un importo complessivo di £ 106.226.000.000 (94.929.000.000 + 11.297.000.000 per Beni Culturali), in coerenza con le priorità indicate al punto 15 del D.M. n. 150/RC dell'8 maggio 1998, e sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate ai settori della sicurezza, sanità, mobilità e cultura ai fini di una maggiore completezza ed armonizzazione del Piano; pertanto a fronte di £ 149.636.763.297 di risorse disponibili e di complessive £ 148.953.084.510 (106.226.000.000 + 42.727.084.510) assentite, restano nella disponibilità della Commissione £ 683.678.787.			
8. Sono inclusi nel Piano, ai soli fini della fruizione di procedure attuative acceleratorie e fatte salve le valutazioni e le determinazioni degli Uffici competenti circa il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 270/1997, i seguenti interventi proposti da soggetti privati:			
A07-47 "Progetto per la trasformazione di manufatti rurali in centro di accoglienza turistica"			

Soggetto proponente: Soc. Agricola Abundantia S.r.l. - Roma

A07-48 "Progetto per la trasformazione di manufatti rurali in centro di accoglienza turistica"

Soggetto proponente: Soc. Agri.Ma S.r.l. - Roma

A07-49 "Realizzazione in autofinanziamento di un albergo a basso costo"

Soggetto proponente: Iniziative immobiliari '96 S.r.l. - Roma

9. Il punto 1.16 degli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano", di cui all'allegato A del D.P.C.M. 11 dicembre 1996 e successive modificazioni, è così sostituito, a decorrere dalla data della delibera n. 5/98, citata in premessa:

"1.16. Il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio provvedono ad approvare l'atto unitario ed organico di affidamento all'Agenzia delle attività da svolgere, sulla base del contributo per la realizzazione del Piano dell'accoglienza disposto in favore della stessa Agenzia, con DD. MM. di recepimento delle deliberazioni della Commissione per Roma Capitale, assunte nelle sedute del 24 ottobre 1996 ed 11 marzo 1998.

A seguito dell'approvazione del predetto atto di affidamento, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi eroga all'Agenzia l'ulteriore importo di £ 21 miliardi.

L'erogazione delle successive quote di contributo avrà luogo alle date del 31 dicembre 1998, del 30 giugno e 31 dicembre 1999, del 31 maggio e 31 dicembre 2000. L'Agenzia correda la domanda di trasferimento delle risorse con la documentazione, previamente verificata dai soggetti affidatari, comprovante i costi sostenuti e gli impegni assunti. L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi procede all'erogazione dell'importo corrispondente all'avanzamento documentato e verificato dai soggetti affidatari.

L'ultima delle predette erogazioni ha luogo a saldo e nella misura rispondente ai costi effettivamente sostenuti e certificati come sopra, ove del caso, anche successivamente alla data del 31 ottobre 2000."

10. Dopo il punto 1.21 è aggiunto, infine, il seguente:

"1.21. Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento siano inferiori all'importo complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, l'importo differenziale viene versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge n. 651/1996."

11. Sono approvati gli indirizzi attuativi di cui all'allegato E che costituisce parte integrante della presente deliberazione

Roma, lì 16 luglio 1998

Il MINISTRO

F.to Costa

D. M. del 7 gennaio 1999

Rep. N. 181/RC

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma", (in G.U. - serie generale - n. 18 del 23/1/1998);

VISTO il decreto ministeriale dell'8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998 e relativo all'approvazione della deliberazione n. 2 dell'11 marzo 1998, con la quale la Commissione per Roma Capitale, integrata ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, ha individuato i settori prioritari di intervento da finanziare a valere sulle future economie comunque realizzate;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 189 del 24 novembre 1998, avente ad oggetto: "Proposta di rimodulazione degli interventi comunali compresi nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000";

VISTA la nota n. ULSG/1800/XI. 3 del 27 novembre 1998, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per il grande Giubileo del 2000, ai sensi dell'art. 1, lett. a), DPR 31 dicembre 1997, sulla base delle esigenze postulate dal processo attuativo del Piano, ha formulato proposte di modificazioni ed integrazioni del Piano medesimo;

CONSIDERATO che nella riunione della Commissione per Roma Capitale del 1° dicembre 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presiedere la riunione medesima;

VISTA la deliberazione n. 6/98 adottata dalla Commissione per Roma Capitale, ex lege n. 651/1996, in data 1° dicembre 1998;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 6/98;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori esigenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 158.437.363.918.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Sono totalmente defianziati, su richiesta degli rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi con recupero di complessive £. 2.500.000.000:

E.05.10: "Acquisto 4 gruppi elettrogeni con relativi shelter": £. 1.000.000.000

E.05.31: "Ampliamento e ristrutturazione sede EUR": £. 1.500.000.000

3. Gli interventi di seguito indicati sono parzialmente defianziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, con recupero di complessive £. 17.491.191.000:

A.07.10 "Campeggio e aree di sosta per camper (Castel Madama)" non realizzabile e il cui stanziamento è ridotto da £. 600.000.000 a £. 150.000.000, defianziato per £. 450.000.000, fatta salva la maggiore somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

C.02.01/1 "Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza", il cui stanziamento, a seguito di riprogrammazione, è ridotto da £. 25.955.600.000 a £. 19.356.600.000, e defianziato per £. 6.599.000.000;

C.02.03/1 "Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza" il cui stanziamento, a seguito di riprogrammazione, è ridotto da £. 13.500.184.000 a £. 11.237.993.000 e defianziato per £. 2.262.191.000;

E.01.19 "Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra (I lotto funzionale)" non realizzabile ed il cui stanziamento è ridotto da £. 3.000.000.000 a £. 150.000.000, defianziato per £. 2.850.000.000, fatta salva la maggiore somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.01.20 Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Via Zucchelli, il cui stanziamento, a seguito di riprogrammazione, è ridotto da £. 6.000.000.000 a £. 670.000.000, defianziato per £. 5.330.000.000, fatta salva la maggiore somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

4. Le risorse disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £. 179.112.233.705, pari alla somma dei seguenti importi:

£. 683.678.787

Risorse residue non assegnate con D.M. del 16 luglio 1998

£.158.437.363.918

Risorse rivenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1

£. 2.500.000.000

Risorse rivenienti da defianziamenti totali di cui al punto 2

£. 17.491.191.000

Risorse rivenienti da defianziamenti parziali di cui al punto 3

5. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 della legge n. 651/96, i cambi di titolo e di soggetto beneficiario, le aggregazioni e disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B;

6. In via confermativa ed integrativa della statuizione di cui al D.M. del 18 aprile 1997 gli interventi sottoindicati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, sono defianziati ed espunti dal Piano, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

B. 13.53 "Chiesa S. Andrea in via Flaminia - (Roma) Restauro", perché realizzato con fondi propri del soggetto titolare;

B.12.07 "Arsenale Pontificio (Roma). Restauro completo dell'immobile per utilizzazione museale", perché non realizzabile;

B.13.37 "Chiesa della SS Annunziata (Roma). Restauro della facciata", perché riprogrammato;

- B.18.15 "Riqualificazione del comprensorio della Mentorella (Capranica)", in quanto incorporato nell'intervento rubricato con codice C.18.02;*
- B.19.11 "Monastero di S. Scolastica (Subiaco RM). Restauro", in quanto incorporato nell'intervento rubricato con codice B.18.16.*
7. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato B, per un ammontare complessivo di £. 109.140.021.000.
8. Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £. 53.604.911.000;
9. Le assegnazioni finanziarie degli interventi sottoindicati sono integrate delle somme a fianco di ciascuno indicate, relative alle minori occorrenze finanziarie risultanti da economie di gara e portate in detrazione sia con D.M.dell'8 maggio 1998 che con D.M del 16 maggio 1998:
- D.14.01 "Strada provinciale Ardeatina. Manutenzione straordinaria dal Km 9,600 al Km. 23.100" £ 1.794.168.005*
- D.14.02 "Strada provinciale Laurentina. Scavi archeologici lungo il tracciato" £ 256.227.845*
- D.14.04 "Strada provinciale Tiberina. (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0,00 al Km 18,00 £ 1.591.680.001;*
- per un ammontare complessivo di £. 3.642.075.851;*
10. Sono accantonate £. 12.725.225.854, quale fondo per far fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel piano che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai termini contrattuali, nonché per provvedere alle esigenze connesse alle eventuali varianti in corso d'opera di cui all'art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
11. Le risorse finanziarie rivenienti da successivi ribassi d'asta, sono destinate, alla realizzazione degli interventi afferenti i seguenti settori, indicati in ordine di priorità.
1. Sicurezza
 2. Trasporti e mobilità (ATAC e COTRAL)
 3. Accoglienza assistita e sanità
 4. Integrazioni della provincia di Roma e viabilità delle province del Lazio
 5. Farmacop (come da delibera comunale)
 6. ACEA
- Integrazioni finanziarie per l'autostrada Roma-Fiumicino (ANAS)*
- Servizi igienici mobili*
- Cattedrale di Anagni e chiesa di Tor Tre Teste*
- Area dei grandi eventi di Tor Vergata.*
12. L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di svolgere ulteriori accertamenti istruttori, per le successive determinazioni della Commissione, in ordine alle richieste di inclusione nel Piano presentate da soggetti privati ai soli fini della fruizione di procedure acceleratorie di cui all'art. 1, c. 6 della legge n. 270/97.
13. Dopo il punto 5 della "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano", di cui all'allegato A del DPCM 11 dicembre 1996 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto 6: "Per i lavori il cui costo di realizzazione sia superiore a 5.000.000 di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a nominare una commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i lavori di importo inferiore a 5.000.000 di ECU e superiore a 1.000.000 di ECU, in luogo della commissione di collaudo viene, di norma, nominato un singolo collaudatore; per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di ECU, che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 28,

c. 7, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori”;

14. *Dopo il punto 1.15 degli “Indirizzi per l’attuazione finanziaria del Piano” di cui all’allegato A del DPCM 11 dicembre 1996 e successive modificazioni, è inserito il seguente punto:*

1.15 bis: “Le risorse finanziarie destinate agli incentivi per la manutenzione edilizia, il decoro cittadino ed i parcheggi pertinenziali sono trasferite in unica soluzione, su richiesta del Comune di Roma, dietro presentazione del relativo programma di utilizzo e delle convenzioni stipulate con i vari istituti di credito. Sono altresì trasferiti in unica soluzione, i contributi a favore delle imprese giovanili e per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari, su richiesta del soggetto beneficiario, alla presentazione della delibera di approvazione dei progetti ammessi.”

Roma, lì 7 gennaio 1999

Il Ministro

Enrico Micheli

Registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 60

ALLEGATI

1. Le modifiche al Piano degli interventi secondo i vari Decreti

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		Riduzione assegnazioni All "A" per 254.464.200			
			Risorse DL 149	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse		Risorse DL 551	Altre risorse	
A 01 12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.218.535.800	10.995.000.000
A 01 11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAAC	1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.503.000.000		1.218.535.800	10.995.000.000
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Frosinone). Ristrutturazione di un immobile del Comune di Frosinone	Comune di Frosinone	700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		600.000.000	600.000.000
A 01 09	Casa di accoglienza temporanea per disabili (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Medigiani	Comune di Roma	700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		600.000.000	600.000.000
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000	500.000.000
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per disoccupati (Roma). Completamento di un complesso dell'area di proprietà comunale	Comune di Roma	3.614.000.000		3.614.000.000		3.614.000.000		3.614.000.000		3.614.000.000		3.614.000.000		3.614.000.000		3.614.000.000		3.614.000.000		4.355.794.364	1.500.000.000
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigole Nuove	Comune di Roma	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.355.794.364	1.500.000.000
		IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000			

R. N. 3
Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 12/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 349	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	
V 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino																	
	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Ristrutturazione dei locali in località Aranova (prima fase)	Comune di Fiumicino																	
	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino																	
V 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma																	
V 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo																	
V 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano																	
V 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia																	
	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione dei locali ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia																	
V 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio																	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 12/12/1997		5° decreto del 08/02/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 349	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651
A 04 01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo secentesco	Comune di Roma																	
A 05 01	Centro di accoglienza temporanea per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Riattivazione complesso dell'ex Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà (1° distretto funzionale)	Regione Lazio, Comune di Roma, USL RM-E																	
A 05 01/1	Centro di accoglienza temporanea per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Riattivazione complesso dell'ex Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà (2° distretto funzionale)	USL RM E																	
A 05 01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E																	
A 05 01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E																	
A 05 01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E																	
A 05 01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)	USL RM E																	
A 05 01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E																	
A 05 02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° distretto funzionale)	Comune di Roma																	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/01/1996			2° decreto del 10/04/1997			3° decreto del 24/04/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/06/1998			7° decreto - 31 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998					
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Tempi let. (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi let. (c)
A 06	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm. di pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97	3.000.000,000	4.050.000,000	dic-97
A 06	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipa e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99	10.000.000,000	10.000.000,000	ott-99
A 07	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi.	Provincia di Roma	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98	9.000.000,000	9.000.000,000	ott-98
A 07	Campagna e area di sosta per camper (Roma) Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi".	Provincia di Roma	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98
A 07	Campagna (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circoscrizionale l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98	450.000,000	450.000,000	ott-98
A 07	Ostello della gioventù (Champino/Roma)	Comune di Champino	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97	3.000.000,000	3.000.000,000	mar-97
A 07	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97	375.000,000	375.000,000	mar-97
A 07	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97	4.050.000,000	4.050.000,000	mar-97
A 07	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva e ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97	2.250.000,000	2.250.000,000	dic-97

Aggiornato al 31 dicembre 1993

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/09/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/02/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Costo Stimato	Risorse DL 551	Costo Stimato	Risorse DL 551	Costo Stimato	Risorse DL 551	Costo Stimato	Risorse DL 551	Costo Stimato	Risorse DL 551	Costo Stimato	Risorse DL 551	Costo Stimato	Risorse DL 551	Costo Stimato	Risorse DL 551
A 07 07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	333.800.000	162.000.000	333.800.000	171.800.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	333.800.000	171.800.000	333.800.000	171.800.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000	333.800.000	250.250.000
A 07 08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma). Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000
A 07 09	Campagna (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000
A 07 10	Campagna e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma). Realizzazione	Comune di Castel Madama	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma). Recupero delle stadiere Estensi	Comune di Tivoli	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000
A 07 12	Ostello della Gioventù (Mazzano/Roma). Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Mazzano	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000
A 07 13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000
A 07 13	Ostello della Gioventù (Cervara/Roma). Completamento e ampliamento della struttura in località Prataglia	Comune di Cervara	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000	333.800.000	162.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 149	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551	Altre risorse	Risorse DL 551
A 07 28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Chiosco S. Maria delle Grazie di Foglia	Comune di Magliano Sabina																	
A 07 29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino																	
A 07 30	Area camper (Montepalati/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montepalati																	
A 07 31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone																	
A 07 32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e ristrutturazione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele																	
A 07 33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola																	
A 07 34	Ostello della Gioventù (Roccaporetti/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili	Comune di Roccaporetti																	
A 07 35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza																	

Revisi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998					
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A 07 36	Ostello della Gioventù (Maremma/Latina) Restauro Palazzo Pecci	Comune di Marina	500.000.000	375.000.000	125.000.000	mar-97	175.000.000	mar-97	500.000.000	mar-97	150.000.000	50.000.000	50.000.000	mar-98	50.000.000	200.000.000	150.000.000	50.000.000	lug-98	50.000.000	150.000.000	Risorse DL 651
A 07 37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	mar-97	400.000.000	mar-97	1.200.000.000	mar-98	400.000.000	400.000.000	400.000.000	apr-97	400.000.000	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	apr-97	400.000.000	942.010.873	Riduzione assegnazioni All "A" per 257.989.127
A 07 38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	mar-97	400.000.000	mar-97	1.200.000.000	mar-98	400.000.000	400.000.000	400.000.000	apr-97	400.000.000	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	apr-97	400.000.000	1.200.000.000	Definizione tot. Per 1.200.000.000
A 07 39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000.000	2.000.000.000	667.000.000	mar-97	667.000.000	mar-97	2.000.000.000	mar-98	667.000.000	667.000.000	667.000.000	feb-98	667.000.000	2.667.000.000	2.000.000.000	667.000.000	feb-98	667.000.000	2.000.000.000	Riduzione assegnazioni All 318.297.000
A 07 40	Centro di accoglienza (Latina) Riattuazione Istituto comunale San Benedetto	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000.000	1.300.000.000	434.000.000	mar-97	434.000.000	feb-98	1.300.000.000	apr-97	434.000.000	434.000.000	434.000.000	feb-98	434.000.000	1.734.000.000	1.300.000.000	434.000.000	feb-98	434.000.000	961.703.000	Riduzione assegnazioni All 318.297.000
A 07 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000.000	800.000.000	267.000.000	mar-97	267.000.000	feb-98	800.000.000	apr-99	267.000.000	267.000.000	267.000.000	apr-99	267.000.000	1.067.000.000	800.000.000	267.000.000	apr-99	267.000.000	800.000.000	Riduzione assegnazioni All 318.297.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		3° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/09/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 06/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998	
			Risorse DL 349	Altres risorse	Risorse DL 551	Altres risorse	Risorse DL 551	Altres risorse	Risorse DL 551	Altres risorse	Risorse DL 551	Altres risorse	Risorse DL 551	Altres risorse	Risorse DL 551	Altres risorse	Risorse DL 551	Altres risorse
A 08 01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	130.000.000,000		130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000	130.000.000,000
A 09 01	Corris Suisina - Ospedale S. Spirito: centro termale di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e abbinamento	USL RM E	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000
A 10 01	Pavimentazione sagrato del Santuario e dei viali processionali	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000
A 10 02	Demolizione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della Chiesa del Santuario	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000
A 10 03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000
B 01 01	Area del Grande Campidoglio: Museo Palazzo Senatorio (Roma) Prosecuzione dei lavori di consolidamento, restauro e musealizzazione del Tabularium (prima fase)	Comune di Roma	5.000.000,000		5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000
B 01 02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	5.000.000,000		5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/01/1997			3° decreto del 2/06/1997			4° decreto del 22/11/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998								
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B 02	Area del Grande Campidoglio, Musei Capitolini (Roma) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli spazi espositivi (prima fase)	Comune di Roma	15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000		15.000.000,000	15.000.000,000	
B 02	Area del Grande Campidoglio. Progetto di restauro e sistemazione dei Musei capitolini. Secondo lotto funzionale	Comune di Roma	10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	
B 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Mercati Traianei, Torre Milizia, Palazzo Tiberi, Fori di Cesare, Augusto, Nerva, Traiano (Roma) Allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	Comune di Roma	10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	
B 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	
B 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali ai mercati traianei	Comune di Roma	1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000		1.000.000,000	1.000.000,000	
B 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali. Restauro dei materiali mobili.	Comune di Roma	3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000	
B 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati	Comune di Roma	3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000	
B 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000	
B 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000		3.000.000,000	3.000.000,000	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 21/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 18/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998				
			Costo Stimato	Risorsa DL 349	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)
	Area dei Fori Imperiali. Torre del Conto (Roma) Restauri e allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	Comune di Roma	5.000.000,000		5.000.000,000				5.593.000,000				5.844.358.000					5.844.358.000			
B 02 03	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Traiano e Augusto; Fori di Cesare, Nerva e Tempio di Pace Restauri e allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	Comune di Roma	15.000.000,000		15.000.000,000			13.407.000,000					4.283.934.000					4.283.934.000			
B 02 03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Templum Pacis (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	15.000.000,000		15.000.000,000			13.407.000,000					4.283.934.000					4.283.934.000			
B 02 03/1 a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Foro di Cesare	Comune di Roma											4.283.934.000					4.283.934.000			
B 02 03/1 b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Tempio della Pace	Comune di Roma											4.283.934.000					4.283.934.000			
B 02 03/1 c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Foro di Traiano	Comune di Roma											4.283.934.000					4.283.934.000			
B 02 03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Templum Pacis (Roma).	Comune di Roma	5.000.000,000		5.593.000,000			5.593.000,000					5.844.358.000					5.844.358.000			
					5.593.000,000								5.844.358.000					5.844.358.000			
					13.407.000,000								4.283.934.000					4.283.934.000			
					13.407.000,000								4.283.934.000					4.283.934.000			
					5.593.000,000								5.844.358.000					5.844.358.000			
					5.593.000,000								5.844.358.000					5.844.358.000			
					5.593.000,000								5.844.358.000					5.844.358.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/01/1978		2° decreto del 18/01/1977		3° decreto del 24/08/1977		4° decreto del 22/12/1977		5° decreto del 08/05/1978		6° decreto del 15/05/1978		7° decreto - 16 luglio 1978		8° decreto - dicembre 1978		
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato
B 03 022	Restauro dei tratti di mura da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma																	
	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metronia	Comune di Roma																	
B 03 03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Anagnina all'anfiteatro Castruense	Comune di Roma																	
	Mura di Roma - Restauro di Porta Anagnina, Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta S. Giovanni all'anfiteatro Castruense	Comune di Roma																	
B 03 04	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, di Porta Tiburtina e dei tratti di mura al lati delle porte	Comune di Roma																	
	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma																	
B 03 04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma																	
	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma																	
B 03 05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma																	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/07/1996		2° decreto del 18/07/1997		3° decreto del 23/08/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato
			700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000
				ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97	ago-97
			1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000
				ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99
			1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000	ago-99	1.300.000.000
				ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99
			800.000.000	ago-97	800.000.000	ago-97	800.000.000	ago-97	800.000.000	ago-97	800.000.000	ago-97	800.000.000	ago-97	800.000.000	ago-97	800.000.000	ago-97	800.000.000
				ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99	ago-97	ago-99
			800.000.000	ago-99	800.000.000	ago-99	800.000.000	ago-99	800.000.000	ago-99	800.000.000	ago-99	800.000.000	ago-99	800.000.000	ago-99	800.000.000	ago-99	800.000.000
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99
				ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99	ago-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/07/1996			2° decreto del 18/07/1997			3° decreto del 24/08/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998					
			Corso Stimato	Risorse DL 149	Altre risorse	Tempi letti (d)	Corso Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Corso Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (d)	Corso Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Corso Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Corso Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (d)	Corso Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse
B 05 01/1	Restauro di Palazzo Braccini - Interventi preliminari.	Comune di Roma	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 05 01/2	Restauro di Palazzo Braccini - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braccini - Museo di Roma	Comune di Roma	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 08 01	Palazzo Altompe (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 08 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 08 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica"; restauri e allestimenti	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 08 04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 08 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, ridisegnazione sistema di illuminazione (grafico verso piazza del Claustrone)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 08 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Strutturazione strutture Diocleziane e opere archeologiche (edificati via Craxia, via Parigi, Obelisco), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000
B 08 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000	nov-97	3.000.000,000	2.100.000,000	1.000.000,000



Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)
B 08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allineamento della Sezione Protestanti e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	8.700.000,000	8.700.000,000		8.700.000,000	8.700.000,000		8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000	8.700.000,000
B 08	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	30.000.000,000	30.000.000,000		30.000.000,000	30.000.000,000		30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000	30.000.000,000
B 09	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralzo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000
B 10	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralzo)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	6.000.000,000	6.000.000,000		6.000.000,000	6.000.000,000		6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000	6.000.000,000
B 10	Museo Nazionale di Villa Giulia (Roma) Restauro, adeguamento funzionale e nuovi allestimenti di Villa Giulia. Restauro architettonico della Villa Poniatowski (prima fase).	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	23.000.000,000	23.000.000,000		23.000.000,000	23.000.000,000		23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000	23.000.000,000
B 10	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	9.800.000,000	9.800.000,000		9.800.000,000	9.800.000,000		9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000
B 10	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	9.800.000,000	9.800.000,000		9.800.000,000	9.800.000,000		9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000	9.800.000,000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 15 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998								
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi letti (c)	Tempi letti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Tempi letti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Tempi letti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Tempi letti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Tempi letti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (c)	Tempi letti (d)
B 12	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medievali sul lato orientale, manutenzione.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
B 12	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000	
B 12	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
B 12	Rocca di Papa, Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
B 12	Castello Palazzolo (Rocca di Papa/Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	
B 12	Castello Colonna (Gonzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord (vedi anche intervento B 19, 4)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	
B 12	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000	
B 12	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/09/1997				3° decreto del 24/09/1997				4° decreto del 22/11/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998				
			Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	
B 12 18	Forse Michelangelo (Civitaavecchia/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.800.000.000		mar-97			2.800.000.000		ott-99			2.800.000.000		ott-99			2.800.000.000		nov-97				2.800.000.000		ott-99					2.800.000.000		ott-99		
B 12 19	Castello di S.Severa (S.Mariella/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.500.000.000		ott-99			5.500.000.000		ott-99			5.500.000.000		ott-99			5.500.000.000		nov-97				5.500.000.000		ott-99					5.500.000.000		ott-99		
B 12 20	Castello Oddecarichi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
B 12 21	Castello Oddecarichi (Bracciano/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
			600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
			600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
			600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
			600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
			600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
			600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		
			600.000.000		apr-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		ott-99			600.000.000		nov-97				600.000.000		ott-99					600.000.000		ott-99		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 23/11/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/06/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)
B 12 22	Castello di Montecore (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000,000			3.000.000,000			3.000.000,000			3.000.000,000			3.000.000,000			3.000.000,000			3.000.000,000			3.000.000,000		
B 12 23	Completamento dei lavori di restauro e ripulitura dei prospetti, revivente dei tetti e lavori interni	Presidenza del Consiglio dei Ministri																								
B 12 24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	Presidenza del Consiglio dei Ministri																								
B 12 25	Restauro della casa di S. Brigida in Piazza Farnese	Ordine del SS Salvatore di Santa Brigida																								
B 12 26	Passetto di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile	Ministero Beni Culturali																								
B 12 27	Ex Scuderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	Ministero Beni Culturali																								
B 13 01	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.000.000,000			5.000.000,000			5.000.000,000			5.000.000,000			5.000.000,000			5.000.000,000			5.000.000,000			5.000.000,000		
B 13 01/A	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																								

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/09/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/11/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. c)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. c)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. c)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (let. c)
B 13	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97
B 13	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97	500.000.000	800.000.000	mar-97
B 13	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	200.000.000	200.000.000	mar-97	200.000.000	200.000.000	mar-97	200.000.000	200.000.000	mar-97	200.000.000	200.000.000	mar-97	200.000.000	200.000.000	mar-97	200.000.000	200.000.000	mar-97	200.000.000	200.000.000	mar-97	200.000.000	200.000.000	mar-97
B 13	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97
B 13	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	mar-97
B 13	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97
B 13	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima parte)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97	800.000.000	800.000.000	mar-97
B 13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97
B 13	Chiesa S. Gregorio Magno al Celio (Roma) Restauro della facciata e riqualificazione dell'area annessa	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97	500.000.000	500.000.000	mar-97

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 2/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Risorse DL 651
B 13 21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		961.300.000		961.300.000		961.300.000	
B 13 22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		961.300.000		961.300.000		961.300.000	
B 13 23	Chiesa S. Susanna (Roma) Interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		961.300.000		961.300.000		961.300.000	
B 13 24	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000		1.300.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		961.300.000		961.300.000		961.300.000	
B 13 25	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma) Restauro dell'apparato decorativo interno, interventi di risanamento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		961.300.000		961.300.000		961.300.000	
B 13 25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altompe e della cappella Avia e indagini archeologiche	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		961.300.000		961.300.000		961.300.000	
B 13 25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altompe e della cappella Avia. Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		961.300.000		961.300.000		961.300.000	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 20/09/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse
B 13 37	Chiesa della SS. Annunziata (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
B 13 38	Chiesa di S. Bartolomeo de Inania (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
B 13 39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondatale.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	
B 13 40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
B 13 41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000	
B 13 42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano e sistemazione museale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
B 13 43	Chiesa del SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996					2° decreto del 18/04/1997					3° decreto del 24/06/1997					4° decreto del 22/12/1997					5° decreto del 08/05/1998					6° decreto del 15/05/1998					7° decreto - 15 luglio 1998					8° decreto - dicembre 1998					
			Costo Stimato	Risorse DL 149	Altre risorse	Tempi letti c)	Tempi letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti c)	Tempi letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti c)	Tempi letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti c)	Tempi letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti c)	Tempi letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti c)	Tempi letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti c)	Tempi letti d)						
B 13	Chiesa del SS. Domenico e Sisto (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.600.000,000	700.000,000		mar-97	11-99		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		500.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000	
B 13	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000,000	1.000.000,000		mar-97	11-99		nov-97		360.000,000	360.000,000		nov-97		360.000,000	360.000,000		nov-97		360.000,000	360.000,000		nov-97		360.000,000	360.000,000		nov-97		360.000,000	360.000,000		nov-97		360.000,000	360.000,000		nov-97		360.000,000	360.000,000	
B 13	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	700.000,000	700.000,000		mar-97	11-99		nov-97		300.000,000	300.000,000		nov-97		300.000,000	300.000,000		nov-97		300.000,000	300.000,000		nov-97		300.000,000	300.000,000		nov-97		300.000,000	300.000,000		nov-97		300.000,000	300.000,000		nov-97		300.000,000	300.000,000	
B 13	Chiesa di S. Giuseppe del Falgoutti, S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.600.000,000	700.000,000		mar-97	11-99		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		500.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000	
B 13	Chiesa di S. Giuseppe del Falgoutti (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.600.000,000	700.000,000		mar-97	11-99		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		500.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000	
B 13	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.600.000,000	700.000,000		mar-97	11-99		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		500.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000	
B 13	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone, S. Maria alle Fornaci, S. Maria dei Miracoli e S. Maria di Monte Santo (Roma) Restauro partecipi e facciate	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.600.000,000	700.000,000		mar-97	11-99		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		500.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000	
B 13	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.600.000,000	700.000,000		mar-97	11-99		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		500.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000		nov-97		400.000,000	500.000,000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/01/1996		2° decreto del 18/01/1997		3° decreto del 24/01/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 149	Altre risorse	Tempi letti (d)	Tempi letti (c)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (d)	Tempi letti (c)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (d)	Tempi letti (c)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (d)	Tempi letti (c)	Risorse DL 651
	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)		3.000.000.000																
B 13 49	Chiesa di S. Michele, S. Nicola in carcere, S. Pantaleo, S. Pietro in Montorio, S. Prisca, S. Salvatore in Lauro e S. Spirito in Sassia (Roma) Restauro globale (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																	
B 13 49/1	Chiesa di S. Michele, Restauro della cripta	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																	
B 13 49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																	
B 13 49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																	
B 13 49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																	
B 13 49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																	
B 13 49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento. Restauro Globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali																	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/09/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998							
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Stato degli adempimenti amministrativi	
B 13	Complesso Abbaziale delle Tre Fontane (Roma) Restauro complessivo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	6.000.000.000	6.000.000.000	0	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	
B 13	Chiesa di S. Zeico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione
B 13	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione
B 13	Convento di San Francesco (Velletri/Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione
B 13	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione
B 13	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma) Restauro globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione
B 13	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione
B 13	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma) Restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione
B 13	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	877.562.470	877.562.470	0	0	0	nov-97	nov-97	nov-97	Riduzione

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 21/11/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 349	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651
B 13	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento di Palazzo (Rocca di Papa/Roma) Restauro globale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
B 13	Convento di San Costantino (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
B 13	Convento di San Costantino (Vicovaro/Roma) Restauro, consolidamento e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
B 13	Abbazia di S. Andrea in Fiumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
B 13	Abbazia di S. Andrea in Fiumine (Ponzano Romano/Roma) Restauro del complesso abbaziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
B 13	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
B 13	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
B 13	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma) Restauro del monastero ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
B 13	Sanctuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

RO 3

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 06/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)
B 13	66	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000		mar-97	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
B 13	67	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000		mar-97	mar-97	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
B 13	68	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000		mar-97	mar-97	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
B 13	69	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000		mar-97	mar-97	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
B 13	70	Comune di Roma	2.000.000.000		mar-97	mar-97	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/09/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998					
			Altre risorse	Risorse DL 149	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato	Altre risorse	Risorse DL 651	Caso Svinato
B 15	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
B 15	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
B 15	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000
B 15	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000
B 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino. Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000
B 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla. Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000
B 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo. Completamento restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000
B 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma. Consolidamento struttura, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000
B 16	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e sicurezza	Ministero per i Beni e le Attività Culturali		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 16/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 23/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)
B 16 06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale. Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio del XI Martire e Portico Adfianze artistiche	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria. Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiburtina e terrazza sul Bastione Traianeo. Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passaggio da S. Maria Antiqua a S. Annalisa e a via di S. Gregorio. Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arce Severiane e Terme. Restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 12	Palatino - Foro Romano (Roma) Arce della Vigla Barberini. Ultimazione restauri	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arce di Costantino. Completamento e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328
B 16 14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio. Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	4.000.000,000	400.000,000	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328	3.698.046,294	398.319,328

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 2/06/1997		4° decreto del 2/2/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/06/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse
B 16 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
B 16 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
B 16 17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
B 16 18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	
B 16 1801	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000	
B 16 1802	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
B 16 1803	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
B 16 1804	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, scavo, valorizzazione, scavo - Area archeologica Tor Carbonara	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
B 16 1805	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	



Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti beneficiari del finanziamento	1° decreto del 14/01/1996			2° decreto del 14/01/1997			3° decreto del 24/01/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 04/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998				
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B 16 18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
B 16 18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino monumentale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Mifre di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Case Castell	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saburo	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Cautigione. Lettura integrata del territorio.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	60.000.000	50.000.000	10.000.000	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97

Aggiornato al 31 dicembre 1998



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998				
			Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato
B 16	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000		mar-97			2.000.000.000		nov-97			2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		2.000.000.000		Progettazione definitiva amministrativi		
B 16	Testaccio (Roma) Scavo, restauro recupero agibilità dell'area del Porto fluviale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.000.000.000		mar-97			2.000.000.000		nov-97			2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		nov-97		2.000.000.000		1.869.967.700		Riduzione assegnazioni All "A" per amministrazioni amministrativi		
B 16	Villa dei Quintili (Roma) Vede, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.900.000.000		mar-97			5.900.000.000		nov-97			5.900.000.000		nov-97		5.900.000.000		nov-97		5.900.000.000		nov-97		5.900.000.000		nov-97		5.469.913.397		5.469.913.397		Riduzione assegnazioni All "A" per amministrazioni amministrativi		
B 16	Villa dei Quintili (Roma) Restauro, scavi archeologici e sistemazione (Appia Antica)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.900.000.000		mar-97			5.900.000.000		nov-97			5.900.000.000		nov-97		5.900.000.000		nov-97		5.900.000.000		nov-97		5.900.000.000		nov-97		5.469.913.397		5.469.913.397		Riduzione assegnazioni All "A" per amministrazioni amministrativi		
B 16	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000		mar-97			1.000.000.000		nov-97			1.000.000.000		nov-97		1.000.000.000		nov-97		1.000.000.000		nov-97		1.000.000.000		nov-97								
B 16	Acquedotto della Villa dei Quintili (Roma) Restauro, riassetto fognario e impiantistica. Completamento restauro arcate e piloni	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000		mar-97			1.000.000.000		nov-97			1.000.000.000		nov-97		1.000.000.000		nov-97		1.000.000.000		nov-97		1.000.000.000		nov-97								
B 16	Parco delle Tombe della Via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	4.580.000.000		mar-97			4.580.000.000		nov-97			4.580.000.000		nov-97		4.580.000.000		nov-97		4.580.000.000		nov-97		4.580.000.000		nov-97		2.659.556.200		2.659.556.200		Riduzione assegnazioni All "A" per amministrazioni amministrativi		
B 16	Flaminia Villa di Livia, Tomba Cetina, Sasa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000.000		mar-97			3.000.000.000		nov-97			3.000.000.000		nov-97		3.000.000.000		nov-97		3.000.000.000		nov-97		3.000.000.000		nov-97		680.000.000		680.000.000		Riduzione assegnazioni All "A" per amministrazioni amministrativi		
B 16	Flaminia Villa di Livia, Tomba Cetina, Sasa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma) Scavi archeologici, restauri e sistemazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000.000.000		mar-97			3.000.000.000		nov-97			3.000.000.000		nov-97		3.000.000.000		nov-97		3.000.000.000		nov-97		3.000.000.000		nov-97		680.000.000		680.000.000		Riduzione assegnazioni All "A" per amministrazioni amministrativi		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Stato degli adempimenti amministrativi	
B 16 24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	
B 16 25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	500.000.000	500.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 26	Antica città di Gabi (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Caugliione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	5.000.000.000	5.000.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 27	Via Anagnina (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 28	Antro delle Sorci (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	560.000.000	560.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 29	Antro delle Sorci (Palestrina/Roma) Recupero e valorizzazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	560.000.000	560.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 16 30	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Centro Camerelle	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.060.000.000	1.060.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 18 01	Recupero del "Barco Borghese" e delle santuzioni della Villa Romana	Comune di Monte Porzio Catone	500.000.000	500.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97
B 18 01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restituito del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	500.000.000	500.000.000		nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97	nov-97

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 21/09/1997		4° decreto del 22/11/1997		5° decreto del 06/05/1998		6° decreto del 15/06/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998			
			Risorse DL 349	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse
B 18 09	Villa Mondragone (Monte Porzio Caveone/Roma) 1° stralzo funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresta	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000,000		7.700.000,000		7.700.000,000		7.700.000,000		7.700.000,000		7.700.000,000		7.700.000,000		7.700.000,000		7.700.000,000	
B 18 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione delle chiese e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.335.000,000		1.257.000,000		93.000,000		93.000,000		93.000,000		93.000,000		93.000,000		93.000,000		93.000,000	
B 18 11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Rerूपero area archeologica	Comune di Valmontone	500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000	
B 18 12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.500.000,000		1.500.000,000		1.500.000,000		1.500.000,000		1.500.000,000		1.500.000,000		1.500.000,000		1.500.000,000		1.500.000,000	
B 18 13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel San Pietro Romano	600.000,000		600.000,000		600.000,000		600.000,000		600.000,000		600.000,000		600.000,000		600.000,000		600.000,000	
B 18 14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000	
B 18 15	Riqualificazione del comprensorio della Montarella (Carrara Prenestina/Roma) Sistemazione dell'area circostante e realizzazione di un'area parcheggio	Provincia di Roma	400.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000		500.000,000	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		3° decreto del 18/01/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998					
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Tempi ltt (c)	Tempi ltt (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi ltt (c)	Tempi ltt (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi ltt (c)	Tempi ltt (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi ltt (c)	Tempi ltt (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Tempi ltt (c)	Tempi ltt (d)
B 18 24	Sistemazione area parcheggio edificio Parco Cligi e risanamento Parco Fimoli	Comune di Ariccia	1.400.000.000		feb-97	feb-97	1.400.000.000		feb-97	feb-97	1.400.000.000		feb-97	feb-97	1.300.000.000		feb-97	feb-97	1.000.000.000		n.d.	n.d.
B 18 23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.400.000.000		feb-98	feb-98	1.400.000.000		feb-98	feb-98	1.400.000.000		feb-98	feb-98	1.300.000.000		feb-98	feb-98	1.200.000.000		feb-98	feb-98
B 18 22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	300.000.000		dic-96	dic-96	300.000.000		dic-96	dic-96	300.000.000		dic-96	dic-96	300.000.000		dic-96	dic-96	274.992.886		dic-96	dic-96
B 18 21	Chiesa di San Lavinio (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S. Paolo	300.000.000		feb-97	feb-97	300.000.000		feb-97	feb-97	300.000.000		feb-97	feb-97	300.000.000		feb-97	feb-97	254.200.000		feb-97	feb-97
B 18 20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000.000		mar-97	mar-97	150.000.000		mar-97	mar-97	150.000.000		mar-97	mar-97	150.000.000		mar-97	mar-97	150.000.000		mar-97	mar-97
B 18 19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	450.000.000		dic-97	dic-97	450.000.000		dic-97	dic-97	450.000.000		dic-97	dic-97	389.792.498		dic-97	dic-97	389.792.498		dic-97	dic-97
B 18 18	Recca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	1.000.000.000		ago-98	ago-98	1.000.000.000		ago-98	ago-98	1.030.000.000		ago-98	ago-98	1.030.000.000		ago-98	ago-98	741.881.223		ago-98	ago-98
B 18 17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	435.000.000		feb-98	feb-98	435.000.000		feb-98	feb-98	512.000.000		feb-98	feb-98	512.000.000		feb-98	feb-98	397.685.651		feb-98	feb-98
B 18 16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ricostruzione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	700.000.000		set-97	set-97	700.000.000		set-97	set-97	2.700.000.000		set-97	set-97	2.700.000.000		set-97	set-97	1.959.637.248		set-97	set-97

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/11/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 10 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi letti (d)	Tempi letti (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (d)	Tempi letti (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi letti (d)	Tempi letti (c)	Costo Stimato	Risorse DL 651
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000
B 19 20/6	Sistemazione dell'piazzale annesso alla Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000
B 19 21	Riapertura del Palazzo Vasconile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000
	Luoghi di culto lungo la via Francigena (Viterbo)	Provincia di Viterbo	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000
	Restauri di chiese, immobili e castelli (prima fase)	Provincia di Viterbo	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscanara/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000
		Provincia di Viterbo	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000
B 19 23	Museo della cristianità (Viterbo) Restauro e ristrutturazione dei locali e dei materiali espositivi (prima fase)	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000
		Comune di Viterbo	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000
			2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000
			2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 14/01/1996		2° decreto del 10/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998					
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)
B 19 24	Santuari e chiese (Tarquinia/Viterbo) Consolidamento e restauro	Provincia di Viterbo	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000	1.600.000,000	2.750.000,000
B 19 24/1	Consolidamento, restauro e recupero edificio della Chiesa di S. Giacomo, della chiesa di Salvatore e del Santuario di Santa Maria in Valverde (Tarquinia VT)	Comune di Tarquinia	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000
B 19 24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000
B 19 24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edificio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000	500.000,000	2.750.000,000
B 19 25	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000
B 19 25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000
B 19 25/2	Sistemazione dell'Orto francescano	Comune di Poggio Bustone	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000
B 19 26	Santuario di "Fonte Colombe" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000	1.600.000,000	500.000,000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/07/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998														
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)						
B 19 43	Sanatorio della Madonna della Sorrecca (Sabaudia/Latina) Restauro	Comune di Sabaudia	125.000.000				125.000.000						125.000.000					125.000.000						179.311.434						179.311.434								
				125.000.000																																		
B 19 44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Sabaudia	200.000.000				200.000.000						200.000.000					200.000.000							179.311.434													
				200.000.000																																		
B 19 45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000.000				650.000.000						650.000.000					650.000.000							650.000.000													
				650.000.000																																		
B 19 46	Ritiratura Santuario Madonna del Colle	Comune di Lencola	100.000.000				100.000.000						100.000.000					100.000.000							100.000.000													
				100.000.000																																		
			20.000.000				20.000.000						20.000.000					20.000.000							20.000.000													
				20.000.000																																		

Al B: Ulteriore finanziamento di 20.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	3° decreto del 18/09/1996		3° decreto del 1/04/1997		3° decreto del 2/06/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998	
			Risorse DL 349	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. c)
B 19 52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Camico	Comune di Settefrati	140.000.000	mar-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	252.424.924	dic-97
B 19 53	Santuario della Madonna di Camico (Settefrati/Protonno) Realizzazione di uno spazio attrezzato esterno	Comune di Settefrati	650.000.000	mar-97	650.000.000	dic-97	650.000.000	dic-97	650.000.000	dic-97	650.000.000	dic-97	650.000.000	dic-97	615.300.000	dic-97
B 19 54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Protonno)	Comune di Settefrati	300.000.000	mar-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	313.880.125	dic-97
B 19 55	Chiesa di Santa Sofia (Settefrati/Protonno)	Comune di Settefrati	300.000.000	mar-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	300.000.000	dic-97	313.880.125	dic-97
B 19 56	Abbazia di Montecassino (Caserta/Protonno) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Casiano	140.000.000	mar-97	140.000.000	dic-97	140.000.000	dic-97	140.000.000	dic-97	140.000.000	dic-97	140.000.000	dic-97	240.000.000	dic-97

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 149	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato
B 19 67	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.000.000,000		2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	2.750.000,000	2.750.000,000	2.750.000,000
B 19 67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino								1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000
B 19 67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino								1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000	1.750.000,000
B 19 68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	800.000,000		800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	675.357,148	675.357,148	675.357,148
B 19 69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasca	300.000,000		300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000
B 19 70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Vulturno/Provine) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Germano	100.000,000		100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000
B 19 71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Vulturno/Provine) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	100.000,000		100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	1.110.846,077	1.110.846,077	1.110.846,077

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998			
			Risorse DL 349	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse
			Costo Stimato	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Tempi lett. c)	Costo Stimato	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Tempi lett. c)	Costo Stimato	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Tempi lett. c)	Costo Stimato	Tempi lett. d)
			1.500.000.000																	
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Veroli																		
B 19 73	Rifacimento copertura, facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano																		
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano																		
B 19 75	Abbazia di Casamari	Ordine Cistercense																		
B 20 01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Clubbete	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	20.000.000.000	dic-97	20.000.000.000	dic-90	20.000.000.000	dic-98	20.000.000.000	dic-90	20.000.000.000	dic-98	20.000.000.000	dic-90	20.000.000.000	dic-98	20.000.000.000	dic-00	20.000.000.000	dic-00
B 20 01.1	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro dell'opera di Roma																		
B 20 01.2	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma																		
B 20 01.3	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro Roma																		
			7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98
			15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98
			1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.
			40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-98	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-98	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-98	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-99
			100.000.000	ren-99	100.000.000	ren-99	100.000.000	ren-98	100.000.000	ren-99	100.000.000	ren-98	100.000.000	ren-99	100.000.000	ren-98	100.000.000	ren-99	100.000.000	ren-99
			40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-98	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-98	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-98	40.000.000	ren-99	40.000.000	ren-99
			1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.	1.000.000.000	n.d.
			15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98
			30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98	30.000.000.000	ott-98
			20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98	20.000.000.000	ott-98
			15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98	15.000.000.000	ott-98
			7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98	7.000.000.000	ott-98



Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/06/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998					
			Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 01 10	P.zz S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riquadratura ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		3.245.965,090		3.245.965,090		nov-99	nov-99
C 01 11	Via Ottaviano, viale Angelica, circonv. Chela, via Ciaula (Roma). Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	3.000.000,000		3.000.000,000		3.000.000,000		3.000.000,000		3.000.000,000		3.000.000,000		3.000.000,000		2.228.821,726		2.228.821,726		nov-99	apr-98
C 01 12	Viale Trastevere, via Moresini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma). Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		2.894.625,466		2.894.625,466		lug-99	apr-98
C 01 13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublico a Porta Marmorata e via Marmorata (Roma). Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	11.500.000,000		11.500.000,000		11.500.000,000		11.500.000,000		11.500.000,000		11.500.000,000		11.500.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		lug-99	apr-98
C 01 13/1	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublico a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Manutenzione marciapiedi, sistema fognario superficiale e arredo	Comune di Roma	4.500.000,000		4.500.000,000		4.500.000,000		4.500.000,000		4.500.000,000		4.500.000,000		4.500.000,000		4.500.000,000		4.500.000,000		nov-99	gen-99

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 10/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 23/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato
	Via Piazza Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da piazza Giarone davanti fino alla via Trionfale (prima fase)	Comune di Roma	4.165.000,000	14.000.000,000															
C 01 18	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, fontana del Ficco e propilei egizi e neoclassici (Roma) Restauro degli arredi e dei perimetri monumentali	Comune di Roma	4.165.000,000	14.000.000,000															
C 01 18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	4.165.000,000	14.000.000,000															
C 01 18/2	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Ficco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma																	
	Villa Borghese: Propilei egizi, Fontana del Ficco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia, restauro degli arredi architettonici	Comune di Roma																	
C 01 19	Villa Borghese: Giardini Segresi, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	2.142.000,000	2.142.000,000	1.300.000,000	1.300.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
	Villa Borghese: Giardini Segresi, Padiglioni della Meridiana e dell'Uccelliera e del piazzale del fronte posteriore del Casinò Nobile (Roma) Restauro degli arredi	Comune di Roma																	
C 10 20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	5.355.000,000	5.355.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000
C 01 21	Villa Doria Pamphilj (Roma) Allungamento del museo di Villa Versella, recupero delle serre ottocentesche e del giardino monumentale e del Museo del Giardino del Cedrina	Comune di Roma	5.355.000,000	5.355.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000	1.190.000,000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996				2° decreto del 18/04/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi (letti c)	Tempi (letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi (letti c)	Tempi (letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi (letti c)	Tempi (letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi (letti c)	Tempi (letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi (letti c)	Tempi (letti d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi (letti c)	Tempi (letti d)		
C 01 26	Riquadratura Teatro Marcello - Piazza di Monte Savello, via Casalana, via del Tempo, via S. Angelo in Pesciera, via Tribuna Campitelli	Comune di Roma	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	dic-97	nov-99	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	dic-97	nov-99	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	dic-97	nov-99	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	dic-97	nov-99	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	dic-97	nov-99				
	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Oltiorio.	Comune di Roma	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99				
	(C01.26) - Recupero urbano del Ghetto (Roma) Recupero edificio via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli (prima fase)	Comune di Roma	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99				
	(C01.27) - Recupero urbano del Ghetto (Roma) Recupero edificio da piazza Monte Savello via Teatro Marcello, via Montanara e area del foro Oltiorio	Comune di Roma	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	dic-97	nov-99				
C 01 28	Potenziamento meccanizzazione Servizio Giardinai	Comune di Roma	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	dic-98	nov-99	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	dic-98	nov-99	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	dic-98	nov-99	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	dic-98	nov-99	2.412.000,000	2.412.000,000	2.412.000,000	dic-98	nov-99				
C 01 29	Lavori per l'impianto del verde nel Parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99				
C 01 30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	Comune di Roma	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99				
	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relativi a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	dic-98	nov-99				

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 14/09/1996		2° decreto del 18/11/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		Suddivisione C 02.03/1 in tre interventi - 02.03/1 in tre parti di 2.362.191.000	
			Risorse DL 149	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Risorse DL 651	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Risorse DL 651	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Risorse DL 651	Tempi lett. d)	Risorse DL 651	Tempi lett. c)		Risorse DL 651
C 02 024	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale	STA	20.000.000,000	gen-98	19.200.000,000	ott-99	19.200.000,000	lug-98	19.200.000,000	nov-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	ott-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	dic-99	8.934.648.000	nov-99
C 02 025	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi di risanamento igienico-ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici	AMA	20.000.000,000	gen-98	19.200.000,000	ott-99	19.200.000,000	lug-98	19.200.000,000	nov-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	ott-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	dic-99	8.934.648.000	nov-99
C 02 026	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di allarme per la sicurezza ed allineamento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero Interno	20.000.000,000	gen-98	19.200.000,000	ott-99	19.200.000,000	lug-98	19.200.000,000	nov-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	ott-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	dic-99	8.934.648.000	nov-99
C 02 027	Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	20.000.000,000	gen-98	19.200.000,000	ott-99	19.200.000,000	lug-98	19.200.000,000	nov-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	ott-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	dic-99	8.934.648.000	nov-99
C 02 03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	20.000.000,000	gen-98	19.200.000,000	ott-99	19.200.000,000	lug-98	19.200.000,000	nov-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	ott-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	dic-99	8.934.648.000	nov-99
C 02 03/1	Area della Basilica di San Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza...	Comune di Roma	20.000.000,000	gen-98	19.200.000,000	ott-99	19.200.000,000	lug-98	19.200.000,000	nov-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	ott-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	dic-99	8.934.648.000	nov-99
C 02 3.1.1	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	20.000.000,000	gen-98	19.200.000,000	ott-99	19.200.000,000	lug-98	19.200.000,000	nov-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	ott-99	13.500.184.000	apr-99	13.500.184.000	dic-99	8.934.648.000	nov-99
C 02	vedi C02A		224.400.000	apr-98	224.400.000	apr-98	224.400.000	apr-98	224.400.000	apr-98	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000
	Cambio titolo - Progra Termini		2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000
			3.864.003.000	apr-98	3.864.003.000	apr-98	3.864.003.000	apr-98	3.864.003.000	apr-98	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000	3.864.003.000
			2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	apr-98	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000	2.385.350.000
			1.456.866.000	apr-98	1.456.866.000	apr-98	1.456.866.000	apr-98	1.456.866.000	apr-98	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000	1.456.866.000
			224.400.000	apr-98	224.400.000	apr-98	224.400.000	apr-98	224.400.000	apr-98	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/01/1998				2° decreto del 18/01/1998				3° decreto del 2/06/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse
C 02	Itinerari giubiliari storici (Roma) Riquilibrare e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99
C 02	Itinerari giubiliari e storici. Contributo alla manutenzione delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99	20.000.000,000	20.000.000,000		lug-98	ott-99
C 02	Itinerari giubiliari e storici. Contributi per la manutenzione e la riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze	Comune di Roma	5.000.000,000	5.000.000,000		5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99
C 02	Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubiliari e storici, processioni e celebrazioni religiose	Comune di Roma	5.000.000,000	5.000.000,000		5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99
C 02	Arce delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle arce	Comune di Roma	5.000.000,000	5.000.000,000		5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99	5.000.000,000	5.000.000,000		lug-98	ott-99
	Intervento di adeguamento dei parcheggi a disposizione delle catacombe - perne al pubblico in Roma	Comune di Roma							lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Contributo per la manutenzione delle sedi stradali e pertinenze delle strade di accesso e dei parcheggi a servizio delle zone limitrofe alle catacombe aperte al pubblico	Comune di Roma							lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
C 02	Ponti pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma							lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
C 02	Pista ciclabile Castel S. Angelo-Ponte Sublico	Comune di Roma							lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99
	Definizione lot. Per								lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99				lug-98	ott-99



Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/09/1997			3° decreto del 28/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998				
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse D. 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)
C 02	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	2.400.000,000					2.400.000,000						2.400.000,000									3.000.000,000	3.000.000,000				
C 02	"ATI" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	2.400.000,000					2.400.000,000						2.400.000,000									3.000.000,000	7.264.911,000				
C 03	Parco Via dei Giubbonari/Campagna de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000,000					2.400.000,000						2.400.000,000									2.400.000,000	2.400.000,000	7.264.911,000			
C 03	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione e costruzione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000,000					1.400.000,000						1.400.000,000									1.400.000,000	1.400.000,000	405.668,150			
C 03	Isole pedonali di piazza S. Ignazio e piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione e costruzione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000,000					1.400.000,000						1.400.000,000									1.400.000,000	1.400.000,000	405.668,150			
C 03	Via delle Muratte, via del Salvatore, via Giustiniana	Comune di Roma	2.600.000,000					2.600.000,000						2.600.000,000									2.600.000,000	2.600.000,000	2.533.908,900			
C 03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi; Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	2.600.000,000					2.600.000,000						2.600.000,000									2.600.000,000	2.600.000,000	2.533.908,900			
C 03	VIA IN ARCIONE, VIA DEL LAVATORE, piazza di Trevi, Via delle Muratte, Piazza di Pietra, Via dei Paschini, Piazza della Rotonda, Via Giustiniana, Via del Salvatore, Piazza Navona (Roma) Interventi di riqualificazione	Comune di Roma	2.600.000,000					2.600.000,000						2.600.000,000									2.600.000,000	2.600.000,000	2.533.908,900			
	Via delle Muratte	Comune di Roma	2.600.000,000					2.600.000,000						2.600.000,000									2.600.000,000	2.600.000,000	2.533.908,900			

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/09/1997			3° decreto del 24/09/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 06/05/1998			6° decreto del 15/02/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 498	Altre risorse	Tempi (let c)	Tempi (let d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (let c)	Tempi (let d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (let c)	Tempi (let d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (let c)	Tempi (let d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (let c)
C 03 04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Salaria (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	4.600.000,000	4.600.000,000		4.600.000,000	4.600.000,000		4.600.000,000	4.600.000,000	4.600.000,000	4.600.000,000		4.600.000,000	4.600.000,000	4.600.000,000	4.600.000,000		4.600.000,000	4.600.000,000	4.600.000,000	4.600.000,000		4.600.000,000	4.600.000,000	4.600.000,000
C 03 05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archetram	Comune di Roma	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000
C 03 06	Archetram (Roma) Interventi di inserimento urbanistico nelle aree di maggiore interesse e turismo complementari alla stazione della ferrovia	Comune di Roma	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000		20.000.000,000	20.000.000,000	20.000.000,000
C 03 07	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (primo stralcio)	Comune di Roma	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000
C 03 08	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (secondo stralcio)	Comune di Roma	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000		19.000.000,000	19.000.000,000	19.000.000,000
C 03 09	Contributi ristrutturazione negozi locali pubblici e insegne eserciti commerciali	Comune di Roma	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000
C 04 01	Terminal bus	Regione Lazio	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000		1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000



Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Stipendio Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998			
			Altre risorse	Risorse DL 349	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Terminal bus (tra la SS 140 ed il parco pubblico di Torlonia) per la movimentazione dei turisti	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza e galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta tra la SS. Appia e la SS. 140	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture di collegamento a servizio della stazione "La Villetta" linea F.F.S.S. Roma-Albano	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Terminal Bus	Comune di CastelGandolfo																		
C 04	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo																		



Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000
C 07 01	Parco Casalino Labicano, Villa De Sanctis - Caricombe di San Marcelino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000
C 08 01	Villa Borghese (Roma) Restauro delle aree a verde del Parco dei Daini, dei Giardini Segreti e realizzazione della recinzione	Comune di Roma	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000
C 08 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000
C 08 01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000
C 08 01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzione lungo Via Pinciana, Giardini del Lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000
C 08 01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000
C 09 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riquadratura del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000
			3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000	3.500.000,000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 13/01/1997		3° decreto del 24/01/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 16/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 349	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651	Costo Stimato	Risorse DL 651
C 09 02	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Sistemazione del Parco del Celio, (Viale compresa tra la "carreria" e il circo di Massenzio)	Comune di Roma	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000
C 09 02/1	Riquadrificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (viale compresa tra la carreria Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma																	
C 09 02/2	Riquadrificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica); Restauro manufatti storici:Ponti,Annia Regilla,Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombaro Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma																	
C 10 01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia; Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma																	
C 11 01	Villa Ada - Catacombe di Priscilla (Roma) Sistemazione delle aree a verde e del corso d'acqua, realizzazione di attrezzature e infrastrutture per la fruizione turistica	Comune di Roma	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
C 11 01/1	S. Gregorio al Celio (Roma) Recupero delle aree a verde	Comune di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
C 11 01/2	Via di S. Gregorio al Celio e nuova perimetrali. Interventi di restauro e manutenzione. - Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili. integrazione illuminazione esistente e nuovi impianti.	Comune di Roma																	
C 11 01/1	Area archeologica del Celio, via al S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma																	
C 11 01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente ed nuovi impianti	Comune di Roma																	

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/06/1998			2° decreto del 18/06/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 6 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998									
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 551	Altre risorse	Tempi (lett. c)	Tempi (lett. d)	
C 11 02	Area archeologica del Celio, Casina dei Savi consolidamento e restauro	Comune di Roma																															
	Casina dei Savi consolidamento e restauro	Comune di Roma																															
	Area archeologica del Celio (Roma) Recupero e valorizzazione dell'area (Programma PARCHCEL)	Comune di Roma																															
C 11 03	Area archeologica del Celio, Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	20.000.000,000																														
	Ex palestra dei Vigili - Spa, Polizia Turistica e Banda (coperture, impianti, sistemazioni esterne)	Comune di Roma																															
C 11 04	Area archeologica del Celio, Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma																															
	Casa dell'ex Abate Commendatario (consolidamento e restauro)	Comune di Roma																															
	Area archeologica del Celio, Restauro del casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario	Comune di Roma																															
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio, colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma																															
	Restauro del verde di Villa Celimontana ed aree prospicenti percorso Archeotrain	Comune di Roma																															

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cd. 11	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998										
			Costo Stimato	Altre risorse	Risorsa DL 349	Tempi (a)	Tempi (b)	Tempi (c)	Tempi (d)	Tempi (e)	Tempi (f)	Risorse DL 651	Costo Stimato	Altre risorse	Risorsa DL 651	Tempi (a)	Tempi (b)	Tempi (c)	Tempi (d)	Tempi (e)	Risorse DL 651	Costo Stimato	Altre risorse	Risorsa DL 651	Tempi (a)	Tempi (b)	Tempi (c)	Tempi (d)	Tempi (e)					
C 11 13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	mar-98	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	mar-98	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	mar-98	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	mar-98	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 14	Fronti Interie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 15	Biblioteca di Papa Adapio ed inselie romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 16	Arco di Siano e Dolabella e soprastante Acquetodino Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Domenica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 21	Attività di formazione	Provincia di Roma	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97
C 11 22	Risarcimento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97	1.700.000,000	191.500.000,000	170.000.000,000	dic-99	mar-98	dic-99	mar-98	nov-97

R. n. 3
Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996			2° decreto del 18/09/1997			3° decreto del 21/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/06/1998			6° decreto del 15/06/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998							
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. c)
D 03 01	Tram San Pietro/Aurelia (Roma) Realizzazione del collegamento tranviario	Comune di Roma	50.000.000.000			50.000.000.000					50.000.000.000					50.000.000.000					50.000.000.000					50.000.000.000					
D 04 01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma	71.000.000.000			71.000.000.000					71.000.000.000					71.000.000.000					71.000.000.000					71.000.000.000					
D 05 01	Tram Traminì, Venezia - San Pietro (Roma) Realizzazione della linea tranviaria. Collegamento con la linea Aurelia/S. Pietro e con la linea Casalbello/largo Argentina	Comune di Roma	50.000.000.000			50.000.000.000					50.000.000.000					50.000.000.000					50.000.000.000					50.000.000.000					
D 05 01/1	Archeo Tram (Roma) Realizzazione della linea tranviaria a servizio di percorsi turistici	Comune di Roma	310.000.000.000			310.000.000.000					310.000.000.000					310.000.000.000					310.000.000.000					310.000.000.000					
D 05 01/2	Materiali rovinabili per le ferrovie concesse e le linee metropolitane, treni tranviari e autobus (Roma) Acquisto di materiale di ricambio autobus e ricambio dell'equipaggio (prima parte)	Comune di Roma	310.000.000.000			310.000.000.000					310.000.000.000					310.000.000.000					310.000.000.000					310.000.000.000					
D 05 01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAAC	8.081.338.000			8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					
D 05 01/2	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAAC	8.081.338.000			8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					
D 05 01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media capacità.	ATAAC	8.081.338.000			8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					8.081.338.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/06/1996				2° decreto del 18/06/1997				3° decreto del 24/06/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi leti (c)	Tempi leti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi leti (c)	Tempi leti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi leti (c)	Tempi leti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi leti (c)	Tempi leti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi leti (c)	Tempi leti (d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi leti (c)	Tempi leti (d)		
			150.000.000,00			100.000.000,00			mag-98	mag-97	150.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00			100.000.000,00			100.000.000,00			100.000.000,00				
D 12 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione ES (Campino/Roma) - Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000,00			1.500.000,00			mar-98	mag-97	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00				
D 11 01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italo e via Pineta Sacchetti	ANAS	1.500.000,00			1.500.000,00			mar-98	mag-97	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00				
D 10 01/b	Autosstrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	150.000.000,00			150.000.000,00			mar-98	mag-97	150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00				
D 10 01/a	Autosstrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	97.500.000,00			97.500.000,00			mar-98	mag-97	97.500.000,00			97.500.000,00		97.500.000,00			97.500.000,00		97.500.000,00			97.500.000,00			97.500.000,00			97.500.000,00				
D 10 01	Autosstrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	97.500.000,00			97.500.000,00			mar-98	mag-97	97.500.000,00			97.500.000,00		97.500.000,00			97.500.000,00		97.500.000,00			97.500.000,00			97.500.000,00			97.500.000,00				
		Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	150.000.000,00			150.000.000,00			mar-98	mag-97	150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00				
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	150.000.000,00			150.000.000,00			mar-98	mag-97	150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00				
		Ferrovie dello Stato	150.000.000,00			150.000.000,00			mar-98	mag-97	150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00				
		Ferrovie dello Stato	150.000.000,00			150.000.000,00			mar-98	mag-97	150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00			150.000.000,00				

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1998			2° decreto del 18/09/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse	Tempi (letti d)	Tempi (letti c)	Altre risorse
D 13 01	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Caltanissetta/Roma) Realizzazione di un parcheggio a scalo del traffico locale sulla linea FMS Roma - Casimo	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
D 13 02	Parcheggio di scambio (Zagreb/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
D 13 04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	700.000.000	700.000.000		700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
D 13 05	D 13 - 4a. Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma) I lotto	Comune di Genazzano	300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
D 13 05	D 13 - 4b. Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma) II lotto	Comune di Genazzano	550.000.000	550.000.000		550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
D 13 05	Parcheggio di scambio in località Bagri di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
D 13 06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FMS Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	700.000.000	700.000.000		700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
D 13 07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FMS Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	700.000.000	700.000.000		700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
D 13 08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 della S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998	
			Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Altre risorse	Tempi let. (c)	Tempi let. (d)	Altre risorse	Tempi let. (c)
D 13 09	S.P. FREGANZANO (Campiano, Frascati, Grotteferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria Km 9+000/12 Km 10+500, via S. Candida alla SS via del Lago (conferma) Prov. di Roma	Provincia di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
D 13 10	S.P. Casa Romana (Zagarolo, S. Cesare/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo Prov. di Roma	Provincia di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
D 13 11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalle Tiburtina alla A24 Prov. di Roma	Provincia di Roma	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000
D 13 12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Marino - via Valignani (Montecitorio/Roma) Prov. di Roma	Provincia di Roma	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
D 14 01	Collegamento tra la S.P. Volturna - S.P. San Marco - S. Valignani (Montecitorio/Roma) Esecuzione di lavori di manutenzione della ferrovia Roma-Orte. Realizzazione di un cavalcavia ferroviario e nuove opere d'arte. Prov. di Roma	Provincia di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
D 14 02	S.P. Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria ed allargamento dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea) Prov. di Roma	Provincia di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
D 14 03	S.P. Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea) Prov. di Roma	Provincia di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
D 14 03	S.P. Laurentina (Roma) dal CRA fino al Km. 28,800. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria Prov. di Roma	Provincia di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998				
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)
D 14 08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	7.500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000
D 14 07	SP Frasca di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	7.500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000
D 14 06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	7.500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000
D 14 05	SP Tibertina (Frasco Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	7.500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000
D 14 04	SP Tibertina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al Km 18+000 (vincolo autostradale)	Provincia di Roma	7.500.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000
D 14 03/b	SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal CRA dal Km 12+000 al Km 14+000; allargamento dal Km 14+500 al Km 16+501	Provincia di Roma	7.500.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000
D 14 03/a	SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal CRA al Km 12+000; manutenzione straordinaria dal Km 16+500 al Km 28+200	Provincia di Roma	7.500.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000
	SP Laurentina (Roma) Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria	Provincia di Roma	7.500.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000
			7.500.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	3.000.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 16/09/1996			2° decreto del 18/04/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 149	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Costo Stimato
D 15 01/1	Raddoppi ed elettrificazione del tratto La Storta - Casano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovia dello Stato																								
D 15 01/2	Potenziamento della linea Ciampino-Viterbo con realizzazione nuova fermata S. Cesarea e nuovi posti di accrocio di Pavana e Lavario	Ferrovia dello Stato																								
	Ferrovia del Lupo; Bracciano-Caselli (Roma-Viterbo) Raddoppio della tratta La Storta-Casano; elettrificazione fino a Viterbo; Realizzazione fermate Zama, Pantano, Ciampino	Ferrovia dello Stato																								
D 16 01	Adeguatezza funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche ad adeguamento del porto (1° lato)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia																								
	Porto di Civitavecchia (Roma) Adeguatezza funzionale e adeguamento del porto (1° lato)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia																								
D 16 02	Adeguamento funzionale (II Lato)	Ente Porto Civitavecchia																								
D 18 01	Linee A e B della metropolitana (Roma) Posenziamento delle linee, eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificazione stazioni, ristrutturazione delle infrastrutture e nodi di scambio	Comune di Roma																								
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini.	Comune di Roma																								
D 18 01/2	Adeguamento metro A.	Comune di Roma																								

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/04/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 15 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998					
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)
2 01 02	Automezze ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Casanetti movimentabili con automezze Side Leader	AMA	1.400.000,000	8.000.000,000	4.400.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	6.300.000,000	apr-98	apr-98	1.400.000,000	8.000.000,000	6.300.000,000	apr-98	apr-98	1.400.000,000	8.000.000,000	6.300.000,000	apr-98	apr-98	
2 01 03	Automezze ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Leader per la raccolta dei rifiuti	AMA	1.100.000,000	10.000.000,000	1.100.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	1.400.000,000	apr-98	apr-98	1.400.000,000	10.000.000,000	1.400.000,000	apr-98	apr-98	1.400.000,000	10.000.000,000	1.400.000,000	apr-98	apr-98	
2 01 04	Automezze ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompartori per la raccolta dei rifiuti suburbani	AMA	1.900.000,000	1.500.000,000	1.900.000,000	1.500.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	500.000,000	apr-98	apr-98	500.000,000	1.500.000,000	500.000,000	apr-98	apr-98	500.000,000	1.500.000,000	500.000,000	apr-98	apr-98	
2 01 05	Automezze ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	600.000,000	600.000,000	600.000,000	600.000,000	700.000,000	700.000,000	100.000,000	apr-98	apr-98	100.000,000	600.000,000	100.000,000	apr-98	apr-98	100.000,000	600.000,000	100.000,000	apr-98	apr-98	
2 01 06	Automezze ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.400.000,000	1.000.000,000	1.400.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	400.000,000	apr-98	apr-98	400.000,000	1.000.000,000	400.000,000	apr-98	apr-98	400.000,000	1.000.000,000	400.000,000	apr-98	apr-98	
2 01 07	Automezze ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Vascoli a trazione elettrica.	AMA	600.000,000	500.000,000	600.000,000	500.000,000	600.000,000	600.000,000	100.000,000	apr-98	apr-98	100.000,000	500.000,000	100.000,000	apr-98	apr-98	100.000,000	500.000,000	100.000,000	apr-98	apr-98	
2 01 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	3.700.000,000	3.000.000,000	3.700.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	700.000,000	apr-98	apr-98	700.000,000	3.000.000,000	700.000,000	apr-98	apr-98	700.000,000	3.000.000,000	700.000,000	apr-98	apr-98	
2 01 09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adegno locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	2.975.000,000	2.500.000,000	2.975.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	475.000,000	feb-99	feb-99	475.000,000	2.500.000,000	475.000,000	feb-99	feb-99	475.000,000	2.500.000,000	475.000,000	feb-99	feb-99	
2 01 10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adegno locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	2.975.000,000	2.500.000,000	2.975.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	475.000,000	feb-99	feb-99	475.000,000	2.500.000,000	475.000,000	feb-99	feb-99	475.000,000	2.500.000,000	475.000,000	feb-99	feb-99	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/01/1996			2° decreto del 14/01/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 15 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998				
			Altre risorse	Risorse DL 349	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Altre risorse	Risorse DL 651	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)		
E 01	27/1	AMA			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 01	27/2	AMA			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 01	27/3	AMA			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 10	28	AMA			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 10	29	AMA			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 10	30	AMA			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 10	31	AMA			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 20	10	USL R.M.E			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99
E 20	02	Azienda S. Giovanni Addolorata			10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99	10.000.000,000	10.000.000,000	apr-98	nov-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato	Altre risorse	Costo Stimato
01	03	USL RM C	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
02	04	USL RM D	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
03	05	Università Cattolica del Sacro Cuore	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
04	06	Regione Lazio	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
05	07	Università Cattolica del Sacro Cuore	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
06	08	Regione Lazio	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
07	09	Azienda Policlinico Umberto I	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
08	10	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000
09	11	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	3.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/07/1996			2° decreto del 18/07/1997			3° decreto del 24/06/1997			4° decreto del 22/12/1997			5° decreto del 08/05/1998			6° decreto del 15/05/1998			7° decreto - 16 luglio 1998			8° decreto - dicembre 1998						
			Costo Stimato	Risorse DL 349	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi let. c)	Tempi let. d)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse
E 02 16	Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma-Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo	Regione Lazio	6.500.000,000			4.670.000,000	4.670.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98
E 02 16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio							mag-98	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98
E 02 16/b	Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma-Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo	Regione Lazio				4.670.000,000	4.670.000,000		mag-98	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98	4.700.000,000	4.700.000,000		mag-97	dic-98
E 02 16/c	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protektorato S. Giuseppe				1.800.000,000	1.800.000,000		mag-98	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-98	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-98	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-98	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-98	dic-98
E 02 16/d	Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma-Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo	Protektorato S. Giuseppe				1.800.000,000	1.800.000,000		mag-97	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-97	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-97	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-97	dic-98	1.800.000,000	1.800.000,000		mag-97	dic-98
E 02 17	Ristrutturazione F. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B				5.000.000,000	5.000.000,000		mag-98	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98
E 02 18	Laboratorio di controllo alimenti (Roma) Ristrutturazione ex Presidio Multiconale di Prevenzione della USL Multiconale di RM B	USL RM B				5.000.000,000	5.000.000,000		mag-98	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98	5.000.000,000	5.000.000,000		mag-97	dic-98
E 02 18	Ospedale "Fratelli Fracelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	Regione Lazio							mag-98	dic-98				mag-97	dic-98				mag-97	dic-98				mag-97	dic-98				mag-97	dic-98
E 02 18	Casa Generalizia "Fratelli Fracelli"	Casa Generalizia "Fratelli Fracelli"							mag-98	dic-98				mag-97	dic-98				mag-97	dic-98				mag-97	dic-98				mag-97	dic-98

Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/02/1998				2° decreto del 18/02/1997				3° decreto del 24/02/1997				4° decreto del 22/12/1997				5° decreto del 08/05/1998				6° decreto del 15/05/1998				7° decreto - 16 luglio 1998				8° decreto - dicembre 1998			
			Caso Stimato	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let (d)	Caso Stimato	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let (d)	Caso Stimato	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let (d)	Caso Stimato	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let (d)	Caso Stimato	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let (d)	Caso Stimato	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let (d)	Caso Stimato	Risorsa DL 651	Altre risorse	Tempi let (d)				
E 02 19	Programma di potenziamento dell'Ospedale S. Carlo di Nancy (primo stralcio)	Istituto Dermatologico dell'Inmascolati																																
E 02 20	Campus Bio-Médico	Liberio Istituto Universitario "Campus Bio-medico" di Roma																																
E 02 21	Dispensario di emergenza e accettazione (DEA) di Livorno per area pediatrica	IHCSS Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"																																
E 02 22	Fornitura natanti di soccorso al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (1° stralcio)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto																																
E 02 23	Acquisto mezzi soccorso a mare per la Capitaneria di porto di Fiumicino (1° Lotto)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto																																
E 03 10	Informaticizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA																																
E 03 10	Informaticizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma																																
E 03 10	Informaticizzazione dei servizi dei Vigili Urbani (Roma) Creazione di banche dati	Istituzione Polizia Municipale di Roma																																
E 03 10		Comune di Roma																																

R.N. Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/09/1996		2° decreto del 18/09/1997		3° decreto del 24/09/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 349	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651	Altre risorse	Risorse DL 651
		Instituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.700.000.000
E 03 04	Tecnologie e mezzi per il Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma																	300.000.000
E 03 041	Acquisto apparecchiature elettroniche e relativi software per le attività esterne di Polizia Municipale	Comune di Roma																	300.000.000
E 03 042	Acquisto apparecchiature (elettroniche e non), materiali ed arredi per la scuola di Polizia Municipale	Comune di Roma																	300.000.000
E 10 10	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori	Regione Lazio	29.280.000.000		27.680.000.000		27.680.000.000		27.680.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000
E 10 10	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento prossi per attività di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	29.280.000.000		27.680.000.000		27.680.000.000		27.680.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000
E 10 10	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	29.280.000.000		27.680.000.000		27.680.000.000		27.680.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000		16.952.000.000
E 10 10	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale.	Regione Lazio	6.020.000.000		6.020.000.000		6.020.000.000		6.020.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000
E 10 10	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	6.020.000.000		6.020.000.000		6.020.000.000		6.020.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000		3.148.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1° decreto del 18/09/1996	2° decreto del 16/04/1997	3° decreto del 24/06/1997	4° decreto del 22/12/1997	5° decreto del 04/05/1998	6° decreto del 15/06/1998	7° decreto - 16 luglio 1998	8° decreto - dicembre 1998
Code								
	Costo Stimato							
	Risorse DL 349							
	Altre risorse							
	Tempi (lett. c)							
	Tempi (lett. d)							
	Soggetto Beneficiario del finanziamento							
Titolo dell'intervento								
12	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri							
13	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri							
14	Ministero Interni							
15	Ministero Interni							
16	Ministero Interni							
17	Ministero Interni							
18	Ministero Interni							
19	Ministero Interni							
05	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tadino"							
05	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinzio"							
05	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino							
05	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici caserma "Piave"							
05	Caserma della polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte							
05	Caserma della polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti							
05	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponti Galeria) Fiumicino							
05	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponti Galeria) Fiumicino							
05	Costo Stimato	11.000.000,000	11.000.000,000	11.000.000,000	11.000.000,000	11.000.000,000	11.000.000,000	11.000.000,000
05	Risorse DL 651	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000
05	Altre risorse							
05	Tempi (lett. c)							
05	Tempi (lett. d)							
05	Stato degli adempimenti amministrativi							
05	Costo Stimato	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000	4.046.000,000
05	Risorse DL 651	2.997.000,000	2.997.000,000	2.997.000,000	2.997.000,000	2.997.000,000	2.997.000,000	2.997.000,000
05	Altre risorse							
05	Tempi (lett. c)							
05	Tempi (lett. d)							
05	Stato degli adempimenti amministrativi							
05	Costo Stimato	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000
05	Risorse DL 651	697.000,000	697.000,000	697.000,000	697.000,000	697.000,000	697.000,000	697.000,000
05	Altre risorse							
05	Tempi (lett. c)							
05	Tempi (lett. d)							
05	Stato degli adempimenti amministrativi							
05	Costo Stimato	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000
05	Risorse DL 651	26.500.000,000	26.500.000,000	26.500.000,000	26.500.000,000	26.500.000,000	26.500.000,000	26.500.000,000
05	Altre risorse							
05	Tempi (lett. c)							
05	Tempi (lett. d)							
05	Stato degli adempimenti amministrativi							
05	Costo Stimato	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000
05	Risorse DL 651	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000
05	Altre risorse							
05	Tempi (lett. c)							
05	Tempi (lett. d)							
05	Stato degli adempimenti amministrativi							
05	Costo Stimato	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000
05	Risorse DL 651	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000	1.995.000,000
05	Altre risorse							
05	Tempi (lett. c)							
05	Tempi (lett. d)							
05	Stato degli adempimenti amministrativi							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	1° decreto del 18/03/1998		2° decreto del 18/03/1997		3° decreto del 21/02/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 16 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998		
			Risorse DL 349	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. d)	Risorse DL 651	Tempi let. c)	Risorse DL 651	Tempi let. d)	Tempi let. c)
07 01	Attività del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei caserini giulibari	Comune di Roma	10.000.000.000	mar-97	10.000.000.000	giu-98	10.000.000.000	mag-98	10.000.000.000	feb-98	10.000.000.000	Progettazione in corso	10.000.000.000	apr-98	10.000.000.000	dic-98	10.000.000.000	mag-97	10.000.000.000
01 01	Centri informativi - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo del Giubileo	10.000.000.000	nov-97	10.000.000.000	giu-98	10.000.000.000	mag-98	10.000.000.000	feb-98	10.000.000.000	Progettazione in corso	10.000.000.000	apr-98	10.000.000.000	dic-98	10.000.000.000	mag-97	10.000.000.000
01 01/1	Centro informativo (Roma) Realizzazione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	regione Lazio; Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000.000	nov-97	10.000.000.000	giu-98	10.000.000.000	mag-98	10.000.000.000	feb-98	10.000.000.000	Progettazione in corso	10.000.000.000	apr-98	10.000.000.000	dic-98	10.000.000.000	mag-97	10.000.000.000
01 01/2	Centro informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	regione Lazio; Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000.000	dic-98	4.000.000.000	giu-99	4.000.000.000	apr-98	4.000.000.000	apr-98	4.000.000.000	Progettazione in corso	4.000.000.000	apr-98	4.000.000.000	dic-98	4.000.000.000	mag-97	4.000.000.000
01 02	Centro stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione di mass media	regione Lazio; Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000.000	dic-98	4.000.000.000	giu-99	4.000.000.000	apr-98	4.000.000.000	apr-98	4.000.000.000	Progettazione in corso	4.000.000.000	apr-98	4.000.000.000	dic-98	4.000.000.000	mag-97	4.000.000.000
01 03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.000.000.000	gen-97	1.000.000.000	giu-98	1.000.000.000	mag-97	1.000.000.000	mag-97	1.000.000.000	Progettazione in corso	1.000.000.000	mag-97	1.000.000.000	dic-98	1.000.000.000	mag-97	1.000.000.000



Aggiornato al 31 dicembre 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Titolo dell'intervento		Beneficiario del finanziamento		1° decreto del 18/07/1996		2° decreto del 10/01/1997		3° decreto del 2/06/1997		4° decreto del 22/12/1997		5° decreto del 08/05/1998		6° decreto del 15/05/1998		7° decreto - 15 luglio 1998		8° decreto - dicembre 1998						
						Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. b)	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. b)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. b)	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre risorse	Tempi lett. d)	Tempi lett. c)	Tempi lett. b)
F	01			Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo		6.000.000.000			giu-98						6.613.240.000			nov-98			6.613.240.000			nov-98		
F	04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma		FS S.p.A.		40.000.000.000			dic-98						40.000.000.000			dic-98			40.000.000.000			dic-98		
F	04	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)		Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo		32.000.000.000			dic-98						32.000.000.000			dic-98			32.000.000.000			dic-98		
F	04	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 651				6.000.000.000			mar-98						6.000.000.000			mar-98			6.000.000.000			mar-98		
F	04	Observatorio sul Piano del Giubileo		Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi		5.400.000.000			dic-98						5.400.000.000			dic-98			5.400.000.000			dic-98		
F	04	Gestione operativa attività concernenti il Giubileo dell'anno 2000 anche in relazione al carattere internazionale dell'evento		Dipartimento per le Aree Urbane		6.000.000.000			dic-98						6.000.000.000			dic-98			6.000.000.000			dic-98		
F	05	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)		Agencia Romana per la preparazione del Giubileo		6.000.000.000			giu-98						6.000.000.000			giu-98			6.000.000.000			giu-98		
F	05	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi		Agencia Romana per la preparazione del Giubileo		6.000.000.000			giu-98						6.000.000.000			giu-98			6.000.000.000			giu-98		
F	05	protezione titolo -							giu-98									giu-98						giu-98		

2. Situazione finanziaria in relazione al singolo intervento

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

Credito	Titolo dell'intervento	Vendita di partecipazioni in società controllate e partecipazioni in società controllate da altri	RISORSE FONDO CIBI (L. 30.9.99)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
					IMPAGATO	UNITI FONDI	IMPEGNI DA SPESA	IMPEGNI DA SPESA	ACCENTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	AMMINISTRAZIONI (ONDELLI)	REGIONE LAZIO (cassa di riserva)	ALTRI BENEFICIARI	IMPEGNI				PAGAMENTI
SETTORE A - SOCIALE E ACCOGLIENZA																				
A.1 Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate																				
A.01	Unità abitative per persone disabili (Piemonte)	Comune di Ivrea	212.000.000	212.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000								10.000.000	10.000.000			
A.01	Unità abitative per persone disabili (Liguria)	URB. IM.A.	212.000.000	212.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000								10.000.000	10.000.000			
A.01	Unità abitative per persone disabili (Lombardia)	URB. IM.A.	7.000.000.000	7.000.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000								350.000.000	350.000.000			
A.01	Unità abitative per persone disabili (Emilia-Romagna)	URB. IM.A.	1.900.000.000	1.900.000.000																
A.01	Unità abitative per persone disabili (Toscana)	URB. IM.A.	1.500.000.000	1.500.000.000	50.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000								50.000.000	50.000.000			
A.01	Unità abitative per persone disabili (Trentino-Alto Adige)	URB. IM.A.	4.355.794.304	4.355.794.304					3.629.828.036	1.814.914.320						3.629.828.036	1.814.914.320			
A.01	Unità abitative per persone disabili (Friuli-Venezia Giulia)	URB. IM.A.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000								50.000.000	50.000.000	-50.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Scheda di Bilancio	Tipologia dell'intervento	RISORSE FONDA CIBILEG 2006	COSTO FINANZIATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	altri fondi		
						INTEGRAZIONE SPESA	Utile Tracciato del Conto Economico	Utile Tracciato del Conto Economico	INTEGRAZIONE SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILIARI	AMMINISTRATIVI	SERVIZI E LAVORI (escluso il personale)	ALTRI BENI E SERVIZI			INTEGRAZIONE SPESA	INTEGRAZIONE SPESA
A. 11 01	Costo di amministrazione	Comune di Roma	DEFINIZIONE																	
A. 11 10	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Comune di Roma	100-09	600.000.000	600.000.000	30.000.000	30.000.000									30.000.000				
A. 11 11	Costo di amministrazione per la gestione del personale	A.T.A.C.	000-09	10.950.000.000	10.950.000.000															
A. 11 12	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Provincia di Roma	000-09	1.218.535.800	1.218.535.800	30.000.000	15.000.000				1.188.475.800	594.237.900				1.218.535.800	624.297.900			
A. 11 13	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Comune di Roma	100-09	2.500.000.000	2.500.000.000	125.000.000	125.000.000									125.000.000				
A. 11 14	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Provincia di Roma	000-09	1.534.000.000	1.534.000.000	30.750.000	30.750.000									30.750.000				
A. 11 15	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Comune di Roma	000-09	240.000.000	240.000.000															
A. 11 16	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Comune di Roma	000-09	630.893.173	630.893.173	37.500.000	37.500.000				598.093.173	119.218.600				631.993.173	335.546.580			
A. 11 17	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Comune di Roma	000-09	3.245.000.000	3.245.000.000	102.250.000	31.450.000									162.250.000	102.250.000			
A. 11 18	Costo di amministrazione per la gestione del personale	Comune di Roma	000-09	149.250.000	149.250.000						121.563.028	60.781.510				121.563.028	60.781.510			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Regione, Provincia o Comune beneficiario	Termini di riferimento	BIBLIOTECA FONDO CIBI (LEO 2000)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPEGNI	altre fonti		
						IMPEGNI IN SPESA	L. 104/98 (Art. 10, comma 1)	L. 104/98 (Art. 10, comma 2)	L. 104/98 (Art. 10, comma 3)	L. 104/98 (Art. 10, comma 4)	L. 104/98 (Art. 10, comma 5)	L. 104/98 (Art. 10, comma 6)	L. 104/98 (Art. 10, comma 7)	L. 104/98 (Art. 10, comma 8)	L. 104/98 (Art. 10, comma 9)	L. 104/98 (Art. 10, comma 10)				L. 104/98 (Art. 10, comma 11)	L. 104/98 (Art. 10, comma 12)
A. 41 141	Progetto di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	1.922.000.000	1.922.000.000				1.922.000.000	961.041.300						1.922.000.000	961.041.300				
A. 41 142	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	16.000.000.000	16.000.000.000																
A. 41 143	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	3.000.000.000	3.000.000.000																
A. 41 144	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	1.000.000.000	6.909.000.000																
A. 4	Restauri del complesso dei Beni Pastori																				
A. 44 145	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	2.200.000.000	2.200.000.000																
A. 44 146	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	9.800.000.000	9.800.000.000				446.172.727							446.172.727		446.172.727			
A. 5	Diamante e rifilatura Opere S. Maria della Pietà e dell'altare V. Emanuele di Santa Maria della Pietà																				
A. 48 147	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	2.000.000.000	2.000.000.000				100.000.000							1.900.000.000		1.900.000.000			
A. 48 148	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	1.000.000.000	1.000.000.000				50.000.000							950.000.000		950.000.000			
A. 48 149	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	5.000.000.000	5.000.000.000				210.000.000							4.790.000.000		4.790.000.000			
A. 48 150	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	6.988.000.000	6.988.000.000				297.000.000							6.691.000.000		6.691.000.000			
A. 48 151	Completamento dell'opera di recupero e riqualificazione del centro storico di Via Salaria	Comune di Roma	01/99	9.927.000.000	9.927.000.000				410.000.000							9.517.000.000		9.517.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Regione beneficiaria	Termine di presentazione delle domande di partecipazione	Data di inizio lavori	Importo in conto capitale	Importo in conto corrente	Importo in conto capitale e corrente	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALL'AVANZAMENTO LAVORI			EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			PAGAMENTI	IMPEGNI	ALTRI IMPEGNI	
								Importo in conto capitale	Importo in conto corrente	Importo in conto capitale e corrente	Importo in conto capitale	Importo in conto corrente	Importo in conto capitale e corrente	ACQUISIZIONI ONEROSI	ACQUISIZIONI ONEROSI	ACQUISIZIONI ONEROSI				
A. 47.34	90.000.000	130.000.000	220.000.000												50.000.000	
A. 47.36	375.000.000	500.000.000	875.000.000	25.000.000	60.000.000	85.000.000	300.000.440	618.016.873	204.000.000							123.000.000
A. 47.37	150.000.000	200.000.000	350.000.000												50.000.000	
A. 47.38	942.010.873	1.342.010.873	2.284.021.746	60.000.000	60.000.000	120.000.000	300.000.440	618.016.873	204.000.000							400.000.000
A. 47.39	2.000.000.000	2.657.000.000	4.657.000.000												667.000.000	
A. 47.40	961.703.000	1.350.703.000	2.312.406.000				480.851.500	961.703.000								424.000.000
A. 47.41	800.000.000	1.087.000.000	1.887.000.000													297.000.000
A. 47.42	1.500.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000										305.000.000
A. 47.43	230.218.865	316.218.865	546.437.730				118.209.430	230.218.865								106.000.000
A. 47.44	926.160.746	1.301.160.746	2.227.321.492	56.250.000	56.250.000	112.500.000	247.882.420	826.274.746	162.254.950							373.000.000
A. 47.45	798.380.500	1.084.180.500	1.882.561.000	40.000.000	40.000.000	80.000.000	219.172.390	730.374.830	146.114.930							284.700.000
A. 47.46	2.000.000.000	2.667.000.000	4.667.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000										467.000.000
A. 8	Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere																			
A. 8.1	99.633.000.000	99.633.000.000	199.266.000.000													99.633.000.000
A. 9	Alimentazione di un centro di accoglienza per poliglottici analfabeti. Corsia Sittius dell'Ospedale Santo Spirito																			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Suggerimento del Senato e del Parlamento	Periodo di attuazione (anni)	Importo stanziato (Chil. Euro)	Costo stimato	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPEGNI	Altri fondi
						Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa	Impieghi in spesa			
A. 09 41	Opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico	USP, PIAE	01-09	630.000.000	630.000.000													
A. 14 41	Attività di ricerca e sviluppo	Provincia di Ancona	01-09	1.379.000.000	1.379.000.000													
A. 14 45	Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche	Provincia di Ancona	01-09	234.000.000	234.000.000													
A. 14 53	Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche	Provincia di Ancona	01-09	917.000.000	917.000.000													
				3.006.988.413,375	3.006.988.413,375													

B SETTORE B - BENI CULTURALI	
Area del Grande Campidoglio, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini	
B. 01 41	Area del Campidoglio
B. 01 45	Area del Campidoglio
B. 01 43	Area del Campidoglio
B. 02	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 01	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 02	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 03	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 04	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 05	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 06	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 07	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 08	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 09	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 10	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 11	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 12	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 13	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 14	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 15	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 16	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 17	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 18	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 19	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 20	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 21	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 22	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 23	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 24	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 25	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 26	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 27	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 28	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 29	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 30	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 31	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 32	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 33	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 34	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 35	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 36	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 37	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 38	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 39	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 40	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 41	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 42	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 43	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 44	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 45	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 46	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 47	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 48	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 49	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 50	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 51	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 52	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 53	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 54	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 55	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 56	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 57	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 58	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 59	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 60	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 61	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 62	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 63	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 64	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 65	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 66	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 67	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 68	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 69	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 70	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 71	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 72	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 73	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 74	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 75	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 76	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 77	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 78	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 79	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 80	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 81	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 82	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 83	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 84	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 85	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 86	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 87	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 88	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 89	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 90	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 91	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 92	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 93	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 94	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 95	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 96	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 97	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 98	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 99	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti
B. 02 100	Area del Foro Imperiali: musei, restauri e allestimenti

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Suggerimento del Parlamento	Termini di riferimento	Tempo di attuazione	Importo in lire (bilione)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI PRELIMINARI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTIVE CON TRASFERIMENTI IN UNICA RALIZAZIONE				IMPEGNI	PARLAMENTI	Altre fonti		
							Importo in lire (bilione)	Importo in lire (bilione)	Importo in lire (bilione)	IMPEGNI IN LIRE	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI		BALZO	ACQUISIZIONE DI AREE E IMMOBILI	ALTERNATIVE STATO	REGIONE LAZIO (comuni diversi)				ALTRI	
												Importo in lire (bilione)	Importo in lire (bilione)				Importo in lire (bilione)					Importo in lire (bilione)
B 09 02	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	2.146.765.526	2.146.765.526											2.300.000.000	2.300.000.000				
B 09 04	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	2.307.818.207	2.307.818.207												2.500.000.000	2.500.000.000			
B 09 05	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	911.587.605	911.587.605												1.000.000.000	1.000.000.000			
B 09 06	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	800.000.000	800.000.000												2.100.000.000	2.100.000.000	400.000.000		
B 09 07	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	2.970.466.700	2.970.466.700												3.000.000.000	3.000.000.000			
B 09 08	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	8.700.000.000	8.700.000.000												8.700.000.000	8.700.000.000			
B 09 09	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	8.222.533.436	8.222.533.436												10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000		
B 9	Palazzo Bicentenario Palazzo Craxi (Cassa di Roma)	Palazzo Bicentenario Palazzo Craxi (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	5.142.884.597	5.142.884.597												6.000.000.000	6.000.000.000	10.000.000.000		
B 10	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	9.800.000.000	9.800.000.000												9.800.000.000	9.800.000.000			
B 10 01	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	9.800.000.000	9.800.000.000												9.800.000.000	9.800.000.000			
B 10 02	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (Cassa di Roma)	1987-88	ott-89	3.400.000.000	3.400.000.000												3.400.000.000	3.400.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Spese per l'attuazione dell'operazione	Termini di pagamento	Rendimenti finanziari	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE DI EROGAZIONI EFFETIVE IN RELAZIONE ALLO STATO DI AVANZAMENTO CANTIERI				EROGAZIONI EFFETIVE CON TRASFERIMENTI IN UN'A/SUBIEZIONI				DIFFERENZI	PAGAMENTI	Altre note				
						Impieghi di spesa	100% Fondo 1% Conto ordinario	100% Fondo 1% Conto ordinario	Impieghi di spesa	100% Fondo 1% Conto ordinario	Impieghi di spesa	100% Fondo 1% Conto ordinario	Impieghi di spesa	100% Fondo 1% Conto ordinario	Impieghi di spesa	100% Fondo 1% Conto ordinario				Impieghi di spesa	100% Fondo 1% Conto ordinario	Impieghi di spesa	100% Fondo 1% Conto ordinario
B 10 015	Chiusura di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668	927.719.668				
B 10 016	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000	348.236.000				
B 10 017	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000				
B 10 018	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000				
B 10 019	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200	489.647.200				
B 10 020	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672	830.903.672				
B 10 021	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273	1.922.727.273				
B 10 022	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000				
B 10 023	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000	180.830.000				
B 10 024	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
B 10 025	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662	918.190.662				
B 10 026	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000				
B 10 027	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774	444.133.774				
B 10 028	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182	672.336.182				
B 10 029	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
B 10 030	Finanziamento di opere in corso di esecuzione	Ministero per il Mezzogiorno	31-08-98	640-99	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C. Conto	Titolo dell'operazione	Spiega il significato della sigla	Termini di riferimento	Tempi di esecuzione	Importo per il bilancio 2008	Costo stimato	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE PRESENTI IN RELAZIONE ALLO STATO				EROGAZIONI EFFETIVE IN CASI DI ESPERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	altri fondi
							Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008	Importo per il bilancio 2008		
B 13 17	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	1.388.727.272	1.388.727.272									1.500.000.000	1.500.000.000				
B 13 18	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	334.948.794	334.948.794									400.000.000	400.000.000				
B 13 19	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	1.072.494.418	1.072.494.418									1.200.000.000	1.200.000.000				
B 13 20	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	2.500.000.000	2.500.000.000									2.500.000.000	2.500.000.000				
B 13 21	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	961.300.000	961.300.000									1.000.000.000	1.000.000.000				
B 13 22	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	737.477.272	737.477.272									800.000.000	800.000.000				
B 13 23	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	500.000.000	500.000.000									500.000.000	500.000.000				
B 13 24	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	639.479.710	639.479.710									800.000.000	800.000.000				
B 13 25	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	500.000.000	500.000.000									500.000.000	500.000.000				
B 13 26	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	300.000.000	300.000.000									300.000.000	300.000.000				
B 13 27	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	848.727.637	848.727.637									1.000.000.000	1.000.000.000				
B 13 28	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	749.391.200	749.391.200									800.000.000	800.000.000				
B 13 29	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	600.000.000	600.000.000									600.000.000	600.000.000				
B 13 30	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	189.413.918	189.413.918									200.000.000	200.000.000				
B 13 31	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	778.810.000	778.810.000									800.000.000	800.000.000				
B 13 32	Chiusura del bilancio di esercizio della Banca d'Italia	Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali	1998-08	1998-08	761.914.618	761.914.618									800.000.000	800.000.000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Beneficiario	Termini di completamento dell'opera	Importo fondo generale	Costo stimato	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTIVE IN RELAZIONE ALLO STATO				EROGAZIONI EFFETTIVE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			PAGAMENTI	Altre fonti		
						Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi			Impieghi in % C. Costi	Impieghi in % C. Costi
B 13 217	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1977-79	450.000.000	450.000.000										450.000.000	450.000.000				
B 13 223	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1978-79	416.972.306	416.972.306										416.972.306	416.972.306				
B 13 23	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1979-80	330.000.000	330.000.000										330.000.000	330.000.000				
B 13 34	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1980-81	736.893.446	736.893.446										800.000.000	800.000.000				
B 13 35	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1981-82	500.000.000	500.000.000										500.000.000	500.000.000				
B 13 36	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1982-83	1.300.000.000	1.300.000.000										1.300.000.000	1.300.000.000				
B 13 38	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1983-84	448.272.727	448.272.727										500.000.000	500.000.000				
B 13 39	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1984-85	518.456.906	518.456.906										550.000.000	550.000.000				
B 13 40	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1985-86	713.805.802	713.805.802										800.000.000	800.000.000				
B 13 41	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1986-87	604.332.254	604.332.254										540.000.000	540.000.000				
B 13 42	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1987-88	94.873.956	94.873.956										100.000.000	100.000.000				
B 13 43	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1988-89	700.000.000	700.000.000										700.000.000	700.000.000				
B 13 44	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1989-90	640.000.000	640.000.000										640.000.000	640.000.000				
B 13 45	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1990-91	310.496.606	310.496.606										340.000.000	340.000.000				
B 13 46	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1991-92	300.000.000	300.000.000										300.000.000	300.000.000				
B 13 47	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1992-93	400.000.000	400.000.000										400.000.000	400.000.000				
B 13 48	Opera di Circonvallazione di Roma e di Albano Laziale	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1993-94	470.650.000	470.650.000										500.000.000	500.000.000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Categorie finanziarie del bilancio	Tramite delegazione del Parlamento	Riduzione Fondo Giubileo 1993	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			PAGAMENTI	altri beni			
						INIZIATIVE DI SPESA	Titoli Terziari	Previdenza, Casse di Risparmio	Dispendio	INFERI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONI FINANZIARIE			AMMINISTRAZIONI LOCALI	REGIONE LAZIO (comuni devoti)	ALTRI
B 13 404	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-98	711.335.614	711.335.614									750.000.000	750.000.000				
B 13 405	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	mag-99	700.000.000	700.000.000									700.000.000	700.000.000				
B 13 406	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	feb-99	724.740.182	724.740.182									800.000.000	800.000.000				
B 13 471	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-99	550.000.000	550.000.000									550.000.000	550.000.000				
B 13 472	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	ago-99	1.235.000.000	1.235.000.000									1.235.000.000	1.235.000.000				
B 13 473	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-99	350.000.000	350.000.000									350.000.000	350.000.000				
B 13 474	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	nov-97	230.000.000	230.000.000									230.000.000	230.000.000				
B 13 475	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-99	200.000.000	200.000.000									200.000.000	200.000.000				
B 13 481	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	feb-99	374.918.000	374.918.000									400.000.000	400.000.000				
B 13 482	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	mag-99	470.454.544	470.454.544									500.000.000	500.000.000				
B 13 483	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-99	381.127.272	381.127.272									400.000.000	400.000.000				
B 13 484	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-98	600.000.000	600.000.000									600.000.000	600.000.000				
B 13 485	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-98	300.000.000	300.000.000									300.000.000	300.000.000				
B 13 486	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-99	550.000.000	550.000.000									550.000.000	550.000.000				
B 13 487	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	apr-99	250.610.433	250.610.433									250.000.000	250.000.000				
B 13 491	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	apr-99	400.000.000	400.000.000									400.000.000	400.000.000				
B 13 492	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	dic-99	381.912.000	381.912.000									400.000.000	400.000.000				
B 13 493	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	mag-99	350.252.537	350.252.537									400.000.000	400.000.000				
B 13 494	Chiamata a lotteria di favore (Fondo Giubileo)	Ministero per il Mezzogiorno	mag-99	250.344.112	250.344.112									300.000.000	300.000.000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Termini di riferimento	Termini di riferimento di competenza	Bilancio Fondo Ciriello 2006	Costo stimato	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
						INTEGRI DI SPESA	Utile Fondo 10% del bilancio	Uffici di Bilancio 10% del bilancio	INTEGRI DI SPESA	ACQUIZIZIONI IMMOBILIARI	AMMONTARI STATO		REAZIONE LAZZI (miliardi di euro)	ALTRI IMPEGNI				
											ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI			Saldo			
B. 13 007	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	480.236.819	480.236.819										500.000.000	500.000.000		
B. 13 008	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	979.794.035	979.794.035										1.000.000.000	1.000.000.000		
B. 13 009	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	334.100.000	334.100.000										400.000.000	400.000.000		
B. 13 010	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	1.372.432.827	1.372.432.827										1.500.000.000	1.500.000.000		
B. 13 011	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	687.981.882	687.981.882										800.000.000	800.000.000		
B. 13 012	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	828.881.683	828.881.683										900.000.000	900.000.000		
B. 13 013	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	5.572.952.500	5.572.952.500										6.000.000.000	6.000.000.000		
B. 13 014	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	1.000.000.000	1.000.000.000										1.000.000.000	1.000.000.000		
B. 13 015	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	898.720.655	898.720.655										1.000.000.000	1.000.000.000		
B. 13 016	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	2.296.693.177	2.296.693.177										2.500.000.000	2.500.000.000		
B. 13 017	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	435.901.736	435.901.736										500.000.000	500.000.000		
B. 13 018	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	877.562.470	877.562.470										1.000.000.000	1.000.000.000		
B. 13 019	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	1.122.388.686	1.122.388.686										1.200.000.000	1.200.000.000		
B. 13 020	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	2.839.823.096	2.839.823.096										3.000.000.000	3.000.000.000		
B. 13 021	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	938.897.396	938.897.396										1.000.000.000	1.000.000.000		
B. 13 022	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	890.516.477	890.516.477										1.000.000.000	1.000.000.000		
B. 13 023	Chiusura di 10 linee di bilancio	01/01/99	01/01/99	929.344.666	929.344.666										1.000.000.000	1.000.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'investimento	Soggetto beneficiario	Termini di completamento dell'opera	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			PAGAMENTI	IMPREZI	IMPREZI
						Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)	Importo in lire (Miliardi e Milioni)			
B 13 46	Tramite della Terna (Piemonte) - Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	1.930.824.500									2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
B 13 47	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	1.791.998.016									2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
B 13 48	Chiusa del Cavallone (Piemonte) - Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	915.683.000									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
B 13 49	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	1.838.043.488									2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
B 13 50	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	1.700.000.000												
B 13 51	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	100.000.000												
B 13 52	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	1.770.000.000												
B 13 53	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	110.000.000												
B 13 54	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	580.000.000												
B 13 55	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	720.000.000												
B 13 56	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	234.000.000												
B 13 57	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	2.037.000.000												
B 13 58	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	2.000.000.000												
B 13 59	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	249.000.000												
B 13 60	Intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovo dell'energia	Materassi per il Comune di Cuneo	00/97	01/99	800.000.000												
B 14	Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medievale, Moderni																
B 14 61	Intervento di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medievale, Moderni	Materassi per il Comune di Cuneo	00/98	01/99	10.714.114.877									11.100.000.000	11.100.000.000	11.100.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Beneficiario dell'intervento	Termini di adempimento (mese/anno)	RISORSE FONDI CIVILILLO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti		
						IMPEGNI DI SPESA	Liberalità (Percentuale 10% Costo stimato)	Uffici Fondi (Percentuale 10% Costo stimato)	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE IMMOBILI	AMMINISTRAZI STATE				REGIONE LAZIO (mese/di denaro)	ALTRI STATI (mese/di denaro)
B 14 02	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	6.984.525.956	6.984.525.956										8.000.000.000	8.000.000.000			
B 14 03	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	747.868.835	747.868.835										800.000.000	800.000.000			
B 14 04	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	1.305.436.014	1.305.436.014										1.400.000.000	1.400.000.000			
B 14 05	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000										1.500.000.000	1.500.000.000			
B 14 06	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	800.000.000	800.000.000										800.000.000	800.000.000			
B 14 07	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	700.000.000	700.000.000														
B 14 08	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	900.000.000	900.000.000														
B 15 Interventi alle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano																			
B 15 01	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	4.000.000.000	4.000.000.000										4.000.000.000	4.000.000.000			
B 15 02	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	7.000.000.000	7.000.000.000										7.000.000.000	7.000.000.000			
B 15 03	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	2.000.000.000	2.000.000.000										2.000.000.000	2.000.000.000			
B 15 04	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	2.000.000.000	2.000.000.000										2.000.000.000	2.000.000.000			
B 15 05	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000										1.500.000.000	1.500.000.000			
B 15 06	Moneta Paolo Vercelli (Moneta Paolo Vercelli)	Ministero per il Mezzogiorno e il Sud	ott-99	1.500.000.000	1.500.000.000										1.500.000.000	1.500.000.000			
B 15 Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici																			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Stipite, beneficiario, data del provvedimento	Termini di pagamento, competenza finanziaria, anno	RISORSE FONDI CIBILLILO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	ALTRI IMPEGNI	ALTRI IMPEGNI			
						IMPEGNI IN SPESA	LIMITE FINANZIARIO autorizzato	1° e 2° % Coda attuata	Libertari Montepiù 1° e 2° Coda attuata	IMPEGNI IN SPESA	ACCENTI	ESTERNE EROGAZIONI		BALZO	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	AMMINISTRATIVE STATO				REGIONE LAZIO (comuni di cui)		ALTRI IMPEGNI
												3° e 4° %	50% maggiorazione dell'importo di spesa							30% in più, 50% maggiorazione dell'importo di spesa	30% in più, 50% maggiorazione dell'importo di spesa	
B. 14 14	Indagine "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	3.698.846.294	3.698.846.294													4.000.000.000	4.000.000.000			
B. 14 16	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	893.462.849	893.462.849													1.000.000.000	1.000.000.000			
B. 14 18	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	2.243.463.108	2.243.463.108													2.500.000.000	2.500.000.000			
B. 14 17	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	274.925.000	274.925.000													300.000.000	300.000.000			
B. 14 18A	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	792.277.827	792.277.827													850.000.000	850.000.000			
B. 14 18B	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	100.000.000	100.000.000													100.000.000	100.000.000			
B. 14 18C	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	87.922.410	87.922.410													100.000.000	100.000.000			
B. 14 18D	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	139.394.813	139.394.813													150.000.000	150.000.000			
B. 14 18E	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	531.079.219	531.079.219													600.000.000	600.000.000			
B. 14 18F	Progetto "Sociologia (Piani) Roma e Provincia"	Ministero per il Mezzogiorno Roma e Provincia	01-99	47.216.077	47.216.077													50.000.000	50.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# Cassa	Titolo dell'operazione	Spese per la realizzazione dell'opera	Termini di realizzazione dell'opera (anni)	Fondazione o ente beneficiario	Tavola di imputazione dell'opera	Rendiconto preventivo dell'opera	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			PAGAMENTI	altri beni				
								Unità finanziarie in % di spesa	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione			Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione	Costo stimato per la progettazione
B 16 1847	45.817.704										50.000.000		50.000.000				
B 16 1848	91.396.638										100.000.000		100.000.000				
B 16 1849	45.798.472										50.000.000		50.000.000				
B 16 1850	92.302.434										100.000.000		100.000.000				
B 16 1851	901.046.434										1.000.000.000		1.000.000.000				
B 16 1852	100.000.000										100.000.000		100.000.000				
B 16 1853	94.336.632										100.000.000		100.000.000				
B 16 1854	50.000.000										50.000.000		50.000.000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Spese di competenza del Ministero	Termini di pagamento	RISORSE FONDO GIULIO-ANDREOTTI	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED IMMOBILIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				IMMOBILIZZAZIONE EFFETTUATA CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			PAGAMENTI	ALTRI FONDI
						IMPEGNI DI SPESA	Lavori di Progettazione	IMPEGNI DI SPESA	ACQUIZIZIONE DI BENI MOBILI	AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	REGIONE LAZIO (fondato decreto)		ALTRI MINISTERI	IMPEGNI	PAGAMENTI		
											ACQUANTO	ULTERIORI IMMOBILIZZAZIONI					
20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)	20% e 50% (Impegno di spesa)		
B 14 1811	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	60.000.000	60.000.000										60.000.000		
B 14 1812	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	122.102.475	122.102.475										122.102.475		
B 14 1813	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	675.315.500	675.315.500										675.315.500		
B 14 1814	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	91.184.327	91.184.327										91.184.327		
B 14 1815	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	25.000.000	25.000.000										25.000.000		
B 14 1816	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	276.028.744	276.028.744										276.028.744		
B 14 1817	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	470.392.287	470.392.287										470.392.287		
B 14 1818	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	831.233.952	831.233.952										831.233.952		
B 14 1819	Struttura edilizia e impiantistica per la sede del Ministero per il Mezzogiorno (Cassa di Roma)	Ministero per il Mezzogiorno	01/09	100.000.000	100.000.000										100.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Soggetti beneficiari	Termini di esecuzione	Costo stimato	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO EFFETTIVO IN RELAZIONE ALLO STATO				ESERCIZIO EFFETTIVO CON IMPEGNAMENTI IN UNICI ESERCIZI			PAGAMENTI	IMPEGNI	Altre voci		
					IMPEGNI IN C/SPESA	IMPEGNI IN C/CONTRO	IMPEGNI IN C/ALTRA	IMPEGNI IN C/STATO	ACCONTI	ULTERIORI IMPEGNAZIONI		BALZO	ASSUNZIONI DI PERSONALE	REGIONE LAZIO (escluso il centro)				C/STATO	C/REGIONE LAZIO
										IMPEGNI IN C/STATO	IMPEGNI IN C/REGIONE LAZIO								
B 18 02	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	800.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000							40.000.000	40.000.000				
B 18 03	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	500.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	219.467.770						445.935.534	235.467.770				
B 18 04	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	200.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	83.029.460						176.940.918	93.029.460				
B 18 05	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	1.000.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	365.410.840						790.211.481	415.410.840				
B 18 06	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	4.515.221.571	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.937.610.790						4.115.221.571	2.182.610.790				
B 18 07	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	314.043.646	30.000.000	30.000.000	30.000.000		24.000.000					30.000.000	50.000.000				
B 18 08	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	500.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000							25.000.000	25.000.000				
B 18 09	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	7.700.000.000												90.000.000			
B 18 10	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	1.237.000.000															
B 18 11	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	332.504.157										302.504.157	196.252.360				
B 18 12	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	1.313.738.535	75.000.000	75.000.000	75.000.000	240.247.710					30.000.000	1.306.238.522	703.819.270				
B 18 13	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	544.129.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	101.860.800						544.129.000	112.865.800	2.300.000			
B 18 14	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	405.771.440	5.000.000	5.000.000	5.000.000	380.771.440						405.771.440	25.000.000				
B 18 15	At. P. 1997/1998	Comune di Albano Laziale	01/98	1.959.637.346	54.000.000	54.000.000	54.000.000	27.000.000						54.000.000	54.000.000				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Regione beneficiaria del finanziamento	Periodo di riferimento (mese/anno)	Bilancio di riferimento (L. n. 30 del 28.2.1998)	Conto ripartito	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPEGNI	ALTRI IMPEGNI
						Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato	Importo in % del totale stanziato			
B 18 17	Contributi di Stato	Primo di Stato	giu-99	397.685.631	397.685.631	31.350.000	4.350.000	17.460.000	375.035.631	187.567.125							397.685.631	397.685.631	397.685.631	
B 18 18	Contributi di Stato	Primo di Stato	lug-99	741.881.223	741.881.223	50.000.000	10.000.000	40.000.000	691.881.223	345.900.010							741.881.223	741.881.223	741.881.223	
B 18 19	Contributi di Stato	Primo di Stato	ago-99	389.792.496	389.792.496	21.500.000	4.500.000	18.000.000	367.292.496	168.446.205	143.532.200						389.792.496	389.792.496	389.792.496	
B 18 20	Contributi di Stato	Primo di Stato	set-99	150.000.000	150.000.000	7.500.000		7.500.000									150.000.000	150.000.000	150.000.000	
B 18 21	Contributi di Stato	Primo di Stato	ott-99	234.300.000	234.300.000	15.000.000	3.000.000	12.000.000	230.300.000	119.551.070							234.300.000	234.300.000	234.300.000	
B 18 22	Contributi di Stato	Primo di Stato	nov-99	274.992.886	274.992.886	15.000.000		15.000.000	259.992.886	129.996.440							274.992.886	274.992.886	274.992.886	
B 18 23	Contributi di Stato	Primo di Stato	dic-99	1.230.000.000	1.230.000.000	70.000.000		70.000.000	1.160.000.000	222.763.360	314.142.000						1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	
B 18 24	Contributi di Stato	Primo di Stato	s.d.	1.000.000.000	1.000.000.000															
B 19	Validazione del patrimonio culturale regionale (circuito abbazie, santuari e musei)																			
B 19 01	Contributi di Stato	Primo di Stato	giu-99	1.000.000.000	1.000.000.000															
B 19 02	Contributi di Stato	Primo di Stato	lug-99	4.517.000.000	4.517.000.000															
B 19 03	Contributi di Stato	Primo di Stato	ago-99	995.842.486	995.842.486	60.000.000		60.000.000	935.842.486	184.415.710	273.122.070						995.842.486	995.842.486	995.842.486	
B 19 04	Contributi di Stato	Primo di Stato	set-99	840.000.000	840.000.000															
B 19 05	Contributi di Stato	Primo di Stato	ott-99	1.107.162.876	1.107.162.876	70.000.000		70.000.000	1.037.162.876	548.581.440							1.107.162.876	1.107.162.876	1.107.162.876	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Regione/Provincia/Comune	Termini di pagamento	Costo netto	Costo netto (IVA inclusa)	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTIVE IN RELAZIONE ALLO STATO				EROGAZIONI EFFETTIVE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	Altri dati
						IMPEGNI IN 1998	IMPEGNI IN 1999	IMPEGNI IN 2000	IMPEGNI IN 2001	ACCENTI	ULTERIORI EROGAZIONI	BALZO	ACQUISIZIONI E AREE MOBILI	AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	REGIONE LAZIO (comunità demont)	ALTRI MINISTERI				
B 19 04	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/98	402.000,00	402.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	185.876,520	132.114,970				397.751,075	341.091,490				
B 19 07	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	995.034,076	995.034,076	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	447.184,540					944.368,076	497.184,540				
B 19 08	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	3.774.000,000	3.774.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	952.116,720	1.428.175,070				5.066.383,580	2.660.391,790				
B 19 09	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	548.829,313	548.829,313					274.414,050					548.829,313	274.414,050				
B 19 10	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	100.000,000	100.000,000															
B 19 11	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99																	
B 19 12	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	1.242.089,445	1.242.089,445					577.169,720			87.750,000	1.342.489,442	664.919,720					
B 19 13	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	300.000,000	300.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	142.500,000				300.000,000	157.500,000					
B 19 14	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	784.429,110	784.429,110					382.214,350				784.429,110	382.214,350					
B 19 15	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	172.890,475	172.890,475					84.443,240				172.890,475	84.443,240					
B 19 16	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	470.519,547	470.519,547					235.259,770				470.519,547	235.259,770					
B 19 17	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	200.000,000	200.000,000															
B 19 18	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/98	150.000,000	150.000,000	7.500,000	7.500,000	7.500,000	7.500,000					150.000,000	7.500,000					
B 19 19	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/98	65.000,000	65.000,000															
B 19 20	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	372.274,000	372.274,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	156.483,000				352.966,000	196.483,000					
B 19 201	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	627.504,000	627.504,000	70.000,000	70.000,000	70.000,000	70.000,000	269.813,000				609.626,000	339.813,000					
B 19 202	Chiusura del cantiere di viale Mazzini	Comune di Trivulzio	04/99	443.246,000	443.246,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	190.203,000				438.407,000	240.203,000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Soggetto beneficiario	Termini di completamento dell'opera	RISORSE FONDI CHIEDETE (MIO)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTIVATE IN RELAZIONE ALLO STATO FINANZIAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTIVATE CON TRASFERIMENTI IN UNICIUSCULAZIONE				PAGAMENTI	altri fondi		
						IMPEGNI IN ITALIA	IMM. E Fondi IN. Conto corrente	IMM. E Fondi PR. Conto corrente	Liberalità 10% Conto corrente	IMPEGNI IN ITALIA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE TABELLE IMMOBILIARI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (comunità demot.)			ALTRI MINISTERI	
												10% - 40% Impieghi di spesa	10% - 40% Impieghi di spesa				10% - 40% Impieghi di spesa				10% - 40% Impieghi di spesa
B 19 204	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	820.925.000	820.925.000	92.000.000	92.000.000	92.000.000	92.000.000	354.790.500	709.394.000	709.394.000	709.394.000	709.394.000	709.394.000	709.394.000	709.394.000	709.394.000	446.790.500		
B 19 205	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	433.724.000	433.724.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	304.450.500	388.901.000	388.901.000	388.901.000	388.901.000	388.901.000	388.901.000	388.901.000	388.901.000	246.450.500		
B 19 206	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	560.327.000	560.327.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	246.624.500	481.249.900	481.249.900	481.249.900	481.249.900	481.249.900	481.249.900	481.249.900	481.249.900	506.624.900		
B 19 207	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	3.070.104.366	3.070.104.366	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	1.447.518.180	2.895.104.260	2.895.104.260	2.895.104.260	2.895.104.260	2.895.104.260	2.895.104.260	2.895.104.260	2.895.104.260	1.622.558.180		
B 19 208	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	2.346.953.306	2.346.953.306	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	449.396.660	2.246.953.306	2.246.953.306	2.246.953.306	2.246.953.306	2.246.953.306	2.246.953.306	2.246.953.306	2.246.953.306	1.243.476.650		
B 19 209	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	2.128.411.476	2.128.411.476	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	130.772.800	1.778.811.476	1.778.811.476	1.778.811.476	1.778.811.476	1.778.811.476	1.778.811.476	1.778.811.476	1.778.811.476	989.460.750		
B 19 210	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	162.388.321	162.388.321	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.981.321	162.388.321	162.388.321	162.388.321	162.388.321	162.388.321	162.388.321	162.388.321	162.388.321	139.530.070		
B 19 211	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	122.768.972	122.768.972	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	57.644.690	115.268.972	115.268.972	115.268.972	115.268.972	115.268.972	115.268.972	115.268.972	115.268.972	61.144.490		
B 19 212	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	2.087.815.000	2.087.815.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	963.967.050	1.967.814.106	1.967.814.106	1.967.814.106	1.967.814.106	1.967.814.106	1.967.814.106	1.967.814.106	1.967.814.106	1.103.967.050		
B 19 213	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	300.000.000	300.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	15.000.000		
B 19 214	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	200.000.000	200.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	10.000.000		
B 19 215	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	1.600.000.000	1.600.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	80.000.000		
B 19 216	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	1.850.000.000	1.850.000.000	92.250.000	92.250.000	92.250.000	92.250.000	92.250.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	92.250.000		
B 19 217	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	804.000.000	804.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	360.000.320	778.118.650	778.118.650	778.118.650	778.118.650	778.118.650	778.118.650	778.118.650	778.118.650	400.000.320		
B 19 218	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	488.429.054	488.429.054	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	231.714.350	463.429.056	463.429.056	463.429.056	463.429.056	463.429.056	463.429.056	463.429.056	463.429.056	256.714.350		
B 19 219	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	201.075.000	201.075.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000										10.000.000		
B 19 220	Intervento di V. della V.le della	Comune di Cerveteri	giu-98	499.790.619	499.790.619	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	123.337.190	477.790.619	477.790.619	477.790.619	477.790.619	477.790.619	477.790.619	477.790.619	477.790.619	231.895.310		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Beneficiario dell'operazione	Termini di pagamento	Termini di pagamento	RISORSE FONDO CIBILEGGIO 2000	COSTO FINANZIATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPEGNI	ALTRI IMPEGNI		
							INTEGRI DI NESEA	LIM. 7 Fondo	Fondo 5% Costo	Ulteriori EROGAZIONI	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ALTRI IMPEGNI		ACQUISIZIONI AMMINISTRATIVE	REGIONE LAZIO (millesimi di euro)	ALTRI IMPEGNI				IMPEGNI	PAGAMENTI
													100% - 50% - 50%	100% - 50% - 50%								
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	1.500.000,00	1.500.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	248.943,00	248.943,00	373.444,00	1.247.715,00	1.247.715,00	697.337,00	1.319.715,00	697.337,00					
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	4.720.000,00	4.720.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00						275.000,00	275.000,00						
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	400.000,00	400.000,00							80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00					
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	1.000.000,00	1.000.000,00							1.218.903,34	1.218.903,34	609.411,67	1.218.903,34	609.411,67	3.000.000,00				
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	1.000.000,00	1.000.000,00							828.377,03	828.377,03	704.290,47	828.377,03	704.290,47					
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							50.000,00	50.000,00					
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	1.000.000,00	1.000.000,00																
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	200.000,00	200.000,00																
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	1.250.000,00	1.250.000,00																
B. 19 - 34	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	683.400,00	683.400,00																
B. 19 - 41/2	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	224.855,727	224.855,727	11.750,000	11.750,000	11.750,000	42.621,150	42.621,150	63.931,726	213.103,727	213.103,727	118.855,727	224.855,727	118.855,727					
B. 19 - 41/2	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	130.642,227	130.642,227	7.000,000	7.000,000	7.000,000	24.728,450	24.728,450	37.692,576	123.642,227	123.642,227	68.821,126	130.642,227	68.821,126					
B. 19 - 42	Comune di S. Maria Capua Vetere (Città di S. Maria Capua Vetere)	Comune di S. Maria Capua Vetere	30/09/97	30/09/97	103.593,660	103.593,660	6.250,000	6.250,000	6.250,000							6.250,000	6.250,000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Tipologia dell'operazione	Fonte	Importo in milioni di lire	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETIVE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETIVE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	Altri fonti
						IMPEGNI IN SFESA	IMPEGNI IN SFESA	IMPEGNI IN SFESA	IMPEGNI IN SFESA	IMPEGNI IN SFESA	IMPEGNI IN SFESA	IMPEGNI IN SFESA	IMPEGNI IN SFESA	AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	ALTRA BENEFICENZA IN		IMPEGNI		
															Utile Fondo 1% Conto capitale	Utile Fondo 1% Conto capitale			
B 19	Altre opere	01-98	01-98	1.000.000.000	1.000.000.000														
B 20	Benefici per attività culturali di iniziativa pubblica e privata concesse al Comune	01-98	01-98	15.000.000.000	15.000.000.000														
B 20 91.1	Onze affiliazioni di Roma	01-98	01-98	15.000.000.000	15.000.000.000														
B 20 91.2	Accademie e Circoli di Roma	01-98	01-98	15.000.000.000	15.000.000.000														
B 20 91.3	Teatro Roma	01-98	01-98	7.000.000.000	7.000.000.000														
B 20 91.4	Altre opere	01-98	01-98	8.000.000.000	8.000.000.000														
B 20 91.5	Altre opere	01-98	01-98	2.000.000.000	2.000.000.000														
B 20 91.6	Altre opere	01-98	01-98	5.000.000.000	5.000.000.000														
B 20 91.7	Altre opere	01-98	01-98	1.000.000.000	1.000.000.000														
B 20 91.8	Altre opere	01-98	01-98	1.000.000.000	1.000.000.000														
B 20 91.9	Altre opere	01-98	01-98	1.000.000.000	1.000.000.000														
B 20 92	Altre opere	01-98	01-98	2.980.000.000	2.980.000.000														
B 20 93	Altre opere	01-98	01-98	59.225.441.254	60.797.911.254	4.579.184.000	162.554.986	4.586.418.608	358.400.000	88.831.747.750	38.598.182.000	1.524.782.700	2.947.546.190	1.008.209.810	197.700.000	234.845.000.000	418.803.644.500	344.822.575.500	48.745.500.000

C SETTORE C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO, PATRIMONIO AMBIENTALE

C.I. Programmi di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente esposte al dissesto idrogeologico

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Soggetto	Termine di completamento dell'opera	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPIEGHI	IMPIEGHI		
					IMPEGNI DI SPESA	LIBRI E FASCICOLI	Primali del Conto Economico	Chiusure dei bilanci con rapporto al 31/12/99	IMPIEGNI IN SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONI FAREE E INUTILI	AMMINISTRAZIONI STATO	REGIONE LAZIO (quantità di denaro)				ALTRI	
															20% + 20% - Impiego di spesa					20% + 20% - Impiego di spesa
C 41 131	1.000.000.000	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	4.500.000.000	115.000.000	225.000.000	225.000.000	115.000.000							340.000.000	340.000.000	340.000.000			
C 41 132	7.000.000.000	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	7.000.000.000																
C 41 14	8.205.315.736	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	8.205.315.736	315.000.000	65.000.000	65.000.000	315.000.000							200.000.000	200.000.000	200.000.000			
C 41 15		Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99		200.000.000	800.000.000	800.000.000	200.000.000							1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			
C 41 16	3.587.522.856	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	3.587.522.856																
C 41 16	9.681.072.728	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	9.681.072.728											2.714.312.849	2.714.312.849	2.714.312.849			
C 41 17	300.000.000	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	300.000.000	140.000.000	160.000.000	160.000.000	140.000.000							300.000.000	300.000.000	300.000.000			
C 41 18	2.000.000.000	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	2.000.000.000	20.000.000	80.000.000	80.000.000	20.000.000							100.000.000	100.000.000	100.000.000			
C 41 18	2.165.000.000	Comune di Roma	01/09/99 - 01/09/99	2.165.000.000	21.000.000	79.200.000	79.200.000	21.000.000							100.822.000	100.822.000	100.822.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Credito	Titolo dell'operazione	Beneficiario	Termini di pagamento (anni)	Bilancio Fondo CIBRI/LEO 2008	Costo stimato	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	altri fondi						
						IMPEGNI DI SPESA	Utile Fondo CIBRI/LEO 2008	Fiduciaro 3% CIBRI/LEO 2008	Utile Fondo CIBRI/LEO 2008	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ESTERNE EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	REGIONE LAZIO (summa di euro)				ALTRI IMMOBILIARI					
															IMPEGNI DI SPESA					Utile Fondo CIBRI/LEO 2008	Fiduciaro 3% CIBRI/LEO 2008	Utile Fondo CIBRI/LEO 2008	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI
C. N. 19	Vallo Brigante - Uscite per la costruzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	1.098.160.000	1.098.160.000													915.113.930						
C. N. 24	Vallo Brigante - Parti del Piano Urbanistico Comunale di Roma per la costruzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	04/1/98 - 04/1/99	875.455.525	875.455.525														36.000.000	36.000.000				
C. N. 31/1	Vallo Circeo Promobiliare (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	3.000.000.000	3.000.000.000															150.000.000	150.000.000			
C. N. 31/2	Vallo Circeo Promobiliare (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	2.355.000.000	2.355.000.000																117.750.000	117.750.000		
C. N. 32/1	Vallo Circeo Promobiliare (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	1.694.479.906	1.694.479.906																1.694.479.906	904.139.930		
C. N. 32/2	Vallo Circeo Promobiliare (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	1.477.997.384	1.477.997.384																	100.000.000	100.000.000	
C. N. 33	Vallo Circeo Promobiliare (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	04/1/98 - 04/1/99	1.550.258.910	1.550.258.910																		61.000.000	61.000.000
C. N. 34	Vallo Panzafani (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	04/1/98 - 04/1/99	1.789.360.660	1.789.360.660																			
C. N. 35	Vallo Panzafani (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	04/1/98 - 04/1/99	1.190.000.000	1.190.000.000																			
C. N. 36	Vallo Panzafani (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	9.000.000.000	9.000.000.000																			
C. N. 37	Vallo Panzafani (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	2.412.000.000	2.412.000.000																			
C. N. 38	Vallo Panzafani (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	1.970.000.000	1.970.000.000																			
C. N. 39	Vallo Panzafani (Rinnovo) - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Comune di Roma	01/1/98 - 01/1/99	5.000.000.000	5.000.000.000																			

C.2 Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, Interni giuliani e costantini)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo del Progetto	Iniziativa del Parlamento	Data di presentazione del disegno di legge	Ciclo di vita del progetto	Ciclo di vita del progetto	Ciclo di vita del progetto	Ciclo di vita del progetto	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALO STATO AVANZAMENTO LAVORI				IMPEGGI EFFETTIVATI CON TRASFERIMENTI DI UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPORTI totali			
								IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI		IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI		IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI		IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI		ACQUISIZIONE DI IMMOBILITÀ	REGIONE LAVORI (standard Devoto)		ALTRA BENEFICENZA			IMPEGGI		
								IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI		IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPEGGI EFFETTIVATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						
C 91 A	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	PTA	01/99	01/99	01/99	2.627.700.000	2.627.700.000	2.627.700.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 92 B	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	DISACQUA SOTTILE DISTRIBUZIONE	09/99	09/99	09/99	5.347.538.000	5.347.538.000	5.347.538.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 93 C	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 94 D	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 95 E	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 96 F	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 97 G	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 98 H	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 99 I	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				
C 100 J	Area delle Botteghe Oscure di Venezia 1. Venezia 2. Dorsoduro 3. Santa Maria della Salute 4. Castello 5. Venezia	Programma di interventi di restauro e manutenzione delle opere d'arte	09/99	09/99	09/99	9.423.458.000	9.423.458.000	9.423.458.000		1.282.308.210										1.282.308.210				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Beneficiario	Termini di riferimento	BIBLIOTECA FONDO GIUGLIANO 1988	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	Altri fondi			
						INFERICI IN SPESA	Letti 1° Corso	Letti 2° Corso	Letti 3° Corso	INFERICI IN SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI		ACQUISIZIONI DI MOBILIARE	AMMINISTRAZIONE STATO			REGIONE LADINO (vademecum allegato)		IMPEGNI
												30% a 30% Impieghi di spesa	30% a 30% Impieghi di spesa					30% a 30% Impieghi di spesa	30% a 30% Impieghi di spesa	
C 04 H	Protezione antiradiazioni	Comune di S. Cassiano	01-98	1.400.000,00	1.400.000,00															
C 05	Chiesa di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione																			
C 03 010	Lavori di recupero e manutenzione	Comune di Bolzano	01-99	3.300.000,00	3.300.000,00	70.000,00									70.000,00					
C 03 012	Lavori di recupero e manutenzione	Comune di Bolzano	01-99	1.700.000,00	1.700.000,00	35.000,00									35.000,00					
C 04	Chiesa S. Giovanni a Cive Bolzano. Interventi di manutenzione																			
C 06 01	Chiesa di S. Giovanni a Cive Bolzano. Interventi di manutenzione	Comune di Bolzano	01-99	3.500.000,00	3.500.000,00	175.000,00									175.000,00					
C 07	Parco Caviglioglio. Interventi di sistemazione a verde																			
C 07 01	Parco Caviglioglio. Interventi di sistemazione a verde	Comune di Bolzano	01-99	2.000.000,00	2.000.000,00	224.000,00									224.000,00					
C 08	Realizzazione del Parco di Villa Margherita																			
C 08 010	Realizzazione del parco di Villa Margherita	Comune di Bolzano	01-97	1.720.816,797	1.720.816,797	85.500,00									85.500,00					
C 08 012	Realizzazione del parco di Villa Margherita	Comune di Bolzano	01-99	3.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00									150.000,00					
C 08 013	Realizzazione del parco di Villa Margherita	Comune di Bolzano	01-97	1.403.307,495	1.403.307,495	124.000,00									124.000,00					
C 08 014	Realizzazione del parco di Villa Margherita	Comune di Bolzano	01-98	1.929.750,000	1.929.750,000	130.000,000									130.000,000					
C 08 015	Realizzazione del parco di Villa Margherita	Comune di Bolzano	01-99	1.000.000,000	1.000.000,000	50.000,000									50.000,000					
C 09	Realizzazione del Parco della Caffarella e degli Acqueforti (Opere varie)																			
C 09 01	Realizzazione del Parco della Caffarella e degli Acqueforti (Opere varie)	Comune di Bolzano	01-99	3.231.442,382	3.231.442,382	175.000,000									175.000,000					
C 09 021	Realizzazione del Parco della Caffarella e degli Acqueforti (Opere varie)	Comune di Bolzano	01-99	3.548.032,795	3.548.032,795	198.409,090									198.409,090					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo del intervento	Budget per l'attuazione del programma	Trasferimento dall'altro capitolo del bilancio dello Stato	Termini di pagamento e di realizzazione delle opere	Indicazioni sul periodo di attuazione della spesa	Importo di bilancio per la spesa	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED IMPEGNI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			IMPEGNI EFFETTUATI CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPREZII	MONTI PER LAVORI			
							Importo in % di Cassa corrente	Utile Fondo in % di Cassa corrente	Impegni di spesa	Impegni di spesa	Impegni di spesa	Impegni di spesa	Impegni di spesa	Impegni di spesa	Impegni di spesa	Impegni di spesa				Impegni di spesa	Impegni di spesa	Impegni di spesa
C 19 01A2	Attivazione del servizio di pulizia e manutenzione per le opere di pubblica utilità			dal-98	dal-99	8.000.000,00																
C 19 01A1	Programma "Protezione del territorio" - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria			dal-98	dal-99	10.000.000,00																
C 19 01A2	Programma "Protezione del territorio" - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria			dal-98	dal-99	4.000.000,00																
C 19 01A3	Programma "Protezione del territorio" - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria			dal-98	dal-99	10.000.000,00																
C 19 01B1	Programma "Protezione del territorio" - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria			dal-98	dal-99	9.000.000,00																
C 19 01	Programma "Protezione del territorio" - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria			dal-98	dal-99	8.000.000,00																
C 28 01	Programma "Protezione del territorio" - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria			dal-98	dal-99	600.000,00																
D 02	Trasporti - San Paolo/Arenula					572.317.454,756	1.098.808.890	11.759.873,194	3.247.578.000	61.947.666,915	19.908.856,235	8.736.000					4.498.500.000	81.854.815,166	37.764.437,425	2.500.000.000	-2.900.000.000	-1.400.000.000
D 03	Trasporti - San Paolo/Arenula						2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000											2.500.000.000	2.500.000.000	-2.900.000.000
D 03 01	Trasporti - San Paolo/Arenula						2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000											2.500.000.000	2.500.000.000	-2.900.000.000
D 03 01 01	Trasporti - San Paolo/Arenula						3.550.000.000	3.550.000.000	3.550.000.000											3.550.000.000	3.550.000.000	-3.500.000.000
D 04	Attrezzature					2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000											2.800.000.000	2.800.000.000	-2.800.000.000
D 04 01	Attrezzature					2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000											2.800.000.000	2.800.000.000	-2.800.000.000
D 05	Attrezzature					107.744.100,000	107.744.100,000	107.744.100,000	107.744.100,000											107.744.100,000	107.744.100,000	-107.744.100,000
D 05 01	Attrezzature					107.744.100,000	107.744.100,000	107.744.100,000	107.744.100,000											107.744.100,000	107.744.100,000	-107.744.100,000
D 05 01 01	Attrezzature					19.807.338,000	19.807.338,000	19.807.338,000	19.807.338,000											19.807.338,000	19.807.338,000	-19.807.338,000
D 05 01 02	Attrezzature					78.870.016,000	78.870.016,000	78.870.016,000	78.870.016,000											78.870.016,000	78.870.016,000	-78.870.016,000
D 05 01 03	Attrezzature					60.954.411,000	60.954.411,000	60.954.411,000	60.954.411,000											60.954.411,000	60.954.411,000	-60.954.411,000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'opera	Regione beneficiaria	Tempi di completamento dell'opera	Importo stanziato in bilancio	Controfirmato	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	IMPREZI	ALTRI BENEFICIARI		
						Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa				Impegni in % Cassa	Impegni in % Cassa
D 14 06	Collegamento di via S. Maria (C. 1400000000) (C. 1400000000) (C. 1400000000)	Provincia di Roma	01/08 - 01/09	11.205.000.000	11.205.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	442.007.013	442.007.013	442.007.013	442.007.013	1.340.214.026	871.607.013							
D 14 08	Intervento di adeguamento della rete idrica pubblica (C. 1400000000) (C. 1400000000) (C. 1400000000)	Provincia di Roma	01/08 - 01/09	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000													
D 14 10	Intervento di adeguamento della rete idrica pubblica (C. 1400000000) (C. 1400000000) (C. 1400000000)	Provincia di Latina	01/08 - 01/09	17.500.000.000	17.500.000.000	171.500.000	171.500.000	171.500.000	171.500.000					171.500.000	171.500.000							
D 14 11	Intervento di adeguamento della rete idrica pubblica (C. 1400000000) (C. 1400000000) (C. 1400000000)	Provincia di Roma	01/08 - 01/09	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000													
D 14 12	Intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria (C. 1400000000) (C. 1400000000) (C. 1400000000)	Provincia di Roma	01/08 - 01/09	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000													
D 15	Passaggio ferroviario del Lago Bracciano-Cantù ed distribuzione filare a Viterbo																					
D 15 010	Realizzazione del collegamento ferroviario tra Bracciano e Viterbo	Provincia di Roma	01/08 - 01/09	170.370.000.000	170.370.000.000	170.370.000.000	170.370.000.000	170.370.000.000	170.370.000.000													
D 15 010	Realizzazione della linea ferroviaria tra Bracciano e Viterbo	Provincia di Roma	01/08 - 01/09	13.341.000.000	13.341.000.000	13.341.000.000	13.341.000.000	13.341.000.000	13.341.000.000													
D 16	Bisaffiliazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia																					
D 16 01	Adeguamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia	Comune di Bracciano	01/07 - 01/09	71.217.371.000	71.217.371.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	3.283.449.996	3.283.449.996	3.283.449.996	3.283.449.996	4.500.000.000	4.500.000.000							
D 16 01	Adeguamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia	Comune di Bracciano	01/07 - 01/09	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000													
D 16 01	Bisaffiliazione e prolungamento della linea A e B della metropolitana e delle ferrovie esistenti (stazioni e infrastruttura di servizio)	Comune di Bracciano	01/07 - 01/09	9.640.000.000	9.640.000.000	2.004.100.000	2.004.100.000	2.004.100.000	2.004.100.000	1.873.771.700	1.873.771.700	1.873.771.700	1.873.771.700	2.004.100.000	2.004.100.000							
D 16 01	Bisaffiliazione e prolungamento della linea A e B della metropolitana e delle ferrovie esistenti (stazioni e infrastruttura di servizio)	Comune di Bracciano	01/07 - 01/09	33.363.381.713	33.363.381.713	5.495.500.000	5.495.500.000	5.495.500.000	5.495.500.000					5.495.500.000	5.495.500.000							
D 16 01	Bisaffiliazione e prolungamento della linea A e B della metropolitana e delle ferrovie esistenti (stazioni e infrastruttura di servizio)	Comune di Bracciano	01/07 - 01/09	55.077.260.016	55.077.260.016					50.873.238.009	50.873.238.009	50.873.238.009	50.873.238.009	23.436.919.000	23.436.919.000							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'interrogazione	Regione di appartenenza del beneficiario	Termini di riferimento del progetto	Importo complessivo del progetto	Importo del contributo statale	Importo del contributo regionale	Importo del contributo provinciale	Importo del contributo comunale	Importo del contributo di altri enti	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTIVE IN RELAZIONE ALLO STATO				EROGAZIONI EFFETTIVE PER OGNI TRASFERIMENTO IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	altri dati					
										IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO			IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO	IMPRESI DI LAVORO
B. 41 25	Legge di spesa in materia di...	AMA	dic-98	7.600.000.000	8.740.000.000	300.000.000																	300.000.000	1.140.000.000				
B. 41 261	...	AMA	dic-98	999.462.000	1.179.462.000	10.000.000																			10.000.000	190.000.000		
B. 41 261	...	AMA	lug-99	538.750.432	538.750.432	15.300.000																			15.300.000	15.300.000		
B. 41 271	...	AMA	dic-99	3.100.000.000	3.100.000.000																							
B. 41 272	...	AMA	dic-99	5.300.000.000	5.300.000.000																							
B. 41 273	...	AMA	gen-99	1.600.000.000	1.600.000.000																							
B. 41 28	...	AMA	gen-99	2.000.000.000	10.710.000.000	100.000.000																						
B. 41 29	...	AMA	gen-99	7.000.000.000	9.520.000.000	350.000.000																						
B. 41 30	...	AMA	gen-99	7.535.460.000	7.535.460.000	280.000.000																						
B. 41 31	...	AMA	dic-98	1.400.000.000	1.400.000.000																							
B. 42 01	...	UNA SPA S	mar-98	22.531.000.000	37.531.000.000	250.000.000																						

Contributo al potenziamento attività pubblica di emergenza: articolo 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, area antishock, 1° livello

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Regione, Provincia, Comune, Circondario, Municipio, Località	Termini di riferimento	RISORSE POTENZIALI (CIRCOLO 2000)	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED IMMOBILIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLO STATO				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI	PAGAMENTI	Saldo		
						DIFFICILI IN SPESA	Utile C. Conto 100, C. Conto 101	Utile C. Conto 102, C. Conto 103	INTEGRI IN SPESA	ACCONTI	ESTERNE EROGAZIONI		MILIO	AMMINICOLI STATO	EROGAZIONE LAZIO (comuni diversi)				ALTRI	
											100, C. Conto 101	102, C. Conto 103			100, C. Conto 101					102, C. Conto 103
B. 42.12	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	4.500.000.000	4.500.000.000		4.500.000.000						4.500.000.000		4.500.000.000	4.500.000.000				
B. 42.13	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	8.219.647.000	8.219.647.000	465.000.000	4.588.111.062	2.294.035.530					4.588.111.062		2.294.035.530	2.798.053.530				
B. 42.14	...	Regione Lazio	01/09/99 - 01/09/99	7.140.000.000	7.140.000.000		7.140.000.000						7.140.000.000		7.140.000.000	7.140.000.000				
B. 42.15	...	Regione Lazio	01/09/99 - 01/09/99	10.540.000.000	10.540.000.000															
B. 42.16a	...	Regione Lazio	01/09/97 - 01/09/98	4.700.000.000	4.700.000.000		4.700.000.000						4.700.000.000		4.700.000.000	4.700.000.000				
B. 42.16b	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000													
B. 42.17	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000													
B. 42.18	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	2.615.000.000	2.615.000.000		2.615.000.000													
B. 42.19	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	3.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000													
B. 42.20	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	8.225.887.000	8.225.887.000		8.225.887.000						8.225.887.000		412.943.500	412.943.500				
B. 42.21	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	2.470.000.000	2.470.000.000		2.470.000.000													
B. 42.22	...	Regione Lazio	01/09/99 - 01/09/99	3.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000													
B. 42.23	...	Regione Lazio	01/09/98 - 01/09/98	3.340.000.000	3.340.000.000		3.340.000.000													

Modello autorizzato dalla Regione Lazio (Regione Lazio - Roma)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Regione di riferimento	Termini di riferimento in mesi	Tipologia di spesa	Costo stimato	PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED IMPEGNI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI			IMPEGNI EFFETTUATI CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI	SPESE
						Impieghi in spesa	Utile / Costo	Utile / Costo	Utile / Costo	Impieghi in spesa	ACQUIZIZIONI DI BENI MOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (contabili diversi)	ALTRA REGIONE (contabili diversi)				
					BILANCIO FINANZIARIO GIUGLIO 2007	Impieghi in spesa	Utile / Costo	Utile / Costo	Utile / Costo	Impieghi in spesa	ACQUIZIZIONI DI BENI MOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	REGIONE LAZIO (contabili diversi)	ALTRA REGIONE (contabili diversi)				
B 04 01	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Regioni Lazio	giu-07	Impieghi in spesa	1.100.000.000					1.100.000.000			1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	
B 04 02	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Regioni Lazio	dic-00	Impieghi in spesa	9.640.000.000					5.200.000.000			5.200.000.000		5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000	
B 04 04	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Regioni Lazio	giu-00	Impieghi in spesa	3.958.000.000					3.148.000.000			3.148.000.000		3.148.000.000	3.148.000.000	3.148.000.000	
B 05 01	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	lug-07	Impieghi in spesa	1.300.000.000							1.300.000.000				1.300.000.000	1.300.000.000	
B 05 02	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	giu-07	Impieghi in spesa	3.700.000.000							1.700.000.000				1.700.000.000	1.700.000.000	
B 05 03	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	dic-07	Impieghi in spesa	3.980.000.000													
B 05 04	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	dic-07	Impieghi in spesa	12.000.000.000							12.000.000.000				12.000.000.000	12.000.000.000	
B 05 05	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	mar-08	Impieghi in spesa	27.358.000.000							24.984.000.000				24.984.000.000	24.984.000.000	
B 05 06	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	giu-09	Impieghi in spesa	3.380.000.000							3.380.000.000				3.380.000.000	3.380.000.000	
B 05 07	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	mar-08	Impieghi in spesa	5.602.000.000							8.222.000.000				8.222.000.000	8.222.000.000	
B 05 08	Finanziamento per la ricostruzione delle opere pubbliche	Molise	giu-09	Impieghi in spesa	600.000.000							600.000.000				600.000.000	600.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'operazione	Regione beneficiaria	Termine di completamento dell'opera	Bilancio preventivo originario	Costo stimato	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PAGAMENTI	altri dati									
						Impieghi in spesa	Impieghi in conto capitale	Utile di bilancio	Impieghi in spesa	Impieghi in conto capitale	Utile di bilancio	Impieghi in spesa	Impieghi in conto capitale	Utile di bilancio	Impieghi in spesa	Impieghi in conto capitale	Utile di bilancio			Impieghi in spesa	Impieghi in conto capitale	Utile di bilancio						
																							ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	REGIONE LAZIO (compreso il debito)	REGIONE LAZIO (compreso il debito)	REGIONE LAZIO (compreso il debito)
B 03 34	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	2.000.000.000	2.000.000.000																							
B 03 35	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	11.000.000.000	11.000.000.000																							
B 03 37	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	399.000.000	399.000.000																							
B 03 38	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	697.000.000	697.000.000																							
B 03 39	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	3.983.000.000	3.983.000.000																							
B 04 30	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	5.000.000.000	5.000.000.000																							
B 03 33	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	1.000.000.000	1.000.000.000																							
B 03 31	Ampliamento e adeguamento della dotazione di posti letto	Marche	dic-98	5.500.000.000	5.500.000.000																							
B.6 Interventi a sostegno dell'occupazione																												
B 04 01	Contributo a favore del personale pubblico	Chieti	dic-00	5.000.000.000	5.000.000.000																							
B 03 01	Contributo a favore del personale pubblico	Chieti	dic-00	2.700.000.000	2.700.000.000																							
				497.716.939.332	551.116.939.332	9.238.000.000	9.238.000.000	76.028.962.846	16.941.833.029	811.999.000	52.336.000.000	42.748.000.000	137.582.962.846	116.068.823.920	44.722.000.000													

F Settore F - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

Conto Informativo, via stampa e iniziative per l'informazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cambio	Titolo dell'opera	Soggetti beneficiari e beneficiario	Termini di attuazione in mesi	Emissione del bilancio	CORTO PERIODO GIUGNO 2000	CORTO PERIODO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE ED IMMOBILIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				PALLAMENTI	MILIARI			
							IMPEGNI DI SPESA	UMIDI E FONDI 2% Costi materie	Primali in conto capitale	Ultimati (Differenziale tra impegni al 31/12 e a 31/03/00)	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	NALDO	ACQUISIZIONE PARZIE E IMMOBILI	LAVORI STATO	REGIONE LAZIO (comuni (divisi))	ALTRA REGIONI			IMPEGNI		
P 05 04	Attrezzature di lavoro per la... di... di...	...	6/00-06	17.993.440,000	500.000,000	500.000,000	200.000,000	200.000,000	9.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000				10.000.000,000	5.250.000,000						
P 05 09	01/00-09	8.152.080,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	5.700.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000				6.000.000,000	3.150.000,000						
P 05 06		3.300.000,000		3.300.000,000																	
P 05 07		6.000.000,000		6.000.000,000			322.000,000	254.000,000						322.000,000	254.000,000						
				180.359.442,500	13.915.000,000	13.915.000,000	14.702.841,260	14.702.841,260	56.597.934,703	29.445.131,270	25.100.000,000	5.525.000,000	502.714,790			64.512.934,703							
				3.487.346,712,071	94.943.317,588	3.869.663,175	84.204.467,741	84.204.467,741	980.525.175,248	231.646.317,495	81.295.828,124	13.946.412,410	46.917.648,010	824.299,000	8.147.303,412	381.605.566,000	69.194.238,000	42.748.000,000	1.845.965.518,205	846.636.483,576	137.428.684,000		
TOTALE																							

3. Lo stato di attuazione per singolo intervento (istogrammi)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Riferimenti legislativi ed obiettivi dell'intervento		Titolo dell'intervento	Segretario Beneficiario	Risorsa finanziaria (in migliaia)			Processo di attuazione																				
	Settore	Sottosettore			Identificativo	Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative			Fasi Esecutive																
								Programma	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Prog. Prec.	Appalto	Contratto	Com. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif. collauda	piena funzione		
A 01 18			Centro di accoglienza residenziale per anziani (AccogliRoma) Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio			149.250																					
A 01 19			Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di accoglienza locale	Provincia di Roma			1.165.066																					
A 01 21			Ospedale israelitico ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bernardino all'Isola	Comune di Roma - Ufficio Citta Storica			5.500.000																					
A 01 22			Segnalazioni scultoree per non vedenti sui marciapiedi pubblici	ATAC			3.000.000																					
A 01 23/1			Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma - Ufficio Speciale Citta dei Bambini			1.000.000																					
A 01 23/2			Ristrutturazione servizi di accoglienza e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza - Policlinico Umberto I			2.000.000																					
A 01 24			Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna			1.288.700																					
A 01 25			Requalificazione di una struttura conventuale	Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori			3.438.000																					
A 01 26/1			Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via delle Isole	Ordine dei SS.mo Salvatore di S. Brigida			2.348.442																					
A 01 26/2			Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via Cassala	Ordine dei SS.mo Salvatore di S. Brigida			1.922.081																					
A 01 27			Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralcio)	Prov Relig Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione			16.000.000																					
A 01 28			Zona ricettiva - Casa per ferie	Direzione Generale Opere San Bologno			3.000.000																					
A 01 29			Centro attrezzato per la tutela della prima infanzia al servizio della famiglia disagiata	Congreg. Figlie della Madonna del Divino Amore			5.909.000																					
A5			RECLUTTO del tempio del Buon Pastore																									
A 04 01/1			Complesso Buon Pastore. Alloggiamento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma - Soprintendenza Concale			2.200.000																					
A 04 01/2			Complesso Buon Pastore (Roma) Restauro e recupero funzionale del corpo XII - IV U.O. seicentesco	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.			9.800.000																					

A5: Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietra e dell'altare V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici	Riferimenti legislativi ed oggetto dell'intervento	Espese finanziarie (in migliaia)			Processo di attuazione																			
		Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti finanziarie	Programma	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Prog. sec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	Fasi Esecutive							Fasi Finali					
Settore	Titolo dell'intervento	Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti finanziarie	Programma	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Prog. sec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certificando	piena funz.	
B 09	01 Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio	15.142.889	5.142.889	10.000.000																				
	S. B. Amb. Archit. RM																							
B 10	01/a Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	9.800.000	9.800.000	0																				
	S. Architet. Etr. Mer.																							
B 10	01/b Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	9.800.000	9.800.000	0																				
	S. Architet. Etr. Mer.																							
B 10	01/c Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stroh Fern)	3.400.000	3.400.000	0																				
	S. Architet. Etr. Mer.																							
B 11	01 Galleria Nazionale d'Arte Moderna	24.124.856	9.124.856	15.000.000																				
	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Coenra (primo stralcio)																							
	Gali. Naz. Arte Mod.																							
B 12	01 Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	561.697	561.697	0																				
	S. B. Amb. Archit. RM																							
B 12	02 Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	3.103.076	3.103.076	0																				
	S. B. Architet. RM																							
B 12	03 Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	9.676.423	9.676.423	0																				
	S. B. Amb. Archit. RM																							
B 12	04 Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	3.000.000	3.000.000	0																				
	S. B. Art. Stor. RM																							
B 12	05 Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	1.401.670	1.401.670	0																				
	S. B. Amb. Archit. RM																							
B 12	06/a Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e ripertura al pubblico del perimetro	2.208.104	2.208.104	0																				
	S. B. Amb. Archit. RM																							
B 12	06/b Chiesa S. Biagio alla Pignatta	267.073	267.073	0																				
	S. B. Amb. Archit. RM																							
B 12	08 Tempio Rotondo del Foro Bosario (Roma) Interventi di restauro	1.654.140	1.654.140	0																				
	S. B. Architet. RM																							
B 12	09 Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	300.000	300.000	0																				
	S. B. Architet. RM																							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Settore	Sottosectore	Identificativo	Riferimenti soggettivi ed obiettivi dell'intervento		Rilievo finanziario (in migliaia)			Processo d'attuazione																								
				Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programma.	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Prog. Tec.	Appalto	Contatto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif. collaudo	piena funz.						
B 13 29				Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	189.614	189.614	0																									
B 13 30				Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	778.810	778.810	0																									
B 13 31				Oratorio dei Careviti (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	761.915	761.915	0																									
B 13 32/1				Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	BB CC AA - (3) S.B. Ati. Stor. RM	450.000	450.000	0																									
B 13 32/2				Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	416.983	416.983	0																									
B 13 33				Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti del cortile Borrominiano	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	350.000	350.000	0																									
B 13 34				Oratorio dei Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	736.893	736.893	0																									
B 13 35				Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei mandati lignei	BB CC AA - (3) S.B. Ati. Stor. RM	500.000	500.000	0																									
B 13 36				Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	BB CC AA - (2) S.B. Ati. Stor. RM	1.300.000	1.300.000	0																									
B 13 38				Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	449.273	449.273	0																									
B 13 39				Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	518.457	518.457	0																									
B 13 40				Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	713.806	713.806	0																									
B 13 41				Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	494.332	494.332	0																									
B 13 42				Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	94.874	94.874	0																									
B 13 43				Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0																									
B 13 44/1				Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	BB CC AA - (3) S.B. Ati. Stor. RM	640.000	640.000	0																									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici	Riferimenti legislativi ed oggetto dell'intervento		Riassunto finanziario (in migliaia)				Processo di attuazione																				
	Settore	Sottosectore	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Programmat.	Prog. Prelim.	Prog. Det.	Prop. Presc.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	Fasi Executive						Fasi Finali						
															10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certificando	piena funzione	
B 19 68			Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	675.357	675.357	0																				
B 19 69			Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000	0																				
B 19 70			Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alb.	100.000	100.000	0																				
B 19 71			Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.110.846	1.110.846	0																				
B 19 72			Ampliamento della Chiesa in località Grunobolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	60.000	60.000	0																				
B 19 73			Rifacimento copertura, facciata esterna e Sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000	100.000	0																				
B 19 74			Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo, Parrocchie S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	40.000	40.000	0																				
B 19 75			Abbazia di Casamari	Ordine Cistercense	1.000.000	1.000.000	0																				
B 20 01.1			Opera lirica Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	15.000.000	0																				
B 20 01.2			Musica Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Accademia di Santa Cecilia	13.000.000	13.000.000	0																				
B 20 01.3			Prosa Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	7.000.000	0																				
B 20 01.4			Mostre Programma di esposizione d'arte da svolgersi nelle Scuole Papali	Agenzia Romana Prep Giubileo	5.000.000	5.000.000	0																				
B 20 01.5			Convegno internazionale	Agenzia Romana Prep Giubileo	2.000.000	2.000.000	0																				
B 20 01.6			Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale	Agenzia Romana Prep Giubileo	5.000.000	5.000.000	0																				
B 20 01.7			Incentivi dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000	0																				
B 20 01.8			Incentivi dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	1.000.000	1.000.000	0																				

B20 Intervento per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici	Settore	Sottosectore	Identificativo	Riferimenti soggettivi ed obiettivi dell'intervento		Risorsa finanziarie (in migliaia)		Processo di attuazione																			
				Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative			Fasi Esecutive								Fasi Finali								
								Programma	Prog. Def.	Prog. Prelim.	Appalto	Contratto	Cont. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Certificazione	Prima funzione		
B 20	01.9			Incentivi dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000																				
B 20	02			Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Picoletti - Villa dei Picoletti - Sole	Fondazione Nicola Picoletti	2.965.070	2.965.000	0																			
C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE																											
C) Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone magazzinate, aree verdi e programmi di abbinamento barriere architettoniche																											
C 01	01			Restauro conservativo dei ponti Vittorio Emanuele II, Umberto I, Regina Margherita e Cavour	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	7.009.952	7.009.952	0																			
C 01	02			Restauro conservativo di ponte Carlo Cestio, ponte Duca D'Aosta, cavalcavia sul Muro Torto	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	8.151.363	8.151.363	0																			
C 01	03			Restauro conservativo di ponte Flaminio ed impermeabilizzazione di ponte Testaccio	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	8.622.872	8.622.872	0																			
C 01	04			Restauro conservativo di ponte Risorgimento	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	2.699.000	2.699.000	0																			
C 01	05			Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	3.334.070	3.334.070	0																			
C 01	06			Restauro conservativo di ponte Fabricio	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	2.138.804	2.138.804	0																			
C 01	07			Restauro conservativo di ponte Nomentano	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	2.554.975	2.554.975	0																			
C 01	10			P.zze S. Pietro in Vinculis, S. Prassede, S. Anastasia, S. Barnolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma) Riquilificaz. Ambient., risagomatura strade e ricristino selciati	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	3.245.965	3.245.965	0																			
C 01	11			Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	2.226.822	2.226.822	0																			
C 01	12			Progetto per interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Percorso "C" - v.le Trastevere, via Merosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	2.894.625	2.894.625	0																			
C 01	13/1			Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Lungotevere di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti. Ristrutturazione marciapiedi e sistema fognario	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	4.500.000	4.500.000	0																			
C 01	13/2			Interventi di manutenzione delle sedi stradali del lungotevere di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti e zone limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	7.000.000	7.000.000	0																			
C 01	14			Via S. Gregorio, via G. Lenza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma - Dip. XII - II.U.O.	8.205.316	8.205.316	0																			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici	Riferimenti soggettivi ed obiettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo di attuazione																				
	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario		Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative			Fasi Esecutive								Fasi Finali							
Settore	Sottosettore	Identificativo						Prog. Finaliz.	Prog. Def.	Prog. Exec.	Alp. Att.	Contratto	Cons. Cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Certif. collaudato	piena funzione	
E. 02	05		Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Acettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)		Università Cattolica del Sacro Cuore	12.184.478	12.184.478	0																		
F. 02	06		Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità Sacro Cuore		Università Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191	6.031.191	0																		
E. 02	07		Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Acettazione di secondo livello		Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000	0																		
E. 02	08/1		Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva Azienda ospedaliera San Filippo Neri		Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572	0																		
E. 02	08/2		Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva Azienda ospedaliera San Filippo Neri		Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990	0																		
E. 02	09		Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza acettazione di primo livello		USL RM H	1.000.000	1.000.000	0																		
E. 02	10		Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso		USL RM G	1.000.000	1.000.000	0																		
E. 02	11		Complesso ospedaliero (Brecchiano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso		USL RM F	1.066.442	1.066.442	0																		
E. 02	12		Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo		Regione Lazio	4.500.000	4.500.000	0																		
E. 02	13		Rede di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani		I.R.C.S. Lazzaro Spallanzani	8.219.647	8.219.647	0																		
E. 02	14		Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione		Regione Lazio	7.140.000	7.140.000	0																		
E. 02	15		Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza		Az. Ospedaliera S. Camillo-Forlani	10.500.000	10.500.000	0																		
E. 02	16/4		Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica		Regione Lazio	4.700.000	4.700.000	0																		
F. 02	16/b		Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale		Protonotario S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000	0																		
E. 02	17		Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma		USL RM B	5.000.000	5.000.000	0																		
E. 02	18		Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola Tiberina - Roma Ampliamento della ramanzione		Casa Generalizia "Fatebene Fratelli"	2.615.000	2.615.000	0																		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici	Riferimenti progettivi ed obiettivi dell'intervento			Risorsa finanziaria (in migliaia)				Percentuale di attuazione																																		
	Settore	Sottoselettore	Titolo dell'intervento	Segretario Beneficiario	Conto stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative					Fasi esecutive					Fasi finali																								
								Programmaz.	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Prog. Tec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Certificato	piena funzione																
E 05 32			Casearia CC P.za Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero dell'Interno	1 000.000		0																																			
E 05 33			Reti di radio comunicazioni della Polizia	Ministero dell'Interno	5.500.000		0																																			
F 06 01			Contributo a favore di imprese giovanili per la promozione di occupazione concessa alle attività giubilari	Comune di Roma - Uff. Spec. Politiche del Lavoro	5 000.000		0																																			
E 07 01			Attività del corpo di polizia municipale per assicurare funzionamento cantieri giubilari	Comune di Roma	2 700.000		0																																			

F.6. Interventi a sostegno dell'occupazione

F.7. Contributo attività straordinaria corpo Polizia Municipale

F INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

F.1. Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione

F 01 01/1			Centro informativo del museo Risorgimento. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep Giubileo	5 675 712		0																																									
F 01 01/2			Centro informativo di Via della Conciliazione. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep Giubileo	7 275 712		0																																									
F 01 02			Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione del mass media	Agenzia Romana Prep Giubileo	5 161 763		0																																									
F 01 03			Informazione al pellegrino ed al turista su scialla metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana Prep Giubileo	614 000		0																																									
F 01 04			Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	Ferrovie dello Stato	3 810 000		0																																									
F 04 01			Contributo assolvimento compiti indicati comma 4, legge 651	Agenzia Romana Prep Giubileo	95 151 496		0																																									
F 04 02			Osservatorio sul Piano del Giubileo	Uff. Progr. Roma Capitale	6 000 000		0																																									
F 05 01			Sistema di provisione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep Giubileo	6 613 240		0																																									
F 05 02			Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep Giubileo	5 000 000		0																																									

F.5. Sistemi informativi e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo

PRIMO TRIMESTRE 1999

1. Sintesi del quinto rapporto trimestrale**2.8 Struttura attuale del piano**

Nel corso del I° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di conseguenza dal 31 dicembre 1998 (4° trimestre '98) al 31 marzo 1999 (1° trimestre '99) il Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle già rappresentate nella precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

Il Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652 miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la ripartizione degli interventi, per numero e per entità finanziaria risulta così articolata:

A. Per Categorie

- N. 438	Lavori	per un importo di 2050,8 miliardi
- N. 90	Forniture	per un importo di 785,8 miliardi
- N. 209	Beni Culturali	per un importo di 323,0 miliardi
- N. 17	Incentivi	per un importo di 312,7 miliardi

B. Per settore

- N. 85	Sociale e accoglienza	per un importo di 300,4 miliardi
- N. 352	Beni culturali	per un importo di 557,3 miliardi
- N. 136	Manutenzione e arredo urbano	per un importo di 571,2 miliardi
- N. 63	Accessibilità e mobilità	per un importo di 1372,4 miliardi
- N. 104	Servizi speciali e formazione	per un importo di 489,7 miliardi
- N. 14	Informazione e preparazione evento	per un importo di 180,4 miliardi

C. Per localizzazione

- N. 499	Comune di Roma	per un importo di 2578 miliardi
- N. 141	Provincia di Roma	per un importo di 540,2 miliardi
- N. 29	Provincia di Frosinone	per un importo di 40,5 miliardi
- N. 32	Provincia di Latina	per un importo di 36,4 miliardi
- N. 20	Provincia di Rieti	per un importo di 41,3 miliardi
- N. 17	Provincia di Viterbo	per un importo di 33,7 miliardi
- N. 16	Senza riferimenti territoriali	per un importo di 201,2 miliardi

D. Per categorie di soggetti beneficiari

- N.	257	Amministrazioni centrali	per un importo di 1034,8 miliardi
- N.	62	Amm. regionali e Provinciali	per un importo di 389,9 miliardi
- N.	278	Amministrazioni comunali	per un importo di 851,9 miliardi
- N.	157	Altri soggetti	per un importo di 1194,8 miliardi

2.9 Lo stato di attuazione

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti a completamento circa 30 ulteriori interventi facendo così crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione è cresciuto dal 31 dicembre scorso ad oggi. La crescita è di sole 31 unità, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L'avanzamento medio nel processo attuativo è aumentato dal 62% al 70% , ma resta un ritardo medio di 104 giorni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale, leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre '98.

Rispetto all'articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in più avanzato stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre nella categoria «lavori» solo l'81,5% è in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle «forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispetto al 98,2%.

Anche l'esame dello stato di attuazione, per «settori d'intervento», registra il valore più alto di cantierizzazione nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il settore della «accessibilità e mobilità» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del «sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all'articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il 95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con l'86,53%, la provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.

La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore più alto di cantierizzazione è quella delle «Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

2.10 Valutazione del rischio di ritardo finale

Con riferimento alle date di completamento programmate, si osserva un notevole «affollamento» di interventi che si troveranno in fase di esecuzione nell'ultimo trimestre del '99. Questo fenomeno, già segnalato in precedenza, comporta che solo il 66% degli interventi, per un importo equivalente all'84% del totale del Piano terminerà, presumibilmente e secondo i programmi aggiornati, tra ottobre e dicembre '99. Ciò fa aumentare il rischio di possibile superamento, per alcuni di essi della data di inizio del Giubileo; la contemporaneità di tanti cantieri, potrebbe, infatti, avere un impatto crescente sulla città di Roma ed implicare ulteriori difficoltà operative.

La valutazione di rischio di ritardo finale¹⁾ fornisce il seguente quadro nel quale gli importi indicati sono riferiti ai finanziamenti ex Legge 651/96:

- «Alto rischio»	n. 75	per un importo totale di	1157 miliardi	(36%)
- «Medio rischio»	n. 248	per un importo totale di	1131 miliardi	(35%)
- «Basso rischio»	n. 288	per un importo totale di	648 miliardi	(20%)
- «Rischio nullo»	n. 103	per un importo totale di	288 miliardi	(9%)

Rispetto alla valutazione di dicembre '98 il numero di interventi ad alto rischio è aumentato (da 52 a 75) e così anche l'importo totale (aumentato da 978 a 1157 miliardi).

I 75 interventi giudicati ad alto rischio, sono così ripartiti tra le categorie:

	totale	lavori	beni culturali	forniture	incentivi
- non appaltati	32	25	/	6	1
- appaltati	43	37	2	2	2

2.11 Considerazioni complessive

Alcune considerazioni basate sui risultati emersi dal monitoraggio effettuato nel trimestre, sono esposte di seguito:

- in termini generali l'attuazione del Piano registra un discreto progresso rispetto al trimestre precedente raggiungendo il 70% dell'avanzamento globale; tuttavia, rispetto alla programmazione iniziale, che indicava la quasi totalità degli interventi in fase di esecuzione entro il 31 marzo, l'obiettivo è stato raggiunto solamente dal 64% degli interventi; quindi oltre un terzo degli interventi registra un ritardo rispetto al cronoprogramma;

1) Si ricorda che gli interventi ad alto rischio sono quelli la cui data di completamento è a ridosso delle scadenze giubilari, che hanno accumulato sensibilmente ritardo e che, tenuto conto delle problematiche d'attuazione/esecuzione, mostrano un alto rischio di non completamento entro i termini giubilari, anche alla luce di quanto realizzato negli ultimi mesi. Gli interventi a rischio nullo sono quelli la cui fase esecutiva è già stata completata.

Gli altri interventi, valutati a medio e basso rischio, sono quelli per i quali non è individuabile, alla data attuale, un rischio particolare che ne possa impedire il completamento entro la scadenza giubilare. Tuttavia, i primi (a medio rischio) per dimensione, complessità e programmi d'esecuzione non presentano margini di sicurezza tali da permettere il recupero di ritardi dovuti ad imprevisti. Margini che invece esistono per gli interventi considerati a basso rischio.

- due fattori possono aver contribuito a frenare l'avanzamento del Piano:
 - a) il maltempo, che nel 1° trimestre '99 ha certamente avuto un effetto negativo su alcuni cantieri;
 - b) l'entrata in vigore di nuove procedure di affidamento degli appalti, che ha provocato di fatto un allungamento nei tempi di affidamento, anche per le necessità di adeguare bandi e capitolati alle nuove regole;
- gli interventi valutati ad «alto rischio» sono aumentati rispetto al trimestre precedente, in quanto alcuni di questi, precedentemente valutati a «medio rischio», sono passati nel livello superiore di rischio per non avere mostrato progressi significativi nel trimestre, viceversa solo un esiguo numero di interventi è progredito tanto da scendere da alto a «medio rischio». Inoltre sono entrati nel livello di «alto rischio» interventi di recente inserimento nel Piano;
- restano ad «alto rischio» alcuni degli interventi dimensionalmente più significativi sulle infrastrutture di trasporto (n.8 per un importo totale di circa 507 miliardi) in ragione della loro complessità esecutiva e/o dei ritardi di esecuzione osservati. E' opportuno però segnalare che 2 di questi:
 - a) il «Sottovia di Lungotevere in Sassia»;
 - b) le «Interconnessioni al parcheggio del Gianicolo»;hanno mostrato significativi progressi, pur dovendo ancora recuperare molto ritardo; mentre si è ulteriormente incrementato il ritardo dei lavori relativi a:
 - a) «Autostrada Roma – Fiumicino» - 2° lotto;
 - b) «Stazione Tiburtina»;
 - c) «Passante ferroviario dei Laghi»;
 - d) «Porto di Civitavecchia»;inoltre i 2 interventi della «metropolitana "A"» hanno tempi di esecuzione molto compressi e data di completamento a ridosso delle scadenze giubilari;
- la «Galleria P.A.S.A.», precedentemente valutata ad «alto rischio», a fronte di un notevole recupero del ritardo e del completamento delle attività di cantiere più critiche, viene ora valutata a «medio rischio»;
- vanno anche segnalati diversi interventi di dimensione media (tra 10 e 30 miliardi) valutati ad «alto rischio», tra questi:
 - a) n. 5 interventi del «Ministero dell'Interno» e dei «Carabinieri»;
 - b) n. 5 strade della «Provincia di Roma»;
 - c) n. 1 intervento affidato alla «STA» per la realizzazione di un «sistema automatico di controllo degli accessi al centro storico»;
 - d) n. 3 interventi consistenti in «incentivi per l'edilizia», «incentivi per le attività alberghiere» ed «incentivi per le attività extra-alberghiere»;
 - e) «ospedale Sant'Eugenio»;
 - f) «ospedale Agostino Gemelli»;
 - g) la «riqualificazione dell'Appia Antica», per il quale i lavori del 2° lotto sono stati sospesi;
- tra gli interventi valutati ad «alto rischio» è evidente che quelli di elevato importo hanno maggiori difficoltà di recupero del ritardo rispetto a quelli, più numerosi, di importo ridotto;
- in generale gli interventi di dimensione ridotta e quelli dei Beni Culturali procedono bene.

In conclusione, si può prendere atto che il miglioramento registrato nell'ultimo trimestre, nella realizzazione di alcuni grandi interventi strategici di «viabilità nell'area di S. Pietro» è stato ottenuto anche a seguito del rafforzamento del management dei relativi cantieri.

Analogo rafforzamento è auspicabile per altri grandi interventi ad «alto rischio», in corso di esecuzione, finalizzato ad ottenere una più alta produttività da parte delle imprese senza che ciò vada a scapito di qualità e sicurezza nell'esecuzione delle opere.

2.12 Situazione finanziaria

2.12.1 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Situazione al 31 dicembre 1998:

- impegni assunti	L.	1.083.456.318.309
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse attivate	L.	1.456.065.818.309
- pagamenti effettuati	L.	503.826.983.578
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L.	884.836.483.578

Situazione al 31 marzo 1999:

- impegni assunti	L.	1.479.440.332.132
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse attivate	L.	1.861.049.832.132
- pagamenti effettuati	L.	997.963.805.282
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L.	1.379.573.305.282

in dettaglio al 31 marzo 1999:

Settore «A»

- impegni assunti	L.	184.176.165.898
- pagamenti effettuati	L.	157.160.122.968

Settore «B»

- impegni assunti	L.	125.488.521.687
- pagamenti effettuati	L.	57.954.434.675

Settore «C»

- impegni assunti	L.	260.035.921.643
- pagamenti effettuati	L.	195.280.166.635

Settore «D»

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- impegni assunti	L.	709.555.487.357
- pagamenti effettuati	L.	452.234.134.763
Settore «E»		
- impegni assunti	L.	118.300.538.764
- pagamenti effettuati	L.	80.751.498.920
Settore «F»		
- impegni assunti	L.	81.883.696.783
- pagamenti effettuati	L.	54.583.447.321

Pertanto le variazioni sulle singole voci, rispetto al 31 dicembre 1998 sono le seguenti:

- maggiori impegni assunti	L.	395.984.013.823
- variazioni di bilancio	L.	0
- Differenza sul tot. risorse attivate	L.	395.984.013.823
- ulteriori pagamenti effettuati	L.	494.136.821.704
- variazioni di bilancio	L.	0
- Differenza sul tot. risorse trasf.	L.	494.136.821.704

2 Allegati

2.1 Graficizzazione dello stato di attuazione


2.2 Tabulato dell'attuazione finanziaria

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 (L.651/96) AL 31 MARZO 1999

FASI PROGRAMMATE DELL'ATTUAZIONE		FASI REALI DELL'ATTUAZIONE		FASI COINCIDENTI			
Riferimenti soggettivi ed obiettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)		Processo di attuazione			
Settore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	
A SOCIALE ACCOGLIENZA							
Al Creazione di strutture per l'accoglienza delle categorie disagiate							
A 01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma)	Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RMA	212.000	212.000	0
A 01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma)	Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RMA	212.000	212.000	0
A 01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	IPAB "S. Margherita" - Roma	7.000.000	7.000.000	0
A 01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma), nell'edificio "S. Giuseppe Doti"	IPAB "S. Francesco Romano" - Roma	IPAB "S. Francesco Romano" - Roma	1.900.000	1.900.000	0
A 01	06	Comunit alloggio per disabili (Roma)	Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove XII - III U.O.	Comune di Roma - Dip. XII - III U.O.	1.500.000	1.500.000	0
A 01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di prophet comunale.		Comune di Roma - Dip. XII - III U.O.	4.955.794	4.955.794	0
A 01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma)	Ristrutturazione di un immobile del comune di In local. Passoscuro	Comune di Fiumicino	600.000	600.000	0
A 01	11	Piano di accessibilit� e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche		ATAC	10.986.000	10.986.000	0
A 01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio		Provincia di Roma	1.218.539	1.218.539	0
A 01	13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma)	Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.600.000	2.600.000	0
A 01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Vainmontone/Roma).	Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000	0
A 01	15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Montecitorio/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente		Comune di Montecitorio	280.000	280.000	0
A 01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso		Comune di Rocca Canterano	650.893	650.893	0



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civilevecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in Comune di Civilevecchia (locali Parlatino)	3.245.000	3.245.000	0
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	149.250	149.250	0
A 01 19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	1.165.068	1.165.068	0
A 01 21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Comune di Roma - Ufficio Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'isola Cilt. Storica	5.500.000	5.500.000	0
A 01 22	Segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici	3.000.000	3.000.000	0
A 01 23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	1.000.000	1.000.000	0
A 01 23/2	Ristrutturazione servizi di accoglienza e pronto soccorso clinica pediatrica	2.000.000	2.000.000	0
A 01 24	Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della pigna e locali annessi	1.288.700	1.288.700	0
A 01 25	Riqualificazione di una struttura conventuale	3.438.000	3.438.000	0
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via delle Isole	2.349.442	2.349.442	0
A 01 26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via Cassala	1.922.091	1.922.091	0
A 01 27	Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo strabico)	16.000.000	16.000.000	0
A 01 28	Zona ricettiva - Casa per ferie	3.000.000	3.000.000	0
A 01 29	Centro attrezzato per la tutela della prima infanzia al servizio della famiglia disagiata	6.909.000	1.000.000	5.909.000
A 04 01/1	Restauri del complesso del Buon Pastore	2.200.000	2.200.000	0
A 04 01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo scienziatico	9.900.000	9.900.000	0
A 05 01/1	Divisione e chiodizio Ospedale S. Maria della Piet. e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia, come centri di accoglienza per pellegrini	2.000.000	2.000.000	0
A 05 01/2	Santa Maria della Piet. - Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ritavimento parco)	1.000.000	1.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A 05	01/3	Santa Maria della Piet. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Stacord, Manuzenz, Padigl. Direzione)	USL RM E	5.098.000	5.098.000	0
A 05	01/4	Santa Maria della Piet. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenzione ordinaria cappella e 3 padiglioni)	USL RM E	6.988.000	6.988.000	0
A 05	01/5	Santa Maria della Piet. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000	9.927.000	0
A 05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturaz. ex colonia marina "V. Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	6.879.166	6.879.166	0
A6 Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi per interventi privati ("private sociale")						
A 06	01	Incentivi all'attività privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle A.M.M. ai pubblici.	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000	0
A 06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iscp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	20.800.000	20.800.000	0
A7 Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo						
A 07	01	Centro di accoglienza turistica e convertito (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	8.875.315	5.231.488	1.743.829
A 07	03	Camppeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Piet	Provincia di Roma	1.110.000	676.000	434.000
A 07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	3.598.201	2.598.201	1.000.000
A 07	05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	550.000	375.000	175.000
A 07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convertito degli Agostiniani	Comune di Marino	4.632.849	3.282.849	1.350.000
A 07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	1.830.000	610.000
A 07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio già adibito a ostello	Comune di Frascati	590.000	420.000	140.000
A 07	09	Camppeggio (Fiano Romano/Roma) Completamento	Comune di Fiano Romano	889.922	589.922	300.000
A 07	10	Camppeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	390.000	190.000	200.000
A 07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000	1.050.000	700.000
A 07	12	Ostello della Gioventù (Manciana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manciana	500.000	375.000	125.000
A 07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	302.623	219.173	83.450

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anicoli Corchiaro/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carbone	Comune di Anicoli Corchiaro	874.500	658.000	218.500
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	964.700	764.700	200.000
A 07 16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pignus	Comune di S. Marinella	962.706	600.000	362.706
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000
A 07 19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Marino al Cimino/Viterbo) Realizzo di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	1.678.902	1.065.902	611.000
A 07 20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	991.503	741.503	250.000
A 07 21	Ostello della Gioventù "Torretto" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, Asilo infantile di Tuscania	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000
A 07 22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monast. Clarisse di S. Rosa (VT)	1.167.077	834.077	333.000
A 07 23	Centro di accoglienza (Conigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Conigliano	2.200.000	1.650.000	550.000
A 07 24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici: a) Residenza Abati di Ferfa; b) ex albergo (Montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli Sabina	800.000	600.000	200.000
A 07 25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Filano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	4.500.000	1.500.000
A 07 26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirafiori/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Straccia	Comune di Poggio Mirafiori	972.000	729.000	243.000
A 07 27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirafiori/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirafiori	1.600.000	1.200.000	400.000
A 07 28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabazia/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000	2.025.000	675.000
A 07 29	Area camper (Frasso Sabina/Rieti) Realizzazione delle pavimentazioni, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabina	500.000	375.000	125.000
A 07 30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli Sabina	500.000	375.000	125.000
A 07 31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000
A 07 32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	288.250	206.250	82.000
A 07 33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Mirasole	Comune di Lenola	380.236	230.236	150.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A 07 34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili	Comune di Roccagorga	120.000	90.000	30.000
A 07 35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pazzi e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	500.000	375.000	125.000
A 07 36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000
A 07 37	Ostello della Gioventù (Sarmonea/Latina) Realizzazione	Comune di Sarmonea	1.342.011	942.011	400.000
A 07 39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (* stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	2.000.000	667.000
A 07 40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Ist. Prof. di Stato San Benedetto	1.365.703	991.703	494.000
A 07 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000	800.000	267.000
A 07 42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Fionardi	Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000
A 07 43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Lucera/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	336.219	236.219	100.000
A 07 44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.301.161	925.161	375.000
A 07 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Cimino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Cimino	1.094.161	799.381	284.780
A 07 46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschetti	Comune di Alatri	2.667.000	2.000.000	667.000
A 08 01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000	0
A 09 01	Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Salaria dell'Ospedale Santo Spirito	Comune di Roma	650.000	650.000	0
A 10 01	Pavimentazione del sagrato del Santuario e dei viali processionali	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	1.379.000	1.379.000	0
A 10 02	Demolizione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della Chiesa del Santuario	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	234.000	234.000	0
A 10 03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	817.000	817.000	0

B BENI CULTURALI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B1. Area del Grande Campidoglio, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini

B 01	02	Area del Grande Campidoglio. Progetto di restauro e sistemazione dei Musei Capitolini. 2° lotto funzionale.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	7.500.000	7.500.000	0
B 02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	5.000.000	5.000.000	0
B 02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali. Allattamento dei materiali mobili restaurati.	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	990.000	990.000	0
B 02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibili Torre delle Milizie.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.322.277	2.322.277	0
B 02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali. Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.188.124	2.188.124	0
B 02	03/1a	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	3.278.708	3.278.708	0
B 02	03/1b	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Tempio della Pace	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	4.283.934	4.283.934	0
B 02	03/1c	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	5.844.358	5.844.358	0
B 02	03/2a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.312.658	1.312.658	0
B 02	03/2b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.360.490	1.360.490	0
B 02	03/2c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.969.554	1.969.554	0
B3. Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche						
B 03	01	Mura di Roma. Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.600.000	1.600.000	0
B 03	02/1	Mura di Roma. Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso, Porta Latina, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.814.554	1.814.554	0
B 03	02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti mura tra Porta S. Sebastiano e Porta Metrona	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.689.121	1.689.121	0
B 03	03	Mura di Roma. Restauro di Porta S. Giovanni a tratto di mura da Porta Asinara all'atrio Casertese	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.000.000	3.000.000	0
B 03	04/1	Mura di Roma. Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.600.000	2.600.000	0
B 03	04/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.068.796	1.068.796	0
B 03	05	Mura di Roma. Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.786.034	1.786.034	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 03	06	Mura di Roma. Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.790.792	1.790.792	0
B 03	07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, musealizzazione ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta San Pancrazio	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.242.790	1.242.790	0
B 03	08	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Fontese	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.774.396	1.774.396	0
B 03	09/1	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle Mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzarini	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.881.050	1.881.050	0
B 03	09/2	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento della Mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - Bastione Ardeatino	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.225.208	2.225.208	0
B4 Palazzo delle Esposizioni: Restauro ed adeguamento funzionale						
B 04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.128.057	1.128.057	0
B5 Palazzo Braschi (Museo di Roma): Restauro ed adeguamento funzionale						
B 05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi - Interventi preliminari	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.608.000	1.608.000	0
B 05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi: Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	10.673.194	10.673.194	0
B6 Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Alessandri, Crypta Balbi)						
B 06	01	Palazzo Alessandri (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo anfitratto	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	6.808.900	4.808.900	2.000.000
B 06	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	1.500.000	1.500.000	0
B 06	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Egittrica": restauri e allestimenti	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	2.146.766	2.146.766	0
B 06	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	2.367.818	2.367.818	0
B 06	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Chiozzotti)	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	911.588	911.588	0
B 06	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture diocleziane ed aree archeologiche, completamento restauro museo delle Cere	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	800.000	800.000	0
B 06	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione egiziana - Sale dei Capolavori"	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	2.970.887	2.970.887	0
B 06	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiosso di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	8.700.000	8.700.000	0
B 06	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	BB, CC, AA - (2) S.B. Archcol. RM	28.222.533	8.222.533	20.000.000

B9 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 09	01	Restaurio del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralzo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	15.142.889	5.142.889	10.000.000
B10 Musei Nazionali di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)						
B 10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	9.600.000	9.600.000	0
B 10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	9.600.000	9.600.000	0
B 10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Storti Fern)	BB. CC. AA. - (6) S. Archeol. Etr. Mer.	3.400.000	3.400.000	0
B11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna						
B 11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma). Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Costanza (primo stralzo)	BB. CC. AA. - (6) Gal. Naz. Arte Mod.	24.124.659	9.124.659	15.000.000
B12 Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)						
B 12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	581.697	581.697	0
B 12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	3.103.076	3.103.076	0
B 12	03	Vitroniano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	9.676.423	9.676.423	0
B 12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli atrii	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	3.000.000	3.000.000	0
B 12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.401.670	1.401.670	0
B 12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.206.104	2.206.104	0
B 12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pignotta	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	267.073	267.073	0
B 12	06	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.654.140	1.654.140	0
B 12	09	Donna sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	300.000	300.000	0
B 12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.660.559	1.660.559	0
B 12	11	Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.206.441	1.206.441	0
B 12	12	Mausoleo "Berenice del Fale" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.264.993	1.264.993	0
B 12	13	Parco archeologico della via Flaminia Arco - Casale di Malborghetto	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	1.000.000	1.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento.	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. Laz	573.725	573.725	0
B 12	15	Rocca di Papa - Castello di Palazzolo	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	923.047	923.047	0
B 12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'area nord	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	5.582.254	5.582.254	0
B 12	17	Antica Rocca (Civita Vecchia/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.691.925	1.691.925	0
B 12	18	Forti Michelangelo (Civita Vecchia/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.670.363	2.670.363	0
B 12	19	Castello di S. Severo (S. Marinella/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	4.965.905	4.965.905	0
B 12	20	Castello Odescalchi (Santa Marinella - Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	523.765	523.765	0
B 12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	564.330	564.330	0
B 12	22	Castello di Montefiore (Ladispoli/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.820.072	2.820.072	0
B 12	23	Completamento dei lavori di restauro e ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni - Palazzo Stamperia	Presidenza Consiglio Ministri	1.500.000	1.500.000	0
B 12	24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	Presidenza Consiglio Ministri	3.672.000	3.672.000	0
B 12	25	Restauro delle case di S. Brigida in P.zza Farnese	Ordine del SS Salvatore di Santa Brigida	600.000	600.000	0
B 12	26	Passello di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pig. - Via del Campitania	BB. CC. AA. - (7)	1.000.000	1.000.000	0
B 12	27	Ex scuderie papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	BB. CC. AA. - (7)	8.897.000	8.897.000	0
013 - Restauri ed interventi conservativi di chiese, basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo.						
B 13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archit. RM	4.000.000	4.000.000	0
B 13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	927.720	927.720	0
B 13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	364.256	364.256	0
B 13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0
B 13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	489.647	489.647	0
B 13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	BB. CC. AA. - (2) S.B. Archeol. RM	890.906	890.906	0
B 13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.922.727	1.922.727	0
B 13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	700.000	700.000	0
B 13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	180.830	180.830	0
B 13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	1.000.000	1.000.000	0
B 13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	918.191	918.191	0
B 13	12	Chiesa del Gas (Roma) Restauro delle opere d'arte	BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	800.000	800.000	0
B 13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	444.154	444.154	0
B 13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	672.836	672.836	0
B 13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.000.000	1.000.000	0
B 13	16	Santa Maria d'Avocosa (Roma) Restauro del campanile e della facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	800.000	800.000	0
B 13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.368.727	1.368.727	0
B 13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	394.949	394.949	0
B 13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.072.494	1.072.494	0
B 13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.500.000	2.500.000	0
B 13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	961.300	961.300	0
B 13	22	Chiesa di S. Susanna restauri prospetti int. rifacimento coperture	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	737.477	737.477	0
B 13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	639.460	639.460	0
B 13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altomps e indagini archeologiche	BB CC AA - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0
B 13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altomps e della cappella Avila Scarso archeologico e labirintizzazione	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	300.000	300.000	0
B 13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	848.724	848.724	0
B 13	27	Restauro, bonifica e rifacimento testi Chiesa S. Eustachio (Roma)	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	749.391	749.391	0
B 13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	600.000	600.000	0
B 13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	189.614	189.614	0
B 13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	778.810	778.810	0
B 13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	761.915	761.915	0
B 13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Corifalco (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	BB CC AA - (3) S.B. Art. Stor. RM	450.000	450.000	0
B 13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	416.993	416.993	0
B 13	33	Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti del cortile Bottonianino	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	350.000	350.000	0
B 13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	736.863	736.863	0
B 13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	BB CC AA - (3) S.B. Art. Stor. RM	500.000	500.000	0
B 13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	BB CC AA - (3) S.B. Art. Stor. RM	1.300.000	1.300.000	0
B 13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de' Insula (Roma) Restauro dei prospetti	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	449.273	449.273	0
B 13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	518.457	518.457	0
B 13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	713.866	713.866	0
B 13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	494.332	494.332	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma). Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	BB. CC. AA. - (2) S. B. Archit. RM	94.874	94.874	0
B 13	43	Chiesa del SS. Domenico e Sisto	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0
B 13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma). Restauro degli affreschi e del muro di confine	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	640.000	640.000	0
B 13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma). Restauro del muro di cinta del convento	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	310.497	310.497	0
B 13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma). Restauro degli interni	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	300.000	300.000	0
B 13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma). Restauro degli interni	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	400.000	400.000	0
B 13	46/1	Chiesa di S. Luca al Conflone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	470.650	470.650	0
B 13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci. Restauro portici e facciata	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	711.336	711.336	0
B 13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0
B 13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	724.740	724.740	0
B 13	47/1	Chiesa di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	550.000	550.000	0
B 13	47/2	Chiesa di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	1.235.000	1.235.000	0
B 13	47/3	Chiesa di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	350.000	350.000	0
B 13	47/4	Chiesa di S. Silvestro ai Quirinali. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	220.000	220.000	0
B 13	47/5	Chiesa di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB. CC. AA. - (3) S. B. Art. Stor. RM	200.000	200.000	0
B 13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	374.916	374.916	0
B 13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	470.435	470.435	0
B 13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicola. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	381.127	381.127	0
B 13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dorati. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S. B. Amb. Archit. RM	600.000	600.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B. 13	485	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro delle coperture e dell'apparato decorativo interno alla navata centrale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	300.000	300.000	0
B. 13	486	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei propeduti e delle facciate (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	550.000	550.000	0
B. 13	487	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	230.610	230.610	0
B. 13	491	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	400.000	400.000	0
B. 13	492	Chiesa di S. Pantaleo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	365.915	365.915	0
B. 13	493	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	359.283	359.283	0
B. 13	494	Chiesa di S. Prisca	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	288.344	288.344	0
B. 13	495	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	480.237	480.237	0
B. 13	496	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento. Restauro Globale	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	978.794	978.794	0
B. 13	50	Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	354.100	354.100	0
B. 13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	BB. CC. AA. - (2) S.B. Architet. RM	1.372.433	1.372.433	0
B. 13	52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	687.983	687.983	0
B. 13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassellonato ligneo settecentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	828.882	828.882	0
B. 13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	5.572.953	5.572.953	0
B. 13	56	Chiesa di S. Zoticco - Calacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	BB. CC. AA. - (2) S.B. Architet. RM	1.000.000	1.000.000	0
B. 13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	868.721	868.721	0
B. 13	58	Chiesa di S. Clemente (Papa Velletri/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.296.693	2.296.693	0
B. 13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	458.902	458.902	0
B. 13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento di Palazzo (Rocca di Papa/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	877.562	877.562	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 13	61	Convento di San Cosimato (Vicoevera/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.122.389	1.122.389	0	
B 13	62	Abbazie di S. Andrea in Formis (Pozzano Romano/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	2.859.922	2.859.922	0	
B 13	63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	959.897	959.897	0	
B 13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	890.516	890.516	0	
B 13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	929.344	929.344	0	
B 13	66	Eremita della Trinità (Alumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.890.867	1.890.867	0	
B 13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Alumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.791.998	1.791.998	0	
B 13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	998.885	998.885	0	
B 13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	BB. CC. AA. - (5) S.B. Amb. Archit. Laz	1.888.045	1.888.045	0	
B 13	70	Restauro delle edifiche sacre del centro storico di Roma	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.700.000	1.700.000	0	
B 13	71	Restauro organo (Aim)	Chiesa di S. Maria Maggiore	100.000	100.000	0	
B 13	72	Ristrutturazione	Parrocchia S. Maria degli Angeli - Roma	1.770.000	1.770.000	0	
B 13	73	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili	Parrocchia Basilica di S. Maria Maggiore	110.000	110.000	0	
B 13	74	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	Parrocchia Basilica di S. Maria Maggiore	590.000	590.000	0	
B 13	75	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Parrocchia Basilica di S. Maria Maggiore	720.000	720.000	0	
B 13	76	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Parrocchia Basilica di S. Maria Maggiore	234.000	234.000	0	
B 13	77	Restauri e nuovo impianto elettrico	Parrocchia Basilica di S. Maria Maggiore	2.057.000	2.057.000	0	
B 13	78	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'ampificazione e la diffusione	Parrocchia Basilica di S. Maria Maggiore	2.000.000	2.000.000	0	
B 13	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Veri	Ord. Cistercense SS. Vincenzo e Anastasio	249.000	249.000	0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 13	80	Cappella S. Maria del Popolo	BB, CC, AA - (7)	800.000	800.000	0	
B13 Interventi di restauro e adeguamenti funzionali di altri Musei Archeologici, Medievale, Moderni							
B 14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli per la nuova sede dell'Ist. Naz. Grafica	BB, CC, AA - (6) Ist. Naz. Grafica	10.714.115	10.714.115	0	
B 14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	BB, CC, AA - (1) S.B. Arch. RM	6.994.528	6.994.528	0	
B 14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	BB, CC, AA - (1) S.B. Arch. RM	747.867	747.867	0	
B 14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	BB, CC, AA - (2) S.B. Arch. RM	1.305.436	1.305.436	0	
B 14	05	Castel S. Angelo (Roma) Alibattimento museale	BB, CC, AA - (6) Mus. Naz. C. S. Ang.	1.500.000	1.500.000	0	
B 14	06	Museo delle tinte romane (Nemi/Roma)	BB, CC, AA - (6) S. Arch. Lazio	800.000	800.000	0	
B 14	07	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini	700.000	700.000	0	
B 14	08	Completamento "Museo del Fiume"	Comune di Nezzano	800.000	800.000	0	
B15 Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Trastevere							
B 15	01	Citt. di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Trastevere	BB, CC, AA - (4) S.B. Arch. Ostia	4.000.000	4.000.000	0	
B 15	02	Citt. di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	BB, CC, AA - (4) S.B. Arch. Ostia	7.000.000	7.000.000	0	
B 15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predispensione materiale illustrativo e didattico	BB, CC, AA - (4) S.B. Arch. Ostia	2.000.000	2.000.000	0	
B 15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	BB, CC, AA - (4) S.B. Arch. Ostia	2.000.000	2.000.000	0	
B 15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	BB, CC, AA - (4) S.B. Arch. Ostia	2.000.000	2.000.000	0	
B 15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	BB, CC, AA - (4) S.B. Arch. Ostia	1.500.000	1.500.000	0	
B 15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	BB, CC, AA - (4) S.B. Arch. Ostia	1.500.000	1.500.000	0	
B16 Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici							
B 16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	BB, CC, AA - (2) S.B. Arch. RM	893.929	893.929	0	
B 16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	BB, CC, AA - (2) S.B. Arch. RM	4.672.784	4.672.784	0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	1.180.800	1.180.800	0
B 16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	2.539.255	2.539.255	0
B 16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento, strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	1.896.029	1.896.029	0
B 16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	398.319	398.319	0
B 16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Cratone del XL Martiri e Forico Adelfiano anastasio	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	2.117.288	2.117.288	0
B 16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	721.892	721.892	0
B 16	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiburtina e terrazza sul Bosalone Farnesiano Restauro e manutenzione	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	2.745.454	2.745.454	0
B 16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S. Maria Antiqua a S. Anastasio e a via di S. Gregorio Restauro e manutenzione	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	1.780.174	1.780.174	0
B 16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcole Severiane e Terme Restauro	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	1.815.959	1.815.959	0
B 16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	3.183.883	3.183.883	0
B 16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	902.280	902.280	0
B 16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	3.696.046	3.696.046	0
B 16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	893.483	893.483	0
B 16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	2.243.464	2.243.464	0
B 16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Colonna Massima Sistemazione e manutenzione	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	274.975	274.975	0
B 16	18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Giardino di P.zo Barberini scavo e restauro	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	792.578	792.578	0
B 16	18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio anfitr	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0
B 16	18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - S. Cecilia, realizzazione di copertura	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	97.922	97.922	0
B 16	18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carboni	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	139.395	139.395	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	551.079	551.079	0
B 16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana localit. Casal Bianco	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	47.516	47.516	0
B 16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	45.818	45.818	0
B 16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Mirco di S. Stefano Rotondo	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	91.597	91.597	0
B 16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	45.798	45.798	0
B 16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	92.502	92.502	0
B 16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	901.046	901.046	0
B 16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bessi	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0
B 16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	94.537	94.537	0
B 16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	50.000	50.000	0
B 16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	60.000	60.000	0
B 16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano sulla ottagona	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	122.102	122.102	0
B 16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	675.516	675.516	0
B 16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana localit. Casalotti	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	93.184	93.184	0
B 16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavi	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	25.000	25.000	0
B 16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in localit. Monte Colonnaio	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	576.929	576.929	0
B 16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Pontuense in localit. Pozzo Pandico	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	470.392	470.392	0
B 16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Cimiterium - Itinerario di visita della citt. e di due necropoli	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	831.234	831.234	0
B 16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	100.000	100.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 16	1824	Palazzo Belcolosini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	300.000	300.000	0
B 16	1825	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauro letto ad esterni	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	130.000	130.000	0
B 16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	1.869.969	1.869.969	0
B 16	20	Villa dei Quiriti (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	5.469.913	5.469.913	0
B 16	22	Parco delle Tombe della Via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	2.659.556	2.659.556	0
B 16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	8.076.283	8.076.283	0
B 16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	BB, CC, AA - (6) S. Archeol. Est. Mer.	600.000	600.000	0
B 16	26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	4.705.715	4.705.715	0
B 16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	BB, CC, AA - (2) S.B. Archeol. RM	1.458.180	1.458.180	0
B 16	28	Antro delle Scriti (Palestrina/Roma)	BB, CC, AA - (6) S. Archeol. Lazio	560.000	560.000	0
B 16	29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccastrada e Centro Camerale	BB, CC, AA - (6) S. Archeol. Lazio	1.660.000	1.660.000	0
B 16	30	Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana	Comune di Monteporzio Caton	3.000.000	3.000.000	0
B18 Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi di culto e di vita nella provincia di Roma						
B 18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Nisfco del Santuario	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000	0
B 18	02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	800.000	800.000	0
B 18	03	Terme di Callimaco e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000	0
B 18	04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	200.000	200.000	0
B 18	05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	1.000.000	1.000.000	0
B 18	06	Palazzo e Parco Chigi (Anicia/Roma)	Comune di Anicia	4.515.222	4.515.222	0
B 18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adattamento funzionale	Provincia di Roma	514.044	514.044	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferata, 4° settore di intervento	XI° Comuni Montana, Sede di Rocca Piaza	500.000	500.000	0	
B 18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catonae/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresta	Università degli studi di Roma - Tor Vergata	7.700.000	7.700.000	0	
B 18	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.350.000	1.257.000	93.000	
B 18	11	Catacombe di S. Ilario (Velletri/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Velletri	392.505	392.505	0	
B 18	12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.313.739	1.313.739	0	
B 18	13	Rocca del Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	546.829	544.329	2.500	
B 18	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	405.771	405.771	0	
B 18	16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	1.859.637	1.859.637	0	
B 18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.686	397.686	0	
B 18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.981	741.981	0	
B 18	19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	389.792	389.792	0	
B 18	20	Chiesa di S. Maria in Traspote (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000	150.000	0	
B 18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civilella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civilella S. Paolo	254.200	254.200	0	
B 18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	274.983	274.983	0	
B 18	23	Aree archeologiche della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.230.000	1.230.000	0	
B 18	24	Sistemazione area parcheggio adiacente parco Chiigi e risanamento parco Primoli	Comune di Ardea	1.000.000	1.000.000	0	
B19 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuito abbazie, santuari e monasteri)							
B 19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000	0	
B 19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Toscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	4.517.000	4.517.000	0	
B 19	04/1	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra-1° stralcio	Comune di Bellegra	995.862	995.862	0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 19 0472	Rituffolazioni Convento S. Francesco di Bellegra-il' straiaco	Comune di Bellegra	840.000	840.000	0
B 19 05	Restaufo del piano terra ex Convento degli Agostini da destinare a Museo Civico e restaufo della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.167.163	1.167.163	0
B 19 06	Restaufo conservativo della Cappella volvo di S. Bellarmino	Comune di Trevignano	402.000	402.000	0
B 19 07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restaufo (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	995.004	995.004	0
B 19 08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	5.774.000	5.774.000	0
B 19 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restaufo	Comune di Valmontone	548.829	548.829	0
B 19 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restaufo	Comune di Valmontone	100.000	100.000	0
B 19 12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpinetto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.242.088	1.242.088	0
B 19 13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro. Santuario Madonna degli Angeli (Cantareo/Roma) Restaufo e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000	300.000	0
B 19 14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	764.429	764.429	0
B 19 15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Guilciano nel Lazio	212.880	172.880	40.000
B 19 16	Chiesa di Santa Liberata (San'Angelo Romano/Roma) Restaufo	Comune di San'Angelo Romano	470.520	470.520	0
B 19 17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabazia/Roma)	Comune di Palombara Sabazia	200.000	200.000	0
B 19 18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	150.000	150.000	0
B 19 19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000	65.000	0
B 19 201	Restaufo delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	372.274	372.274	0
B 19 202	Restaufo della Chiesa di S. Terenziano (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	627.504	627.504	0
B 19 203	Pavimentazione del corso Petrucci ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	445.248	445.248	0
B 19 204	Sistemazione di Via della Maltona (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	820.925	820.925	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 19	20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	453.724	453.724	0
B 19	20/6	Sistemazione del piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	560.327	560.327	0
B 19	21	Riabilitazione del Palazzo Vescovile di Acquafredda (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.070.104	3.070.104	0
B 19	22	Convento di S. Francesco (Tuscanara/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Onofre in Grotte	2.366.953	2.366.953	0
B 19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di VT	2.128.411	2.128.411	0
B 19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	162.368	162.368	0
B 19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	122.789	122.789	0
B 19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edificio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.087.815	2.087.815	0
B 19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000	0
B 19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000	0
B 19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000	1.600.000	0
B 19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.650.000	1.650.000	0
B 19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000	804.000	0
B 19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	488.429	488.429	0
B 19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greggio capoluogo. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075	201.075	15.000
B 19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico a Giuditta	Comune di Migliarino	488.791	488.791	0
B 19	30	Complesso di S. Alessandro (Tuffara/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	1.600.000	1.600.000	0
B 19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Fara e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	4.729.000	4.729.000	0
B 19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed annesso della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000	400.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 19	33	Monastero delle Clarisse (Suzzani/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	4.988.803	1.988.803	3.000.000
B 19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Con	1.000.000	1.000.000	0
B 19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Ctr. Vecchie di Gaeta e del promontorio di Monte DiGirolamo	Comune di Gaeta	1.000.000	1.000.000	0
B 19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000	0
B 19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	1.000.000	1.000.000	0
B 19	38	Chiesa di San Giovanni (Castellone/Latina) Restauro	Comune di Castellone	200.000	200.000	0
B 19	39	Abbazia di Fossanova (Piverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (*1° stralzo funzionale)	Comune di Piverno	1.250.000	1.250.000	0
B 19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	683.400	683.400	0
B 19	41/1	Restauro e trasferimento conservato e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	224.856	224.856	0
B 19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	130.642	130.642	0
B 19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Smeralda	Comune di Sabaudia	105.594	105.594	0
B 19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	179.311	179.311	0
B 19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	120.000	120.000	0
B 19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000	650.000	0
B 19	46	Progetto pubblica illuminazione delle aree adiacenti il santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	98.981	98.981	0
B 19	47	Recupero del complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	936.087	936.087	0
B 19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Suzzani/Latina) restauro	Comune di Suzzani	700.000	700.000	0
B 19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	1.300.000	1.300.000	0
B 19	50	Museo storico benedettino (Anagnini/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Certi	650.302	650.302	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquinofrosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	989.007	989.007	0
B 19	52	Sistemazione aree attrezzate esterne al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Seterrali	252.425	252.425	0
B 19	53	Santa Maria Assunta (Alatri/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	615.300	615.300	0
B 19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Seterrali/Frosinone)	Comune di Seterrali	313.880	313.880	0
B 19	55	Basilica S. Maria Saome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Ente Chiesa di S. Maria Saome	240.000	240.000	0
B 19	56	Abbazia di Montecassino (Casinofrosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Casinò	4.000.000	4.000.000	0
B 19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Emica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Emica	256.272	256.272	0
B 19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	430.000	430.000	0
B 19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000	0
B 19	60	Chiesa S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	483.803	483.803	0
B 19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	363.475	363.475	0
B 19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagnifrosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per APSA-Pontificio Collegio Leoniano	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.071.006	571.006	500.000
B 19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagnifrosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per APSA-Pontificio Collegio Leoniano	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	164.443	164.443	0
B 19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	683.007	683.007	0
B 19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	870.224	870.224	0
B 19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	422.384	422.384	0
B 19	67	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.750.000	2.750.000	0
B 19	68	Chiesa di S. Rostilda (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	675.357	675.357	0
B 19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone). Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000	100.000	0
B 19	71	Abbazia di Trinità-Casaman (Veroelli/Frosinone). Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.110.846	1.110.846	0
B 19	72	Ampliamento della Chiesa in località Grunapolo facente parte della Parrocchia di S. Cosma e Damiano	Comune di S. Cosma e Damiano	80.000	80.000	0
B 19	73	Ridimensionamento copertura, facciata esterna e Sistemazione area esterna della Chiesa Comune di S. Cosma e Damiano	Comune di S. Cosma e Damiano	100.000	100.000	0
B 19	74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di S. Antonio Danilino	40.000	40.000	0
B 19	75	Abbazia di Casaman	Ordine Cisterciense	1.000.000	1.000.000	
B20 - Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata concesse al Giubileo.						
B 20	01.1	Opera lirica Programmata da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	15.000.000	0
B 20	01.2	Musica. Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Accademia di Santa Cecilia	13.000.000	13.000.000	
B 20	01.3	Prosa. Programma da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	7.000.000	
B 20	01.4	Mostre. Programma di esposizione d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000	
B 20	01.5	Convegno Internazionale	Agenzia Romana Prep. Giubileo	2.000.000	2.000.000	
B 20	01.6	Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000	
B 20	01.7	Incentivi dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000	
B 20	01.8	Incentivi dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	1.000.000	1.000.000	
B 20	01.9	Incentivi dell'offerta culturale nelle Regioni Lazio	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000	
B 20	02	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Picolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Picolomini	2.985.000	2.985.000	0

C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE

C1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche.

C 01	01	Restauro conservativo dei ponti Vittorio Emanuele II, Umberto I, Regina Margherita e Cayour	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	7.008.952	7.008.952	0
------	----	---	-------------------------------------	-----------	-----------	---

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 01	02	Restauro conservativo di ponte Caio Cestio, ponte Duca D'Aosta, cavalcavia sul Muro Torto	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.151.363	8.151.363	0
C 01	03	Restauro conservativo di ponte Flaminio ed impermeabilizzazione di ponte Testaccio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	6.622.872	6.622.872	0
C 01	04	Restauro conservativo di ponte Risorgimento	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.689.000	2.689.000	0
C 01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto - Uff. Dir. Storica	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Dir. Storica	3.334.070	3.334.070	0
C 01	06	Restauro conservativo di ponte Fabricio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.138.804	2.138.804	0
C 01	07	Restauro conservativo di ponte Nomentano	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.554.975	2.554.975	0
C 01	10	P.zza S. Pietro in Vincoli, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma) Riquilibrac. Ambient., risagomatura strade e ripristino selciati	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.245.865	3.245.865	0
C 01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, c.d. via Coda, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.228.822	2.228.822	0
C 01	12	Progetto per interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Percorso "C", v.le Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.894.625	2.894.625	0
C 01	13/1	Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Lungotevere di sinistra e di destra da ponte Millefiori, Ristutturazione marciapiedi e sistema fognario	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	4.500.000	4.500.000	0
C 01	13/2	Interventi di manutenzione delle sedi stradali del lungotevere di sinistra e di destra da ponte Sublicio a ponte Matteotti e zone limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	7.000.000	7.000.000	0
C 01	14	Via S. Giovanni, via G. Lenza, via Washington, interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	8.205.316	8.205.316	0
C 01	15/1	Via Appia Antica, 1° Lotto. Riquilibrac. e adeguamento della sede stradale da piazza Numa Pompilio a via di Cecilia Metella	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.587.523	3.587.523	0
C 01	15/2	Via Appia Antica, 2° Lotto. Riquilibrac. e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	9.881.076	9.881.076	0
C 01	18/1	Villa Borghese, Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, proplei neoclassici, prospetti di piazza della Canestre	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.000.000	2.000.000	0
C 01	18/2	Villa Borghese: proplei egizi, Fontana del Fucos, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia, Restauro degli arredi architettonici	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.165.000	2.165.000	0
C 01	19	Villa Borghese, Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.098.161	1.098.161	0
C 01	20	Villa Borghese: Parco dei Diani (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	875.458	875.458	0
C 01	21/1	Villa Doria Pamphili (Roma): sistemaz. esterne ed allestim. del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati, illuminaz. esterna	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.000.000	3.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C. 01	21/2	Villa Doria Pamphili (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.355.000	2.355.000	0
C. 01	22/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giove.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.694.480	1.694.480	0
C. 01	22/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e allestimento museale della Casina Falajetti e dell'area annessa.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.497.997	1.497.997	0
C. 01	23	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.550.959	1.550.959	0
C. 01	24	Villa Pamphili (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.789.261	1.789.261	0
C. 01	25	Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.190.000	1.190.000	0
C. 01	26/A	Riquadratura: Teatro Marcello-Piazza di Montu Savello, via Casalena, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	9.000.000	9.000.000	0
C. 01	28	Polenzamento meccanizzazione servizio giardini	Comune di Roma - Dip. X	2.412.000	2.412.000	0
C. 01	29	Lavori per l'impianto del verde nel Parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma - Dip. X	1.970.000	1.970.000	0
C. 01	30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relativi a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma - Dip. XII	5.000.000	5.000.000	0
C.2 Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, rilievi ai pubblici e catcombe)						
C. 02	A	Area delle Basiliche di San Pietro in Vaticano, S. M. Maggiore e S. Croce in Gerusalemme. Realizzaz. impianti tematici ed installaz. pannelli tematici di informazione, pannelli orientativi di valubili e di segnalatica pedonale	STA	2.625.700	2.625.700	0
C. 02	B1/1/1	"BOR" progetto di riqualificazione ambientale di borgo s. spirito.	Comune di Roma	5.347.538	5.347.538	0
C. 02	B1/1/2	"RIS" progetto riqualificazione ambientale piazza Risorgimento.	Comune di Roma	9.425.458	9.425.458	0
C. 02	B1/1/3	"CON" progetto di riqualificazione ambientale via della Conciliazione	Comune di Roma	4.583.604	4.583.604	0
C. 02	B1/2	Area delle Basiliche di San Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.869.660	1.869.660	0
C. 02	B1/4	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	AMA	907.430	907.430	0
C. 02	B1/5	Area delle Basiliche di San Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rifrazione, realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero dell'Interno	2.805.000	2.805.000	0
C. 02	B1/6	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro. allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale proietto lungo Ponte Gelomino	Roma 2000	1.446.500	1.446.500	0
C. 02	B1/7	Infrastrutture area stazione di S. Pietro (Pietro)	Roma 2000	9.240.000	9.240.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 02	02/1	Demolizione dei dismessi depositi ATAC di via Carlo Felice	Comune di Roma - Dip. XII - Il U.O.	1.786.438	1.786.438	0
C 02	02/2.1	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma	400.000	400.000	0
C 02	02/2.2	"GIO" progetto di riqualificazione ambientale piazza San Giovanni	Comune di Roma	9.932.464	9.932.464	0
C 02	02/2.3	"MER" progetto di riqualificazione ambientale via Mercuria	Comune di Roma	4.943.202	4.943.202	0
C 02	02/2.4	"MAR" progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Maria Maggiore	Comune di Roma	5.213.681	5.213.681	0
C 02	02/2.5	"CRO" progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Croce in Gerusalemme	Comune di Roma	1.909.636	1.909.636	0
C 02	02/2.6	"QUA" progetto di riqualificazione ambientale via Santi Quattro Coronati	Comune di Roma	1.410.753	1.410.753	0
C 02	02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale san Giovanni	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata	14.129.000	14.129.000	0
C 02	02/5	Area delle Basiliche san Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme: distristizione	AMA	1.456.866	1.456.866	0
C 02	02/6	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S. M. Maggiore e S. Croce in Gerusalemme. Installaz. impianti tecnologici TVCC e di rilevaz. realizzaz. ed allestim. di strutture temporanee per la sicurezza	Ministero dell'Interno	2.385.350	2.385.350	0
C 02	02/7	Area delle Basiliche san Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme: interventi illuminazione	ACEA	3.884.003	3.884.003	0
C 02	03/1/1	"PAO" progetto di riqualificazione ambientale piazza San Paolo	Comune di Roma	8.934.648	8.934.648	0
C 02	03/1/2	"LUN" progetto di riqualificazione ambientale lungotevere San Paolo	Comune di Roma	1.482.518	1.482.518	0
C 02	03/1/3	"OST" progetto di riqualificazione ambientale via Ostiense	Comune di Roma	820.827	820.827	0
C 02	03/2	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.943.700	1.943.700	0
C 02	03/4	Area basilica San Paolo: distristizione	AMA	386.636	386.636	0
C 02	03/5	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza	Ministero dell'Interno	1.491.600	1.491.600	0
C 02	03/6	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Amm. n. 14/Riciale Basilica S. Paolo	1.256.320	1.256.320	0
C 02	04/1	Itinerari giuliani e storici: manutenzione sedi stradali	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C. 02	0442	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000	0			
C. 02	05	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - Il U.O.	5.000.000	5.000.000	0			
C. 02	06	Piani pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma - Dip. VI - UR Citt. Storica	7.400.000	7.400.000	0			
C. 02	08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	3.000.000	3.000.000	0			
C. 02	09	"ATT"-fornitura e posa in opera attrezzature temporanee basiliche san Pietro, San Giovanni e San Paolo	Comune di Roma	7.254.911	7.254.911	0			
C.3 - arretrato, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed interventi per l'adeguamento delle insegne commerciali									
C. 03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riquilificazione delle sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - Il U.O.	2.400.000	2.400.000	0			
C. 03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma - Dip. XII - Il U.O.	405.668	405.668	0			
C. 03	03	Via delle Muratte	Comune di Roma - Dip. VI - UR Citt. Storica	2.353.909	2.353.909	0			
C. 03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma - Dip. XII - Il U.O.	3.257.956	3.257.956	0			
C. 03	06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi perimetrali (primo stralcio)	Comune di Roma - Dip. IX	112.500.000	112.500.000	0			
C. 03	07	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi perimetrali (secondo stralcio)	Comune di Roma - Dip. IX	27.500.000	27.500.000	0			
C. 03	08	Contributi ristrutturazione bagni locali pubblici e insegne esercizi commerciali	Comune di Roma - Dip. VIII	5.000.000	5.000.000	0			
C. 03	09	Incentivi per riquilificazione strutture commerciali	Regione Lazio	2.000.000	2.000.000	0			
C.4 - Area di Castel Gandolfo, Adeguamento delle infrastrutture									
C. 04	A	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.300.000	1.300.000	0			
C. 04	B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.500.000	1.500.000	0			
C. 04	C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	300.000	300.000	0			
C. 04	D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	550.000	550.000	0			
C. 04	E	Systemazion e delle viabilità urbana	Comune di CastelGandolfo	3.500.000	3.500.000	0			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 04	F	Sistemazione della passeggiata sul lungolego	Comune di Castel Gandolfo	2.500.000	2.500.000	0
C 04	H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di Castel Gandolfo	1.400.000	1.400.000	0
C5 - Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione						
C 05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma - Dip. X	3.300.000	3.300.000	0
C 05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma - Dip. X	1.700.000	1.700.000	0
C6 - Giardini San Giovanni in Via Carlo Felice. Interventi di manutenzione						
C 06	01	Giardini di San Giovanni in via Carlo Felice (Roma): Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma - Dip. X	3.500.000	3.500.000	0
C7 - Parco Casilino-Latinate. Interventi di sistemazione e verde						
C 07	01	Parco Casilino, Labicarno, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma): Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.000.000	2.000.000	0
C8 - Restauro del Parco di Villa Borghese						
C 08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma - Dip. X	1.720.817	1.720.817	0
C 08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	3.000.000	0
C 08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via piacentina, Giardini del lago, cancello d'ingresso, Parco dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	1.405.357	1.405.357	0
C 08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma - Dip. X	2.928.750	1.928.750	1.000.000
C 08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0
C9 - Riquadrificazione del Parco della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)						
C 09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riquadrificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma - Dip. X	3.281.442	3.281.442	0
C 09	02/1	Riquadrificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cantiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma - Dip. X	3.548.053	3.548.053	0
C 09	02/2	Riquadrificaz. parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfseo Egeata, S Urbano, Colombario Comune di Roma - Dip. X Costantiano, Torre Valca	Comune di Roma - Dip. X	5.500.000	5.500.000	0
C10 - Restauro del Parco di Villa Ada Savola						
C 10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savola: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma - Dip. X	2.568.975	2.568.975	0
C11 - Recupero dell'area di San Gregorio al Celio						
C 11	01/1	Area archeologica del Celio via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.000.000	1.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 11 01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrelli. Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	3.500.000	3.500.000	0
C 11 02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salmi consolidamento e restauro. Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.866.273	2.866.273	0
C 11 03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra del Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.281.068	1.281.068	0
C 11 04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario. Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	616.460	616.460	0
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio, colle del Celio, recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Dell'Orto e S. Sisto Vecchio. Comune di Roma - Dip. X	4.000.000	4.000.000	0
C 11 06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso affarone di Suor Teresa di Calcutta. Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.500.000	2.500.000	0
C 11 07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico. Comune di Roma	301.710	301.710	0
C 11 08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapio (portale). BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	396.510	396.510	0
C 11 09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata). BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	250.000	250.000	0
C 11 10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture). BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	272.377	272.377	0
C 11 11	Torre medievale - (SNP consolidamento, coperture, paramenti murari). BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	274.766	274.766	0
C 11 12	Archi del Clivo di Scauro. BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	747.072	747.072	0
C 11 13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.353.310	1.353.310	0
C 11 14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro. BB. CC. AA. - (2) S.B. Architet. RM	626.337	626.337	0
C 11 15	Biblioteca di Papa Agapio ed insule romane adiacenti. BB. CC. AA. - (2) S.B. Architet. RM	1.044.466	1.044.466	0
C 11 16	Arco di Siano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celsimontano. BB. CC. AA. - (2) S.B. Architet. RM	448.352	448.352	0
C 11 17	Basilica SS. Giovanni e Paolo. BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	216.500	216.500	0
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Domenica. BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	190.000	190.000	0
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Formis. BB. CC. AA. - (3) S.B. Art. Stor. RM	53.300	53.300	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	BB CC AA - (3) S.B. Art. Stor. RM	630.700	630.700	0
C 11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500	191.500	0
C 11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Savelli	ITALGAS	170.000	170.000	0
C 11	23	Musealizzazione e finalizzazione all'accoglienza di visitatori alle case romane sotto l'aspetto di SS Giovanni e Paolo al Celio	BB CC AA - (7)	600.000	600.000	0
C12 - Restauro del Parco di Villa Doria Pamphili						
C 12	01	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma - Dip. X	4.600.000	4.600.000	0
C 12	02	Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma - Dip. X	3.000.000	3.000.000	0
C 12	03	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma - Dip. X	699.364	699.364	0
C 12	04/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0
C 12	04/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Cedrat, di Villa Vecchia, delle Serte	Comune di Roma - Dip. X	698.934	698.934	0
C13 - Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mellini						
C 13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma); Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.317.533	2.317.533	0
C 13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario. Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma - Dip. X	4.300.000	4.300.000	0
C14 - Bonifica delle pendici del Gianicolo						
C 14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riquadrificazione delle aree a verde	Comune di Roma - Dip. X	2.999.278	2.999.278	0
C15 - Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio						
C 15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma - Dip. X	1.000.000	1.000.000	0
C 15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Escorte Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.440.668	1.440.668	0
C18 - Ripulizione ambientale nella provincia di Roma						
C 18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000	1.000.000	0
C 18	02	Santuario della Merlonella (Pisciniano-Caprinica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei terreni vicini	Provincia di Roma	2.800.000	2.800.000	0
C 18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000	6.000.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 18	04	Basco e cave nel parco dei Castelli Romani (Mariano/Roma) Interventi di Riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000	0
C 19 Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana						
C 19	01/a2	Sistemazione idraulica del fosso dell'acqua Mariana	Comune di Roma - Dip. XII - I.U.O.	8.000.000	8.000.000	0
C 19	01/b1	Risanamento Fosso Palatino - Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000	0
C 19	01/b2	Risanamento Fosso Palatino - Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	4.000.000	4.000.000	0
C 19	01/b3	Risanamento Fosso Palatino - Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	16.000.791	16.000.791	0
C 19	01/b4	Opere di difesa del litore di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000	9.000.000	0
C 19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	8.000.000	0
C 20 Opere Botaniche						
C 20	01	Orto Botanico	Universit. La Sapienza	600.000	600.000	0

D ACCESSIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA

D 05 Adempimenti del materiale stabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale						
D 05	01/a	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	105.744.100	105.744.100	0
D 05	01/2	Fornitura di autobus urbani di media capacita	ATAC	19.807.339	19.807.339	0
D 05	01/3	Fornitura di 18 vetture tranviarie di grande capacita	ATAC	78.870.018	78.870.018	0
D 05	01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.695.411	60.695.411	0
D 05	01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacita	COTRAL	13.472.353	13.472.353	0
D 05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	7.891.000	7.891.000	0
D 05	01/7	Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viareggio	COTRAL	36.190.000	36.190.000	0
D 05	01/8	Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma-Pantano	COTRAL	12.200.000	12.200.000	0
D 05	02	Fornitura di autobus da 18 metri	ATAC	44.000.000	44.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 07	02	Sottovia Lungotevere in Sassetta	Proveditorato OO. PP. del Lazio	33.309.568	33.309.568	0
D8 Qualificazione dell'area del Giannicolo						
D 08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scavalcano di m. 10,50 di larghezza e m. 8,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - larghezza in sottrazione m. 875).	Proveditorato OO. PP. del Lazio	56.050.000	56.050.000	0
D 08	02	Parcheggio propagganda Fide Giannicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000	40.000.000	40.000.000
D 08	03	Interconnessioni tra il parcheggio del Giannicolo e la viabilit� esterna	Proveditorato OO. PP. del Lazio	15.390.000	15.390.000	0
D9 Infrastruttura dell'area della Stazione Tiburtina						
D 09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	92.481.695	92.481.695	0
D10 Terza corsia dell'Autostrada Roma-Francoforte						
D 10	01a	Autostrada Roma-Francoforte. Realizzazione terza corsia (lotto 2)	ANAS	88.867.135	88.773.824	4.093.311
D 10	01b	Autostrada Roma-Francoforte. Realizzazione terza corsia (lotto 3)	ANAS	15.748.076	15.571.357	176.719
D11 Adeguamento del Grande Racordo Anulare nel tratto Pignone-Aurelia						
D 11	01	GRA tratto Pignone-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (lotto 23b)	ANAS	48.850.000	48.850.000	0
D12 Miglioramento viabilit� di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di Ostia e di Ardea (Cavelli Romano, Litorale e nodi ferroviari)						
D 13	01	Parcheggio a raso e viabilit� di accesso alla stazione FS (Campino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria fra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000	0
D 13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM8 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.171.017	1.171.017	0
D 13	03	Parcheggio di scambio (Zaganello/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.081.574	1.081.574	0
D 13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.030.000	1.390.000	640.000
D 13	05	Parcheggio di scambio in locali Bagri di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Galdosia - Tiburtina	Provincia di Roma	397.391	397.391	0
D 13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000	0
D 13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM6 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	680.000	680.000	0
D 13	08	S.P. Metrocine Sani (Metroroma) Allargamento del Km 0+000 al Km 3+900 della S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000	4.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grotteferrata, Marino/Roma) Manut. attrad. Km 0+0-10+5, da SS Casilina a SS via dei Leghi (colleg. Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	1.978.635	1.978.635	0
D 13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S. Cesario/Roma) Ripristino della strada per Tuscolano al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000	0
D 13	11	S.P. Meremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio della Tiberina alla A25	Provincia di Roma	3.672.391	3.672.391	0
D 13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallegati (Montecitorio/Roma)	Provincia di Roma	6.200.000	6.200.000	0
D14 Miglioramento della viabilit provinciale di collegamento tra Roma e le aree di città e di accoglienza ("stradetradiali")						
D 14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria del Km 0+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.228.124	3.228.124	0
D 14	03	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	1.743.772	1.743.772	0
D 14	03	S.P. Laurentina del GRA fino al Km 19,500	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000	0
D 14	04	S.P. Tibertina (Roma) Manutenzione straordinaria del Km 0+100 (Prima Ponsa) al km 18+000 (vincolo autostradale)	Provincia di Roma	2.906.320	2.906.320	0
D 14	05	SP Tibertina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	2.650.000	2.650.000	0
D 14	06	SP Saticomini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	8.210.000	8.210.000	0
D 14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	2.335.062	2.335.062	0
D 14	08	Collegamento SP Subicamini - SP Plantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	11.205.000	11.205.000	0
D 14	09	Interventi di manutenzione ed adeguamento delle rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Frosinone	17.500.000	17.500.000	0
D 14	10	Miglioramento della viabilit provinciale di collegamento tra Roma e la area di visita e di accoglienza (primo e secondo stralcio)	Provincia di Latina	17.500.000	17.500.000	0
D 14	11	Sistemazione viabilit provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Rieti	17.500.000	17.500.000	0
D 14	12	Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (primo e secondo stralcio)	Provincia di Viterbo	17.500.000	17.500.000	0
D15 Passante ferroviaria dei laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo						
D 15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	170.379.000	170.379.000	0
D 15	01/2	Potenziamento della linea Ciampino-Velletri con realizzazione della nuova fermata S. Cesario e nuovi posti di incrocio di Ponona e Lanurto	Ferrovie dello Stato	13.341.000	13.341.000	0

D16 Riqualificazione e potenziamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 16 01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine Autorità portuale del porto commerciale. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto) di Civitavecchia	71.217.371	71.217.371	0
D 16 02	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (2° lotto) di Civitavecchia	11.000.000	11.000.000	0
D18. Riquadrificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie emnesse (stazioni e infrastrutture di servizio)				
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini	9.640.000	9.640.000	0
D 18 01/2a	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 1° stralcio	25.363.362	25.363.362	0
D 18 01/2b	Linea metropolitana. Adeguamento metro A. 2° stralcio	55.037.266	55.037.266	0
D 18 02/1a	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma - Lido	6.381.331	6.381.331	0
D 18 02/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione	2.000.000	2.000.000	0
D 18 02/2	Ferrovie concesse: potenziamento Roma Nord	20.000.000	20.000.000	0
D 18 03	Sicurezza stazione Termini	10.000.000	10.000.000	0
D 18 04	Alta Mazoni - stazione Termini	20.000.000	20.000.000	0
D19. Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autostrade				
D 19 02	Interventi relativi a nodi di scambio e stazioni ferroviarie, Stazione Aurelia	10.000.000	10.000.000	0
D 19 03	Parcheggi di scambio con strutture mobili	5.000.000	5.000.000	0
D 19 04	Stralcio funzionale. Nodo di scambio Viale Aurelia con intersezione tra Via Anastasio II e Via Angelo Emo. Circostrazione XVII-XVIII	4.099.250	4.099.250	0
D20. Controllo e gestione del traffico				
D 20 01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	20.650.000	20.650.000	0
D 20 02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	17.000.000	17.000.000	0
D 20 03	Iniziativa per una mobilità sostenibile a Roma	3.500.000	3.500.000	0
D21. Riorganizzazione nodo di scambio largo Torre Argentina				
D 21 01	Riorganizzazione nodo di scambio largo Torre Argentina	9.424.700	9.424.700	0
D22. Area per Grandi Eventi - Tor Vergata				

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 22 01/1	Completamento delle progettazioni	Proveditorato Opere Pubbliche Lazio	960.000	960.000	0
D 22 01/2	Organizzazione manifestazioni	Agenzia Romana Prep. Giubbileo	1.174.000	1.174.000	
D 22 01/3	Progettazione interventi futuri sulla Tor Vergata	Università Tor Vergata	870.000	870.000	

E SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE

E1. Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggior affollamento del territorio urbano e metropolitano.

E 01 01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	5.304.869	3.304.869	2.000.000
E 01 02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma). Casermetti monumentali con automazzi Side Loader	AMA	12.095.040	5.795.040	6.300.000
E 01 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	10.257.968	8.857.968	1.400.000
E 01 04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Manicompartitori per la raccolta dei rifiuti sulle urban	AMA	1.658.800	1.458.800	500.000
E 01 05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vettura ribaltabile.	AMA	700.000	600.000	100.000
E 01 06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.308.000	908.000	400.000
E 01 07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000	500.000	100.000
E 01 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona mediante ex Mercato Genovese.	AMA	3.948.920	2.648.920	700.000
E 01 09/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	375.000	0	375.000
E 01 09/2	Forniture di n. 1000 cestini stradali	AMA	2.800.000	2.500.000	100.000
E 01 11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Comerzia	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000
E 01 12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalotti.	AMA	5.008.569	3.852.569	1.056.000
E 01 13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	539.521	403.521	136.000
E 01 14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Via Popolare.	AMA	5.713.000	2.800.000	1.213.000
E 01 15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	2.500.000	2.000.000	500.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 01 16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	6.252.609	5.072.609	560.000
E 01 17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellani.	AMA	6.965.000	4.000.000	2.965.000
E 01 18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	4.872.769	2.668.769	1.994.000
E 01 19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Sasa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	1.087.000	150.000	937.000
E 01 20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchi.	AMA	3.000.000	870.000	2.130.000
E 01 22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sarnio.	AMA	3.402.734	2.547.734	855.000
E 01 22/2	Fornitura attrezzature: Competitori su sentinacci e mietili per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sarnio	AMA	1.073.501	1.073.501	0
E 01 24	Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate. (Via di Torrevecchia)	AMA	7.038.000	3.000.000	4.038.000
E 01 25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Marsicello Giardino.	AMA	8.740.000	7.800.000	1.140.000
E 01 26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campobasso.	AMA	1.178.462	995.462	190.000
E 01 26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campobasso.	AMA	236.750	236.750	0
E 01 27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000	3.100.000	0
E 01 27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.900.000	5.900.000	0
E 01 27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Sistema radiocalcolazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.800.000	1.800.000	0
E 01 28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000	2.000.000	8.710.000
E 01 29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000
E 01 30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	7.885.480	7.885.480	0
E 01 31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.400.000	1.400.000	0
E 01 01	Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello.	USL RM E	37.231.000	22.531.000	15.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 02 02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Auditoria	10.000.000	10.000.000	0
E 02 03	Ospedale Sank'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000	0
E 02 04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	5.067.347	5.067.347	0
E 02 05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	12.164.478	12.164.478	0
E 02 06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191	6.031.191	0
E 02 07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000	0
E 02 08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572	0
E 02 08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (beni)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990	0
E 02 09	Ospedale di Albano (Albania/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	1.000.000	1.000.000	0
E 02 10	Ospedale Anguillara Sabazia (Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000	1.000.000	0
E 02 11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	1.056.442	1.056.442	0
E 02 12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000	4.500.000	0
E 02 13	Rede di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. J. J. J. Spallanzani	8.219.647	8.219.647	0
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000	7.140.000	0
E 02 15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Az. Ospedaliera S. Camillo-Forlani	10.500.000	10.500.000	0
E 02 16/a	Programmazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000	0
E 02 16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protektorato S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000	0
E 02 17	Ristrutturazione P. M. P. Via Sardo Roma	USL RM B	5.000.000	5.000.000	0
E 02 18	Ospedale "Fatebenefratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	Casa Generalizia "Fatebenefratelli"	2.615.000	2.615.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 02 19	Progr. n. 19 di potenziamento dell'ospedale S. Carlo di Nancy (primo piano)	Istituto Dermatologico dell'Infirocata	3.000.000	3.000.000	0
E 02 20	Campus bio-medico	Libero Int. Univ. "Campus bio-medico" di Roma	8.225.887	8.225.887	0
E 02 21	Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello per area pediatrica	I.R.C.C.S. - Osped. Pediatrico "Bambino Gesù"	2.470.000	2.470.000	0
E 02 22	Fornitura nautici di soccorso al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (1° strabco)	Comando Generale della Capitaneria di Porto	3.000.000	3.000.000	0
E 02 23	Acquisto mezzi soccorso capitaneria di porto Fiumicino	Comando Generale della Capitaneria di Porto	3.300.000	3.300.000	0
E 03	Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)				
E 03 01	Informizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA	5.000.000	5.000.000	0
E 03 02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Viale Trastevere N. 18, Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	Comune di Roma - Dip. XII	2.500.000	2.500.000	0
E 03 02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Via Ferruccio N. 8, Roma sede Comando Vigili Urbani I gruppo	Comune di Roma - Dip. XII	1.000.000	1.000.000	0
E 03 02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in Via Palmiro Togliatti N. 887, Roma sede del VII gruppo Vigili Urbani	Comune di Roma - Dip. XII	2.000.000	2.000.000	0
E 03 02/4	Lavori di manut. strucc. restauro ed adeguam. impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luca", p.zza Cinecittà 11, Roma, per sede di Scuole del personale di Polizia Municipale	Comune di Roma - Dip. XII	4.000.000	4.000.000	0
E 03 02/5	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio sito in Via della Consolazione N. 4, Roma sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma - Dip. XII	500.000	500.000	0
E 03 03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma - Dip. XII	3.805.237	3.805.237	0
E 03 04/1	Acquisto apparecchiature elettroniche per attività esterne	Comune di Roma - VV.UU.	1.700.000	1.700.000	0
E 03 04/2	Acquisto apparecchiature elettroniche per scuole di polizia	Comune di Roma - VV.UU.	300.000	300.000	0
E 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane				
E 04 01	Piano di valorizzazione risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formaz. e aggiornam. professionale addetti Pubb. Amministrat.: Impiego cooperatori in servizio civile.	Regione Lazio	16.952.000	16.952.000	0
E 04 02	Piano di valorizzazione risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formaz. e aggiornam. professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Gubbio.	Regione Lazio	1.100.000	1.100.000	0
E 04 03	Piano di valorizzazione risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e invio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	9.040.000	5.200.000	3.840.000
E 04 04	Piano di valorizzazione risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; qualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	3.958.000	3.148.000	810.000
E 5	Sicurezza pubblica e protezione civile				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E. 05	01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'interno	1.300.000	1.300.000	0
E. 05	01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'interno	3.700.000	3.700.000	0
E. 05	2/A	Attrezzature ed impianti di telecomunicazioni: seed operaiva VV.FF.	Ministero dell'interno - Dipartimento Protezione Civile	3.000.000	3.000.000	0
E. 05	03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'interno	12.000.000	12.000.000	0
E. 05	04	Controllo sicurezza bagagli da aerea (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	27.500.000	27.500.000	0
E. 05	05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	3.380.000	3.380.000	0
E. 05	06	Controllo sicurezza bagagli da aerea (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	5.002.000	5.002.000	0
E. 05	07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	650.000	650.000	0
E. 05	08	Addebiamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'incassata e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000	10.000.000	0
E. 05	09	Acquisto di 7 lotti per illuminazione	Ministero Difesa	200.000	200.000	0
E. 05	11	Arquipamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate all'aggio operatori volontari e poliziotti italiani ed esteri	Ministero Difesa	4.800.000	4.800.000	0
E. 05	12	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	Ministero Difesa - Arma Carabinieri	1.995.000	1.995.000	0
E. 05	13	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quosco"	Ministero LL.PP.	26.500.000	26.500.000	0
E. 05	14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero dell'interno	19.000.000	19.000.000	0
E. 05	15	Infrastrutture - Riabilitazione Servizi Logistici caserma "Foligno"	Ministero dell'interno	697.000	697.000	0
E. 05	16	Caserma della polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	Ministero dell'interno	1.800.000	1.800.000	0
E. 05	17	Caserma della polizia di Stato "Maurizio Gaglio" sede del reparto volanti	Ministero dell'interno	2.997.000	2.997.000	0
E. 05	18	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'interno	4.048.000	4.048.000	0
E. 05	19	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero dell'interno	11.000.000	11.000.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 05 20	Coordinamento Centrali operative interforze	Ministero Difesa - Arma Carabinieri	1.500.000	1.500.000	0
E 05 21	Iniziativa per la formazione del personale	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	455.000	455.000	0
E 05 22	Iniziativa per la formazione del personale	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	539.000	539.000	0
E 05 23	Realizzazione nuovo collegamento disloccamento fluviale	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	500.000	500.000	0
E 05 24	Ampliamento e ristrutturazione sede Tuscolano II	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	2.000.000	2.000.000	0
E 05 25	Acquisto elicotteranza	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	11.000.000	11.000.000	0
E 05 27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	Presid. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	399.000	399.000	0
E 05 28	Adeguamento e potenziamento della funzionali della sala operativa del dipartimento della protezione civile	Presid. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	697.000	697.000	0
E 05 29	Predisposizione di circa 150 moduli containerizzati pluriuso/ sociali per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza	Presid. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	3.983.000	3.983.000	0
E 05 30	Acquisto tazzi e attrezzature varie	Ministero dell'Interno - Dip. Prot. Civ. - VV.FF.	5.000.000	5.000.000	0
E 05 31	Caserma CC P.za Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero dell'Interno	1.000.000	1.000.000	0
E 05 33	Rete di radio comunicazioni della Polizia	Ministero dell'Interno	6.500.000	6.500.000	0
E 06 01	Interventi a sostegno dell'occupazione	Comune di Roma - Uff. Spec. Politiche del Lavoro	5.000.000	5.000.000	0
E 07 01	Contributo attività straordinaria corpo Polizia Municipale	Comune di Roma	2.700.000	2.700.000	0

F INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

F 01 01/1	Centro informativo del museo Ricorinamento. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Comune di Roma - Gubbio	5.675.712	5.675.712	0
F 01 01/2	Centro informativo di Via della Conciliazione. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Comune di Roma - Gubbio	7.275.712	7.275.712	0
F 01 02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Comune di Roma - Gubbio	5.161.763	5.161.763	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

F 01 03	Informazione al pellegrino ad al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	614.000	614.000	0
F 01 04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	3.810.000	3.810.000	0
F 4 Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 340 del 3 luglio 1976				
F 04 01	Contributo assolvimento compiti indicati comma 4, legge 651	95.157.496	95.157.496	0
F 04 02	Osservatorio sul Piano del Giubileo	6.000.000	6.000.000	0
F 5 Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo				
F 05 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli affluenti (primo stralcio funzionale)	8.613.240	8.613.240	0
F 05 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	5.000.000	5.000.000	0
F 05 03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	7.612.000	7.612.000	0
F 05 04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	17.993.440	17.993.440	0
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	8.152.060	8.152.060	0
F 05 06	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	3.300.000	3.300.000	0

G MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

G 1 1	Monitoraggio interventi	6.000.000	6.000.000	
-------	-------------------------	-----------	-----------	--

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GIUBILEO DA GIUGNO 1998 A MARZO 1999
(dati ITALCONSULT integrati con informazioni dell'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi)

PARAMETRI	TOTALE			LAVORI			BENI CULTURALI					FORNITURE					
	mar.99	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar.99	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar.99 (5)	dic. 98	set. 98	giu. 98	mar.99	dic. 98	set. 98	giu. 98	
Numero interventi																	
totali	754(1)	754(1)	720 (1)	720 (2)	438	438	435	447	209	209	205	205	107(1)	90	71	63	
non appaltati o senza inform.	120	226	224	304	78	148	181	257	1	7	0	1	41	57	43	45	
appaltati	587	528(2)	487	411	323	290	254	190	205	202	205	204	52	33	28	18	
in realizzazione	463	432(3)	359	307	301	262	161	102	132	148	192	201	28	21	6	4	
completati	100	76	19	7	19	17	4	3	78	54	9	1	12	5	6	3	
Indicatori procedurali																	
Avanzam. Medio (%)	70%	62%	55%	40%	66%	58%	52%	42%	83%	75%	65%	41%	52%	45%	41%	35%	
Ritardo affidamento (gg)	104	100	94	57	113	109	100	75	71	74	74	18	141	136	129	124	
Margine finale (gg)	124(4)	50	61	80	96	58	78	93	198	44	44	83	76	19	14	-27	
Indicatori di costo																	
Finanziamento L.651 (mid)	3471	3471	3265	3380	2054	2054	2083	2350	324	324	306	325	1098	785	591	565	
Costo totale (mid)	3652	3652	3407	3550	2174	2174	2163	2432	371	371	354	379	1104	799	606	595	
Economie (mid)	338	303	118	110	290	247	86	102	43	52	50	28	5	4	-18	-20	
% economie	14%	8,3%	3,5%	3,1%	14%	11,4%	4,0%	4,2%	12%	14,0%	14,1%	7,4%	0,50%	0,5%	-3,0%	-3,4%	
Valutazione di criticità																	
Alta criticità	68	85	99	98	48	66	66	83	3	4	20	25	17	15	11	14	
Media criticità	147	147	167	219	106	90	109	126	21	35	37	41	20	22	21	26	
Bassa criticità	479	377	317	276	259	230	165	127	180	129	138	138	40	18	13	10	
Valutazione di rischio																	
Alto rischio	75	52	37	73	62	45	36	70	2	0	0	0	11	7	1	3	
Medio rischio	248	238	250	214	175	178	156	126	41	30	68	66	32	30	26	22	
Basso rischio	288	322	308	313	163	155	155	149	91	138	127	138	34	29	26	26	
Rischio nullo	103	58	23	8	21	13	8	5	70	36	9	0	12	9	6	3	
Importo Alto rischio (mid)	1157	978	882	933	873	912	877	917	8	0	0	0	277	66	5	16	
Importo Medio rischio (mid)	1131	1092	1118	1114	764	781	648	700	144	67	178	124	224	244	292	290	
Importo Basso rischio (mid)	648	804	696	647	330	369	364	226	107	271	172	254	211	164	160	167	
Importo rischio Nullo (mid)	288	190	133	110	48	18	12	11	48	15	3	0	191	157	118	99	

(1) - compresi 17 incentivi
(2) - compresi 3 incentivi
(3) compreso 1 incentivo e 10 interventi di cui non si hanno informazioni
(4) non raffrontabile: criterio di calcolo modificato
(5) include gli incentivi


Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

**PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO
(LEGGE 651/96)**




SETTORE	NUMERO		FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.		INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE		INTERVENTI COMPLETATI	
		%	milioni	%	milioni	%	numero	%	numero	%	numero	%
A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA	85	11,3	300.432	8,7	323.469	8,9	7,1	64	75,29	0	0,00	
B - BENI CULTURALI	352	46,7	557.320	16,1	607.971	16,6	8,3	240	68,18	78	22,16	
C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO	136	18,0	571.217	16,5	572.217	15,7	0,2	70	51,47	7	5,15	
D - ACCESSIBILITA' E MOBILITA'	63	8,4	1.372.361	39,5	1.417.281	38,8	3,2	41	65,08	7	11,11	
E - SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE	104	13,8	489.717	14,1	551.117	15,1	11,1	41	39,42	6	5,77	
F - INFORMAZIONE, PREPARAZIONE EVENTO	14	1,9	180.359	5,2	180.359	4,9	0,0	7	50,00	2	14,29	
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	463	61,41	100	13,26	


**NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 651/96)**

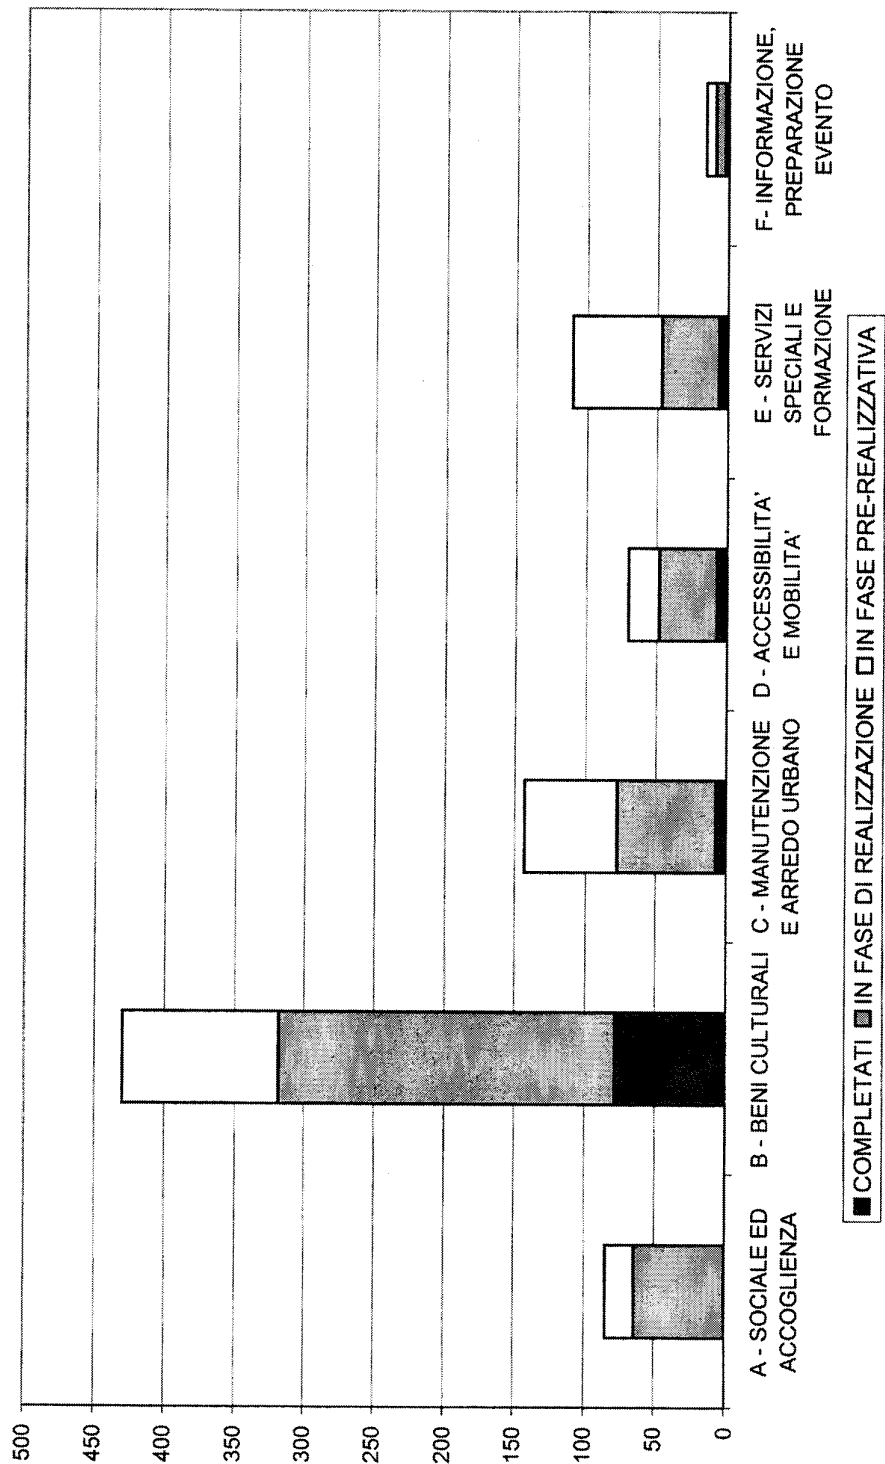

**PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SETTORE
(L.651/96)**

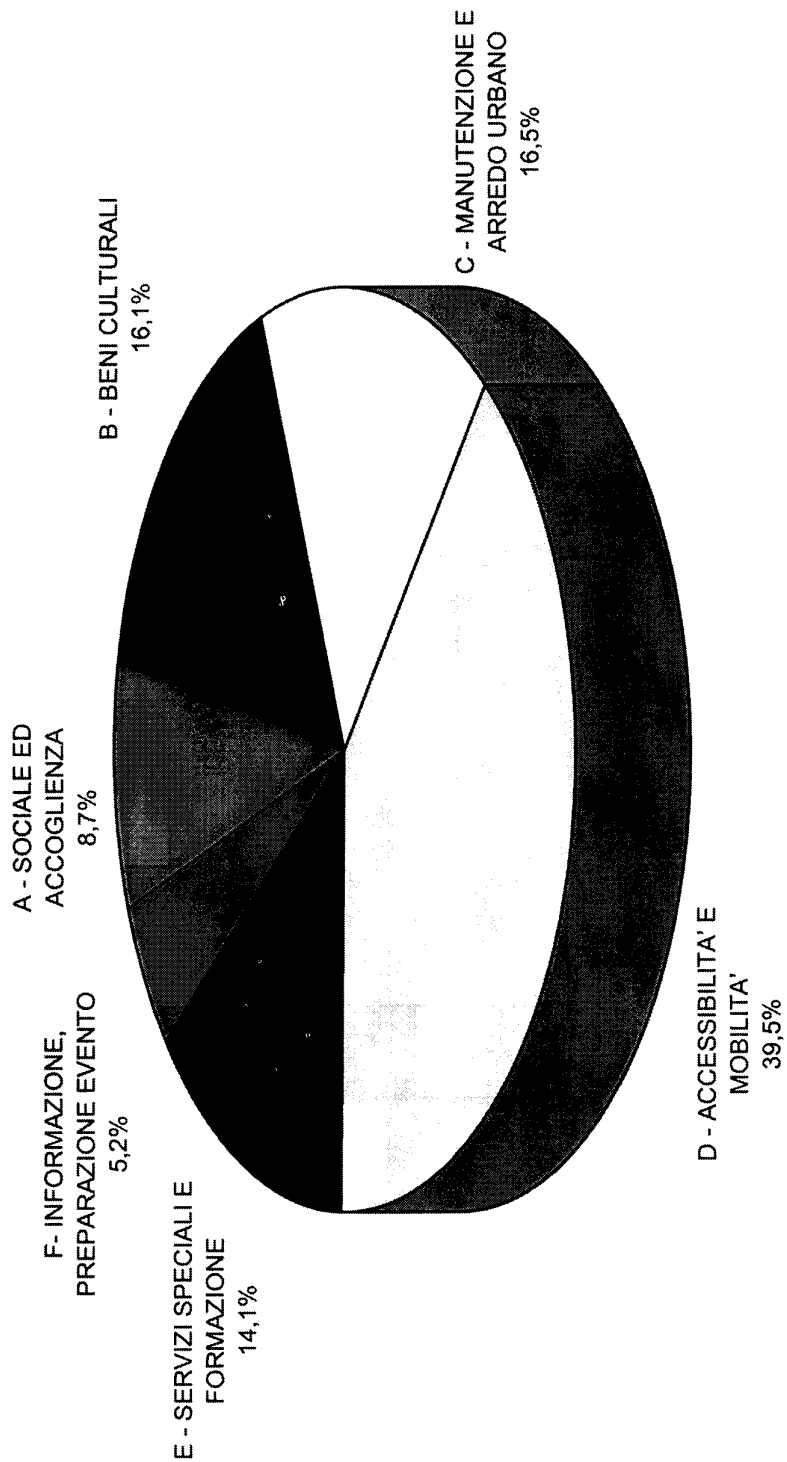

**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 651/96)**

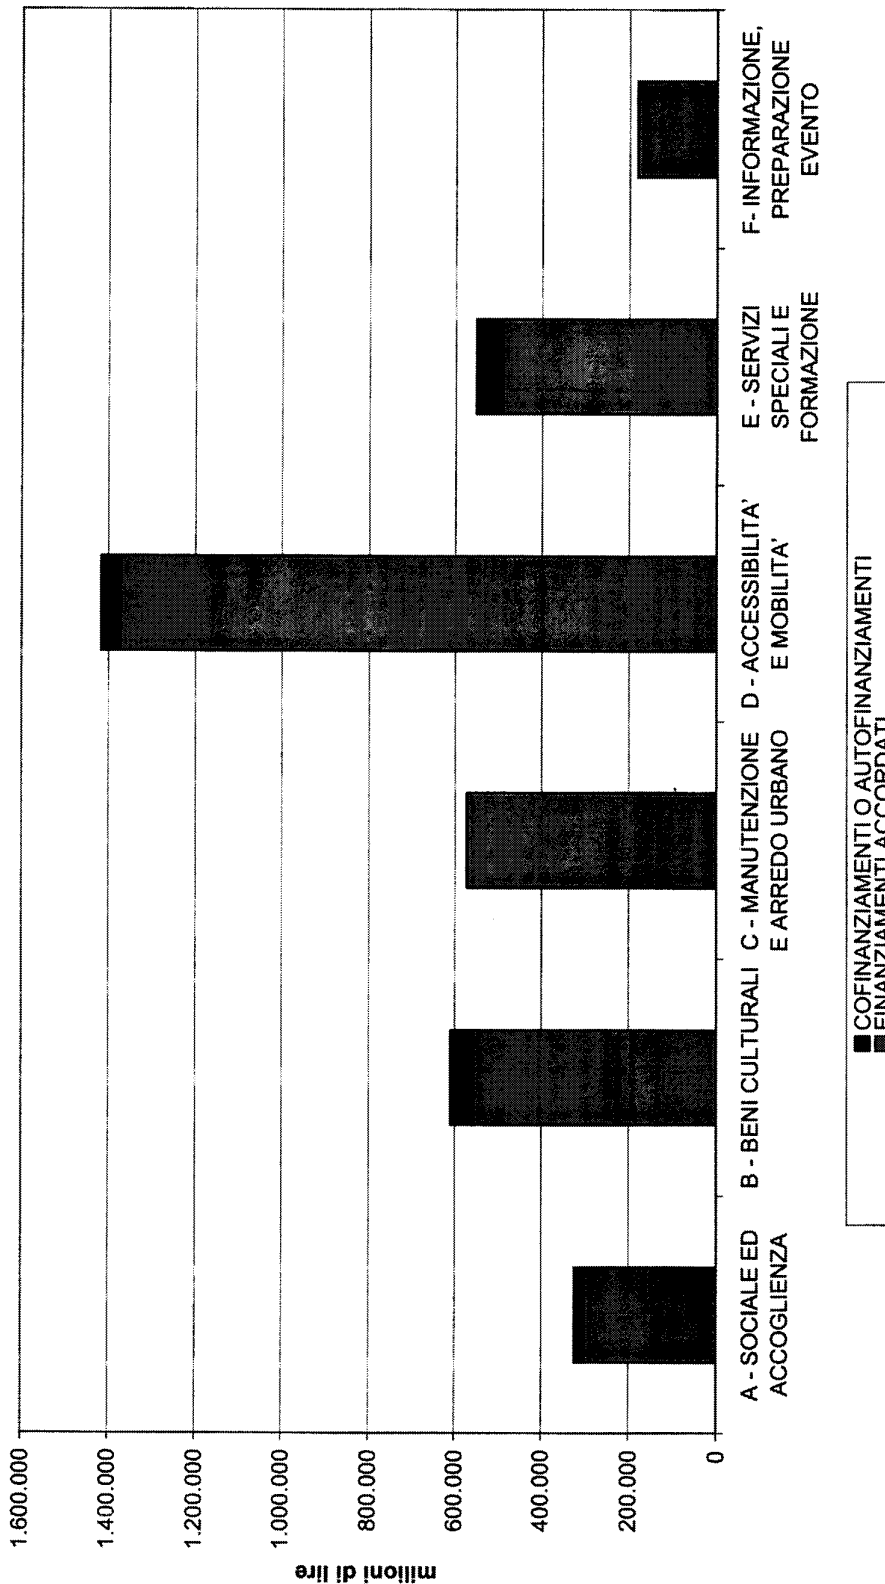


PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO
(LEGGI 651/96)


NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER LOCALITÀ

Localizzazione	NUMERO		FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.		INTER. IN FASE DI REALIZZAZIONE		INTERVENTI COMPLETATI	
	numero	%	milioni	%	milioni	%	numero	%	numero	%	numero	%
Comune di Roma	499	66,2	2.578.005	74,3	2.732.934	74,8	5,7	271	54,31	78	15,63	
altri comuni in prov. Roma	141	18,7	540.258	15,6	548.786	15,0	1,6	106	75,18	16	11,35	
Totale Provincia di Roma	640	84,9	3.118.262	89,8	3.281.720	89,9	5,0	377	58,91	0	0,00	
Provincia di Frosinone	29	3,8	40.503	1,2	42.930	1,2	5,7	25	86,21	3	10,34	
Provincia di Latina	32	4,2	36.434	1,0	41.649	1,1	12,5	24	75,00	1	3,13	
Provincia di Rieti	20	2,7	41.336	1,2	45.239	1,2	8,6	19	95,00	0	0,00	
Provincia di Viterbo	17	2,3	33.698	1,0	35.054	1,0	3,9	14	82,35	2	11,76	
senza riferimenti territoriali	16	2,1	201.173	5,8	205.823	5,6	2,3	4	25,00	0	0,00	
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	463	61,41	100	13,26	


**NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)**

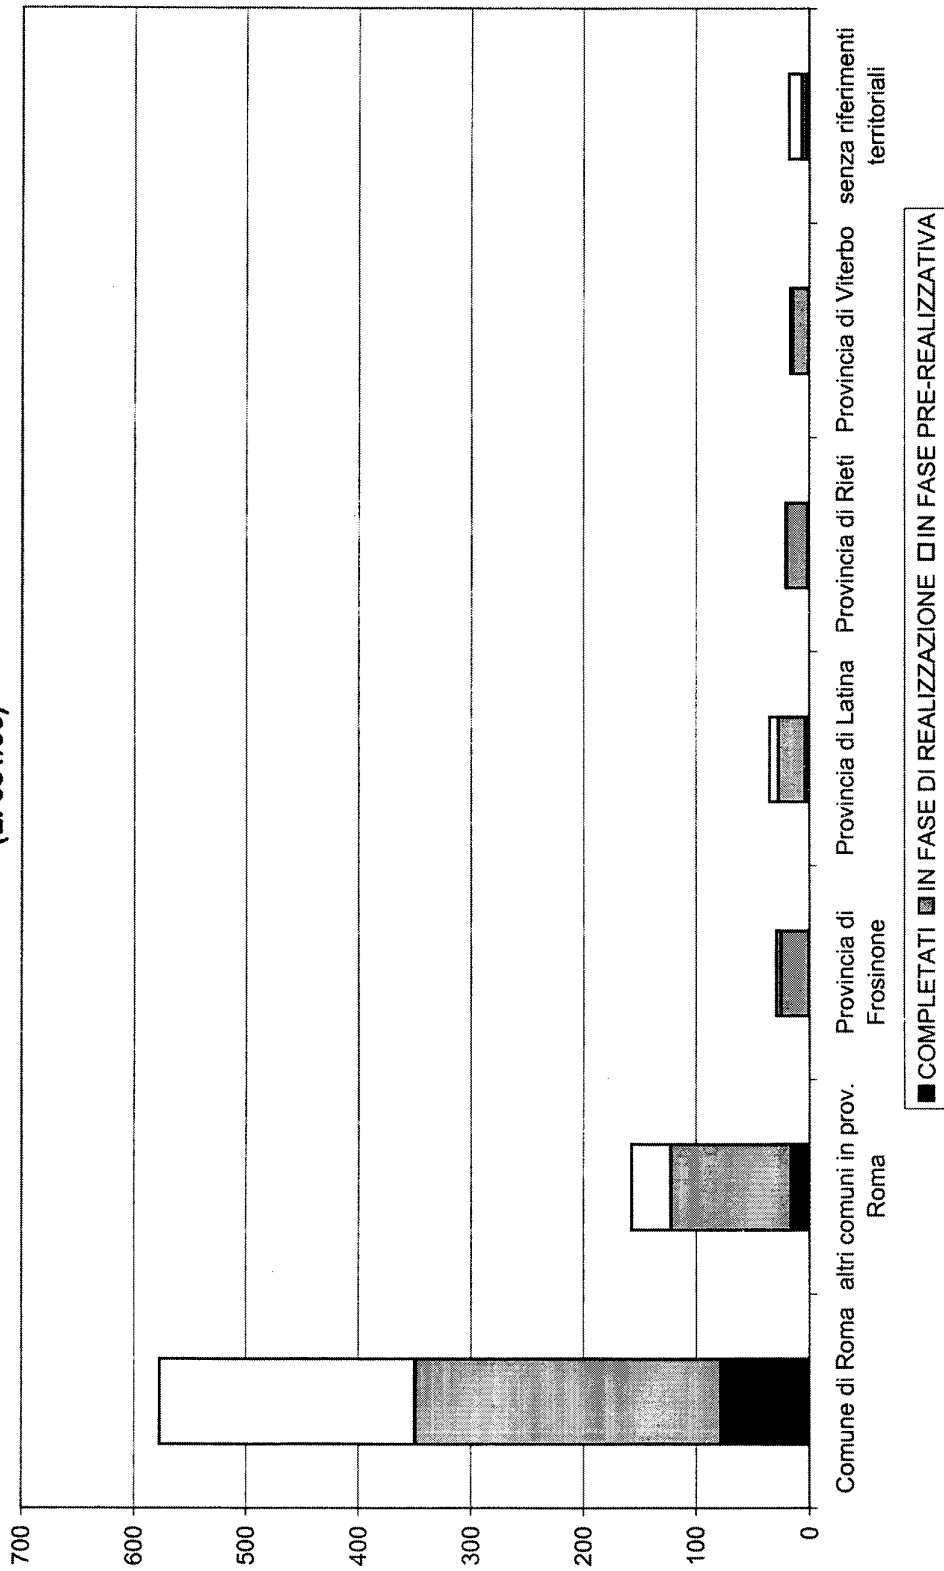

**PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER LOCALIZZAZIONE
(L.651/96)**

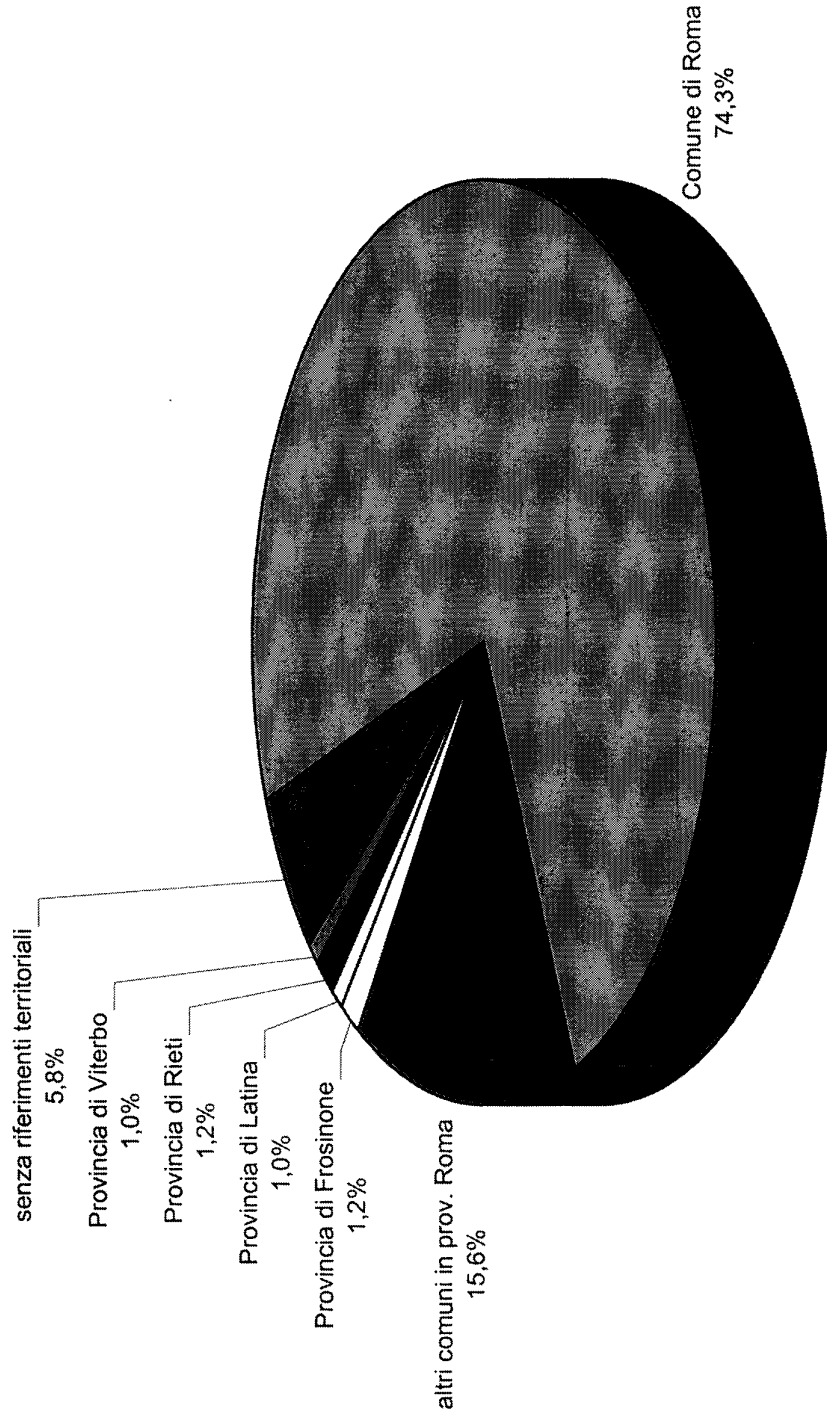

**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)**

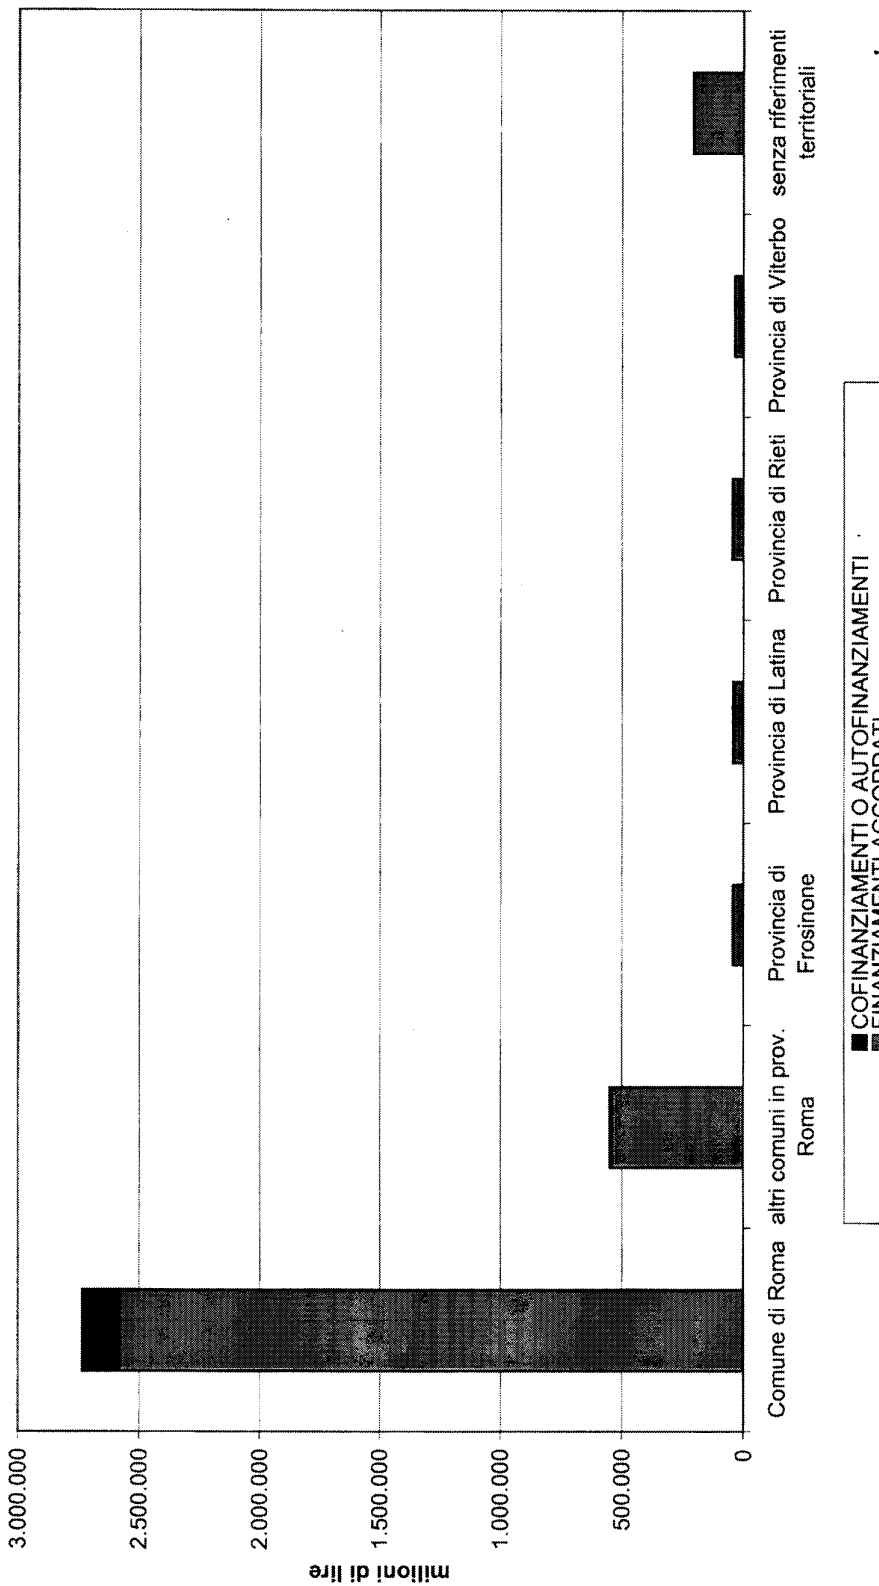


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(LEGGE 651/96)


NUMERO COSTI (C)

Soggetto beneficiario	NUMERO		FINANZIAMENTI ACCORDATI		COSTO INTERVENTI		QUOTA % DI COFINANZ.		INTER IN FASE DI REALIZZAZIONE		INTERVENTI COMPLETATI	
		%	milioni	%	milioni	%	numero	%	numero	%	numero	%
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	206	27,3	317.320	9,1	364.320	10,0	12,9	133	64,56	69	33,50	
Min. BB. CC. AA.	25	3,3	130.426	3,8	130.426	3,6	0,0	10	40,00	0	0,00	
Min. Interni	5	0,7	132.200	3,8	132.200	3,6	0,0	4	80,00	0	0,00	
Min. LL. PP.	13	1,7	37.546	1,1	37.546	1,0	0,0	5	38,46	0	0,00	
altri Ministeri	3	0,4	127.295	3,7	131.565	3,6	3,2	3	100,00	0	0,00	
ANAS	5	0,7	290.022	8,4	290.022	7,9	0,0	4	80,00	0	0,00	
FS	257	34,1	1.034.808	29,8	1.086.079	29,7	4,7	159	61,87	69	26,85	
Totale Amm. Centrali												
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE	16	2,1	214.194	6,2	218.844	6,0	2,1	6	37,50	0	0,00	
Regione Lazio	35	4,6	97.971	2,8	100.149	2,7	2,2	27	77,14	2	5,71	
Provincia di Roma	3	0,4	19.537	0,6	19.912	0,5	1,9	3	100,00	0	0,00	
Provincia di Frosinone	5	0,7	22.132	0,6	25.132	0,7	11,9	5	100,00	0	0,00	
Provincia di Latina	1	0,1	17.500	0,5	17.500	0,5	0,0	1	100,00	0	0,00	
Provincia di Rieti	2	0,3	18.566	0,5	19.177	0,5	3,2	1	50,00	0	0,00	
Provincia di Viterbo	62	8,2	389.900	11,2	400.714	11,0	2,7	43	69,35	2	3,23	
Totale Amm. Regionale e Provinc.												
AMM. COMUNALI	139	18,4	697.285	20,1	698.285	19,1	0,1	76	54,68	4	2,88	
Roma	56	8,8	93.788	2,7	100.138	2,7	6,3	50	75,76	6	9,09	
altri Comuni in Prov. di Roma	18	2,4	17.262	0,5	18.814	0,5	8,2	15	83,33	3	16,67	
Comuni in Prov. di Frosinone	26	3,4	13.340	0,4	15.121	0,4	11,8	18	69,23	1	3,85	
Comuni in Prov. di Latina	19	2,5	23.836	0,7	27.739	0,8	14,1	18	94,74	0	0,00	
Comuni in Prov. di Rieti	10	1,3	6.394	0,2	6.644	0,2	3,8	8	80,00	2	20,00	
Comuni in Prov. di Viterbo	278	36,9	851.906	24,5	866.741	23,7	1,7	185	66,55	16	5,76	
Totale Amm. Comunali												
ALTRI SOGGETTI	29	3,8	184.115	5,3	199.115	5,5	7,5	19	65,52	2	6,90	
Istituzioni sanitarie	14	1,9	174.423	5,0	174.423	4,8	0,0	6	42,86	2	14,29	
Agenzia Romana Giubileo	36	4,8	97.394	2,8	139.144	3,8	30,0	11	30,56	4	11,11	
AMA	5	0,7	50.276	1,4	50.276	1,4	0,0	1	20,00	0	0,00	
STA	4	0,5	10.677	0,3	10.677	0,3	0,0	3	75,00	0	0,00	
ACEA	12	1,6	394.865	11,4	394.865	10,8	0,0	4	33,33	4	33,33	
ATAC-COTRAL	7	0,9	47.161	1,4	47.161	1,3	0,0	1	14,29	0	0,00	
Istituzioni culturali	36	4,8	95.809	2,8	142.551	3,9	32,8	22	61,11	1	2,78	
Enti religiosi	14	1,9	140.074	4,0	140.670	3,9	0,4	9	64,29	0	0,00	
altri beneficiari	157	20,8	1.194.793	34,4	1.298.881	35,6	8,0	76	48,41	13	8,28	
Totale altri soggetti												
TOTALE	754	100,0	3.471.407	100,0	3.652.415	100,0	5,0	463	61,41	100	13,26	


**NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)**

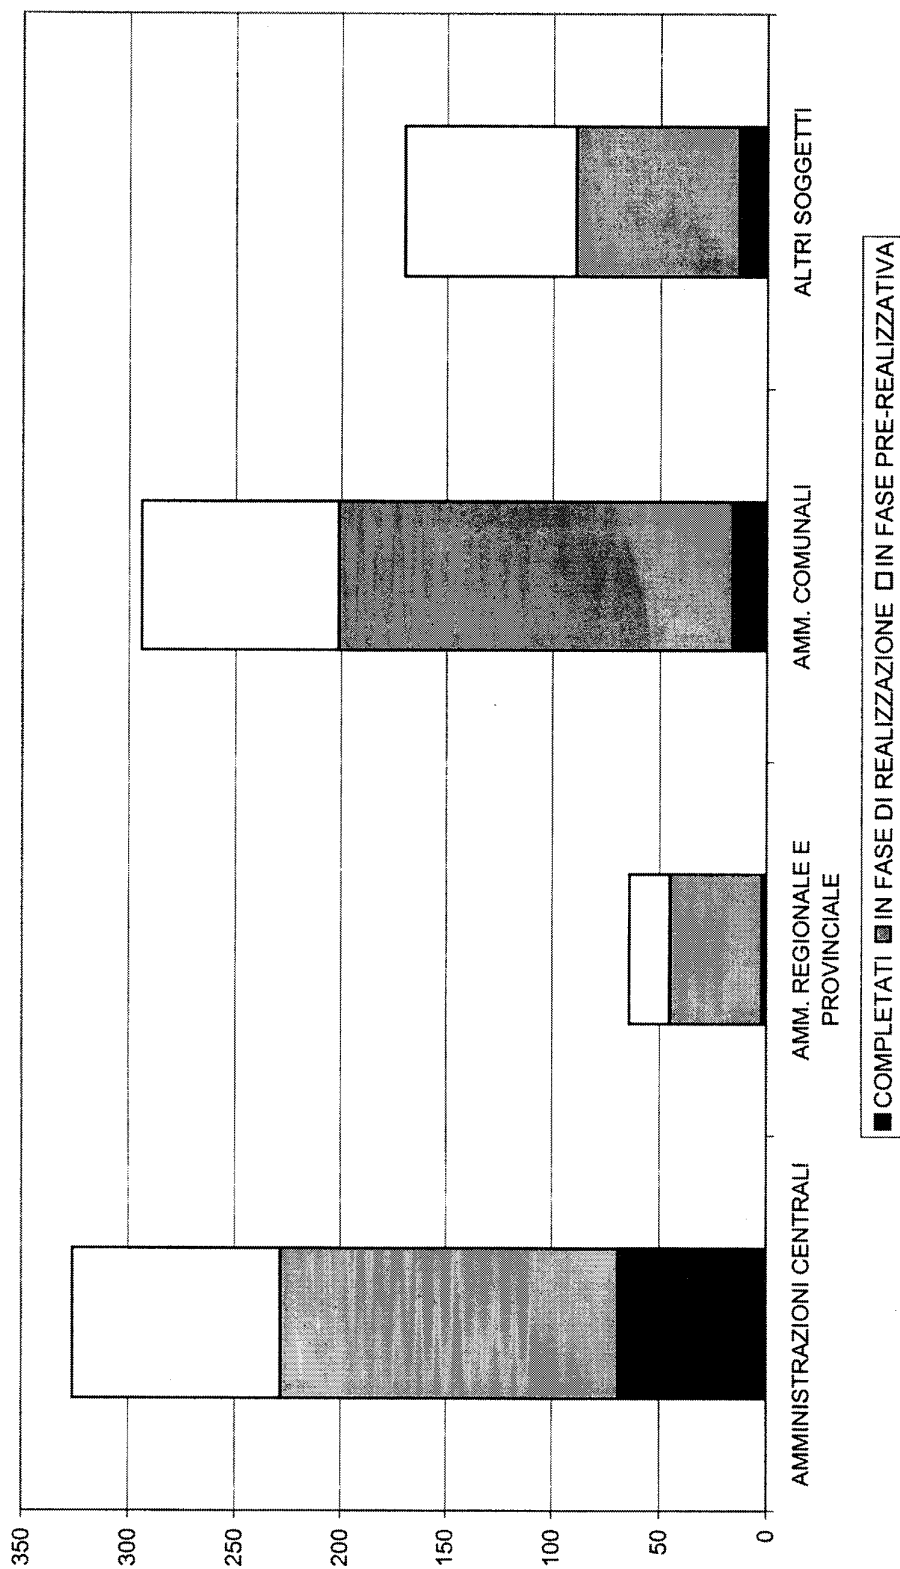

**PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO
BENEFICIARIO (L. 651/96)**

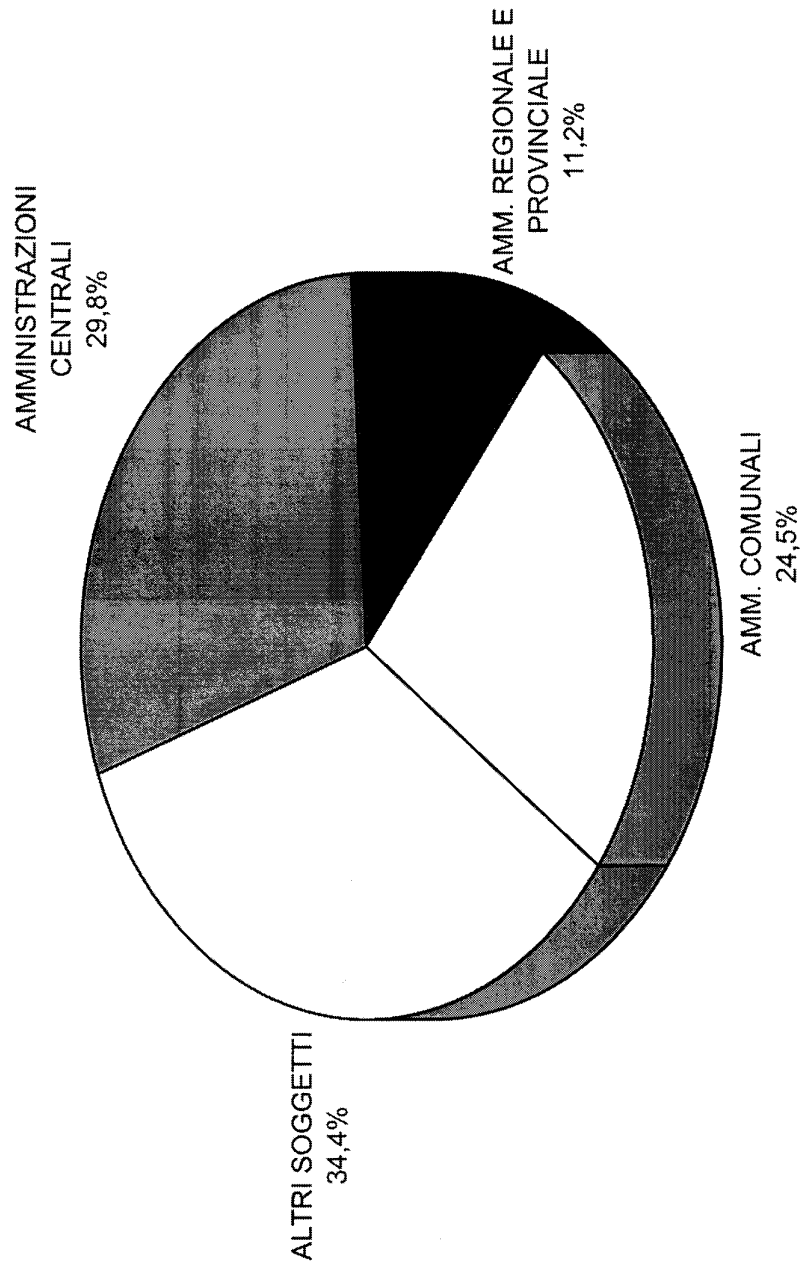

**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)**

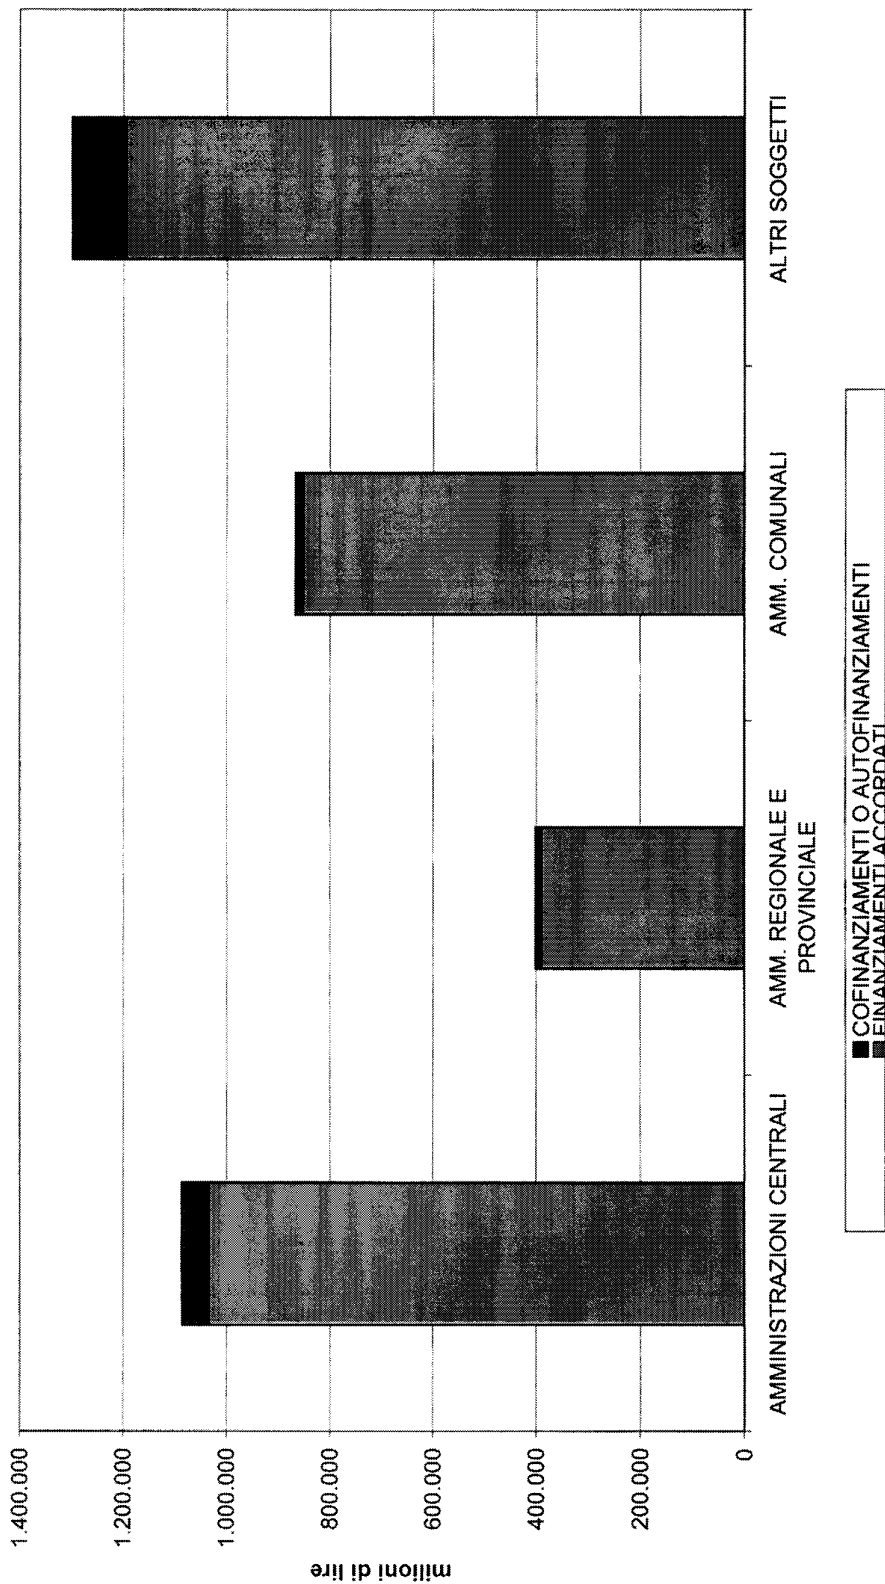

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTUAZIONE FINANZIARIA AL 31 Marzo 1999

UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIULIELO 2000		COSTO STIMATO		PROIEZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN			
			A	A	A	A	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Titolari 1% Conto estero	Privati 5% Conto estero	Utenti finanziati nei rapporti al 100% Conto estero	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Dovute di versamento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN
												30% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa				
A 01 11	Prato di mobilità e trasporto per disabili (Roma), iniziative di un servizio a chiamata con mezzi pubblici messi a disposizione																
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Frosinone/Roma). Ristrutturazione di un immobile da convertire in Residenze Pubbliche	Comune di Frosinone	600.000.000		600.000.000	30.000.000		30.000.000								30.000.000	
A 01 09	Case di accoglienza temporanea per palligiani (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Nazionale	Comune di Roma															
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento di un malato di mente. Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (Centro di Roma)	Comune di Roma	50.000.000		50.000.000	10.000.000		10.000.000								50.000.000	
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per palligiani (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di progetto comunale.	Comune di Roma	4.355.794.364		4.355.794.364				3.629.838.636							3.629.838.636	
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigore Nuovo	Comune di Roma	1.500.000.000		1.500.000.000	50.000.000		50.000.000								50.000.000	
A 01 05	Centro di accoglienza diurna per palligiani e per anziani (Roma). Immobile "S. Giuseppe Donato"	PAAB "S. Francesco Romano", Roma	1.900.000.000		1.900.000.000				1.410.577.960							1.410.577.960	
A 01 04	Centro di accoglienza per palligiani sezione disabili	PAAB "S. Margherita", Roma	7.000.000.000		7.000.000.000	350.000.000		350.000.000	5.371.860.480							5.371.860.480	
A 01 03	Centro diurno e residenziale per palligiani disabili (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL R.M.A.	212.000.000		212.000.000	10.600.000		10.600.000								10.600.000	
A 01 02	Centro di accoglienza per palligiani disabili (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL R.M.A.	212.000.000		212.000.000	10.600.000		10.600.000								10.600.000	
A 01 01	Centri diurni per persone disabili (Roma). Amministrazione centrale presso gli ospedali S. Spirito e S. Galluzzo	Comune di Roma															
A 1	Creazione di strutture per l'assistenza e l'accompagnamento alle categorie disuglie																
<p>EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN</p> <p>IMMOBILI</p> <p>ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali</p> <p>IMPEGNI</p> <p>PAGAMENTI</p> <p>altre fonti</p>																	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Table with columns: Codice, Titolo dell'intervento, Soggetto Beneficiario del finanziamento, RISOSE FONDO GIUBILEO 2000, COSTO STIMATO, and columns for PROGETTAZIONE (IMPEGNI DI SPESA), REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTIVATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (ACCONTI, ULTERIORI EROGAZIONI, SALDO), and EROGAZIONI EFFETTIVATE CON TRASFERIMENTI IN REGIONE LAZIO (AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ALTRI BENEFICIARI).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		COSTO STIMATO		PROGETTAZIONE		REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN		IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
			B	B 13	B	B 13	IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori finanziamenti non superstiti al 10% Caso ritardato	Ulteriori finanziamenti non superstiti al 10% Caso ritardato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E PLOTI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)			
B 13 10	Chiesa S. Maria Maddalena (Roma) - Intervento di restauro della chiesa (per la base)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		1.000.000.000		1.000.000.000									1.000.000.000		
B 13 09	Badia di S. Maria in Trastevere (Roma) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		180.830.000		180.830.000									180.830.000		
B 13 08	Chiesa di S. Marco (Firenze) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		700.000.000		700.000.000									700.000.000		
B 13 07	Chiesa S. Piero in Vincoli (Firenze) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		1.922.727.273		1.922.727.273									1.922.727.273		
B 13 05	S. Clemente (Roma) - Intervento di restauro della basilica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		890.905.672		890.905.672									890.905.672		
B 13 04	Badia di S. Scholastica (Firenze) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		500.000.000		500.000.000									500.000.000		
B 13 03	Chiesa di S. Sebastiano (Firenze) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		500.000.000		500.000.000									500.000.000		
B 13 02	Badia di S. Lorenzo fuori le Mura (Roma) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		384.256.001		384.256.001									384.256.001		
B 13 01	Chiesa S. Croce in Circo (Firenze) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	B		927.719.659		927.719.659									927.719.659		
B 13	Risparmi e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monumenti, Opere	Ministero Beni Culturali	B	B 13												4.000.000.000		
B	Badia di S. Croce in Caracalla (Roma) - Intervento di restauro della chiesa	Ministero Beni Culturali	B		4.000.000.000		4.000.000.000									4.000.000.000		
B	Ulteriori finanziamenti non superstiti al 10% Caso ritardato		B		8.897.000.000		8.897.000.000									8.897.000.000		
RISORSE FONDO GIUBILEO 2000					8.897.000.000										8.897.000.000			
COSTO STIMATO					8.897.000.000										8.897.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Colloca	Titolo dell'incarico				Soggetti beneficiari del finanziamento				RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE				REALIZZAZIONE (1) EROGAZIONI EFFETTIVATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTIVATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI							
	B 16	B 16	B 16	B 16	B 16	B 16	B 16	B 16			B 16	B 16	DEPERNI DI SPESA	Ultri 1% Caste stimate	Privati 5% Caste stimate	Ulteriori finanziamenti non superiori a 10% Caste stimate	DEPERNI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Dinamica di versazione)	MIGLIORIE LAVORI (finanziati da fondi)	ALTRI BENEFICIARI per "borse di studio" e per altre attività culturali	DOPEGNI	PAGAMENTI
	3.698.046.294		902.259.741	3.183.883.190	1.815.958.548	1.780.173.676	2.745.453.709	721.892.086	2.117.585.925	398.319.338	1.886.029.019	2.339.254.745	1.186.799.560	1.186.799.560						2.000.000.000			1.200.000.000	1.200.000.000		
	3.698.046.294		902.259.741	3.183.883.190	1.815.958.548	1.780.173.676	2.745.453.709	721.892.086	2.117.585.925	398.319.338	1.886.029.019	2.339.254.745	1.186.799.560	1.186.799.560						2.000.000.000			1.200.000.000	1.200.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetti beneficiari del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		COSTO STIMATO		PROGETTAZIONE		REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN							
	B 16	B 16		B 16	B 16	B 16	IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori finanziamenti senza imprevisti al 4% Costo ritmato	Private 3% Costo ritmato	Ulteriori finanziamenti senza imprevisti al 4% Costo ritmato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (Decreto di variazione)	ALTRI BENEFICIARI (Decreto di variazione)	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti
B 16 18/09	18/09	18/09	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	91.596.639	91.596.639	91.596.639	91.596.639	91.596.639							100.000.000			100.000.000			
B 16 18/07	18/07	18/07	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	45.817.700	45.817.700	45.817.700	45.817.700	45.817.700							50.000.000			50.000.000			
B 16 18/06	18/06	18/06	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	47.516.077	47.516.077	47.516.077	47.516.077	47.516.077							50.000.000			50.000.000			
B 16 18/05	18/05	18/05	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	551.079.219	551.079.219	551.079.219	551.079.219	551.079.219							600.000.000			600.000.000			
B 16 18/04	18/04	18/04	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	139.394.913	139.394.913	139.394.913	139.394.913	139.394.913							150.000.000			150.000.000			
B 16 18/03	18/03	18/03	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	97.922.410	97.922.410	97.922.410	97.922.410	97.922.410							100.000.000			100.000.000			
B 16 18/02	18/02	18/02	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000							100.000.000			100.000.000			
B 16 18/01	18/01	18/01	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	792.577.857	792.577.857	792.577.857	792.577.857	792.577.857							850.000.000			850.000.000			
B 16 17	B 16 17	B 16 17	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	274.975.000	274.975.000	274.975.000	274.975.000	274.975.000							300.000.000			300.000.000			
B 16 16	B 16 16	B 16 16	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	2.243.463.530	2.243.463.530	2.243.463.530	2.243.463.530	2.243.463.530							2.500.000.000			2.500.000.000			
B 16 15	B 16 15	B 16 15	Musei per i Beni Culturali ed Architettonici	893.462.689	893.462.689	893.462.689	893.462.689	893.462.689							1.000.000.000			1.000.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetti beneficiari del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	COSTO STIMATO	PROGETTAZIONE		REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN		IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti	
					IMPEGNI DI SPESA	Ulteriori finanziamenti non superiori al 5% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di autorizzazione)				REGIONI
E 03 04.2	Acquisto apparecchiature elettroniche e relative materiali ed energia per la scuola di Polizia Municipale	Comune di Roma	300.000.000	300.000.000												
E 03 04.1	Acquisto apparecchiature elettroniche e relative materiali ed energia per la scuola di Polizia Municipale	Comune di Roma	1.700.000.000	1.700.000.000												
E 03 03	Servizi tecnici e tecnici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma	3.805.237.367	3.805.237.367												
E 03 03 02/5	Lavori di rifinitura dell'edificio via Copernico n. 107/108 - Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma	500.000.000	500.000.000												
E 03 03 02/4	Lavori di straordinaria manutenzione e restauro ed adeguamento alle normative vigenti del Palazzo Municipale "Piazza Cavour" n. 11	Comune di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000												
E 03 03 02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti del Palazzo Municipale "Piazza Cavour" n. 11 - Gruppo vigili urbani	Comune di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000												
E 03 03 02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti del Palazzo Municipale "Piazza Cavour" n. 11 - Gruppo vigili urbani	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000												
E 03 03 02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti del Palazzo Municipale "Piazza Cavour" n. 11 - Gruppo vigili urbani	Comune di Roma	2.500.000.000	2.500.000.000												
E 03 03 01	Informazione dei servizi del Vigili Urbani	STA	5.000.000.000	5.000.000.000												
E 3	Modernizzazione della vigilanza urbana (organica e tecnologica)															
E 02 23	Acquisto mezzi economici per il servizio di pulizia del parco di Flaminio (Lazio)	Comune Operativo delle Capitanerie di Porto	3.300.000.000	3.300.000.000												
E 02 02																
E 02 02																
					IMPEGNI DI SPESA		ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO					
					Ulteriori finanziamenti non superiori al 5% Costo stimato		24% e 50% Impegno di spesa		20% e 30% Impegno di spesa		10% Impegno di spesa		Fin alla concorrenza del 85% e 90%		10% all'impugnazione del certificato di collaudo provvisorio	
					IMPEGNI DI SPESA		ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di autorizzazione)		REGIONI		PAGAMENTI		altre fonti	
					250.000.000						250.000.000		250.000.000			
					250.000.000											
					3.180.297.800						3.180.297.800					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Table with columns: Credits, Title of the intervention, Subject Beneficiary of the financing, RIFORME FONDO GIUBILEO 2000, COSTO STIMATO, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI, EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN. Includes rows for various funding initiatives like 'Cultura OC P 2ra Dente', 'Cultura OC P 1ra Dente', etc.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000		COSTO STIMATO		PROGETTAZIONE			REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN									
							IMPEGNI DI SPESA	UMI Tenuti 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	ACCONTI	ULTERIORI EROGAZIONI	SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	RESORSE LORO DESTINATARI	ALTRE BENEFICIARI per "Escentri" nel settore delle attività culturali	IMPEGNI	PAGAMENTI	altre fonti		
												20% e 50% Impegno di spesa	30% e 30% Impegno di spesa	30% Impegno di spesa	Fin alla concorrenza del 85% e 90% per impegni di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio							
F 05 07	Manutenzione degli interventi in viale del Piano per il Chiabotto	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000					322.000.000														
F 05 06	Finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di rinnovo, di adeguamento, di riqualificazione, di rinnovo, di rinnovo, di rinnovo	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi	3.300.000.000	3.300.000.000																			
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Chiabotto Agnelli	Agenzia Roma per la preparazione del Chiabotto	8.152.080.000	8.152.080.000					300.000.000														
F 05 04	Sistema informativo e di gestione per la preparazione, realizzazione e gestione del Chiabotto	Agenzia Roma per la preparazione del Chiabotto	17.993.440.000	17.993.440.000					500.000.000														
F 05 03	Sistema tecnico di gestione per la preparazione, realizzazione e gestione del Chiabotto	Agenzia Roma per la preparazione del Chiabotto	7.612.000.000	7.612.000.000					150.000.000														
F 05 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità per la preparazione, realizzazione e gestione del Chiabotto	Agenzia Roma per la preparazione del Chiabotto	5.000.000.000	5.000.000.000																			
TOTALE			3.487.260.774.371	3.487.260.774.371	6.000.000.000	6.000.000.000	300.000.000	300.000.000	84.839.807.741	8.363.322.971	1.383.872.064.544	466.150.963.080	105.392.175.270	66.476.949.620	100.466.093.170	1.804.506.880	8.674.303.413	381.609.500.000	151.936.230.000	2.021.660.365.545	997.963.805.282	165.154.278.893	

Impegni di spesa	1.479.440.332.132	Pagamenti	997.963.805.282
Variazioni di bilancio	381.609.500.000	Variazioni di bilancio	381.609.500.000
Totale risorse attivate	1.861.049.832.132	Totale risorse trasferite	1.379.573.305.282
Impegni di spesa - A	184.176.165.898	Pagamenti A	157.160.122.968
Impegni di spesa - B	125.488.521.687	Pagamenti B	57.954.434.675
Impegni di spesa - C	260.035.921.643	Pagamenti C	195.280.166.635
Impegni di spesa - D	709.555.487.357	Pagamenti D	452.234.134.763
Impegni di spesa - E	118.300.538.764	Pagamenti E	80.751.498.920
Impegni di spesa - F	81.883.696.783	Pagamenti F	54.583.447.321
TOTALI	1.479.440.332.132		997.963.805.282

